Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» 10 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УниверсалСтройСервис», г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Момбеков Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительства системы электроснабжения в новь открывшихся улицы с.Коктал Панфиловский район»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" - Саурыков А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Тендер Береке», ТОО «Гранд Тауэр Сервис», ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», ТОО «ЖАЙЛЫАҚТАУ»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Геодезия Сервис» Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

Сканировано с CamScanner

ржден(а) **ГУ «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта, Автомобильных Дорог И Жилищной Инспекции Панфиловского Района» №58 от 31.12.2021 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
		заявленные	рекомен.к утвержд.
СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	9,12	9,12
СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	4,644	4,644
СИП-3 1х50-20	км	11,132	11,132
СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,116	1,116
Установка опор ВЛ 0,4 кВ	шт	600	600
Установка опор ВЛ 10 кВ	шт	77	77
Установка опор ВЛ 110 кВ	шт	42	42

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

Сканировано с CamScanner

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **За точки подключения проектируемой ВЛ-10кВ принят ВЛ-10кВ №37 от ПС №137 "Коктал". От точки подключения до территории ИЖС строится ВЛ-10кВ на ж/б опорах с подвеской провода СИП-3 сечением 1х50 мм². На территории ИЖС запроектированы: КТПН-250-10/0,4кВ-1шт, КТПН-160-10/0,4кВ-7шт. Ввод в проектируемые КТПН выполнены воздушными. Выход с КТПН-250-10/0,4кВ №1 выполнен кабельным. От проектируемых КТПН строится ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах с подвеской провода СИП-4 сечением 35 мм², 55 мм², 70 мм², 95 мм². Для одноцепных линий ВЛИ-0,4кВ применены типовые опоры на базе ж/б стоек СВ95-2а; для двухцепных линий ВЛИ-0,4кВ применены типовые опоры на базе ж/б стоек СВ105-5; для совместного подвеса ВЛИ-10кВ и ВЛИ-,4кВ применены типовые опоры на базе ж/б стоек СВ110-5: для ВЛИ-10кВ. Выходы из КТПН №1-№8 выполнены воздушными.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев:
фактически 6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 94,2% и фактический применено 95 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

Сканировано с CamScanner

...оснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жаркентский РЭС Сорсембаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

28.10.2023

УСС Момбеков Жонболом Аскарович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

УСС Момбеков Жонболом Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительства системы электроснабжения в новь открывшихся улицы с.Коктал Панфиловский район»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «УниверсалСтройСервис» - Момбеков Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

27.10.2023г.

Сканировано с CamScanner

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	27,172
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	719
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	27,172
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		

Сканировано с CamScanner

	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники уличные светодиодные	шт	
10	Кабели:		
	1) марки СИП-3 1х50-35 напряжением напряжение 35кВ	км	2,684
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	16
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" Саурыков А.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Геодезия Сервис» Слоновский Е. О.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

...ского района, Алматинской области»

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

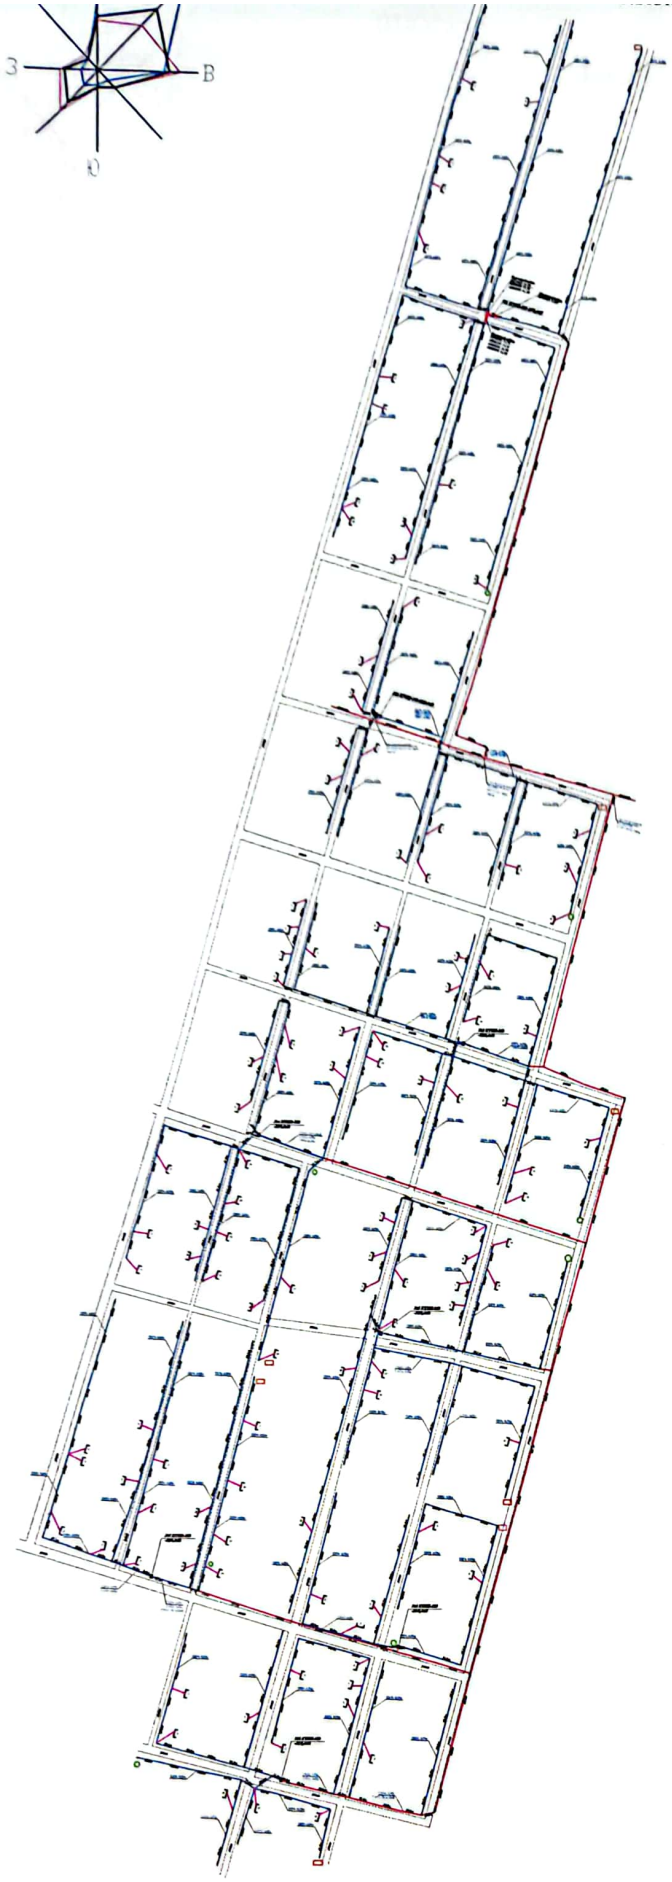

ВЛ 10 кв		
Наименование	Количество шт.	ед.изм
Ж/б опоры СВ-105	77	шт
Ж/б Подкосы СВ-105	38	шт
СИП3. 3(1х50)	9269,8	м

Общее количество всех столбов	719	шт
СИП 4 4х70	8852,8	м
СИП 4 4х50	5528,7	м
СИП 4 4х35	1097,5	м
СИП 3 (1х50)	9269,8	м
АВБбШв 4х95	53	м
АВБбШв 4х70	206	м
Общая протяженность кабелей без учета провиса	25007,8	м

Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата
Директор:		Шарипов Б.			
Исполнитель:		Кулыбеков Д.			14.12.23

ТОО "Саулет Гео-Групп"
№ 21011898 (от 12.03.2021г)
(8702-62-999-21)

Система координат - местная
Система высот - Балтийская

Сканировано с CamScanner



Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту : «Электроснабжение в новь открывшихся улиц, с.Коктал, Панфиловского района, Алматинской области»

КТПН-1

Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

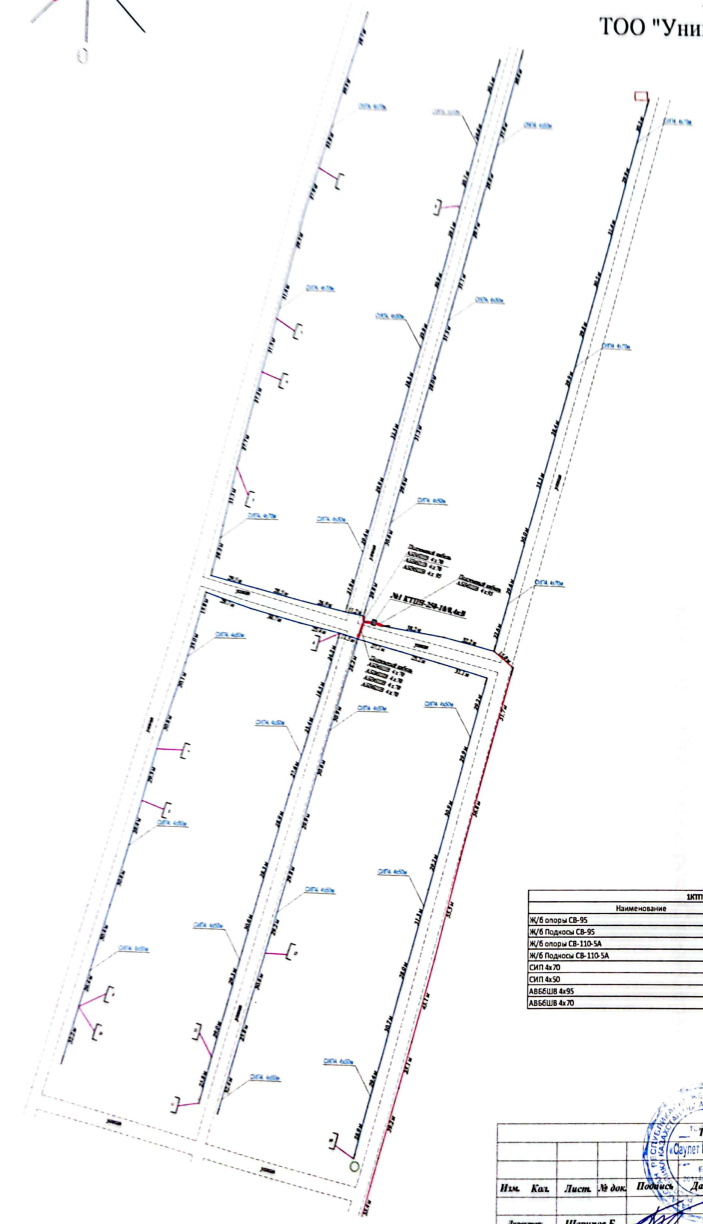

1КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	84	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	14	шт
Ж/б опоры СВ-110-5А	6	шт
Ж/б Подкосы СВ-110-5А	4	шт
СИП 4х70	1027,2	м
СИП 4х50	2219,1	м
АВБбШВ 4х95	53	м
АВБбШВ 4х70	206	м

					ТОР-2023
Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата
Директор:		Шарипов Б.			
Исполнитель:		Кулыбеков Д.			14.12.23

ТОО "Саулет Гео-Групп"
Л № 21011898 (от 12.03.2021г)
(8702-62-999-21)

Система координат - местная
Система высот - Балтийская

Сканировано с CamScanner

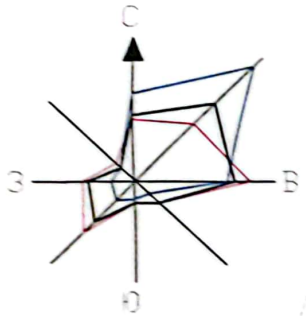

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту : «Электроснабжение в новь открывшихся улиц, с.Коктал, Панфиловского района, Алматинской области»

КТПН-2

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

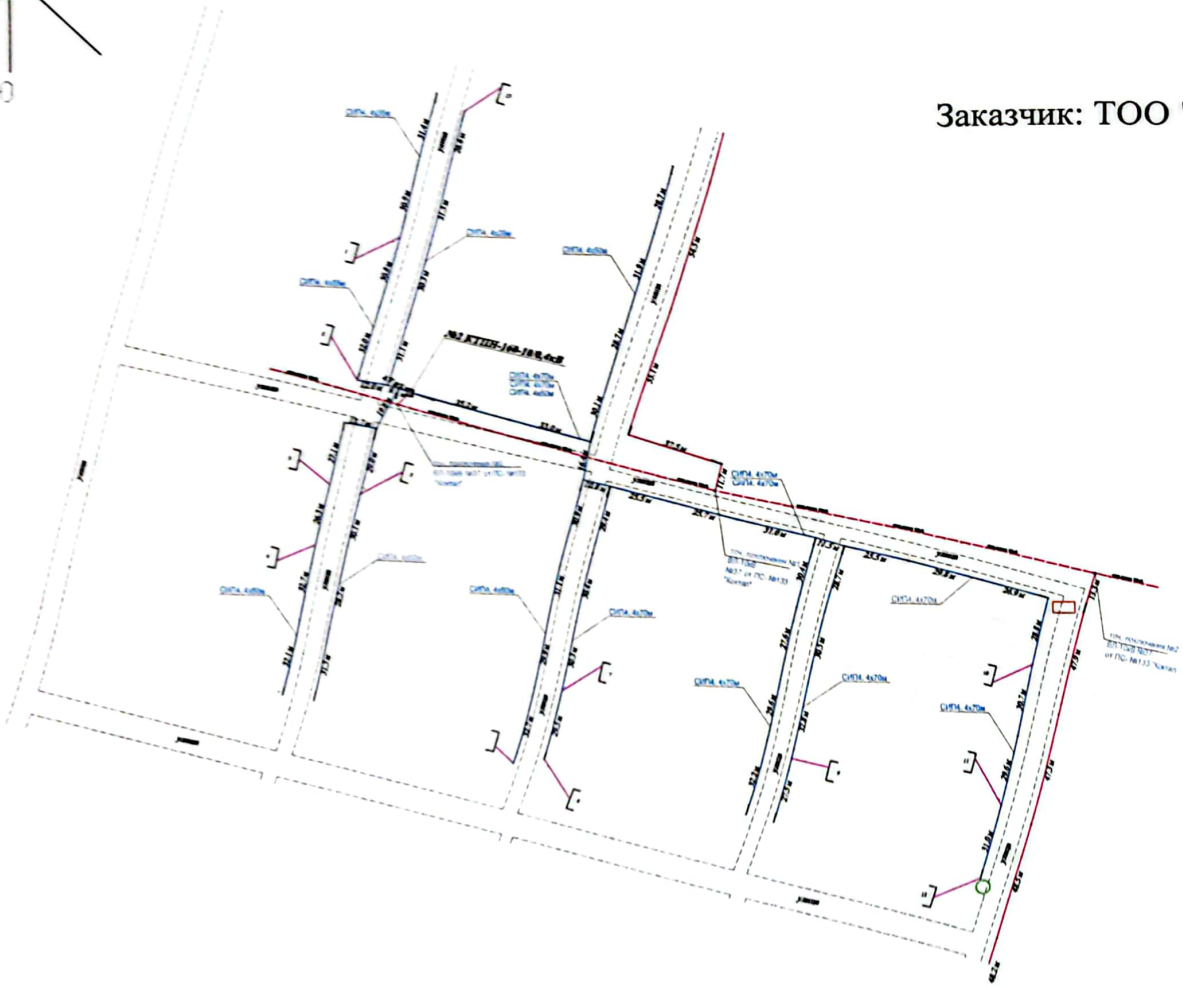

2КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	48	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	21	шт
Ж/б опоры СВ-110-5А	5	шт
Ж/б Подкосы СВ-110-5А	3	шт
СИП 4 4х35	274,9	м
СИП 4 4х50	614,8	м
СИП 4 4х70	932,6	м

					ТОО 2023
Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата
Директор:		Шарипов Б.			
Исполнитель:		Кулыбеков Д.			14.12.23

ТОО "Саулет Гео-Групп"
ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г)
(8702-62-999-21)

Система координат - местная
Система высот - Балтийская

Сканировано с CamScanner

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту : «Электроснабжение в новь открывшихся улиц, с.Коктал, Панфиловского района, Алматинской области»
КТПН-3

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

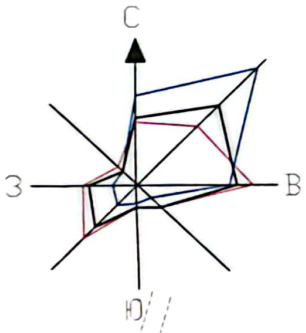

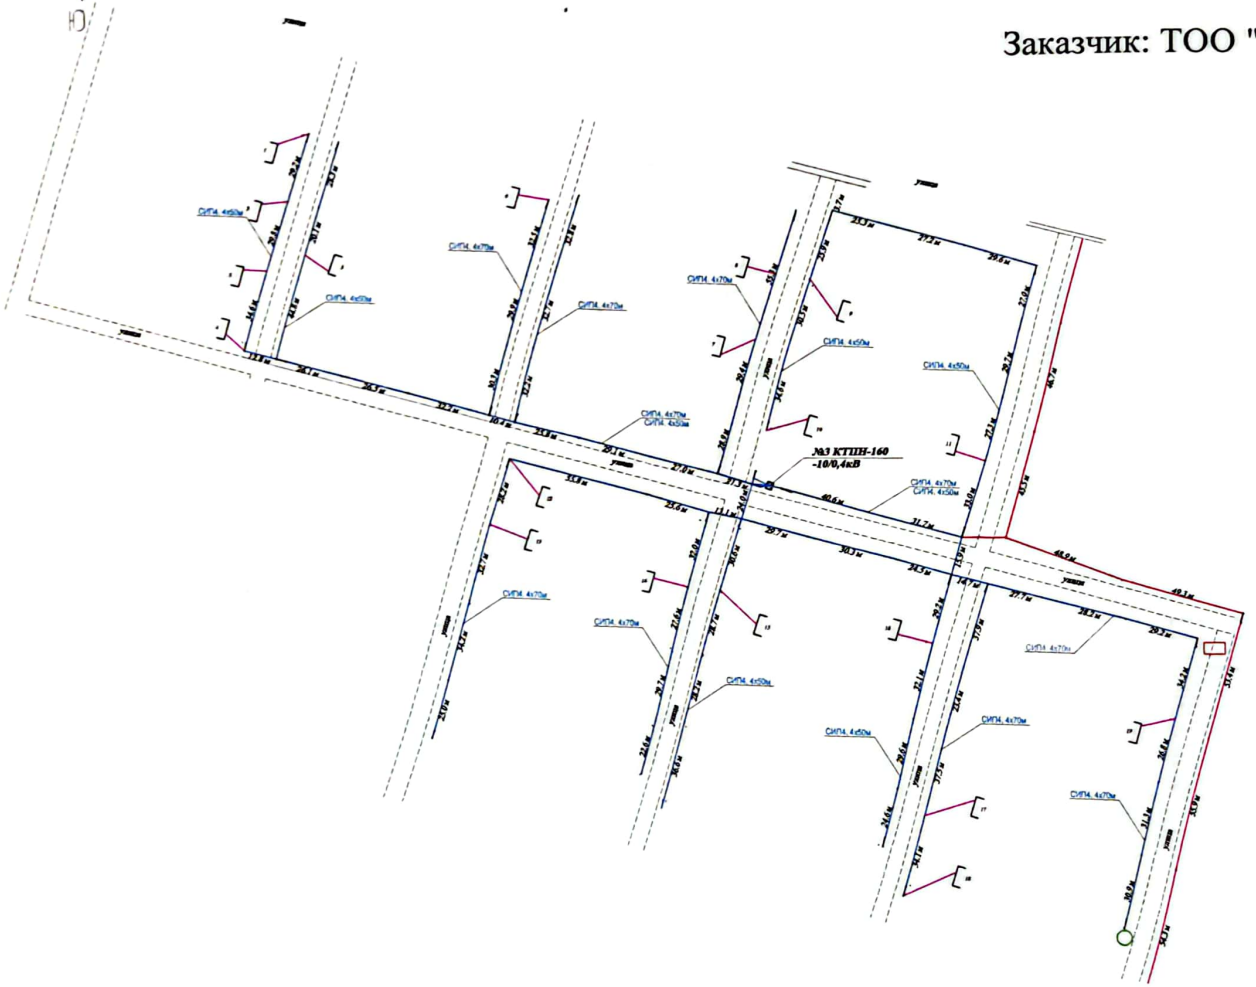

ЗКТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	64	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	26	шт
Ж/б опоры СВ-110-5А	5	шт
Ж/б Подкосы СВ-110-5А	3	шт
СИП 4 4х50	1116,6	м
СИП 4 4х70	1237,4	м

Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата
Директор:		Шарипов Б.			
Исполнитель:		Кулыбеков Д.			14.12.23

ТОО "Саулет Гео-Групп"
ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г)
(8702-62-999-21)

Система координат - местная
Система высот - Балтийская

Сканировано с CamScanner

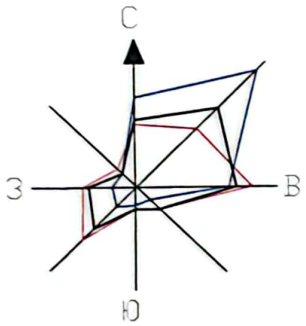

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту : «Электроснабжение в новь открывшихся улиц, с.Коктал, Панфиловского района, Алматинской области»

КТПН-4

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

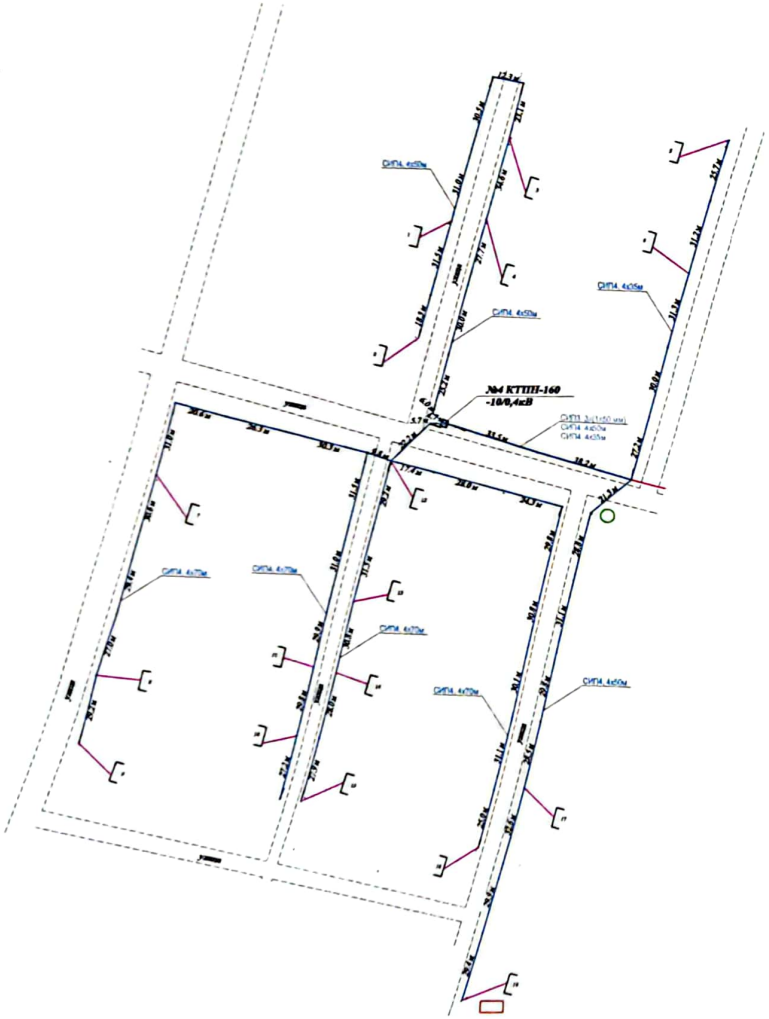

4КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	48	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	15	шт
Ж/б опоры СВ-110-5А	2	шт
Ж/б Подкосы СВ-110-5А	2	шт
СИП 4 4х35	221,6	м
СИП 4 4х50	577,8	м
СИП 4 4х70	858,8	м

ТОО "Саулет Гео-Групп"
ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г)
(8702-62-999-21)

Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата
Директор:		Шарипов Б.			
Исполнитель:		Кульбеков Д.			14.12.23

Система координат - местная
Система высот - Балтийская

Сканировано с CamScanner

Сканировано с CamScanner

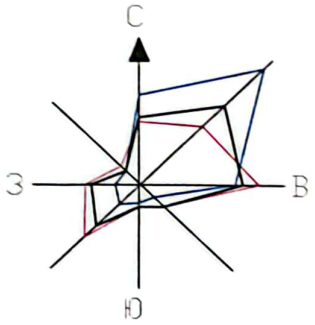

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту : «Электроснабжение в новь открывшихся улиц, с.Коктал, Панфиловского района, Алматинской области»

КТПН-5

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

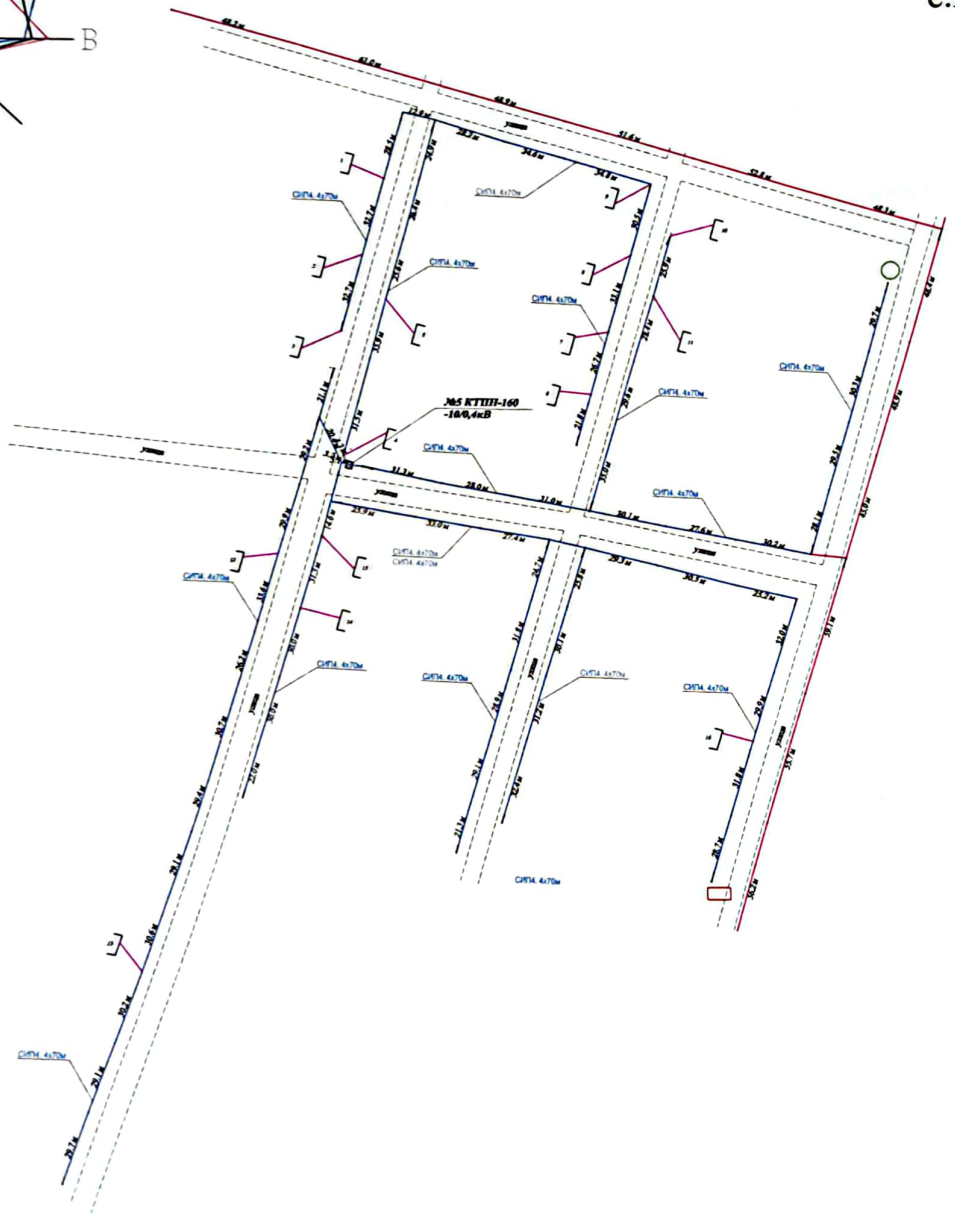

SKTPH		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	61	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	19	шт
Ж/б опоры СВ-110 5А	2	шт
Ж/б Подкосы СВ-110	1	шт
СИП 4 4х70	2241, 7	м

						ТОР-2023
Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата	ТОО "Саулет Гео-Групп" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-62-999-21)
Директор:		Шарипов Б.				Система координат - местная
Исполнитель:		Кулыбеков Д.			14.12.23	Система высот - Балтийская

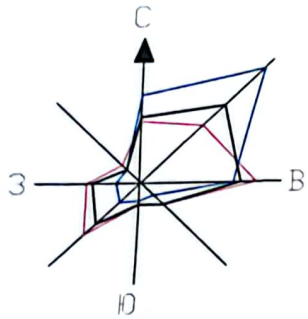

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту : «Электроснабжение в новь открывшихся улиц, с.Коктал, Панфиловского района, Алматинской области»
КТПН-6

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

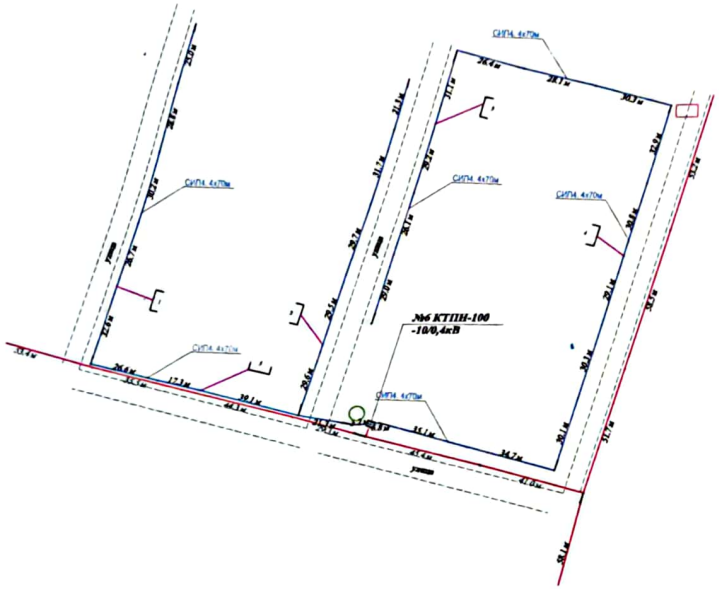

6КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	29	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	9	шт
СИП 4 4х70	822,6	м

					ТОР-2023	
					ТОО "Сеулет Гео-Групп" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-62-999-21)	
Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата	
Директор:		Шарипов Б.				Система координат - местная Система высот - Балтийская
Исполнитель:		Кулыбеков Д.			14.12.23	

Сканировано с CamScanner

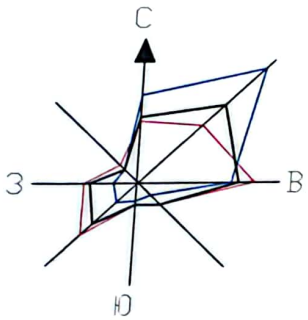

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту : «Электроснабжение в новь открывшихся улиц, с.Коктал, Панфиловского района, Алматинской области»

КТПН-7

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

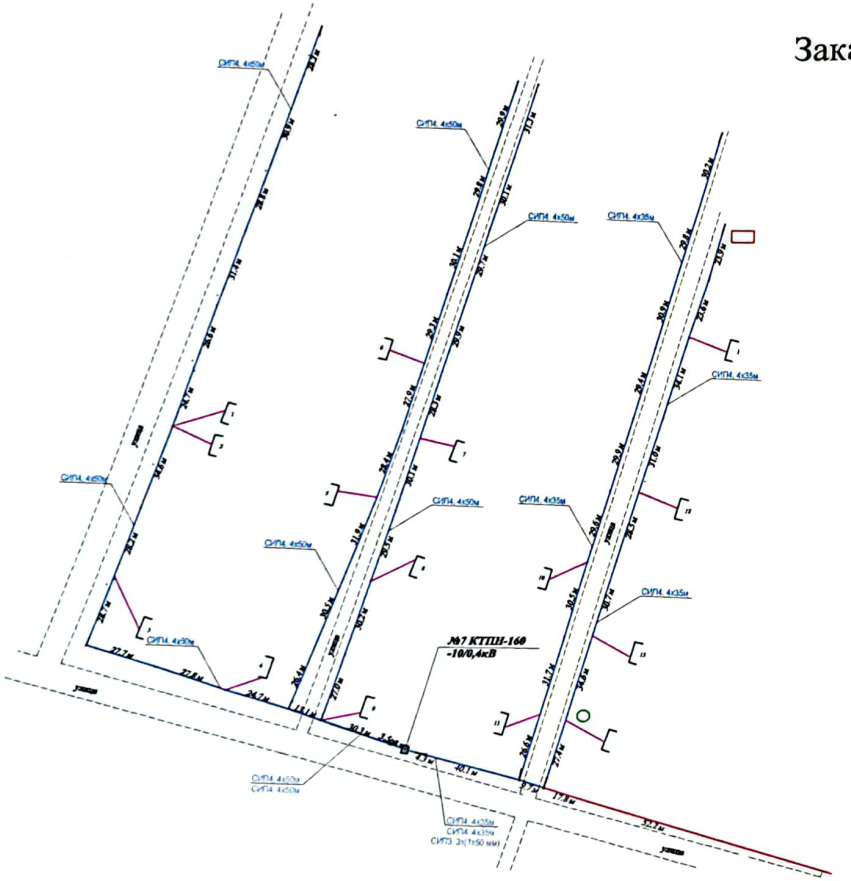

7КТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	47	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	9	шт
Ж/б опоры СВ-110-5А	6	шт
Ж/б Подкосы СВ-110-5А	3	шт
СИП 4 4х35	601	м
СИП 4 4х50	1000,4	м

ТОО "Саулет Гео-Групп" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-62-999-21)

Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата
Директор:		Шарипов Б.			
Исполнитель:		Кулыбеков А.			14.12.23

ТОР-2023

Система координат - местная
Система высот - Балтийская

Сканировано с CamScanner

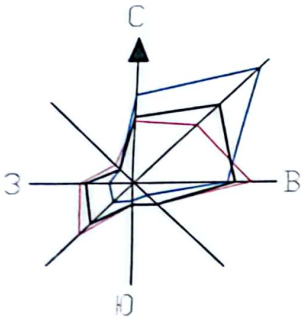

Исполнительная съемка установленных ЛЭП опор и СИП кабелей по проекту : «Электроснабжение в новь открывшихся улиц, с.Коктал, Панфиловского района, Алматинской области»
КТПН-8

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

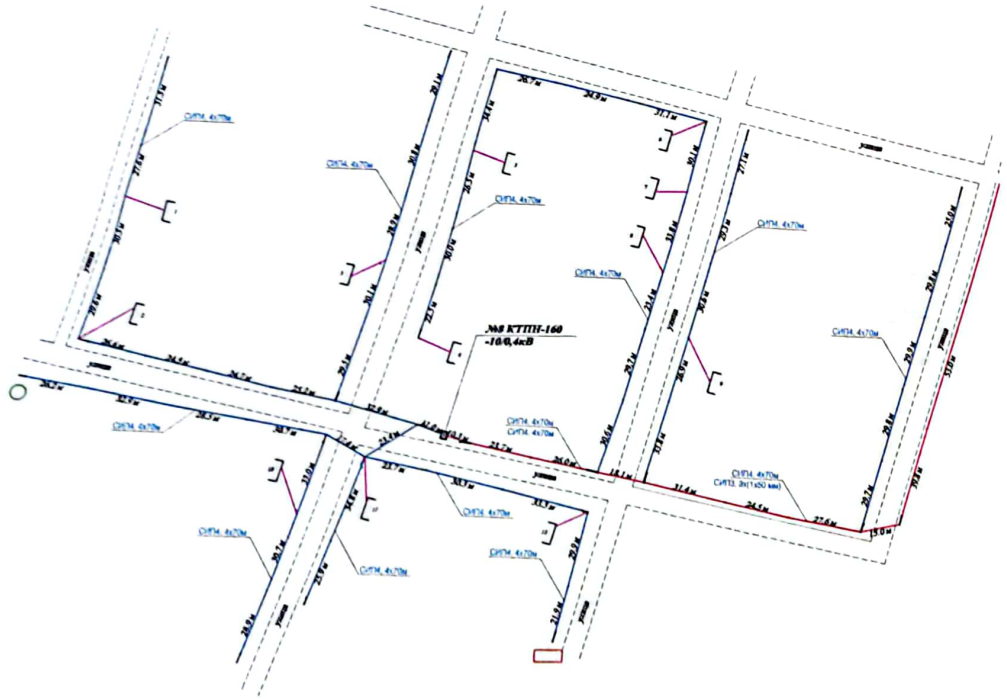

ВКТПН		
Наименование	Количество	ед.изм
Ж/б опоры СВ-95	52	шт
Ж/б Подкосы СВ-95	16	шт
СИП 4 4х70	1732,5	м

						ТОР-2023
						ТОО "Саулет Гео-Групп" ГЛ № 21011898 (от 12.03.2021г) (8702-62-999-21)
Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата	
Директор:		Шарипов Б.				Система координат - местная Система высот - Балтийская
Исполнитель:		Кулыбеков Д.			14.12.23	

Сканировано с CamScanner
