Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Астана, проспект Мангилик Ел, дом № 8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**220840048968**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, район Есиль ул. Әлихан Бөкейхан, дом № 10/1, к.1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050940013378**

Договор (контракт) №16 от 12.02.2025

Номер документа	Дата составления
136	**05.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебно административные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36			работа	1	212 038 349,52	212 038 349,52	22 718 394,59
				Итого	1	x	212 038 349,52	22 718 394,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нургалиев А.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель аппарата / _____ / Кожахмет М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Страница 1 из 5

Подписано через EQURYUS.KZ (#787c4ae-ba321e-8311-b8eae5b2aa

Приложение 2 к приказу

Исполняющего обязанности

министра промышленности

и строительства Республики Казахстан

от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1

к Правилам организации

деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан" г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БИН 220840048968

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1 БИН/ИИН 050940013378

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебно-административные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, ул.Кенесары 36

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль-сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 220840048968	БИН/ИИН 050940013378			16	12.02.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце,		из них:			
				без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А		1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебно-административные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Алматы, ул.Кенесары 36		**593 903 219,77**	**212 038 349,52**	**189 319 954,93**	**189 319 954,93**			**22 718 394,59**	**212 038 349,52**
ИТОГО:									**212 038 349,52**
Удержание аванса 30%									**63 611 504,86**
Гарантийные обязательства 3%									**6 361 150,49**
Итого к оплате									**142 065 694,17**

СДАЛ: (ПОДРЯДЧИК)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1 БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Нургалиев А.Г.**

Представитель технического надзора
ТОО "Аркада KZ"
Приказ № 05-02 от 03марта2025года

Главный эксперт _____ **Красиков К.С.**
Аттестат № KZ34VJE00047503

ПРИНЯЛ: (ЗАКАЗЧИК)

Государственное учреждение "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан" г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8 БИН 220840048968

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

_____ **Қожахмет М.Д.**

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ null	Начальник ПТО	Подписано: 23.09.2025 11:49
Заказчик: ИИН 860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР null	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	Подписано: 23.09.2025 16:08
Заказчик: ИИН 920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН null	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	Подписано: 23.09.2025 16:09
Технический надзор: ИИН 860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ null	Технический директор	Подписано: 23.09.2025 15:48
Заказчик: ИИН 870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР null	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	Подписано: 23.09.2025 16:40
Заказчик: ИИН 840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР null	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	Подписано: 23.09.2025 16:42

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#7f37c4ae-f6a3-421e-82df-b8ea8454b27a)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#7f37c4ae-f6a3-421e-82df-b8ea8454b27a)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#7f37c4ae-f6a3-421e-82df-b8ea8454b27a)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#7f37c4ae-f6a3-421e-82df-b8ea8454b27a)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть				
			Раздел: 1 ЭТАЖ				
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/841,6м2/				
1	72	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	800	296	236 800
2	73	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	160	326	52 160
3	74	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	800	7 790	6 232 000
4	75	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	864	145	125 280
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/841,6м2/				**6 646 240**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, помещения персонала/394,8м2/				
5	79	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	300	296	88 800
6	80	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	60	326	19 560
7	81	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	7 790	2 337 000
8	82	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	324	145	46 980

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, помещения персонала/394,8м2/				**2 492 340**
			Подраздел: ТИП СТ4/столовая, кухня, подсобные помещения кухни/1059,9м2/				
9	91	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	900	296	266 400
10	92	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	150	326	48 900
11	93	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	900	7 790	7 011 000
12	94	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	972	145	140 940
			Итого по подразделу: ТИП СТ4/столовая, кухня, подсобные помещения кухни/1059,9м2/				**7 467 239**
			Подраздел: ТИП СТ5/спортзал, раздевалки/332,4м2/				
13	98	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	300	296	88 800
14	99	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	60	326	19 560
15	100	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	7 790	2 337 000
16	101	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	324	145	46 980
			Итого по подразделу: ТИП СТ5/спортзал, раздевалки/332,4м2/				**2 492 339**
			Итого по разделу: 1 ЭТАЖ				**19 098 159**
			Раздел: 2 ЭТАЖ.═══════════════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-953,3 м2				
17	109	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	150	6 677	1 001 550
18	110	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	153	3 266	499 698
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-953,3 м2				**1 501 248**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/1628,9м2/				
19	166	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	1500	296	444 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	167	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	300	326	97 800
21	168	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1500	7 790	11 685 000
22	169	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	1620	145	234 900
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/1628,9м2/				**12 461 700**
			Подраздел: ТИП СТ4/столовая /487,5м2/				
23	185	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	400	296	118 400
24	186	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	80	326	26 080
25	187	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	7 790	3 116 000
26	188	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	432	145	62 640
			Итого по подразделу: ТИП СТ4/столовая /487,5м2/				**3 323 120**
			Итого по разделу: 2 ЭТАЖ.				**17 286 067**
			Раздел: 3 ЭТАЖ				
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/423,7м2/				
27	237	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	423.7	296	125 415
28	238	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	84.74	326	27 625
29	239	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	423.7	7 790	3 300 623
30	240	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	457.596	145	66 351
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/423,7м2/				**3 520 014**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, помещения персонала/520м2/				
31	244	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	520	296	153 920

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	245	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104	326	33 904
33	246	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	520	7 790	4 050 800
34	247	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	561.6	145	81 432
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, помещения персонала/520м2/				**4 320 056**
			Итого по разделу: 3 ЭТАЖ═══════════════════════════				**7 840 070**
			Раздел: 4 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/114м2/				
35	298	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	34	296	10 064
36	299	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6.8	326	2 217
37	300	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34	7 790	264 860
38	301	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	36.72	145	5 324
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/114м2/				**282 465**
			Подраздел: ТИП СТ2/библиотека/102м2/				
39	305	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	42	296	12 432
40	306	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8.4	326	2 738
41	307	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	42	7 790	327 180
42	308	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	45.36	145	6 577
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/библиотека/102м2/				**348 927**
			Итого по разделу: 4 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**631 392**
			Раздел: 5,13 ЭТАЖИ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-110,6х2 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	324	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	221.2	6 677	1 476 952
44	325	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	225.624	3 266	736 888
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-110,6х2 м2				**2 213 840**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,4х2 м2				
45	326	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	72.8	8 057	586 550
46	327	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	74.256	3 065	227 595
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,4х2 м2				**814 145**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, архив, конференц-зал/-257,6х2 м2				
47	328	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	515.2	296	152 499
48	329	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	103.04	326	33 591
49	330	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	515.2	1 771	912 419
50	331	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	2318.4	113	261 979
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, архив, конференц-зал/-257,6х2 м2				**1 360 488**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5х2 м2				
51	334	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45	2 196	98 820
52	335	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45	513	23 085
53	336	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	45	8 057	362 565
54	337	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	45.9	3 065	140 684
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5х2 м2				**625 154**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-18,48х2 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	338	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36.96	8 057	297 787
56	339	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	37.699	3 065	115 547
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-18,48х2 м2				**413 334**
			Итого по разделу: 5,13 ЭТАЖИ.═══════════════════════════				**5 426 961**
			Раздел: 6 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-118 м2				
57	388	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	118	6 677	787 886
58	389	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	120.36	3 266	393 096
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-118 м2				**1 180 982**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,73 м2				
59	390	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36.73	8 057	295 934
60	391	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	37.465	3 065	114 830
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,73 м2				**410 764**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-391,7 м2				
61	392	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	391.7	296	115 943
62	393	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	78.34	326	25 539
63	394	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	391.7	1 771	693 701
64	395	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1762.65	113	199 179
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-391,7 м2				**1 034 362**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
65	398	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	399	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
67	400	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
68	401	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
69	402	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
70	403	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/156м2/				
71	438	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	36	296	10 656
72	439	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7.2	326	2 347
73	440	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	4 677	168 372
74	441	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	26.4	9 245	244 068
75	442	232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	159.12	3 034	482 770
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/156м2/				**908 213**
			Итого по разделу: 6 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**4 211 472**
			Раздел: 7 ЭТАЖ.═══════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-115 м2				
76	450	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	115	6 677	767 855
77	451	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	117.3	3 266	383 102

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-115 м2				**1 150 957**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,1 м2				
78	452	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36.1	8 057	290 858
79	453	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	36.822	3 065	112 859
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,1 м2				**403 717**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				
80	454	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	64.3	296	19 033
81	455	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12.86	326	4 192
82	456	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	64.3	1 771	113 875
83	457	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	289.35	113	32 697
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				**169 797**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
84	460	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
85	461	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
86	462	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
87	463	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
88	464	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
89	465	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-133,6м2				
90	471	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	133.6	296	39 546
91	472	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26.72	326	8 711
			Итого по подразделу: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-133,6м2				**48 257**
			Итого по разделу: 7 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**2 449 879**
			Раздел: 8 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-112,7 м2				
92	516	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	112.7	6 677	752 498
93	517	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	114.954	3 266	375 440
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-112,7 м2				**1 127 938**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-38,7 м2				
94	518	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	38.7	8 057	311 806
95	519	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	39.474	3 065	120 988
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-38,7 м2				**432 794**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				
96	520	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	192.8	296	57 069
97	521	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38.56	326	12 571
98	522	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	192.8	1 771	341 449
99	523	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	867.6	113	98 039
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				**509 128**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	526	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
101	527	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
102	528	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
103	529	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
104	530	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
105	531	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-204,4м2				
106	537	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	204.4	296	60 502
107	538	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	40.88	326	13 327
			Итого по подразделу: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-204,4м2				**73 829**
			Итого по разделу: 8 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**2 820 840**
			Раздел: 9 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-112,8 м2				
108	582	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	112.8	6 677	753 166
109	583	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	115.056	3 266	375 773
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-112,8 м2				**1 128 939**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-37,1 м2				
110	584	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37.1	8 057	298 915

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	585	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	37.842	3 065	115 986
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-37,1 м2				**414 901**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				
112	586	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	192.8	296	57 069
113	587	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38.56	326	12 571
114	588	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	192.8	1 771	341 449
115	589	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	867.6	113	98 039
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				**509 128**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
116	592	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
117	593	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
118	594	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
119	595	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
120	596	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
121	597	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-203,4м2				
122	603	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	203.4	296	60 206

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	604	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	40.68	326	13 262
			Итого по подразделу: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-203,4м2				**73 468**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/280м2/				
124	622	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	50	296	14 800
125	623	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10	326	3 260
126	624	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	7 790	389 500
127	625	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	54	145	7 830
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/280м2/				**415 390**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./509м2/				
128	629	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	49	296	14 504
129	630	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.8	326	3 195
130	631	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	49	7 790	381 710
131	632	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	52.92	145	7 673
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./509м2/				**407 082**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/164м2/				
132	636	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	44	296	13 024
133	637	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8.8	326	2 869
134	638	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	44	4 677	205 788
135	639	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	164	9 245	1 516 180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	640	232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	167.28	3 034	507 528
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/164м2/				**2 245 389**
			Итого по разделу: 9 ЭТАЖ.═══════════════════════				**5 871 448**
			Раздел: 10 ЭТАЖ.═══════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-119,6 м2				
137	648	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	119.6	6 677	798 569
138	649	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	121.992	3 266	398 426
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-119,6 м2				**1 196 995**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-37,5 м2				
139	650	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37.5	8 057	302 138
140	651	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	38.25	3 065	117 236
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-37,5 м2				**419 374**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				
141	652	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	264.3	296	78 233
142	653	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	52.86	326	17 232
143	654	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	264.3	1 771	468 075
144	655	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1189.35	113	134 397
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				**697 937**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
145	658	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
146	659	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	660	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
148	661	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
149	662	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
150	663	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-136,5м2				
151	669	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	136.5	296	40 404
152	670	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.3	326	8 900
			Итого по подразделу: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-136,5м2				**49 304**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/268м2/				
153	688	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	38	296	11 248
154	689	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7.6	326	2 478
155	690	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38	7 790	296 020
156	691	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	41.04	145	5 951
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/268м2/				**315 696**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./528,28м2/				
157	695	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	28.28	296	8 371
158	696	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5.656	326	1 844

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	697	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	28.28	7 790	220 301
160	698	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	30.542	145	4 429
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./528,28м2/				**234 945**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/156м2/				
161	702	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	26	296	7 696
162	703	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5.2	326	1 695
163	704	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	4 677	121 602
164	705	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	156	9 245	1 442 220
165	706	232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	159.12	3 034	482 770
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/156м2/				**2 055 983**
			Итого по разделу: 10 ЭТАЖ.═══════════════════════════════				**5 647 385**
			Раздел: 11 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-108,9 м2				
166	714	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	108.9	6 677	727 125
167	715	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	111.078	3 266	362 781
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-108,9 м2				**1 089 906**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-29,9 м2				
168	716	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29.9	8 057	240 904
169	717	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	30.498	3 065	93 476
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-29,9 м2				**334 380**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-281,6 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
170	718	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	281.6	296	83 354
171	719	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	56.32	326	18 360
172	720	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	281.6	1 771	498 714
173	721	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1267.2	113	143 194
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-281,6 м2				**743 622**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
174	724	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
175	725	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
176	726	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
177	727	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
178	728	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
179	729	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-133,4м2				
180	735	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	133.4	296	39 486
181	736	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26.68	326	8 698
			Итого по подразделу: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-133,4м2				**48 184**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/383,8м2/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	756	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	53.8	296	15 925
183	757	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10.76	326	3 508
184	758	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	53.8	7 790	419 102
185	759	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	58.104	145	8 425
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/383,8м2/				**446 960**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./530,7м2/				
186	763	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	30.7	296	9 087
187	764	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6.14	326	2 002
188	765	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30.7	7 790	239 153
189	766	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	33.156	145	4 808
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./530,7м2/				**255 049**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/143,6м2/				
190	770	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	13.6	296	4 026
191	771	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2.72	326	887
192	772	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	13.6	4 677	63 607
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/143,6м2/				**68 520**
			Итого по разделу: 11 ЭТАЖ.═══════════════════════				**3 663 772**
			Раздел: 12 ЭТАЖ.═══════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-111,42 м2				
193	782	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	111.42	6 677	743 951

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	783	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	113.648	3 266	371 174
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-111,42 м2				**1 115 125**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-34,64 м2				
195	784	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34.64	8 057	279 094
196	785	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	35.333	3 065	108 296
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-34,64 м2				**387 390**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
197	792	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
198	793	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
199	794	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
200	795	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
201	796	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
202	797	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП СТ6/2438,7м2/				
203	848	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	1800	296	532 800
204	849	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	360	326	117 360
205	850	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1800	7 790	14 022 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	851	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	1944	145	281 880
			Итого по подразделу: ТИП СТ6/2438,7м2/				**14 954 039**
			Итого по разделу: 12 ЭТАЖ.═══				**17 133 705**
			Раздел: МОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКА/л.74/				
			Подраздел: СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКА 200мм и 400мм				
207	870	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6.6	31 431	207 445
208	871	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	6.468	31 172	201 620
209	872	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	165	48	7 920
			Итого по подразделу: СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКА 200мм и 400мм				**416 985**
			Подраздел: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА 100мм				
210	873	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15	31 431	471 465
211	874	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	14.7	31 172	458 228
212	875	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	37.65	48	1 807
			Итого по подразделу: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА 100мм				**931 501**
			Подраздел: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА и закладка проемов/120мм, 250х120х88мм/				
213	876	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66.55	10 149	675 416
214	877	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2.583	94 191	243 296
215	878	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1.378	20 774	28 626
			Итого по подразделу: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА и закладка проемов/120мм, 250х120х88мм/				**947 338**
			Итого по разделу: МОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКА/л.74/				**2 295 824**
			Раздел: ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМОГРАНИТОМ/л.75/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
216	879	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	50.2	22 323	1 120 615
217	880	231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	50.2	18 080	907 616
218	881	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	6.722	31 248	210 049
219	882	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	51.204	5 598	286 640
			Итого по разделу: ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМОГРАНИТОМ/л.75/				**2 524 920**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть				**96 901 895**
			ИТОГО по акту:				**96 901 895**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)	96901895.101 x 6.30%	6 104 820
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	96901895.101 + 6104819.576	103 006 715
	Сметная прибыль, (5.00%)	103006714.677 x 5.00%	5 150 336
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	103006714.677 x 5.000%	5 150 336
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		113 307 386
	Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300	113307386.145 x 0.8300	94 045 131
	Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800	94045130.500 x 0.9800	92 164 228
	Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750	92164227.890 x 1.0750	99 076 545
	НДС (12%)	99076544.982 x 12%	11 889 185
	Итого с НДС	99076544.982 + 11889185.398	110 965 730

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	18.09.2025 14:02
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 19:26
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:53 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:52
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:50
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:03
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:03

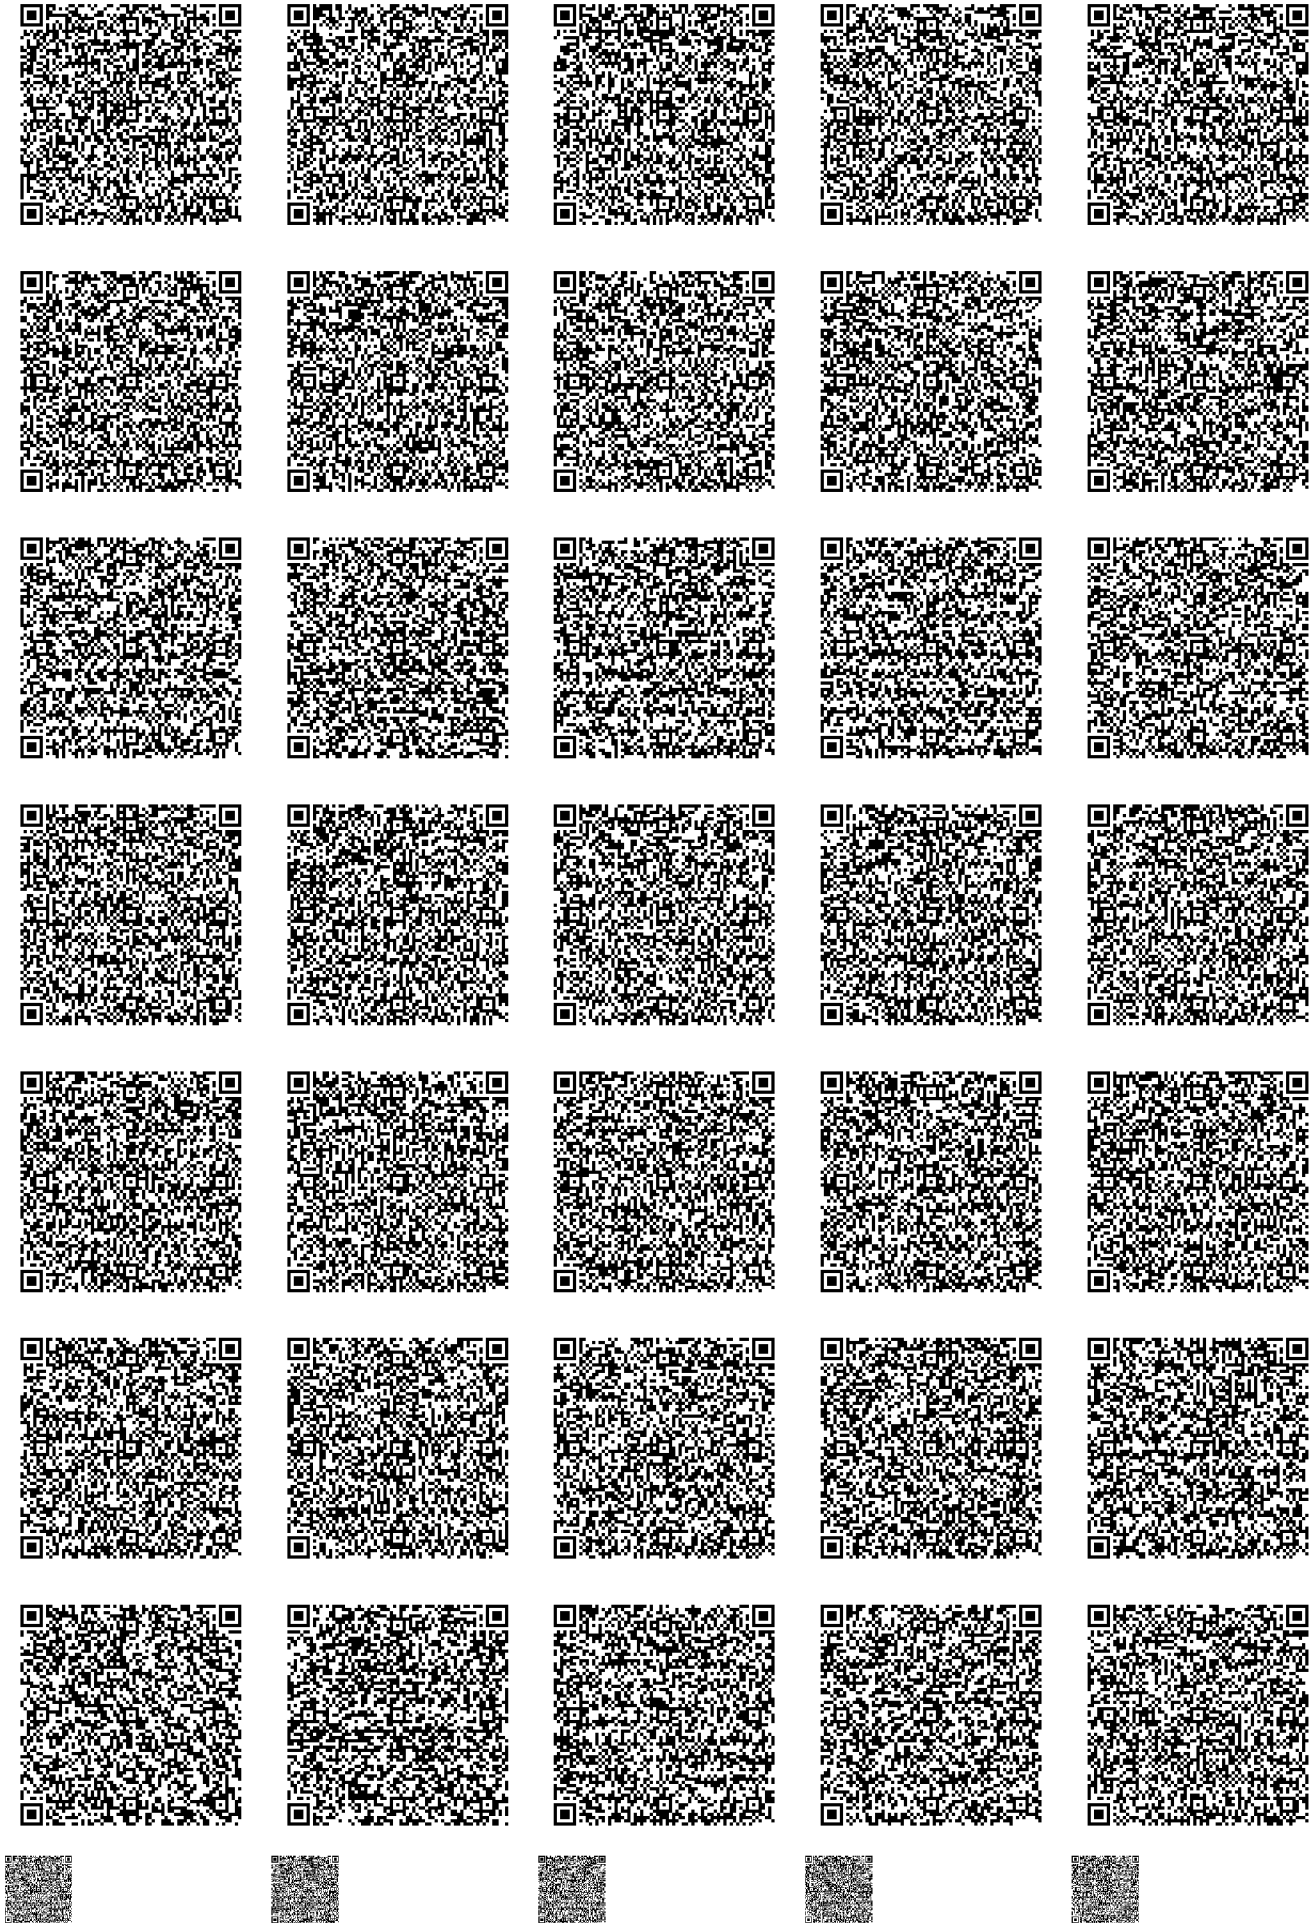

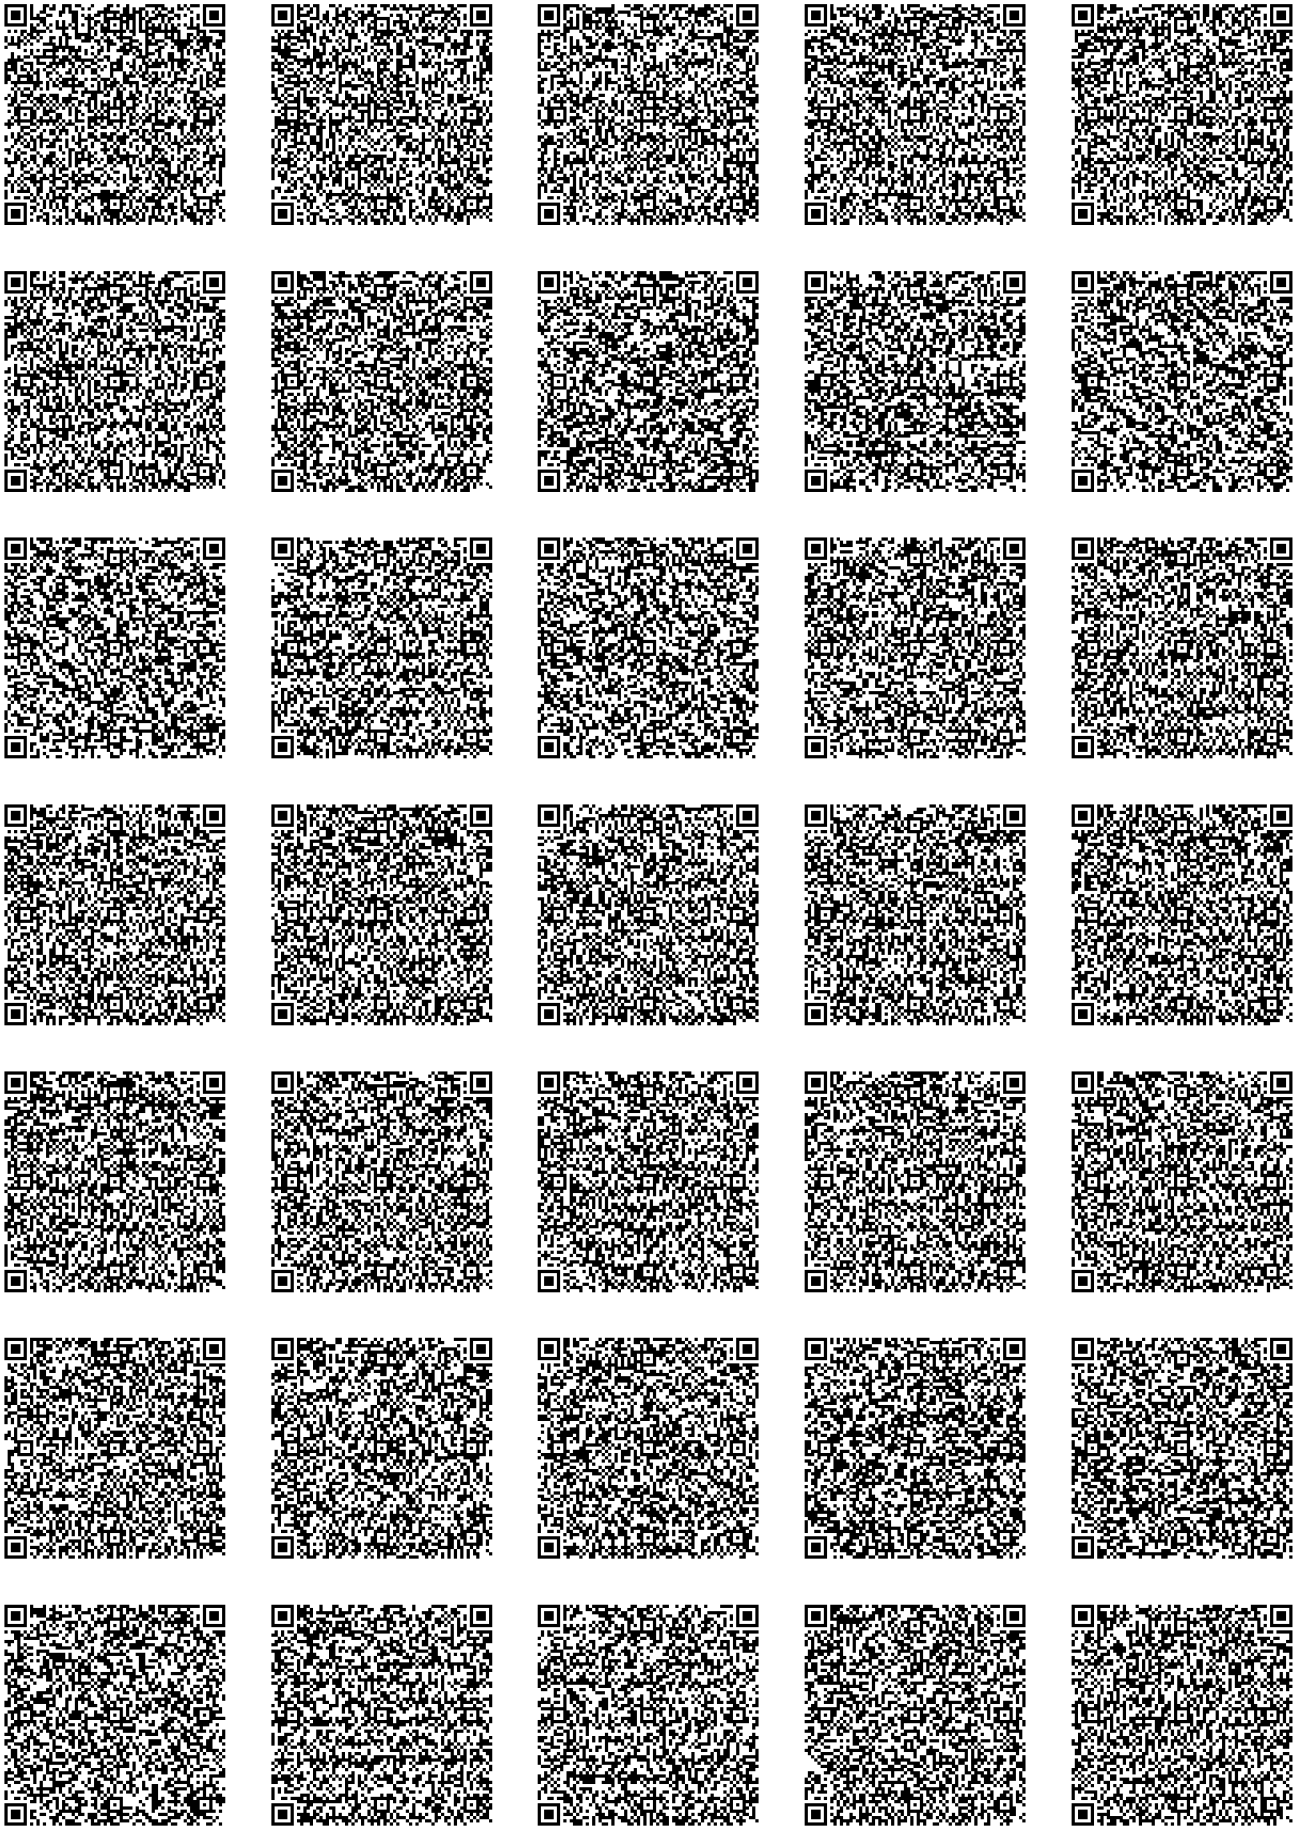

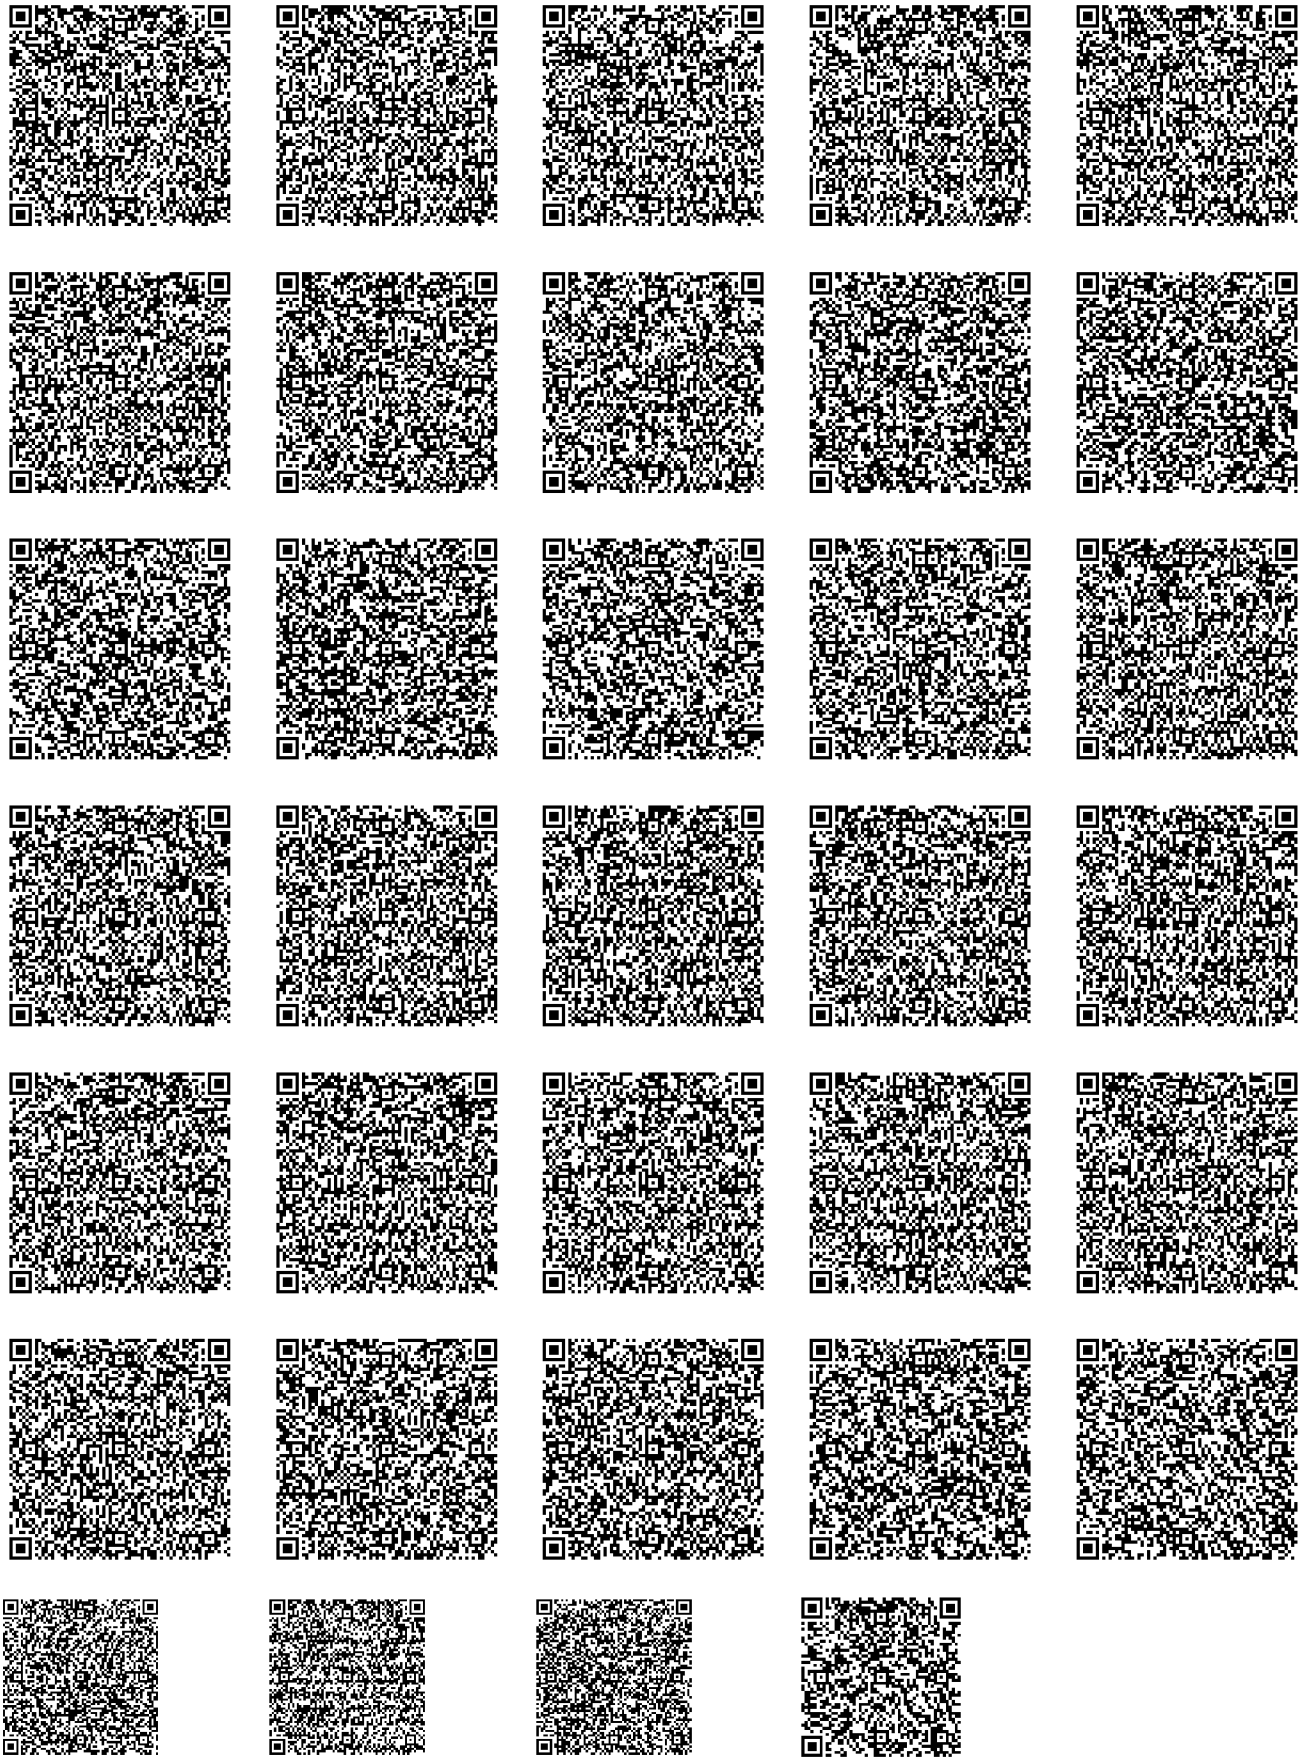

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть				
			Раздел: 1 ЭТАЖ				
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/841,6м2/				
1	72	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	800	296	236 800
2	73	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	160	326	52 160
3	74	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	800	7 790	6 232 000
4	75	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	864	145	125 280
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/841,6м2/				**6 646 240**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, помещения персонала/394,8м2/				
5	79	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	300	296	88 800
6	80	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	60	326	19 560
7	81	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	7 790	2 337 000
8	82	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	324	145	46 980

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, помещения персонала/394,8м2/				**2 492 340**
			Подраздел: ТИП СТ4/столовая, кухня, подсобные помещения кухни/1059,9м2/				
9	91	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	900	296	266 400
10	92	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	150	326	48 900
11	93	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	900	7 790	7 011 000
12	94	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	972	145	140 940
			Итого по подразделу: ТИП СТ4/столовая, кухня, подсобные помещения кухни/1059,9м2/				**7 467 239**
			Подраздел: ТИП СТ5/спортзал, раздевалки/332,4м2/				
13	98	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	300	296	88 800
14	99	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	60	326	19 560
15	100	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	7 790	2 337 000
16	101	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	324	145	46 980
			Итого по подразделу: ТИП СТ5/спортзал, раздевалки/332,4м2/				**2 492 339**
			Итого по разделу: 1 ЭТАЖ				**19 098 159**
			Раздел: 2 ЭТАЖ.═══════════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-953,3 м2				
17	109	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	150	6 677	1 001 550
18	110	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	153	3 266	499 698
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-953,3 м2				**1 501 248**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/1628,9м2/				
19	166	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	1500	296	444 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	167	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	300	326	97 800
21	168	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1500	7 790	11 685 000
22	169	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	1620	145	234 900
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/1628,9м2/				**12 461 700**
			Подраздел: ТИП СТ4/столовая /487,5м2/				
23	185	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	400	296	118 400
24	186	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	80	326	26 080
25	187	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	7 790	3 116 000
26	188	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	432	145	62 640
			Итого по подразделу: ТИП СТ4/столовая /487,5м2/				**3 323 120**
			Итого по разделу: 2 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**17 286 067**
			Раздел: 3 ЭТАЖ═══════════════════════				
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/423,7м2/				
27	237	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	423.7	296	125 415
28	238	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	84.74	326	27 625
29	239	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	423.7	7 790	3 300 623
30	240	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	457.596	145	66 351
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/423,7м2/				**3 520 014**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, помещения персонала/520м2/				
31	244	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	520	296	153 920

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	245	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104	326	33 904
33	246	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	520	7 790	4 050 800
34	247	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	561.6	145	81 432
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, помещения персонала/520м2/				**4 320 056**
			Итого по разделу: 3 ЭТАЖ═══════════════════════════				**7 840 070**
			Раздел: 4 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/114м2/				
35	298	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	34	296	10 064
36	299	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6.8	326	2 217
37	300	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34	7 790	264 860
38	301	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	36.72	145	5 324
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/114м2/				**282 465**
			Подраздел: ТИП СТ2/библиотека/102м2/				
39	305	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	42	296	12 432
40	306	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8.4	326	2 738
41	307	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	42	7 790	327 180
42	308	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	45.36	145	6 577
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/библиотека/102м2/				**348 927**
			Итого по разделу: 4 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**631 392**
			Раздел: 5,13 ЭТАЖИ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-110,6х2 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	324	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	221.2	6 677	1 476 952
44	325	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	225.624	3 266	736 888
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-110,6х2 м2				**2 213 840**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,4х2 м2				
45	326	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	72.8	8 057	586 550
46	327	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	74.256	3 065	227 595
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,4х2 м2				**814 145**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, архив, конференц-зал/-257,6х2 м2				
47	328	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	515.2	296	152 499
48	329	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	103.04	326	33 591
49	330	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	515.2	1 771	912 419
50	331	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	2318.4	113	261 979
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, архив, конференц-зал/-257,6х2 м2				**1 360 488**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5х2 м2				
51	334	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45	2 196	98 820
52	335	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45	513	23 085
53	336	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	45	8 057	362 565
54	337	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	45.9	3 065	140 684
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5х2 м2				**625 154**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-18,48х2 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	338	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36.96	8 057	297 787
56	339	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	37.699	3 065	115 547
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-18,48х2 м2				**413 334**
			Итого по разделу: 5,13 ЭТАЖИ.═══════════════════════════				**5 426 961**
			Раздел: 6 ЭТАЖ.═══════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-118 м2				
57	388	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	118	6 677	787 886
58	389	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	120.36	3 266	393 096
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-118 м2				**1 180 982**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,73 м2				
59	390	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36.73	8 057	295 934
60	391	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	37.465	3 065	114 830
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,73 м2				**410 764**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-391,7 м2				
61	392	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	391.7	296	115 943
62	393	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	78.34	326	25 539
63	394	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	391.7	1 771	693 701
64	395	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1762.65	113	199 179
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-391,7 м2				**1 034 362**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
65	398	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	399	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
67	400	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
68	401	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
69	402	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
70	403	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/156м2/				
71	438	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	36	296	10 656
72	439	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7.2	326	2 347
73	440	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	4 677	168 372
74	441	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	26.4	9 245	244 068
75	442	232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	159.12	3 034	482 770
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/156м2/				**908 213**
			Итого по разделу: 6 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**4 211 472**
			Раздел: 7 ЭТАЖ.═══════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-115 м2				
76	450	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	115	6 677	767 855
77	451	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	117.3	3 266	383 102

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-115 м2				**1 150 957**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,1 м2				
78	452	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36.1	8 057	290 858
79	453	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	36.822	3 065	112 859
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-36,1 м2				**403 717**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				
80	454	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	64.3	296	19 033
81	455	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12.86	326	4 192
82	456	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	64.3	1 771	113 875
83	457	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	289.35	113	32 697
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				**169 797**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
84	460	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
85	461	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
86	462	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
87	463	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
88	464	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
89	465	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-133,6м2				
90	471	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	133.6	296	39 546
91	472	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26.72	326	8 711
			Итого по подразделу: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-133,6м2				**48 257**
			Итого по разделу: 7 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**2 449 879**
			Раздел: 8 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-112,7 м2				
92	516	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	112.7	6 677	752 498
93	517	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	114.954	3 266	375 440
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-112,7 м2				**1 127 938**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-38,7 м2				
94	518	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	38.7	8 057	311 806
95	519	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	39.474	3 065	120 988
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-38,7 м2				**432 794**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				
96	520	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	192.8	296	57 069
97	521	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38.56	326	12 571
98	522	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	192.8	1 771	341 449
99	523	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	867.6	113	98 039
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				**509 128**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	526	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
101	527	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
102	528	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
103	529	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
104	530	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
105	531	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-204,4м2				
106	537	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	204.4	296	60 502
107	538	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	40.88	326	13 327
			Итого по подразделу: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-204,4м2				**73 829**
			Итого по разделу: 8 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**2 820 840**
			Раздел: 9 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-112,8 м2				
108	582	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	112.8	6 677	753 166
109	583	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	115.056	3 266	375 773
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-112,8 м2				**1 128 939**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-37,1 м2				
110	584	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37.1	8 057	298 915

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	585	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	37.842	3 065	115 986
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-37,1 м2				**414 901**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				
112	586	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	192.8	296	57 069
113	587	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	38.56	326	12 571
114	588	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	192.8	1 771	341 449
115	589	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	867.6	113	98 039
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				**509 128**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
116	592	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
117	593	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
118	594	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
119	595	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
120	596	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
121	597	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-203,4м2				
122	603	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	203.4	296	60 206

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	604	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	40.68	326	13 262
			Итого по подразделу: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-203,4м2				**73 468**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/280м2/				
124	622	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	50	296	14 800
125	623	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10	326	3 260
126	624	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	7 790	389 500
127	625	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	54	145	7 830
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/280м2/				**415 390**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./509м2/				
128	629	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	49	296	14 504
129	630	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.8	326	3 195
130	631	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	49	7 790	381 710
131	632	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	52.92	145	7 673
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./509м2/				**407 082**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/164м2/				
132	636	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	44	296	13 024
133	637	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8.8	326	2 869
134	638	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	44	4 677	205 788
135	639	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	164	9 245	1 516 180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	640	232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	167.28	3 034	507 528
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/164м2/				**2 245 389**
			Итого по разделу: 9 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**5 871 448**
			Раздел: 10 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-119,6 м2				
137	648	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	119.6	6 677	798 569
138	649	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	121.992	3 266	398 426
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-119,6 м2				**1 196 995**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-37,5 м2				
139	650	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37.5	8 057	302 138
140	651	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	38.25	3 065	117 236
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-37,5 м2				**419 374**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				
141	652	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	264.3	296	78 233
142	653	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	52.86	326	17 232
143	654	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	264.3	1 771	468 075
144	655	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1189.35	113	134 397
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				**697 937**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
145	658	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
146	659	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	660	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
148	661	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
149	662	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
150	663	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-136,5м2				
151	669	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	136.5	296	40 404
152	670	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.3	326	8 900
			Итого по подразделу: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-136,5м2				**49 304**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/268м2/				
153	688	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	38	296	11 248
154	689	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7.6	326	2 478
155	690	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38	7 790	296 020
156	691	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	41.04	145	5 951
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/268м2/				**315 696**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./528,28м2/				
157	695	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	28.28	296	8 371
158	696	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5.656	326	1 844

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	697	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	28.28	7 790	220 301
160	698	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	30.542	145	4 429
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./528,28м2/				**234 945**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/156м2/				
161	702	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	26	296	7 696
162	703	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5.2	326	1 695
163	704	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	4 677	121 602
164	705	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	156	9 245	1 442 220
165	706	232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	159.12	3 034	482 770
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/156м2/				**2 055 983**
			Итого по разделу: 10 ЭТАЖ.═══════════════════════════════				**5 647 385**
			Раздел: 11 ЭТАЖ.═══════════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-108,9 м2				
166	714	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	108.9	6 677	727 125
167	715	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	111.078	3 266	362 781
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-108,9 м2				**1 089 906**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-29,9 м2				
168	716	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29.9	8 057	240 904
169	717	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	30.498	3 065	93 476
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-29,9 м2				**334 380**
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-281,6 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
170	718	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	281.6	296	83 354
171	719	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	56.32	326	18 360
172	720	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	281.6	1 771	498 714
173	721	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1267.2	113	143 194
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-281,6 м2				**743 622**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
174	724	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
175	725	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
176	726	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
177	727	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
178	728	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
179	729	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-133,4м2				
180	735	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	133.4	296	39 486
181	736	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26.68	326	8 698
			Итого по подразделу: ТИП НП10/компьютерный класс и др./-133,4м2				**48 184**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/383,8м2/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	756	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	53.8	296	15 925
183	757	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10.76	326	3 508
184	758	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	53.8	7 790	419 102
185	759	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	58.104	145	8 425
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/383,8м2/				**446 960**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./530,7м2/				
186	763	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	30.7	296	9 087
187	764	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6.14	326	2 002
188	765	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30.7	7 790	239 153
189	766	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	33.156	145	4 808
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./530,7м2/				**255 049**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/143,6м2/				
190	770	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	13.6	296	4 026
191	771	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2.72	326	887
192	772	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	13.6	4 677	63 607
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/143,6м2/				**68 520**
			Итого по разделу: 11 ЭТАЖ.═══════════════════════════════				**3 663 772**
			Раздел: 12 ЭТАЖ.═══════════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП1/коридоры, холлы/-111,42 м2				
193	782	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	111.42	6 677	743 951

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	783	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	113.648	3 266	371 174
			Итого по подразделу: ТИП НП1/коридоры, холлы/-111,42 м2				**1 115 125**
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-34,64 м2				
195	784	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34.64	8 057	279 094
196	785	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	35.333	3 065	108 296
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-34,64 м2				**387 390**
			Подраздел: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				
197	792	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.5	2 196	49 410
198	793	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные/до толщ.37мм/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22.5	513	11 542
199	794	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22.5	8 057	181 282
200	795	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22.95	3 065	70 342
			Итого по подразделу: ТИП НП5/лестничная площадка/-22,5 м2				**312 576**
			Подраздел: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				
201	796	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32.6	8 057	262 658
202	797	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	33.252	3 065	101 917
			Итого по подразделу: ТИП НП5а/ступени лестниц/-32,6 м2				**364 575**
			Подраздел: ТИП СТ6/2438,7м2/				
203	848	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	1800	296	532 800
204	849	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	360	326	117 360
205	850	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1800	7 790	14 022 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	851	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	1944	145	281 880
			Итого по подразделу: ТИП СТ6/2438,7м2/				**14 954 039**
			Итого по разделу: 12 ЭТАЖ.═══				**17 133 705**
			Раздел: МОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКА/л.74/				
			Подраздел: СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКА 200мм и 400мм				
207	870	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6.6	31 431	207 445
208	871	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	6.468	31 172	201 620
209	872	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	165	48	7 920
			Итого по подразделу: СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКА 200мм и 400мм				**416 985**
			Подраздел: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА 100мм				
210	873	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15	31 431	471 465
211	874	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	14.7	31 172	458 228
212	875	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	37.65	48	1 807
			Итого по подразделу: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА 100мм				**931 501**
			Подраздел: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА и закладка проемов/120мм, 250х120х88мм/				
213	876	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66.55	10 149	675 416
214	877	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2.583	94 191	243 296
215	878	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1.378	20 774	28 626
			Итого по подразделу: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА и закладка проемов/120мм, 250х120х88мм/				**947 338**
			Итого по разделу: МОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКА/л.74/				**2 295 824**
			Раздел: ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМОГРАНИТОМ/л.75/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
216	879	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	50.2	22 323	1 120 615
217	880	231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	50.2	18 080	907 616
218	881	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	6.722	31 248	210 049
219	882	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	51.204	5 598	286 640
			Итого по разделу: ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМОГРАНИТОМ/л.75/				**2 524 920**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть				**96 901 895**
			ИТОГО по акту:				**96 901 895**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)	96901895.101 x 6.30%	6 104 820
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	96901895.101 + 6104819.576	103 006 715
	Сметная прибыль, (5.00%)	103006714.677 x 5.00%	5 150 336
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	103006714.677 x 5.000%	5 150 336
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		113 307 386
	Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700	113307386.145 x 0.1700	19 262 256
	Итого в текущих ценах 2025 года к=1.155, к = 1.1550	19262255.645 x 1.1550	22 247 905
	Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800	22247905.270 x 0.9800	21 802 947
	НДС (12%)	21802947.164 x 12%	2 616 354
	Итого с НДС	21802947.164 + 2616353.660	24 419 301

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	18.09.2025 13:55
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 19:26
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:53 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:51
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:03
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:52
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:05

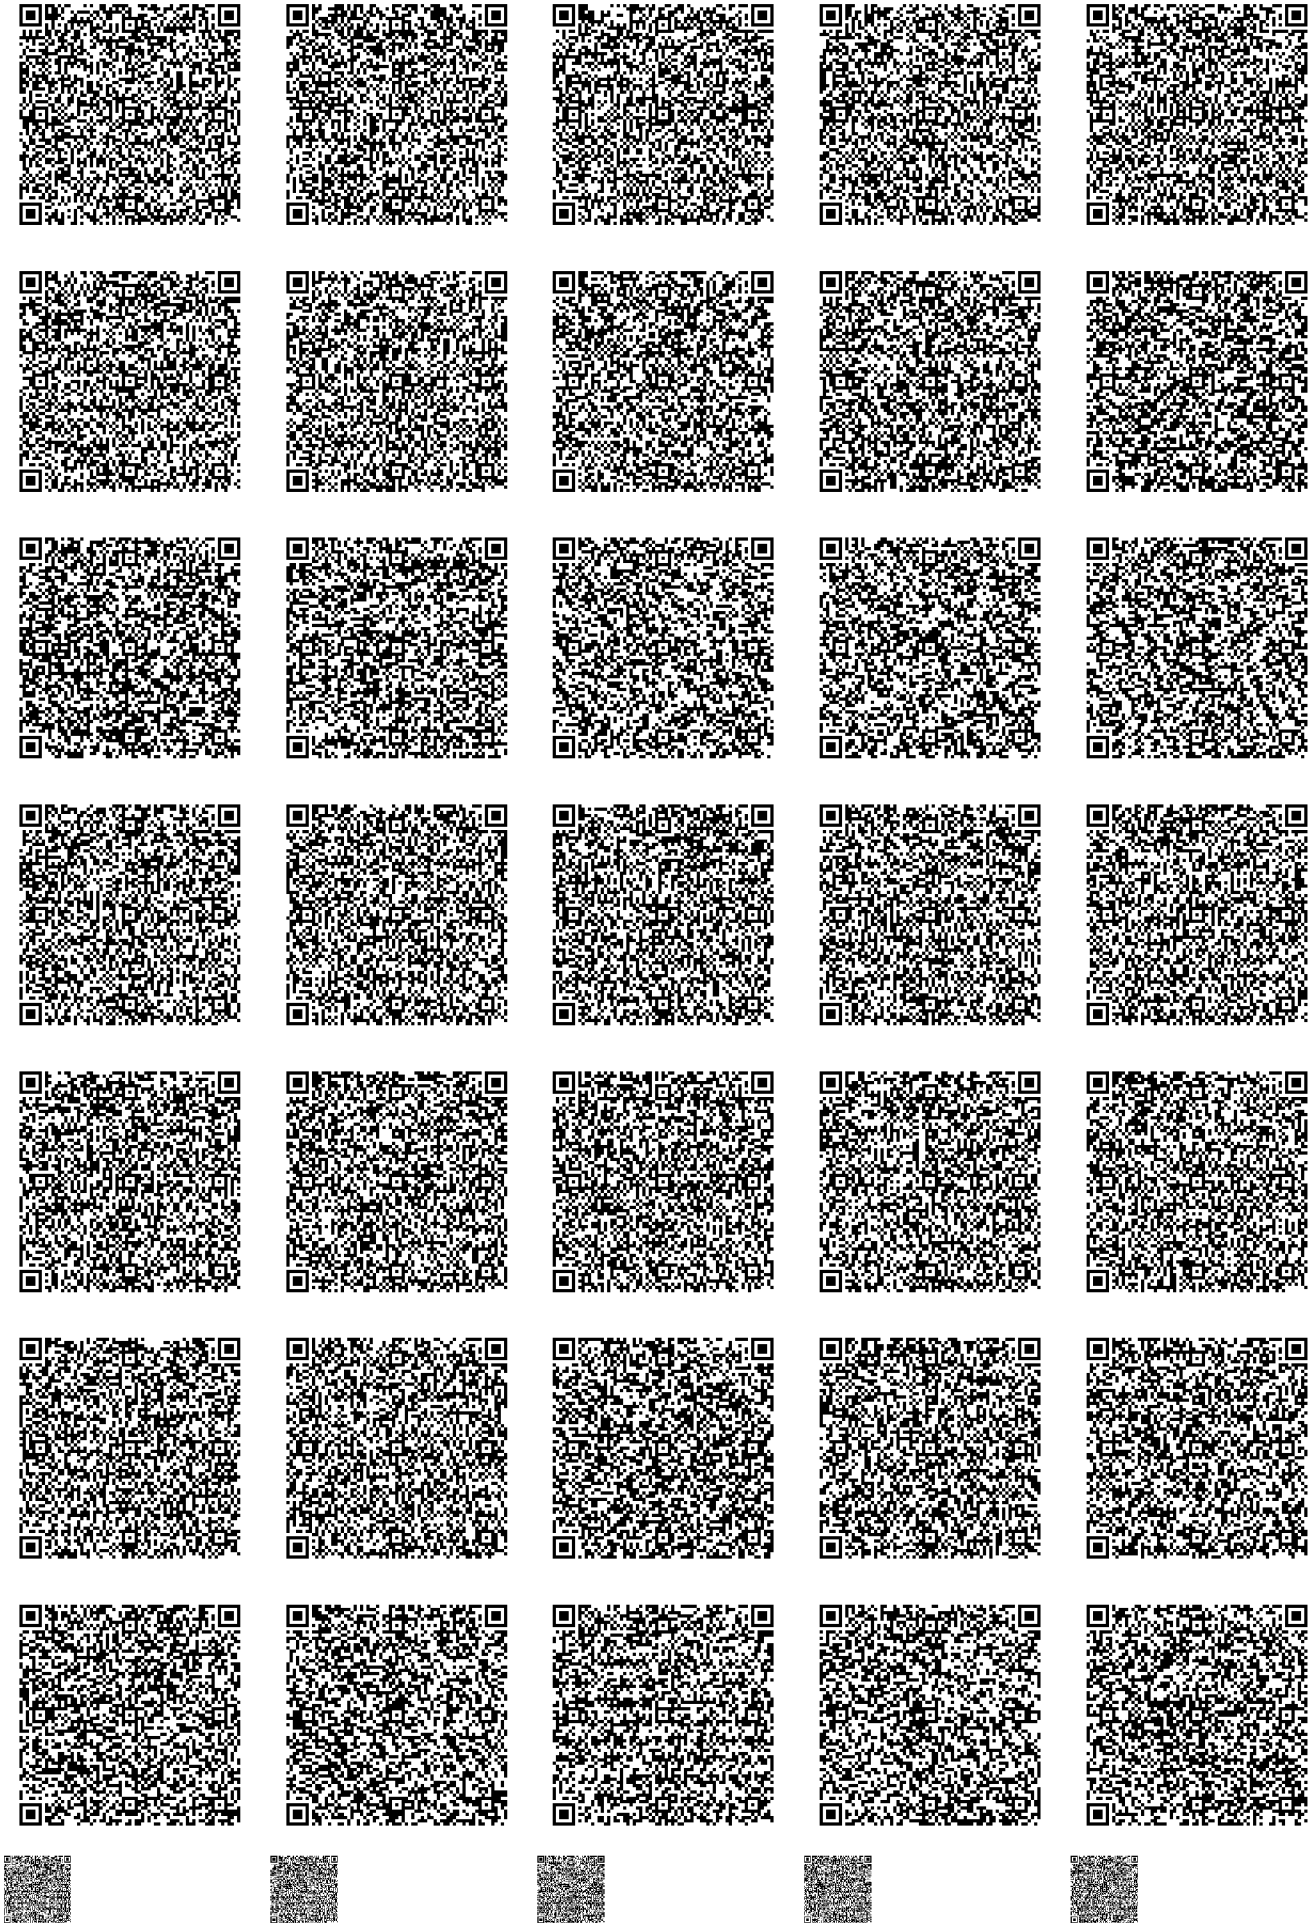

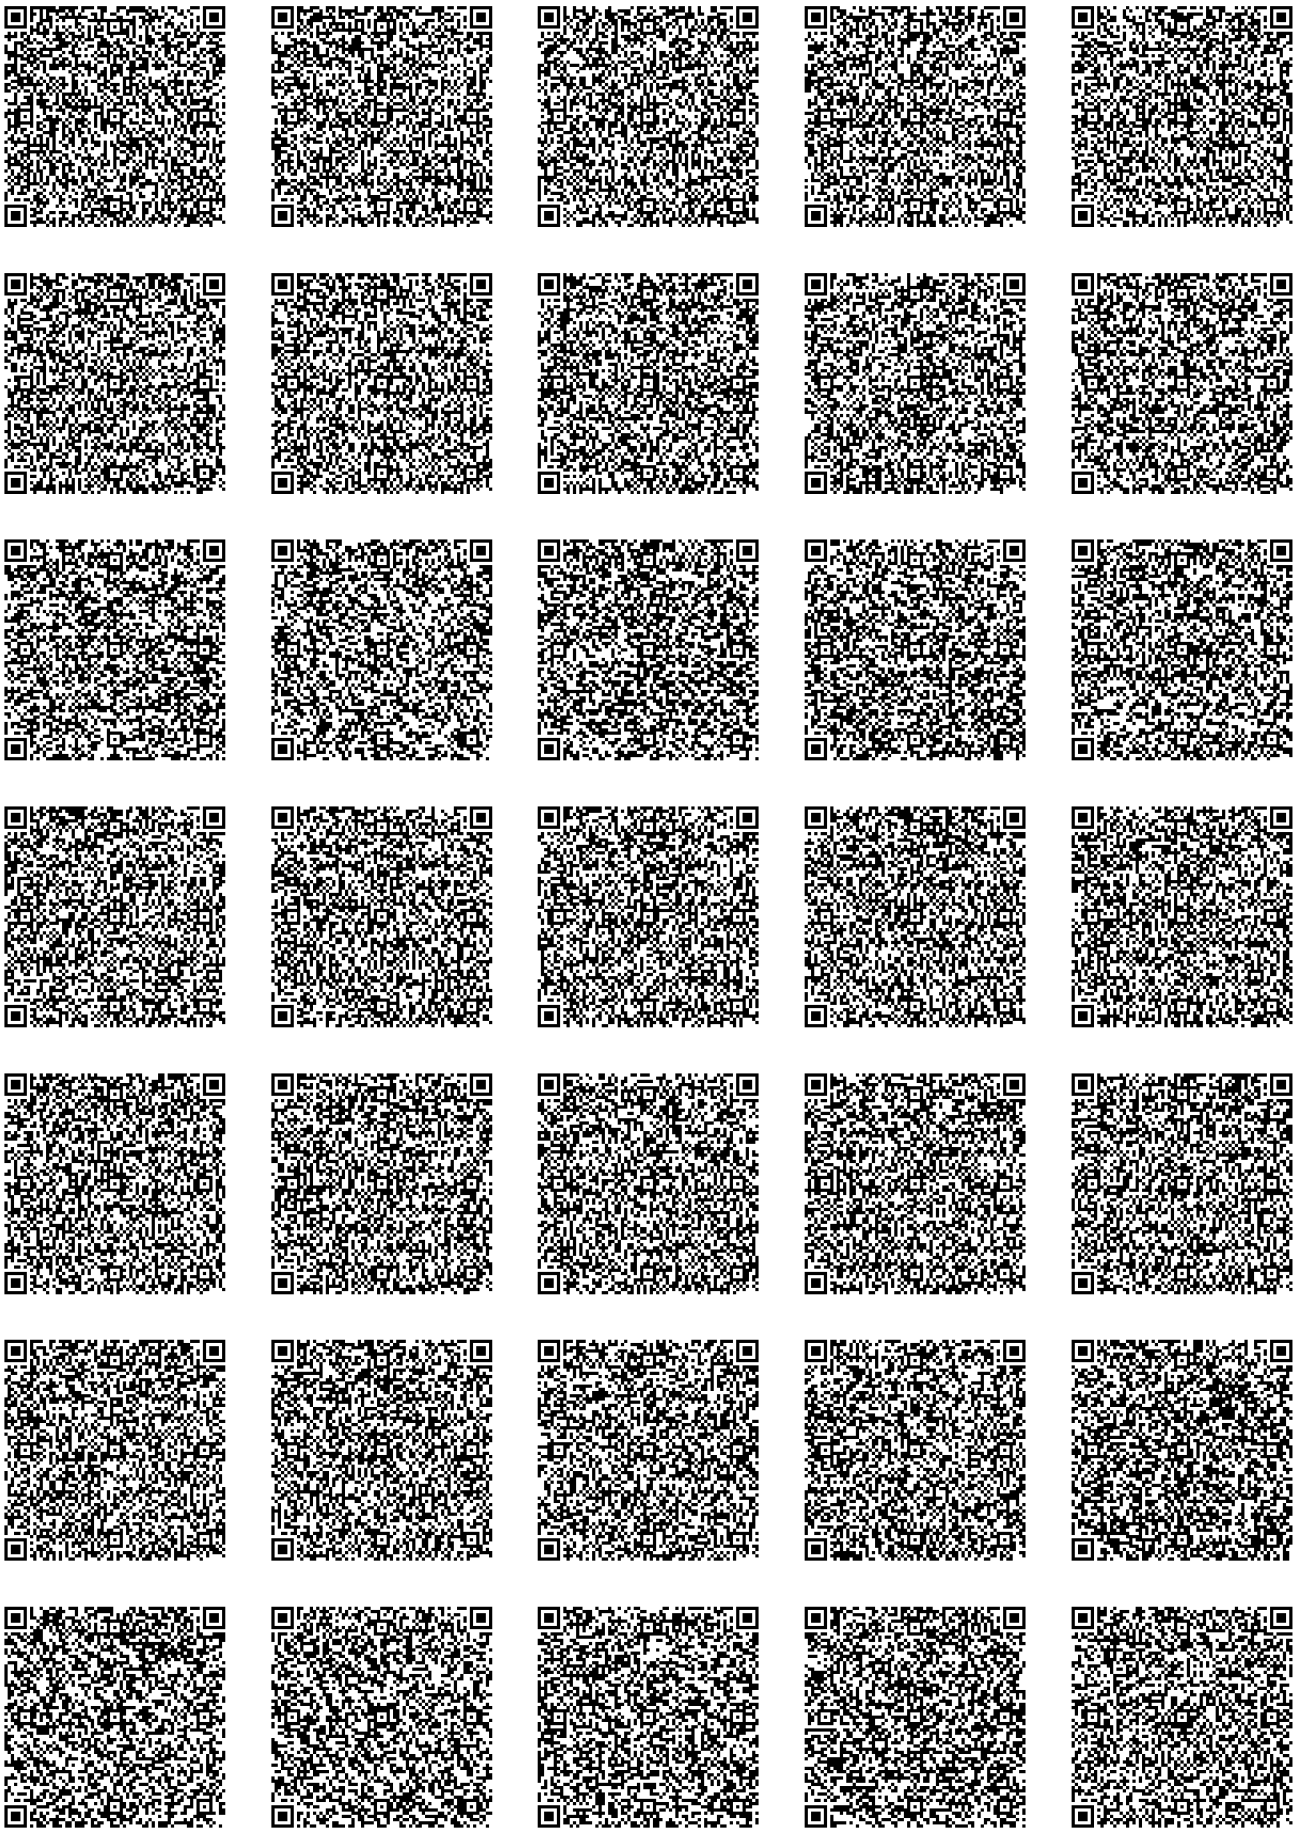

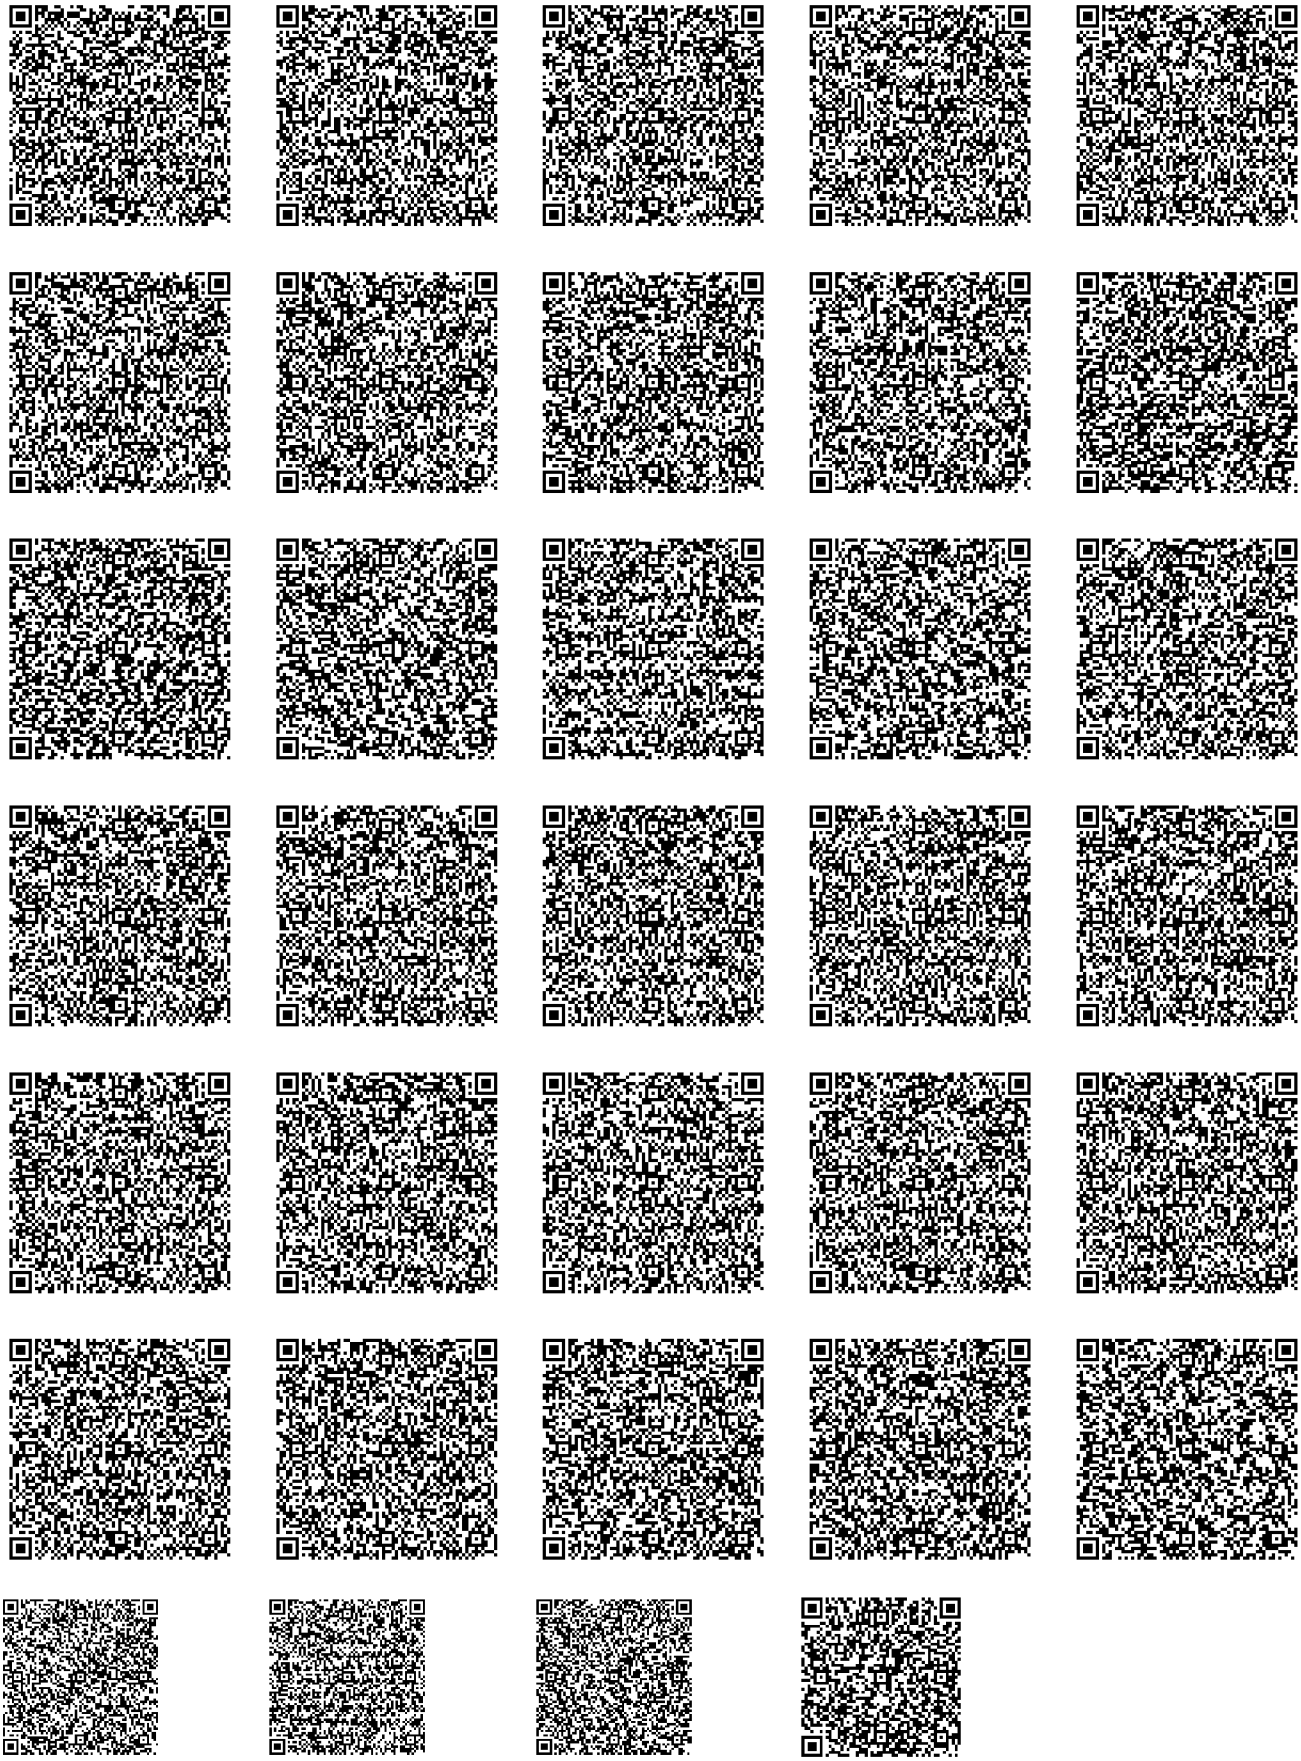

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система контроля управления доступом(СКУД)				
			Раздел: Оборудование				
1	24	1121-0202-0103 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.25/	м	700	786	550 200
2	25	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	50	1 727	86 350
3	26	243-305-0301СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0.153	105 729	16 177
4	27	243-305-0601СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0.306	170 884	52 291
5	28	243-108-1501РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.102	549 789	56 078
6	29	243-304-0102РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.204	179 638	36 646
			Итого по разделу: Оборудование				**797 742**
			Итого по локальной смете: Система контроля управления доступом(СКУД)				**797 742**
			ИТОГО по акту:				**797 742**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)				797742.000 x 6.30%	50 258
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				797742.000 + 50257.748	848 000
		Сметная прибыль, (5.00%)				847999.748 x 5.00%	42 400
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				847999.748 x 5.000%	42 400
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					932 800
		Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700				932799.722 x 0.1700	158 576
		Итого в текущих ценах 2025 года к=1.155, к = 1.1550				158575.953 x 1.1550	183 155

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800				183155.225 x 0.9800	179 492
		НДС (12%)				179492.121 x 12%	21 539
		Итого с НДС				179492.121 + 21539.055	201 031

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	18.09.2025 11:27
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:53
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:52 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:02
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:53
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:08
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:49

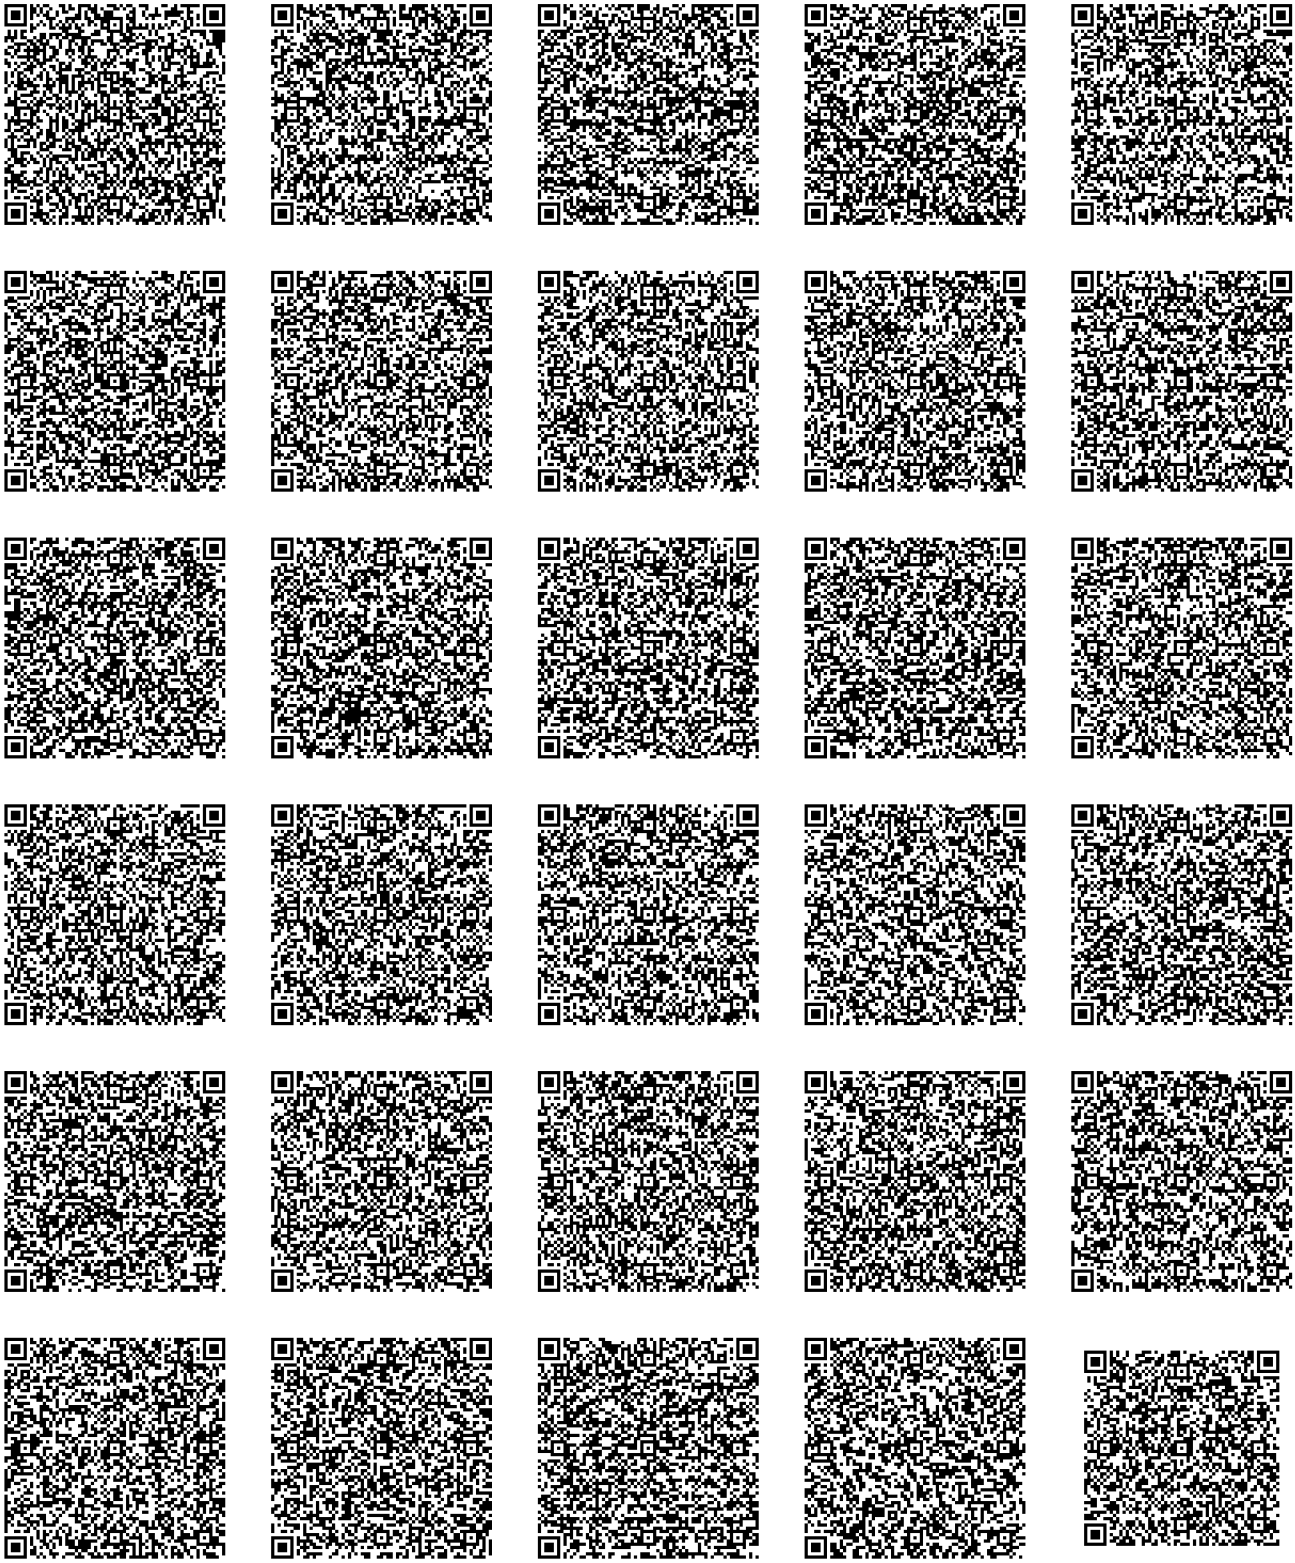

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система контроля управления доступом(СКУД)				
			Раздел: Оборудование				
1	24	1121-0202-0103 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.25/	м	700	786	550 200
2	25	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	50	1 727	86 350
3	26	243-305-0301СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0.153	105 729	16 177
4	27	243-305-0601СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0.306	170 884	52 291
5	28	243-108-1501РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.102	549 789	56 078
6	29	243-304-0102РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.204	179 638	36 646
			Итого по разделу: Оборудование				**797 742**
			Итого по локальной смете: Система контроля управления доступом(СКУД)				**797 742**
			ИТОГО по акту:				**797 742**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)				797742.000 x 6.30%	50 258
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				797742.000 + 50257.748	848 000
		Сметная прибыль, (5.00%)				847999.748 x 5.00%	42 400
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				847999.748 x 5.000%	42 400
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					932 800
		Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300				932799.722 x 0.8300	774 224
		Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750				774223.769 x 1.0750	832 291

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800				832290.552 x 0.9800	815 645
		НДС (12%)				815644.741 x 12%	97 877
		Итого с НДС				815644.741 + 97877.369	913 522

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	18.09.2025 11:24
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:52
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:52 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:08
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:03
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:53
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:48

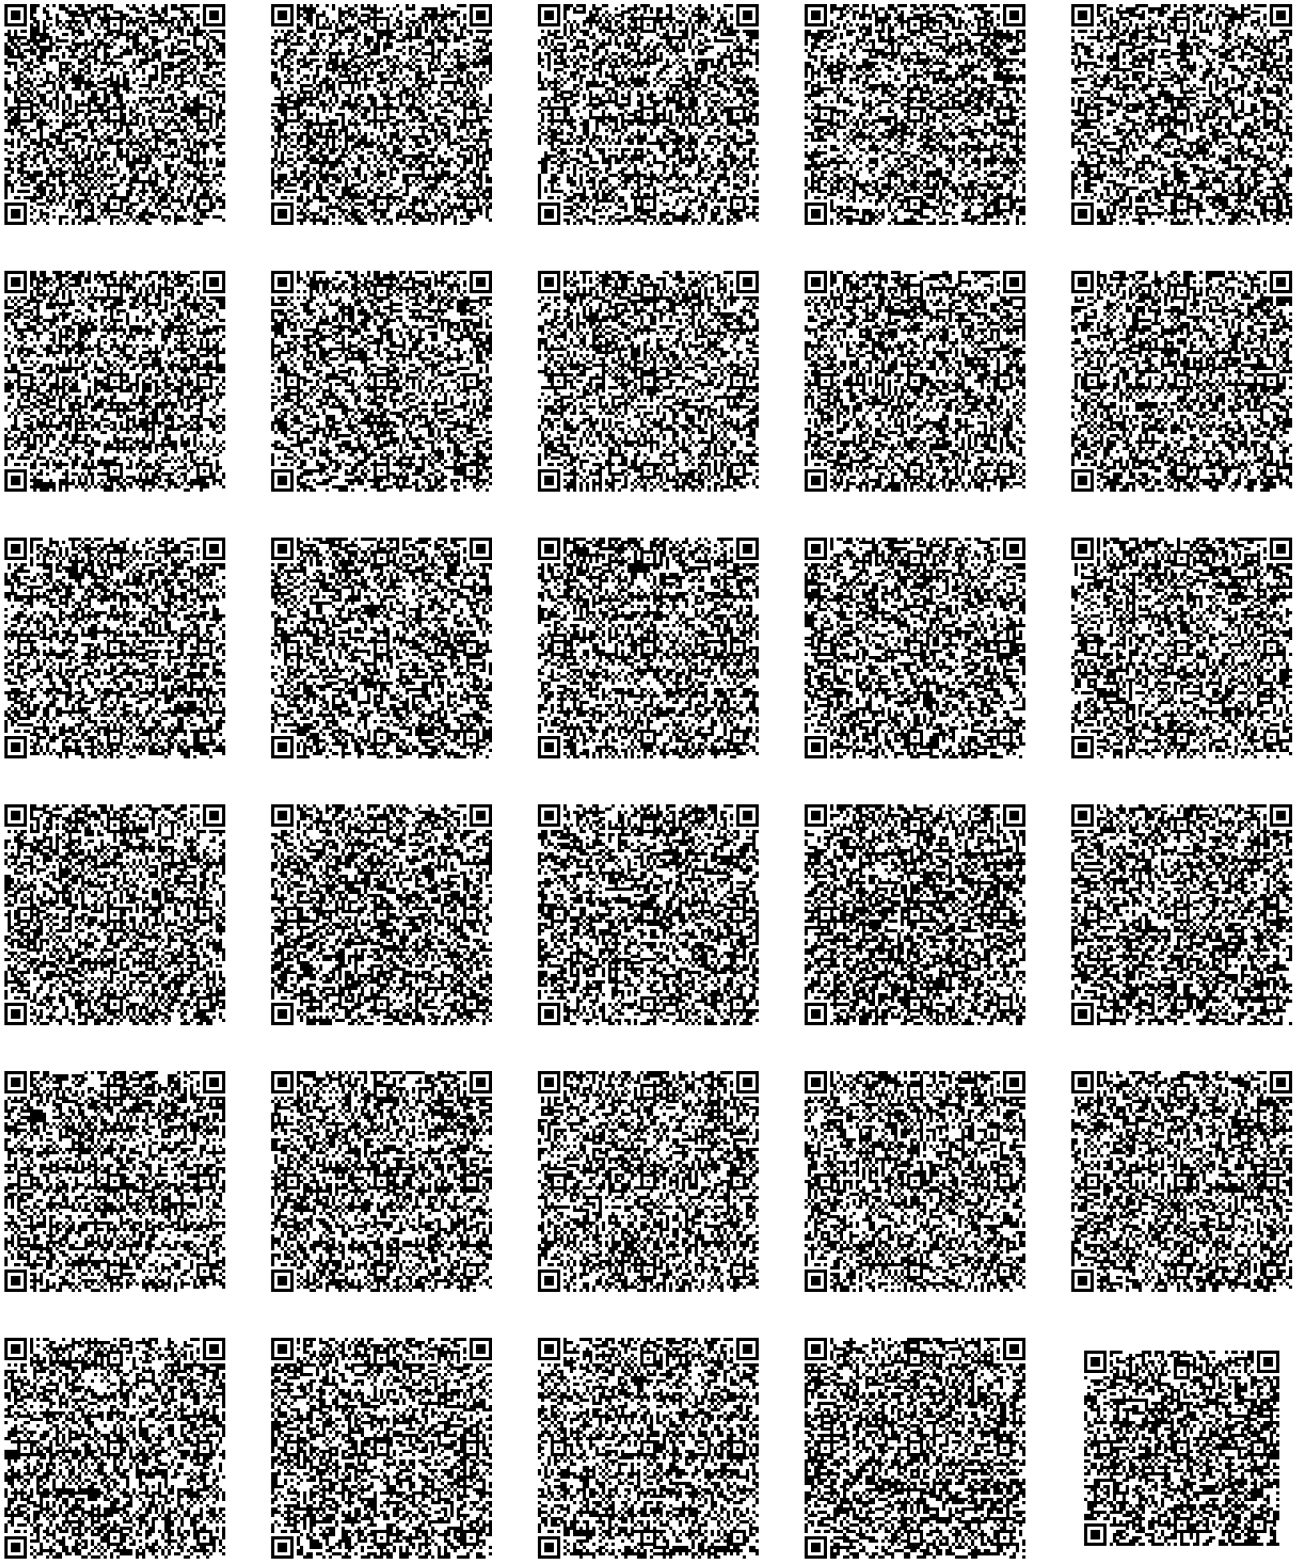

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Видеонаблюдение(СВН)				
1	22	1121-0202-0103РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	5000	707	3 535 000
2	23	243-304-0134СпрСЦ 11.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF	км	5.1	175 872	896 947
3	24	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5050	54	272 700
			Итого по локальной смете: Видеонаблюдение(СВН)				**4 704 647**
			ИТОГО по акту:				**4 704 647**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)				4704647.368 x 6.30%	296 393
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4704647.368 + 296392.793	5 001 040
		Сметная прибыль, (5.00%)				5001040.162 x 5.00%	250 052
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				5001040.162 x 5.000%	250 052
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					5 501 144
		Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300				5501144.178 x 0.8300	4 565 950
		Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800				4565949.668 x 0.9800	4 474 631
		Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750				4474630.674 x 1.0750	4 810 228
		НДС (12%)				4810227.975 x 12%	577 227
		Итого с НДС				4810227.975 + 577227.357	5 387 455

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	18.09.2025 11:19
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:44
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:49 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:54
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:47
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:21
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:04

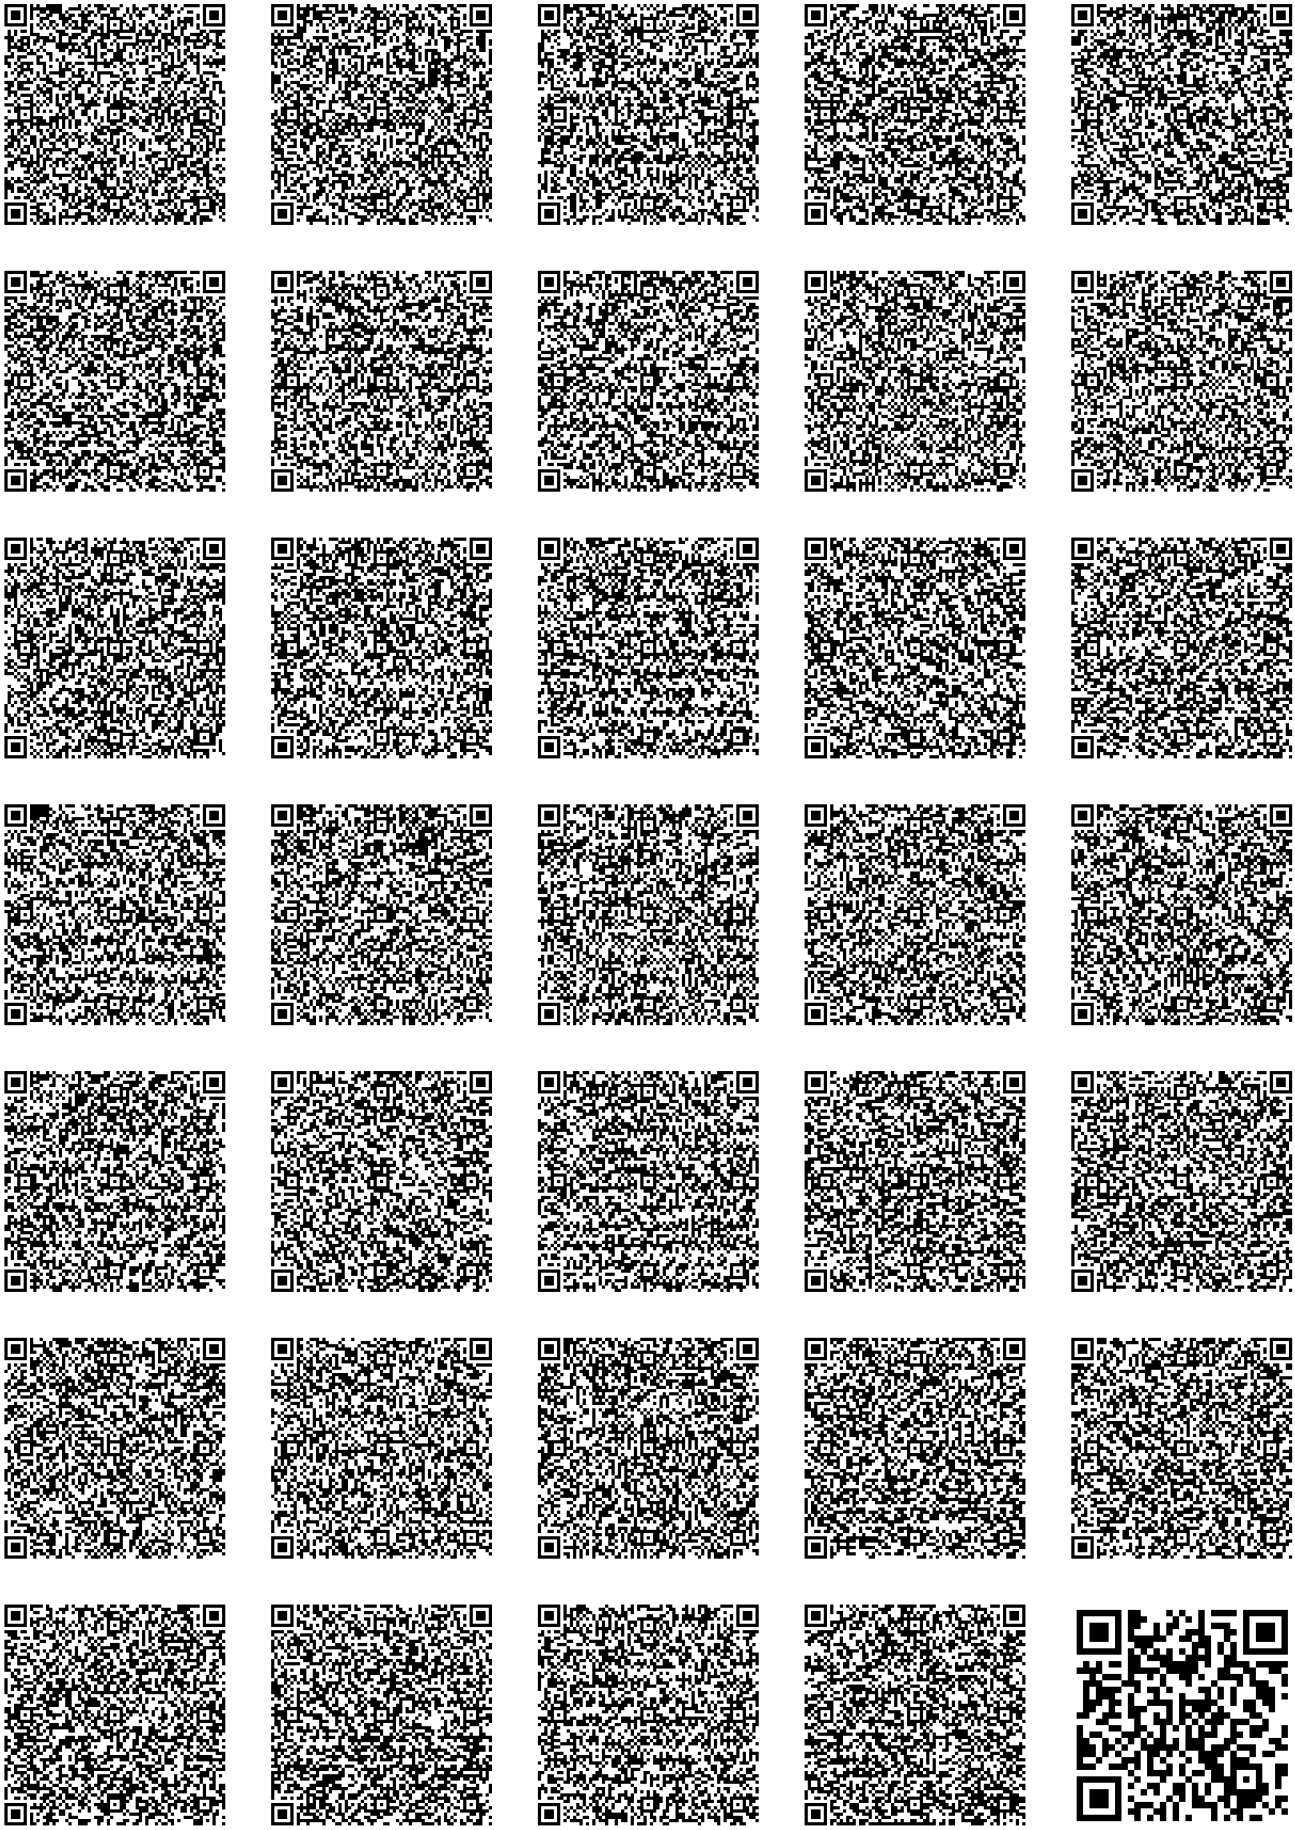

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Видеонаблюдение(СВН)				
1	22	1121-0202-0103РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	5000	707	3 535 000
2	23	243-304-0134СпрСЦ 11.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF	км	5.1	175 872	896 947
3	24	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5050	54	272 700
			Итого по локальной смете: Видеонаблюдение(СВН)				**4 704 647**
			ИТОГО по акту:				**4 704 647**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)				4704647.368 x 6.30%	296 393
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4704647.368 + 296392.793	5 001 040
		Сметная прибыль, (5.00%)				5001040.162 x 5.00%	250 052
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				5001040.162 x 5.000%	250 052
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					5 501 144
		Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700				5501144.178 x 0.1700	935 195
		Итого в текущих ценах 2025 года к=1.155, к = 1.1550				935194.510 x 1.1550	1 080 150
		Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800				1080149.659 x 0.9800	1 058 547
		НДС (12%)				1058546.666 x 12%	127 026
		Итого с НДС				1058546.666 + 127025.600	1 185 572

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	18.09.2025 11:19
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:45
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:49 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:48
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:53
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:01
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:20

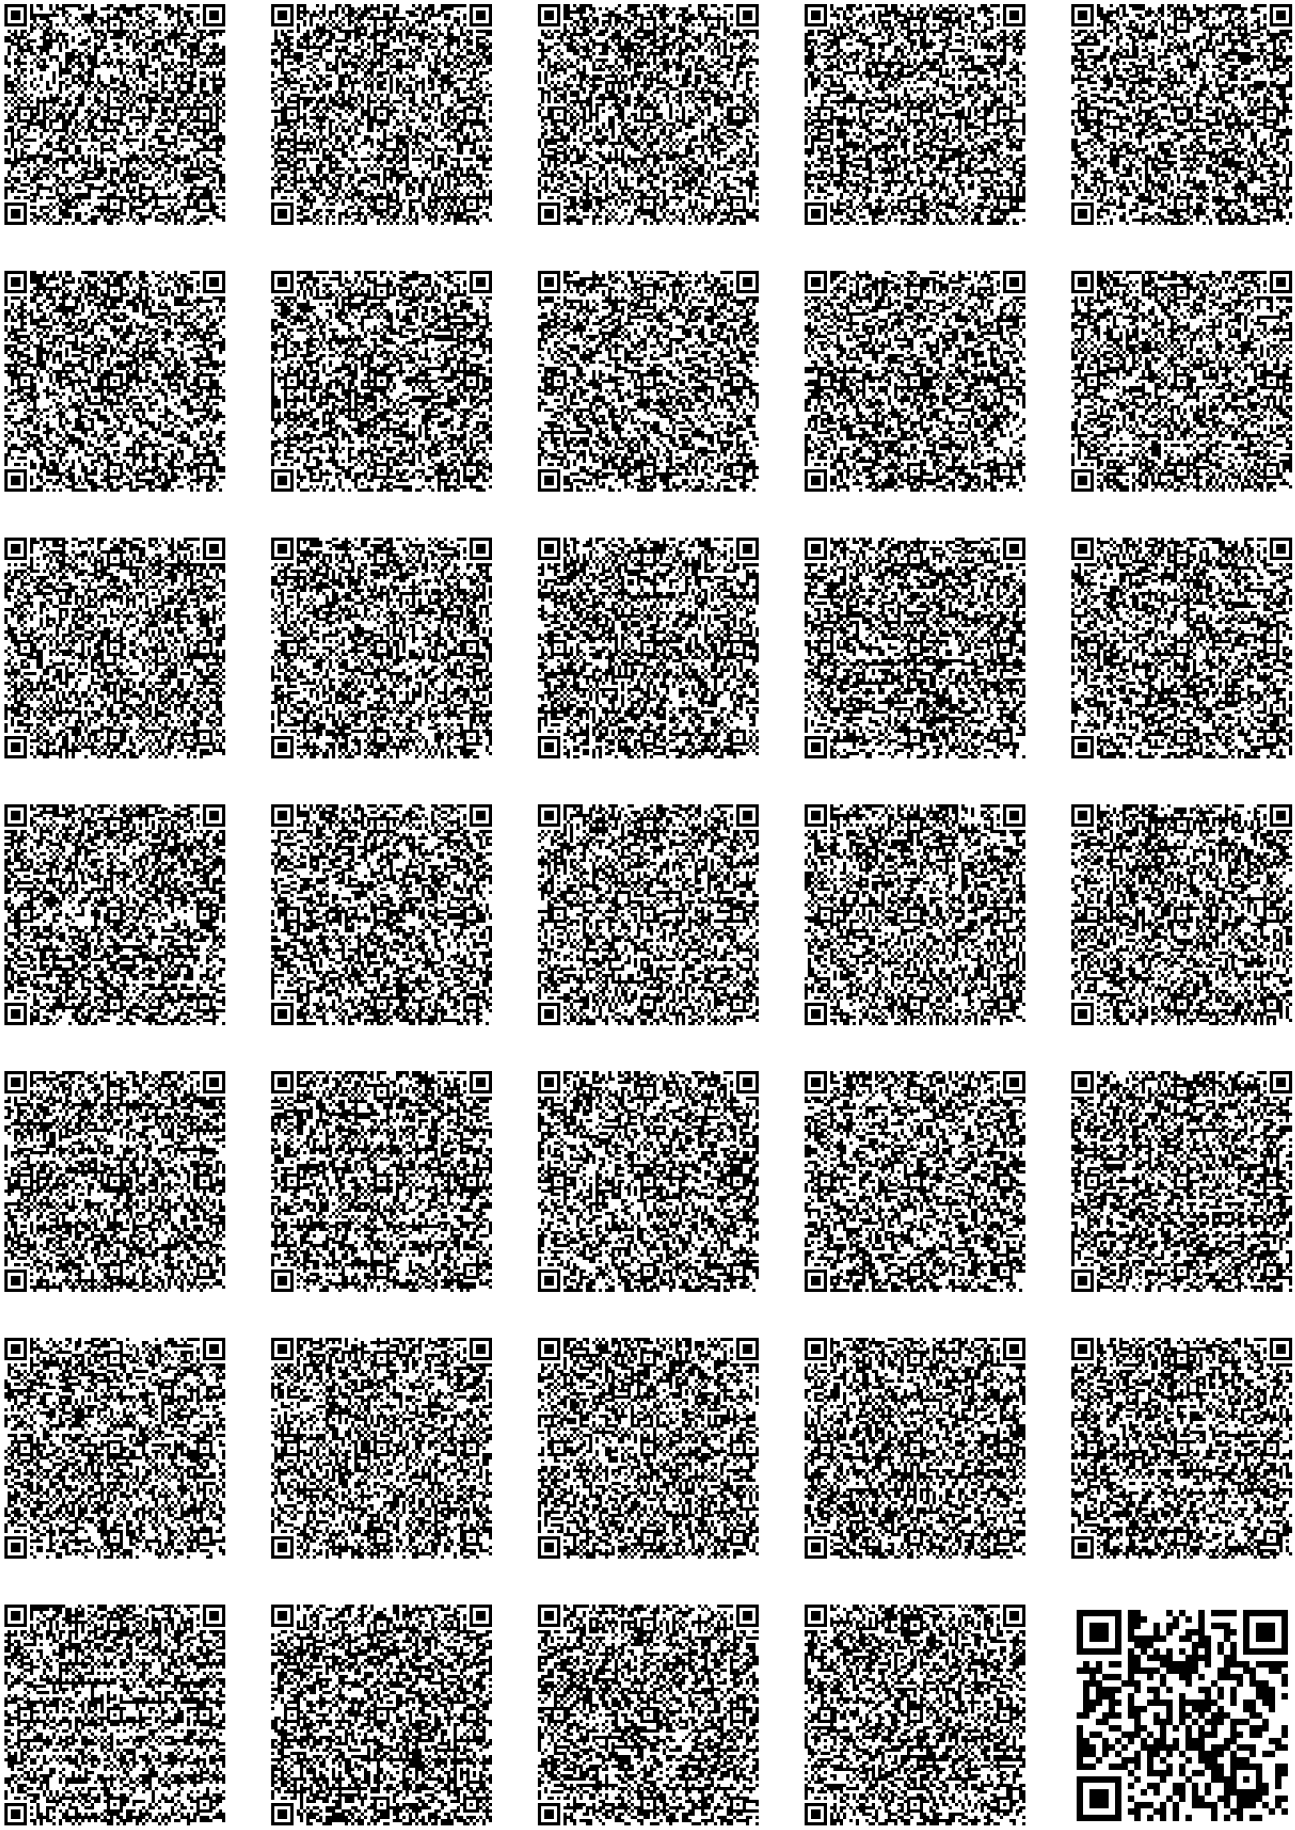

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Водопровод и канализация				
1	143	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	5 165	103 300
2	144	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	4 574	205 830
3	145	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	86	4 257	366 102
4	146	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3 694	221 640
5	147	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	2 796	83 880
6	148	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30	279	8 370
7	149	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22.21	708	15 725
8	150	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	211	418	88 198
9	151	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	211	2 147	453 017

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	152	234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	22	886	19 492
11	153	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	49.5	672	33 264
12	154	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	94.6	636	60 166
13	155	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	66	528	34 848
14	156	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3 525	31 725
15	157	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	2 350	35 250
16	178	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	5 165	103 300
17	179	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	4 574	205 830
18	180	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	86	4 257	366 102
19	181	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3 694	221 640
20	182	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	2 796	83 880
21	183	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	30	273	8 190
22	184	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22.21	708	15 725
23	185	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	241	418	100 738
24	186	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	241	2 147	517 427

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	187	234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	22	886	19 492
26	188	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	49.5	672	33 264
27	189	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	94.6	636	60 166
28	190	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	66	528	34 848
29	191	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3 525	31 725
30	192	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	2 350	30 550
31	207	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	70	5 165	361 550
			Итого по локальной смете: Водопровод и канализация				**3 955 234**
			ИТОГО по акту:				**3 955 234**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)	3955234.000 x 6.30%	249 180
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	3955234.000 + 249179.750	4 204 414
	Сметная прибыль, (5.00%)	4204413.750 x 5.00%	210 221
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	4204413.750 x 5.000%	210 221
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		4 624 855
	Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700	4624855.124 x 0.1700	786 225
	Итого в текущих ценах 2025 года к=1.155, к = 1.1550	786225.371 x 1.1550	908 090
	Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800	908090.304 x 0.9800	889 928
	НДС (12%)	889928.498 x 12%	106 791
	Итого с НДС	889928.498 + 106791.420	996 720

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	18.09.2025 10:22
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:42
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:48 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:21
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:45
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:54
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:01

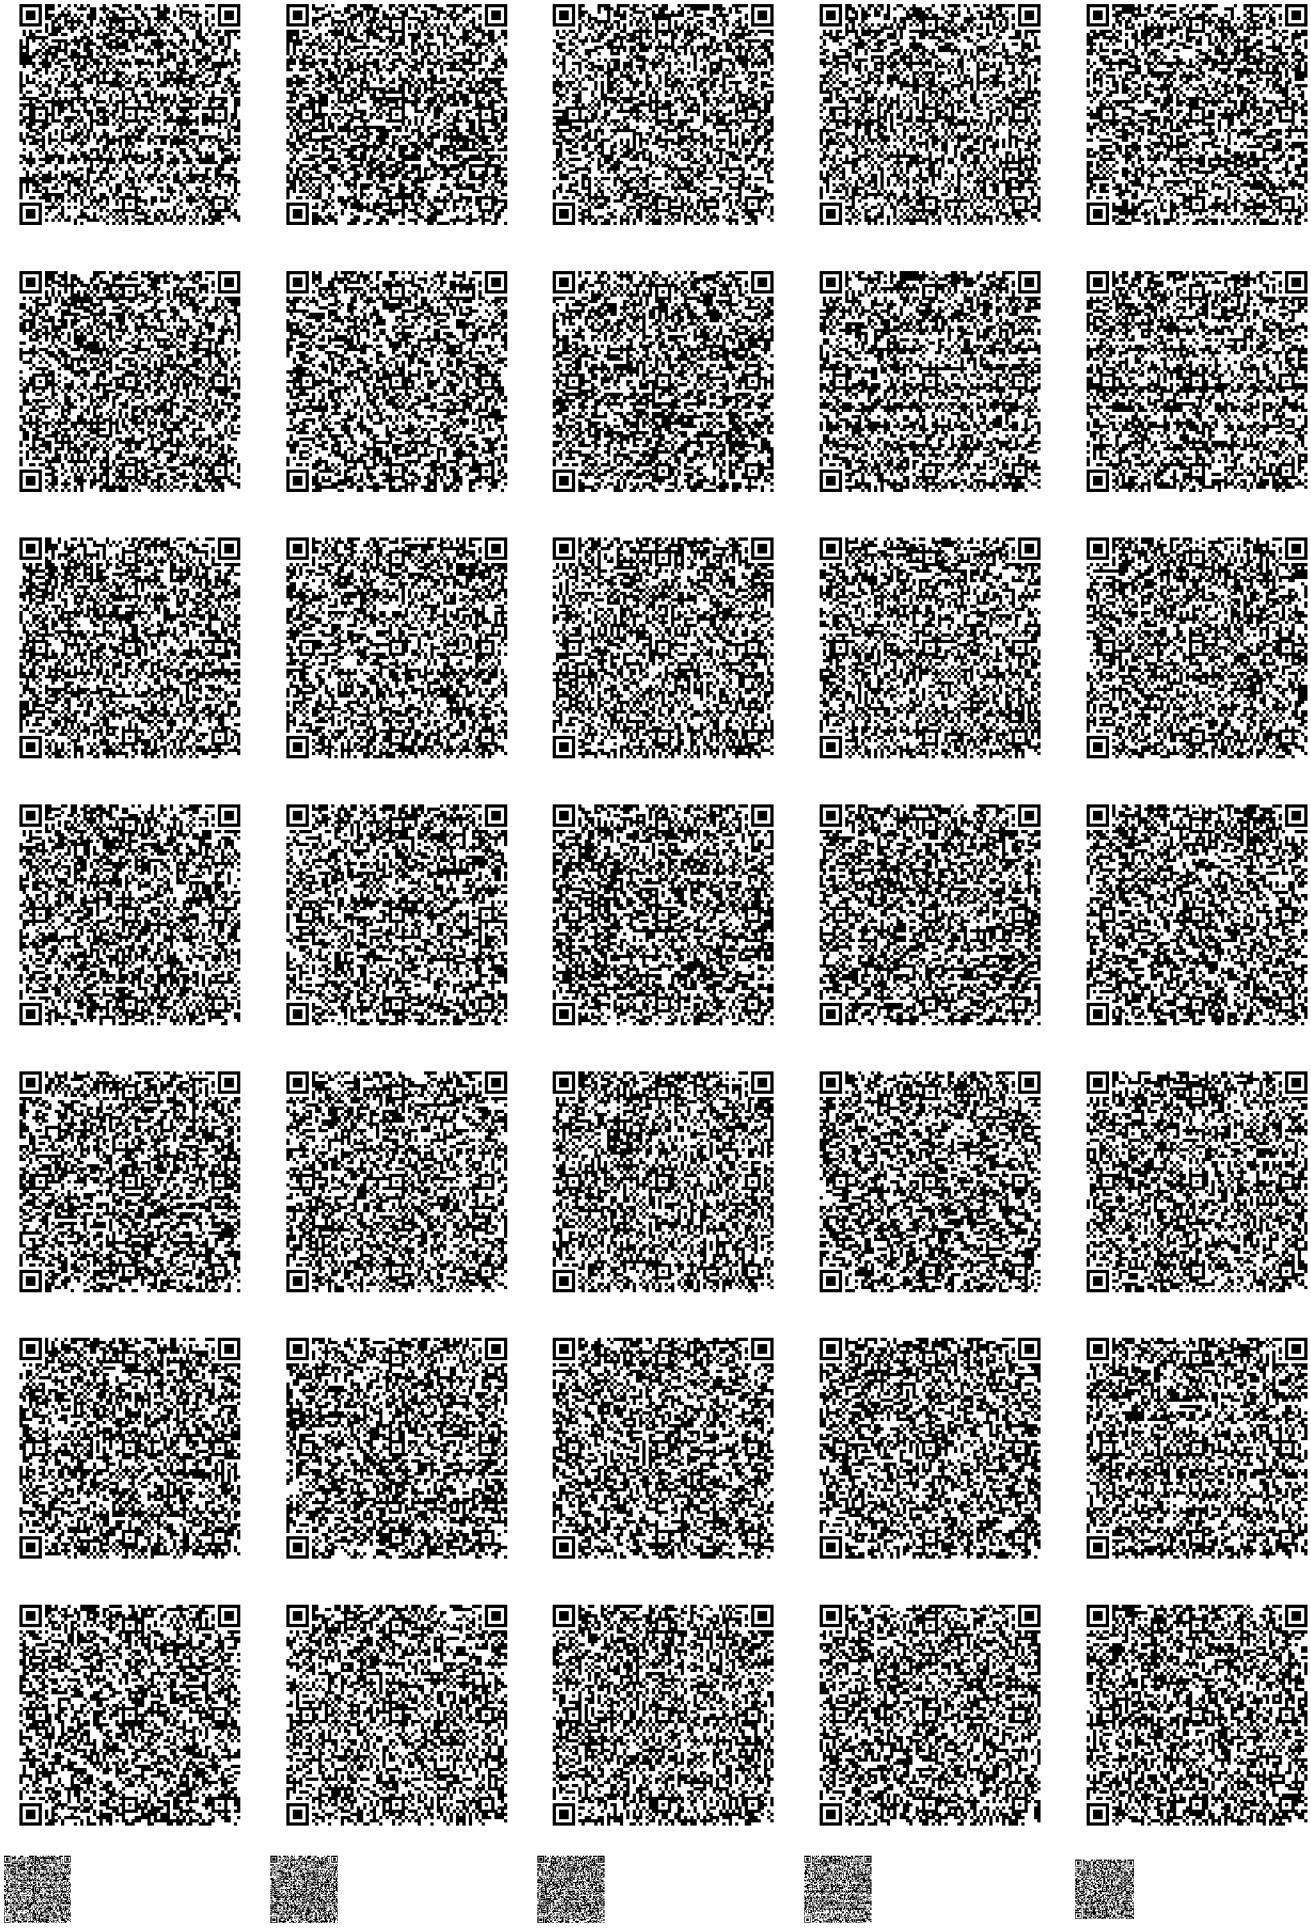

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Водопровод и канализация				
1	143	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	5 165	103 300
2	144	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	4 574	205 830
3	145	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	86	4 257	366 102
4	146	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3 694	221 640
5	147	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	2 796	83 880
6	148	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30	279	8 370
7	149	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22.21	708	15 725
8	150	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	211	418	88 198
9	151	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	211	2 147	453 017

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	152	234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	22	886	19 492
11	153	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	49.5	672	33 264
12	154	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	94.6	636	60 166
13	155	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	66	528	34 848
14	156	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3 525	31 725
15	157	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	2 350	35 250
16	178	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	5 165	103 300
17	179	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	4 574	205 830
18	180	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	86	4 257	366 102
19	181	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3 694	221 640
20	182	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	2 796	83 880
21	183	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	30	273	8 190
22	184	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22.21	708	15 725
23	185	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	241	418	100 738
24	186	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	241	2 147	517 427

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	187	234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	22	886	19 492
26	188	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	49.5	672	33 264
27	189	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	94.6	636	60 166
28	190	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	66	528	34 848
29	191	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3 525	31 725
30	192	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	2 350	30 550
31	207	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	70	5 165	361 550
			Итого по локальной смете: Водопровод и канализация				**3 955 234**
			ИТОГО по акту:				**3 955 234**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)	3955234.000 x 6.30%	249 180
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	3955234.000 + 249179.750	4 204 414
	Сметная прибыль, (5.00%)	4204413.750 x 5.00%	210 221
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	4204413.750 x 5.000%	210 221
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		4 624 855
	Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300	4624855.124 x 0.8300	3 838 630
	Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750	3838629.753 x 1.0750	4 126 527
	Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800	4126526.985 x 0.9800	4 043 996
	НДС (12%)	4043996.445 x 12%	485 280
	Итого с НДС	4043996.445 + 485279.573	4 529 276

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	18.09.2025 10:10
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:42
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:48 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:02
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:44
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:54
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:21

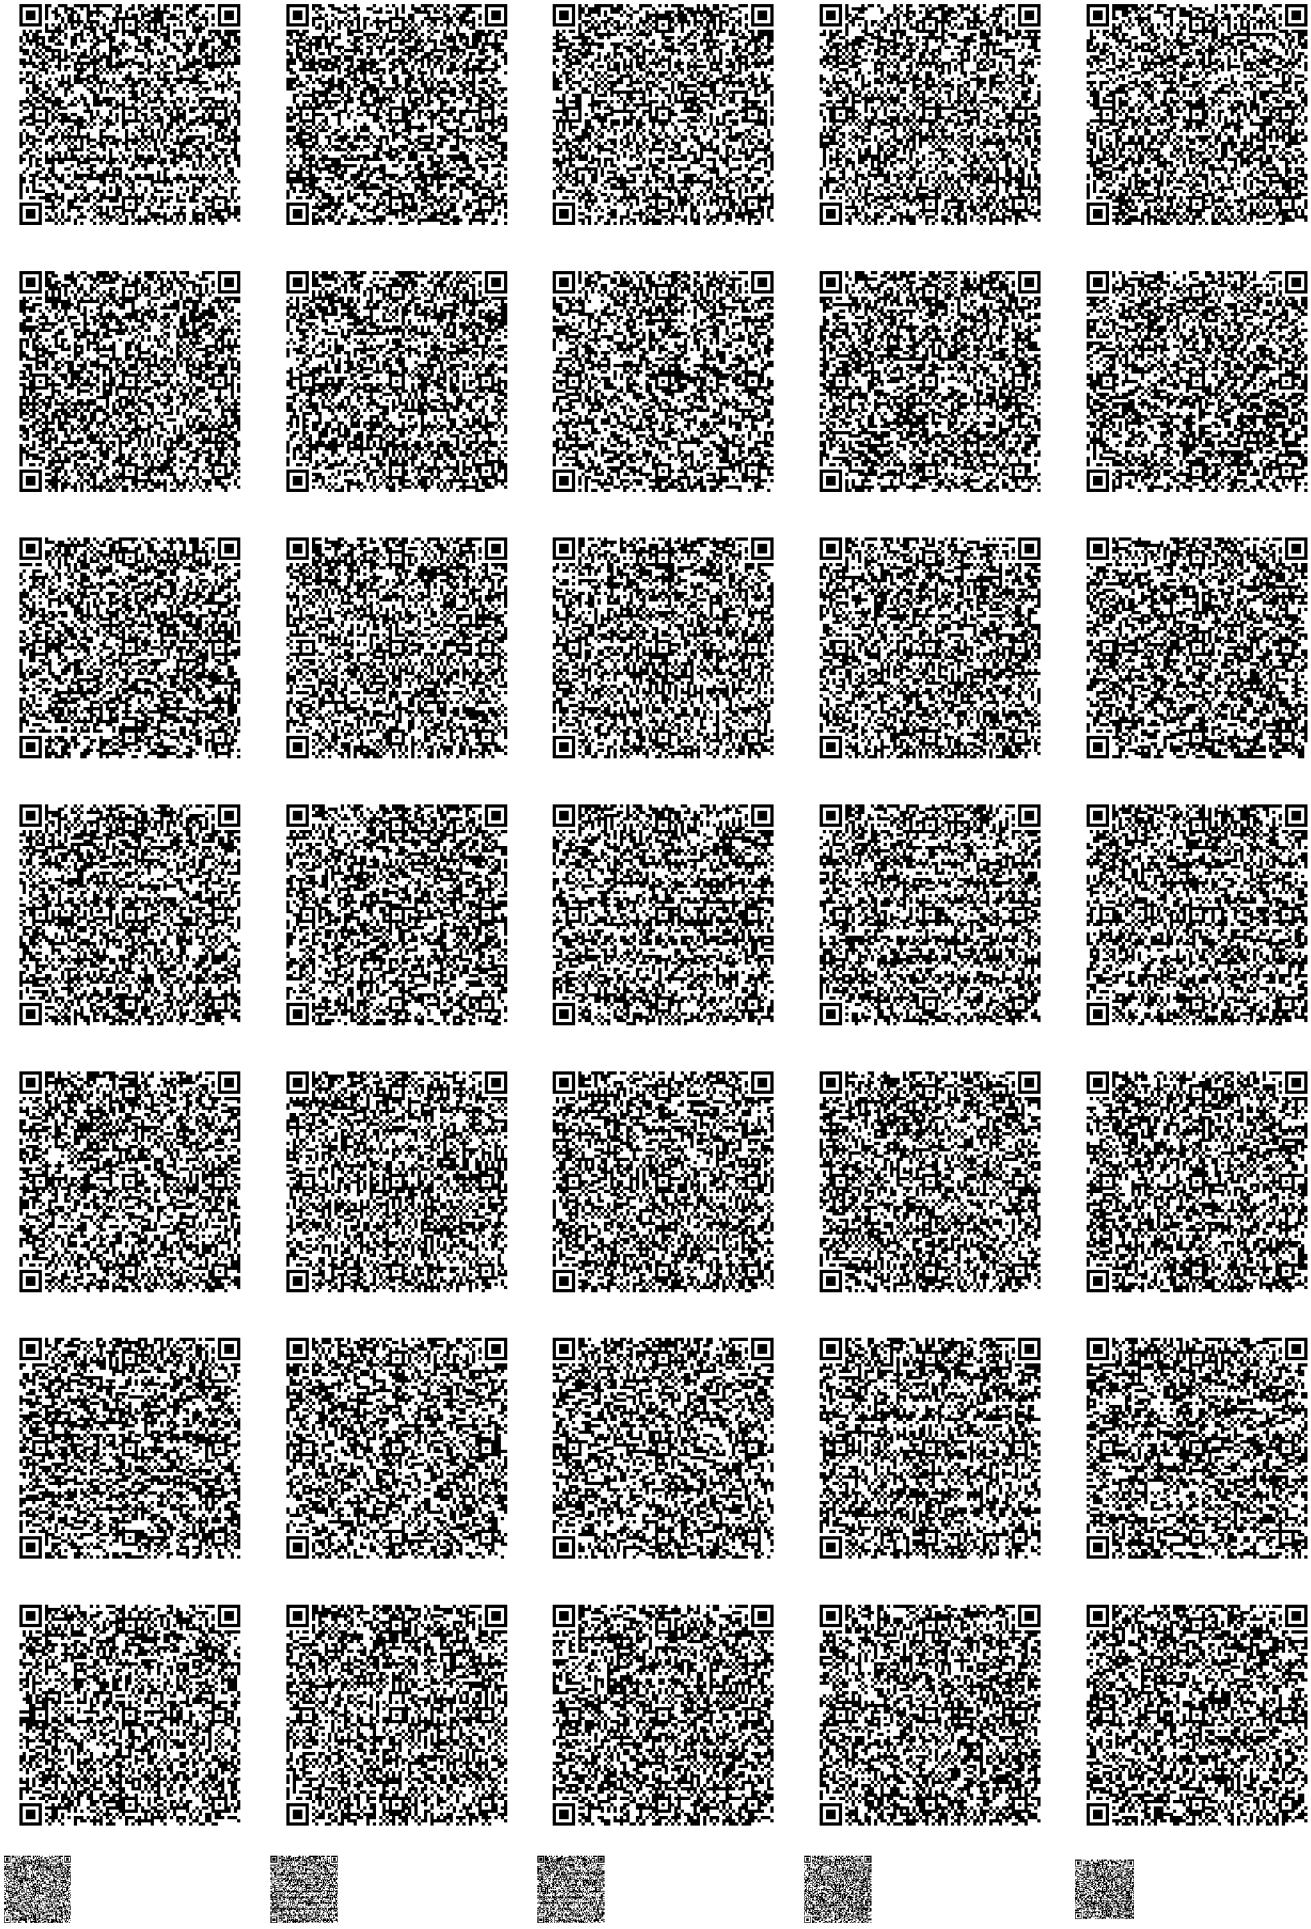

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система автоматической пожарной сигнализации(АПС)				
1	20	1121-0202-0103РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	3500	707	2 474 500
2	21	6119-0102-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода в полу	м	3500	707	2 474 500
3	22	6119-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	1900	1 727	3 281 300
4	23	243-305-0301СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	3.774	105 729	399 021
5	24	243-305-0304СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0.306	266 097	81 426
6	25	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3500	54	189 000
			Итого по локальной смете: Система автоматической пожарной сигнализации(АПС)				**8 899 747**
			ИТОГО по акту:				**8 899 747**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)	8899747.000 x 6.30%	560 684
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	8899747.000 + 560684.078	9 460 431
	Сметная прибыль, (5.00%)	9460431.078 x 5.00%	473 022
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	9460431.078 x 5.000%	473 022
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		10 406 474
	Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300	10406474.186 x 0.8300	8 637 374
	Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750	8637373.574 x 1.0750	9 285 177
	Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800	9285176.592 x 0.9800	9 099 473
	НДС (12%)	9099473.060 x 12%	1 091 937
	Итого с НДС	9099473.060 + 1091936.767	10 191 410

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	17.09.2025 16:35
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:38
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:48 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:21
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:55
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:01
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:43

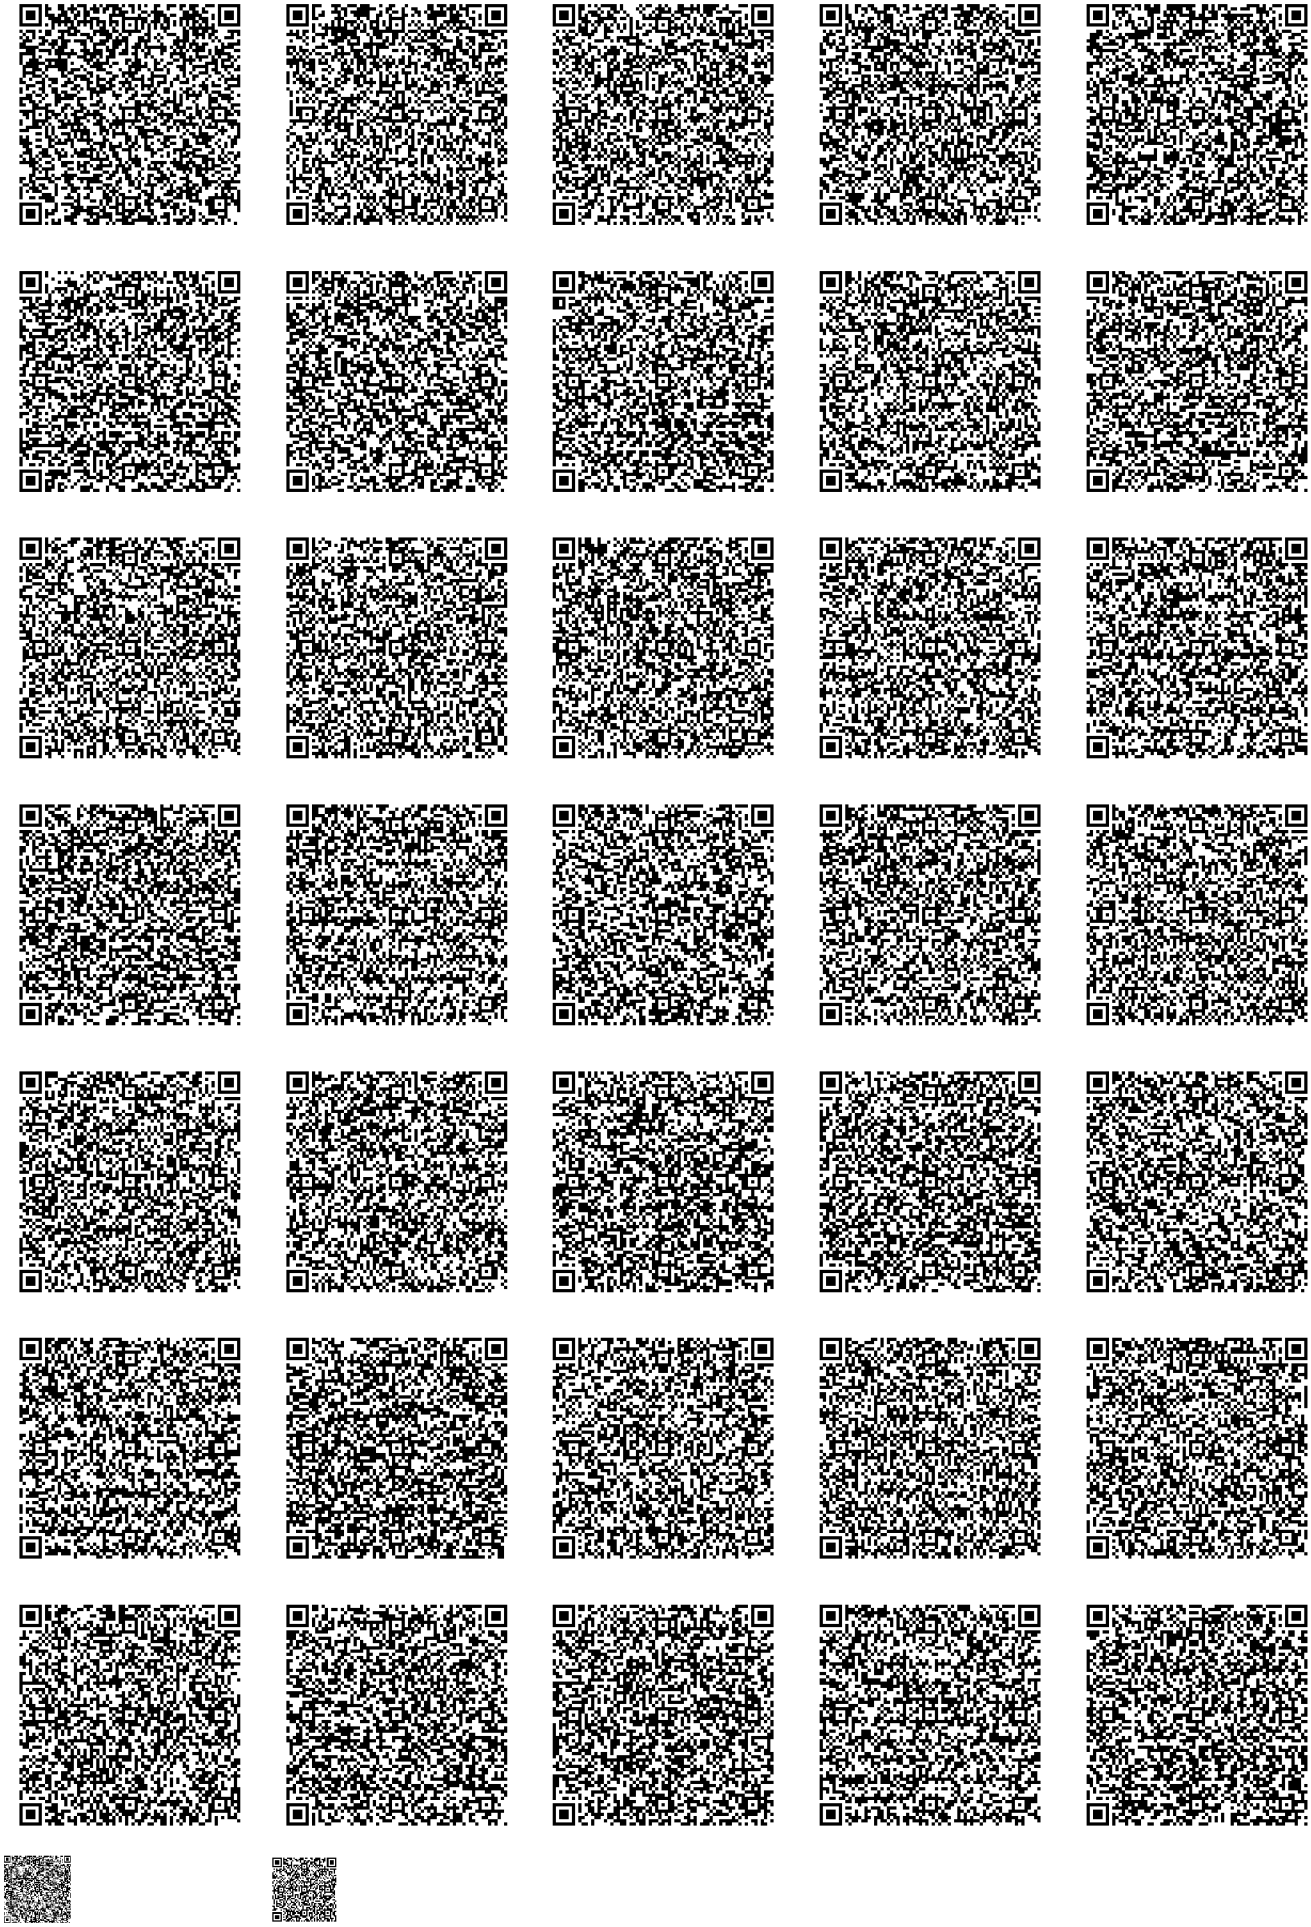

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система автоматической пожарной сигнализации(АПС)				
1	20	1121-0202-0103РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	3500	707	2 474 500
2	21	6119-0102-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода в полу	м	3500	707	2 474 500
3	22	6119-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	1900	1 727	3 281 300
4	23	243-305-0301СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	3.774	105 729	399 021
5	24	243-305-0304СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0.306	266 097	81 426
6	25	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3500	54	189 000
			Итого по локальной смете: Система автоматической пожарной сигнализации(АПС)				**8 899 747**
			ИТОГО по акту:				**8 899 747**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)	8899747.000 x 6.30%	560 684
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	8899747.000 + 560684.078	9 460 431
	Сметная прибыль, (5.00%)	9460431.078 x 5.00%	473 022
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	9460431.078 x 5.000%	473 022
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		10 406 474
	Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700	10406474.186 x 0.1700	1 769 101
	Итого в текущих ценах 2025 года к=1.155, к = 1.1550	1769100.612 x 1.1550	2 043 311
	Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800	2043311.206 x 0.9800	2 002 445
	НДС (12%)	2002444.982 x 12%	240 293
	Итого с НДС	2002444.982 + 240293.398	2 242 738

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	17.09.2025 16:33
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:38
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:47 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:22
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:56
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:02
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:43

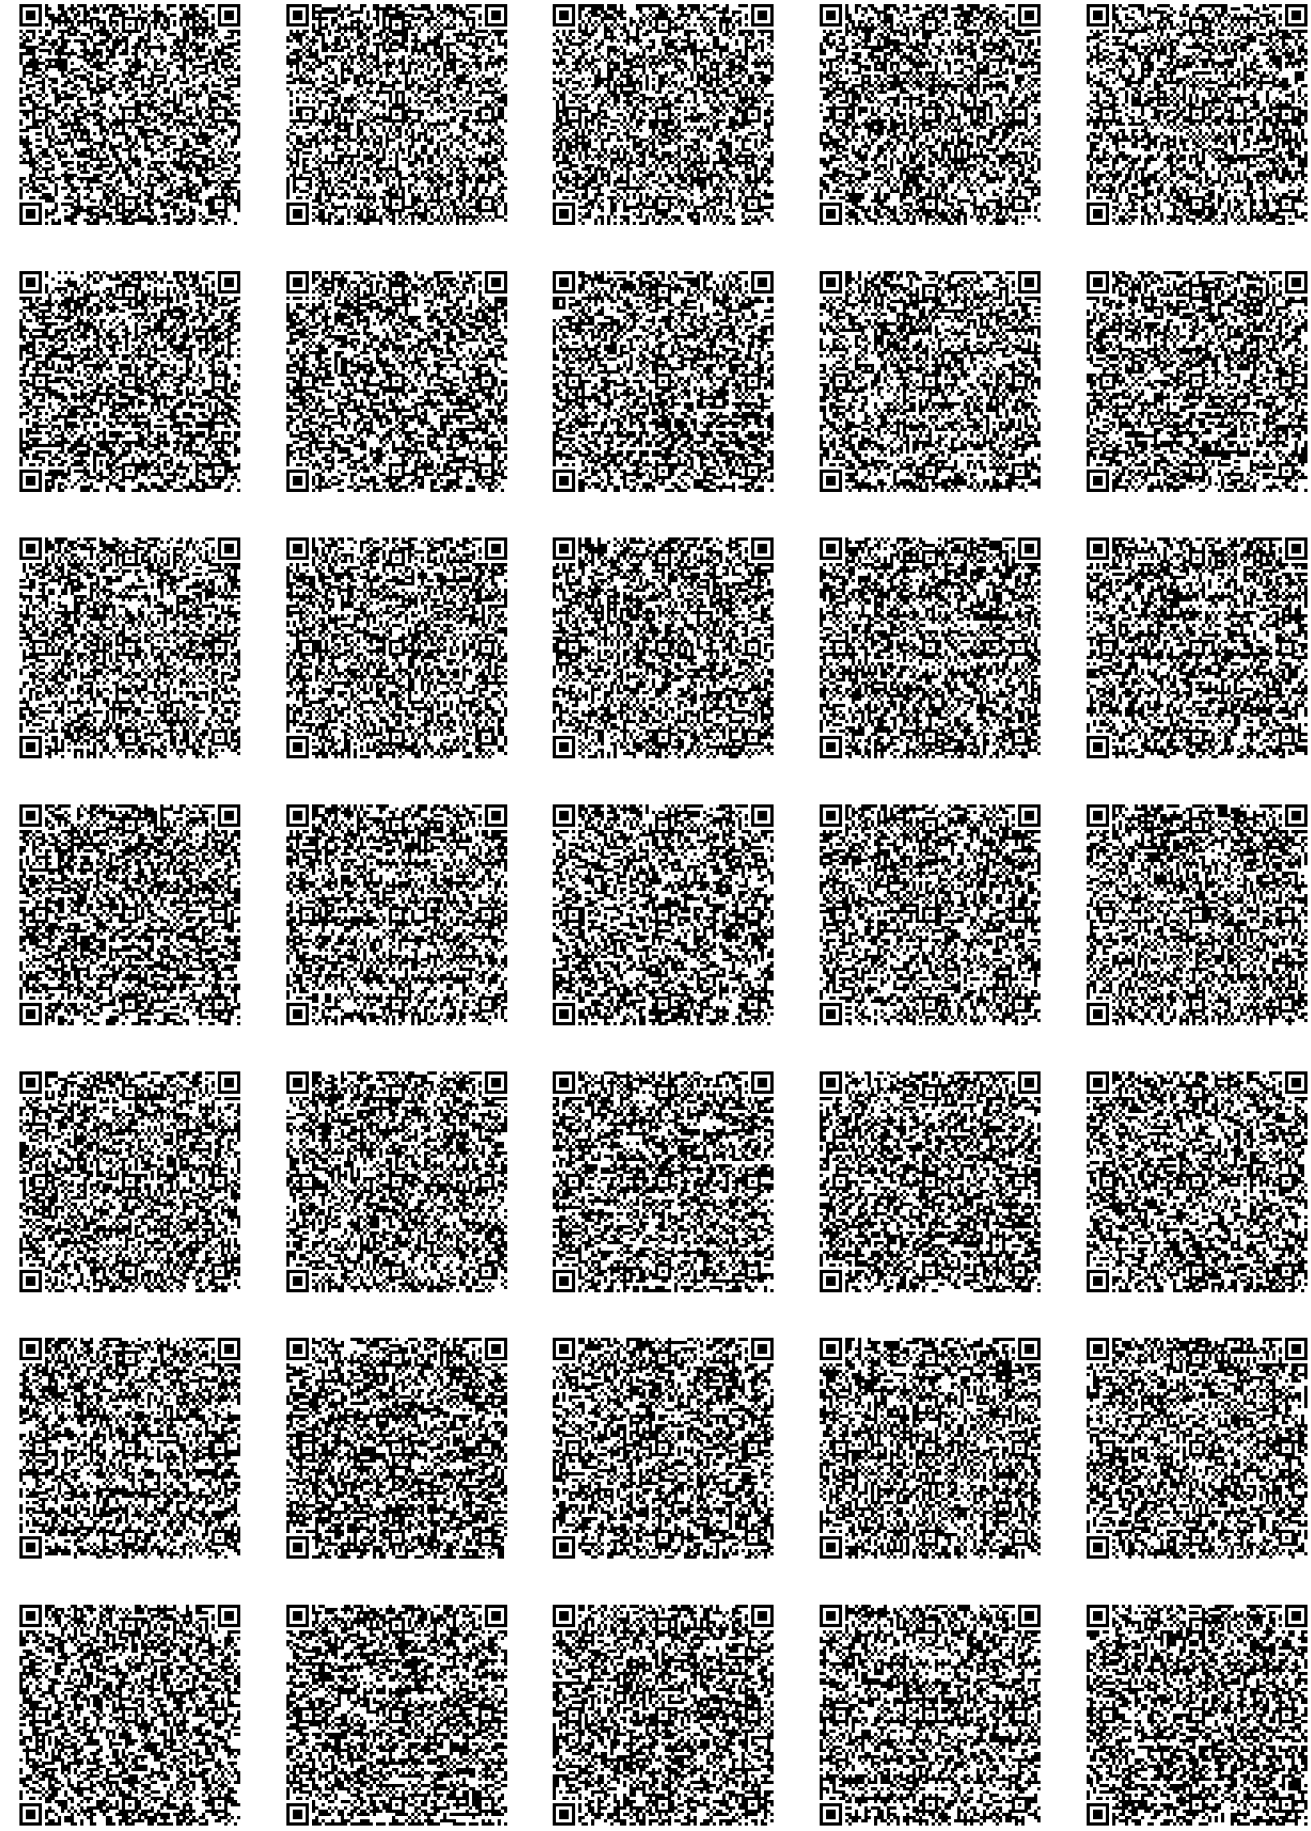

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система структурированной кабельной сети(СКС)				
1	20	1121-0202-0103РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	20300	707	14 352 100
2	21	243-304-0134СпрСЦ 11.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF	км	20.706	175 872	3 641 605
3	28	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20300	54	1 096 200
			Итого по локальной смете: Система структурированной кабельной сети(СКС)				**19 089 905**
			ИТОГО по акту:				**19 089 905**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)				19089905.422 x 6.30%	1 202 664
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				19089905.422 + 1202664.078	20 292 570
		Сметная прибыль, (5.00%)				20292569.500 x 5.00%	1 014 628
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				20292569.500 x 5.000%	1 014 628
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					22 321 826
		Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300				22321826.450 x 0.8300	18 527 116
		Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750				18527115.954 x 1.0750	19 916 650
		Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800				19916649.650 x 0.9800	19 518 317
		НДС (12%)				19518316.657 x 12%	2 342 198
		Итого с НДС				19518316.657 + 2342197.999	21 860 515

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	16.09.2025 18:58
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:36
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:47 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:42
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:00
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:23
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:56

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система структурированной кабельной сети(СКС)				
1	20	1121-0202-0103РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	20300	707	14 352 100
2	21	243-304-0134СпрСЦ 11.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF	км	20.706	175 872	3 641 605
3	28	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20300	54	1 096 200
			Итого по локальной смете: Система структурированной кабельной сети(СКС)				**19 089 905**
			ИТОГО по акту:				**19 089 905**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)				19089905.422 x 6.30%	1 202 664
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				19089905.422 + 1202664.078	20 292 570
		Сметная прибыль, (5.00%)				20292569.500 x 5.00%	1 014 628
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				20292569.500 x 5.000%	1 014 628
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					22 321 826
		Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700				22321826.450 x 0.1700	3 794 710
		Итого в текущих ценах 2025 года к=1.155, к = 1.1550				3794710.497 x 1.1550	4 382 891
		Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800				4382890.623 x 0.9800	4 295 233
		НДС (12%)				4295232.811 x 12%	515 428
		Итого с НДС				4295232.811 + 515427.937	4 810 661

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	16.09.2025 18:54
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:36
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:46 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:00
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:56
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:22
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 17:40

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ)				
1	13	1121-0202-0103РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	3000	796	2 388 000
2	14	243-305-0307СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	2.35	344 443	809 441
3	15	243-305-0303СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0.33	145 814	48 119
4	16	243-305-0301СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0.33	105 729	34 891
			Итого по локальной смете: Система оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ)				**3 280 451**
			ИТОГО по акту:				**3 280 451**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)	3280450.608 x 6.30%	206 668
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	3280450.608 + 206668.395	3 487 119
	Сметная прибыль, (5.00%)	3487119.002 x 5.00%	174 356
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	3487119.002 x 5.000%	174 356
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		3 835 831
	Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700	3835830.903 x 0.1700	652 091
	Итого в текущих ценах 2025 года к=1,155, к = 1.1550	652091.253 x 1.1550	753 165
	Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800	753165.398 x 0.9800	738 102
	НДС (12%)	738102.090 x 12%	88 572
	Итого с НДС	738102.090 + 88572.251	826 674

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	16.09.2025 18:46
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:35
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:37 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 17:00
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:22
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:34
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 15:28

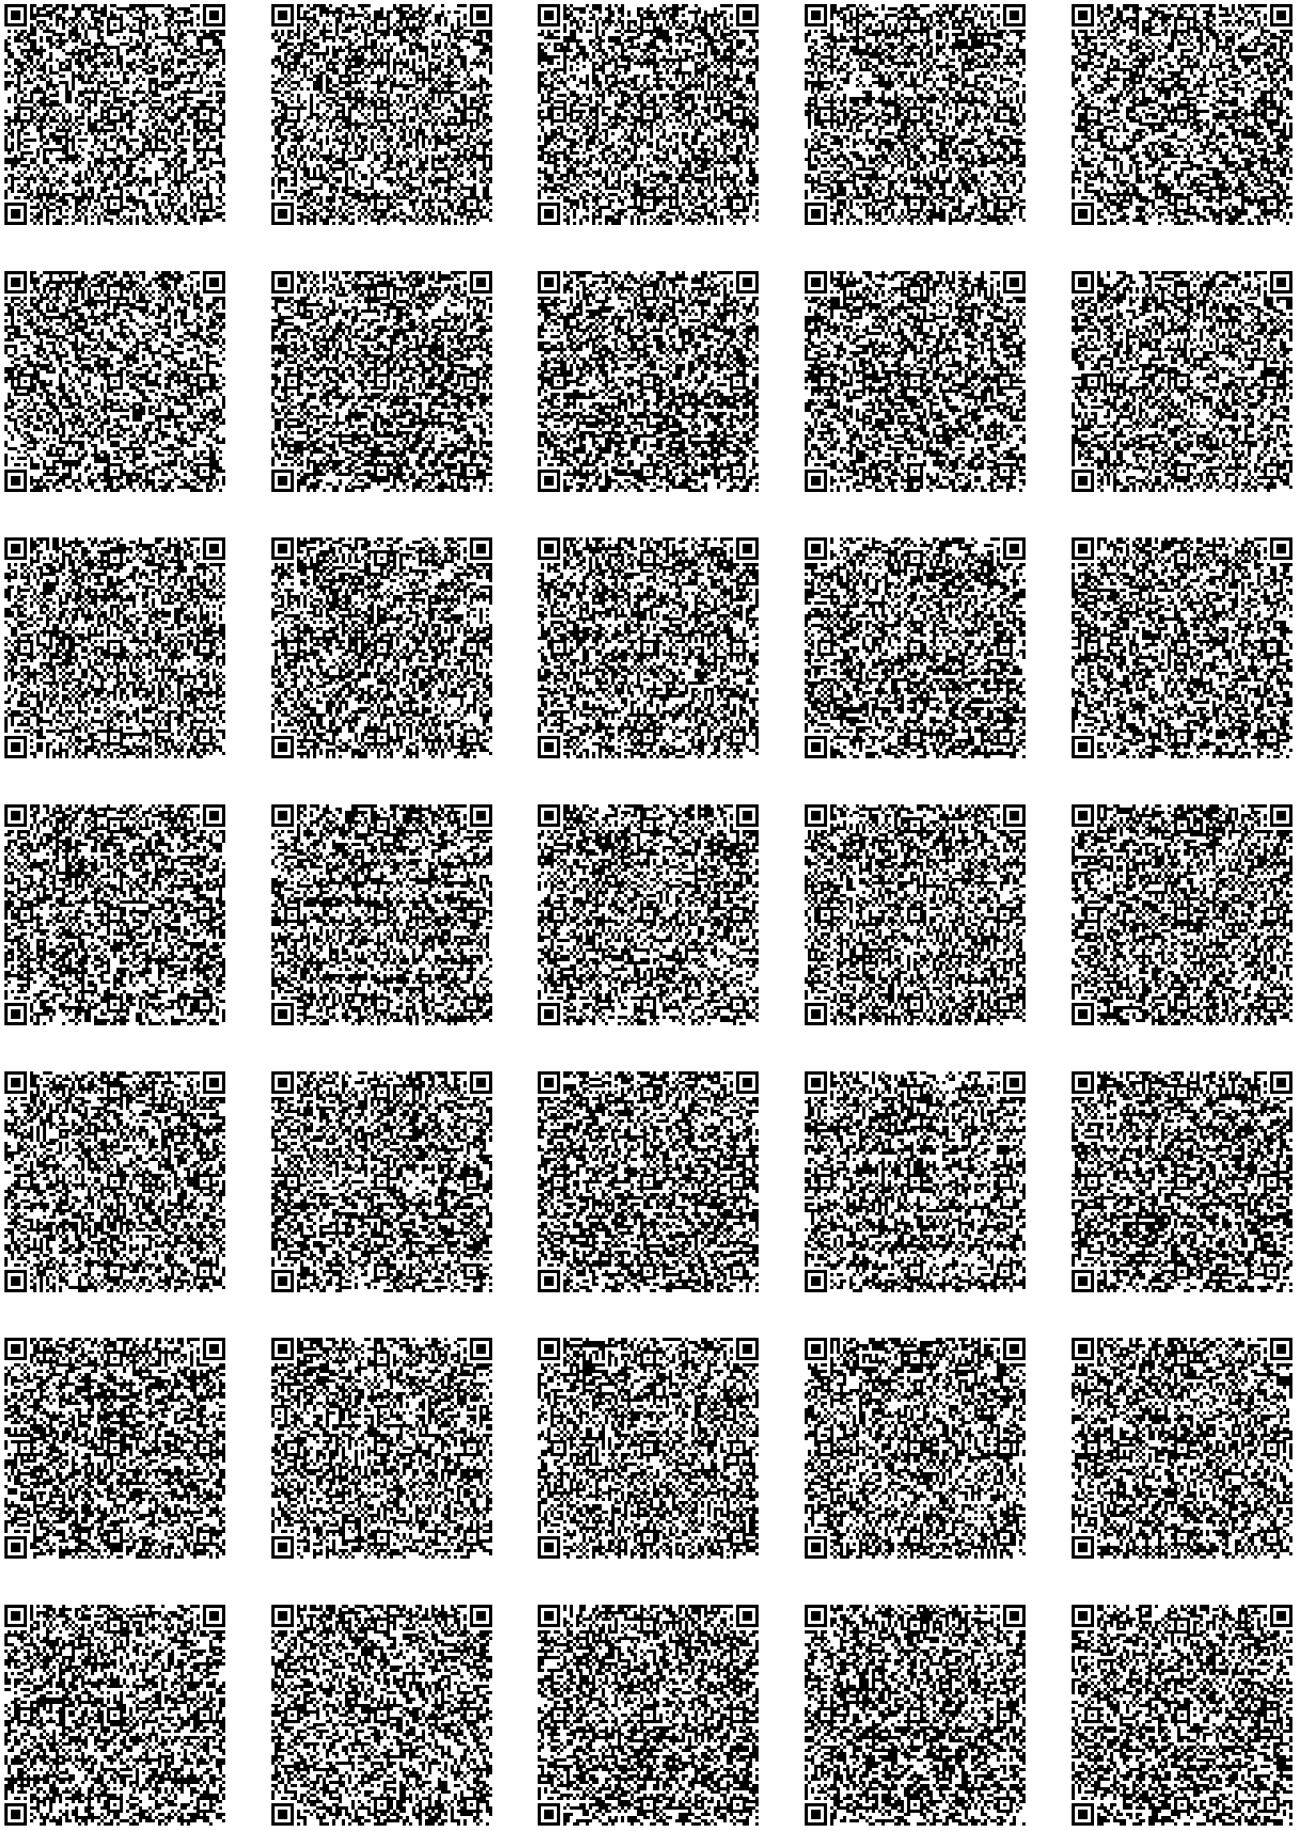

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ)				
1	13	1121-0202-0103РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	3000	796	2 388 000
2	14	243-305-0307СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	2.35	344 443	809 441
3	15	243-305-0303СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0.33	145 814	48 119
4	16	243-305-0301СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0.33	105 729	34 891
			Итого по локальной смете: Система оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ)				**3 280 451**
			ИТОГО по акту:				**3 280 451**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)	3280450.608 x 6.30%	206 668
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	3280450.608 + 206668.395	3 487 119
	Сметная прибыль, (5.00%)	3487119.002 x 5.00%	174 356
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	3487119.002 x 5.000%	174 356
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		3 835 831
	Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300	3835830.903 x 0.8300	3 183 740
	Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750	3183739.649 x 1.0750	3 422 520
	Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800	3422520.123 x 0.9800	3 354 070
	НДС (12%)	3354069.720 x 12%	402 488
	Итого с НДС	3354069.720 + 402488.366	3 756 558

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	16.09.2025 18:42
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:34
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:36 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:23
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 15:28
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 10:10
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:34

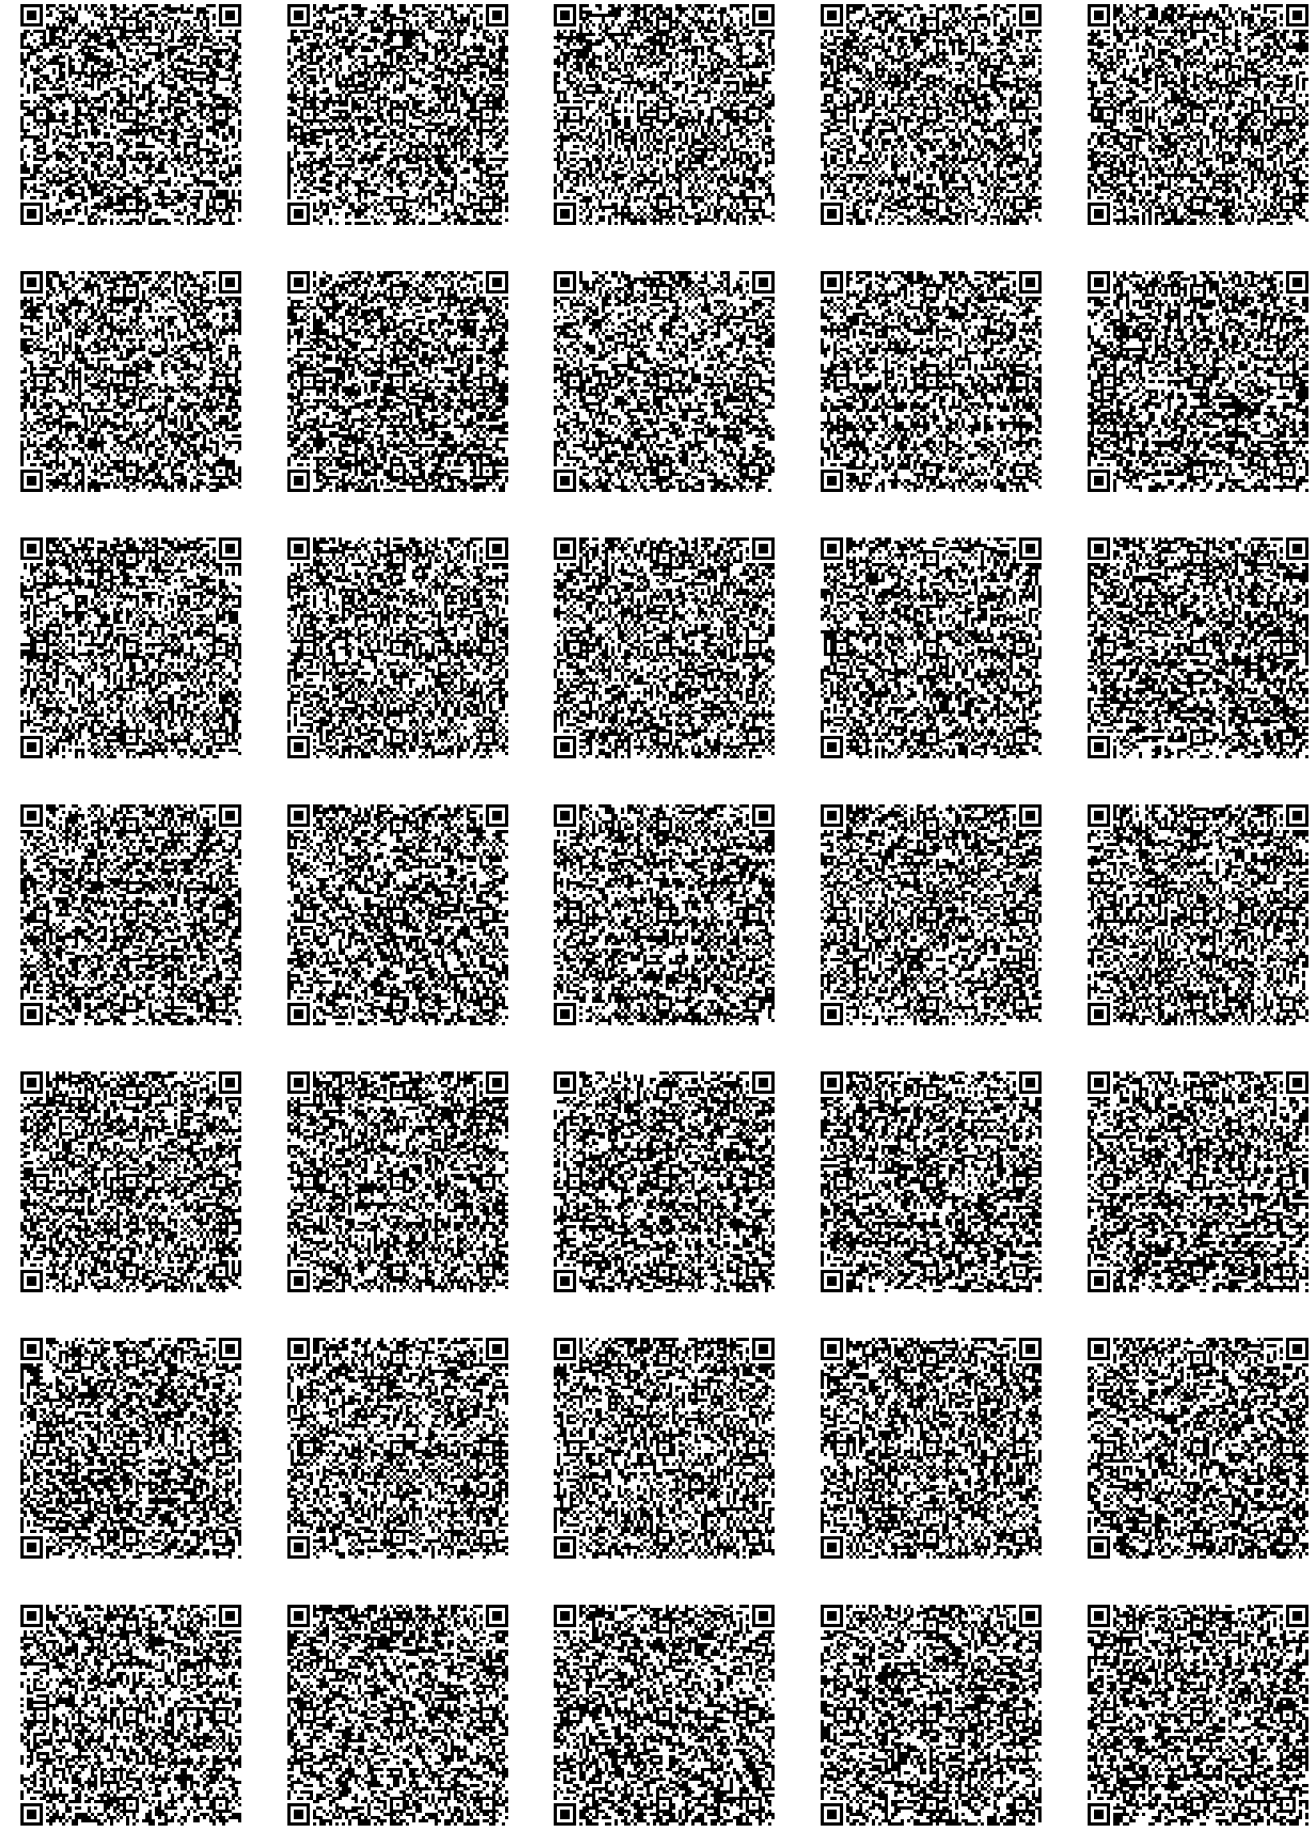

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электрооборудование				
			Раздел: Кабельные изделия				
1	152	1121-0202-0103 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	3272	707	2 313 304
2	165	243-108-0502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.337	810 112	273 008
3	176	243-107-0502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	3	609 368	1 828 104
			Итого по разделу: Кабельные изделия				**4 414 416**
			Раздел: Монтажное оборудование				
4	181	241-207-1702СпрСЦ 11.2023	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	3272	140	458 080
			Итого по разделу: Монтажное оборудование				**458 080**
			Итого по локальной смете: Электрооборудование				**4 872 496**
			ИТОГО по акту:				**4 872 496**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)	4872495.935 x 6.30%	306 967
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4872495.935 + 306967.253	5 179 463
	Сметная прибыль, (5.00%)	5179463.188 x 5.00%	258 973
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	5179463.188 x 5.000%	258 973
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		5 697 410
	Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300	5697409.507 x 0.8300	4 728 850
	Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750	4728849.891 x 1.0750	5 083 514
	Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800	5083513.632 x 0.9800	4 981 843
	НДС (12%)	4981843.360 x 12%	597 821

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				4981843.360 + 597821.203	5 579 665

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	16.09.2025 17:46
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:33
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:36 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 15:27
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:22
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 16:59
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:33

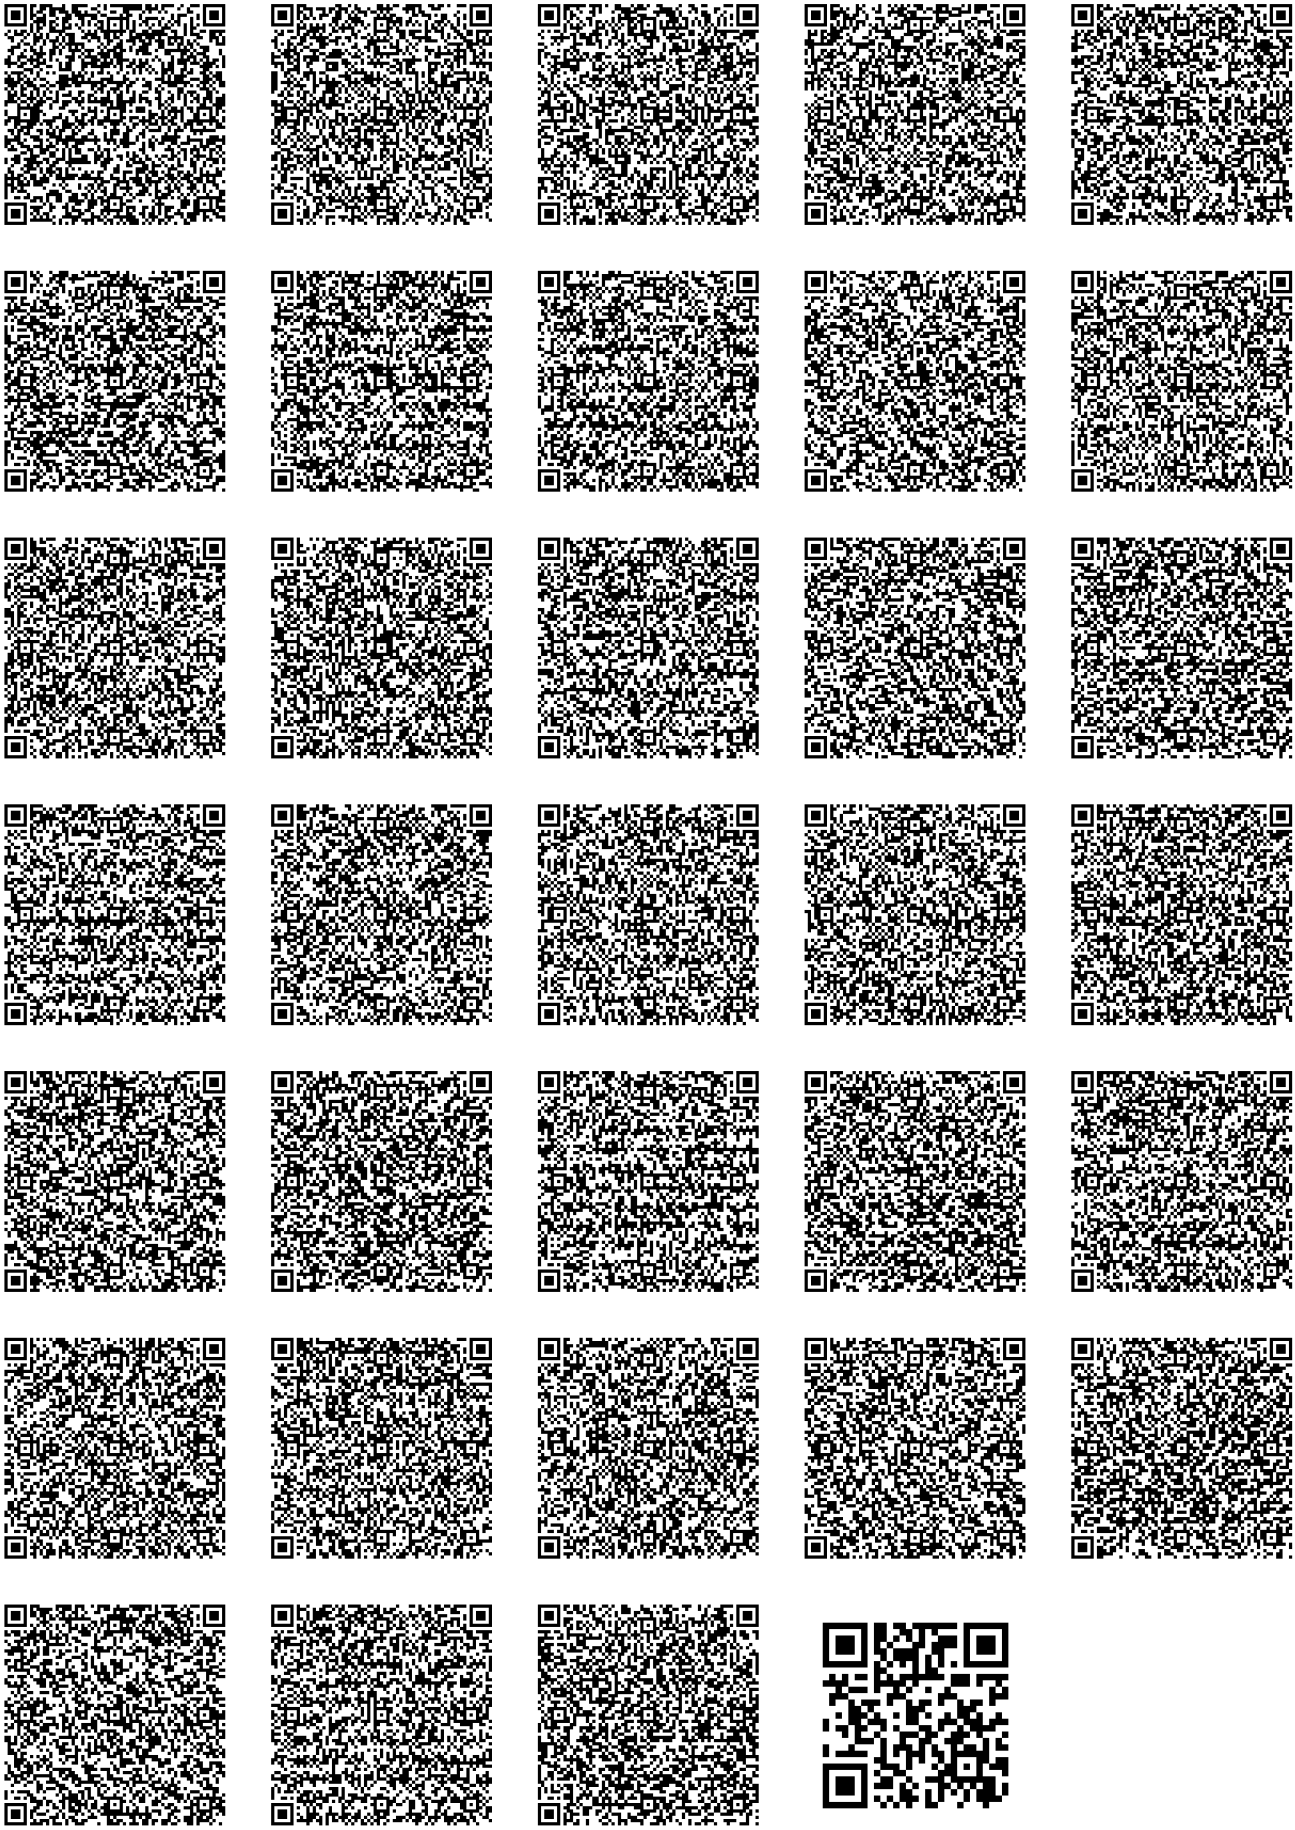

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электрооборудование				
			Раздел: Кабельные изделия				
1	152	1121-0202-0103 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	3272	707	2 313 304
2	165	243-108-0502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.337	810 112	273 008
3	176	243-107-0502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	3	609 368	1 828 104
			Итого по разделу: Кабельные изделия				**4 414 416**
			Раздел: Монтажное оборудование				
4	181	241-207-1702СпрСЦ 11.2023	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	3272	140	458 080
			Итого по разделу: Монтажное оборудование				**458 080**
			Итого по локальной смете: Электрооборудование				**4 872 496**
			ИТОГО по акту:				**4 872 496**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)				4872495.935 x 6.30%	306 967
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4872495.935 + 306967.253	5 179 463
		Сметная прибыль, (5.00%)				5179463.188 x 5.00%	258 973
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				5179463.188 x 5.000%	258 973
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					5 697 410
		Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800				5697409.507 x 0.9800	5 583 461
		Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700				5583461.317 x 0.1700	949 188
		Итого в текущих ценах 2025 года к=1.155, к = 1.1550				949188.424 x 1.1550	1 096 313
		НДС (12%)				1096312.630 x 12%	131 558

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				1096312.630 + 131557.516	1 227 870

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	16.09.2025 17:42
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:32
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:35 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:32
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 15:27
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 10:10
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:23

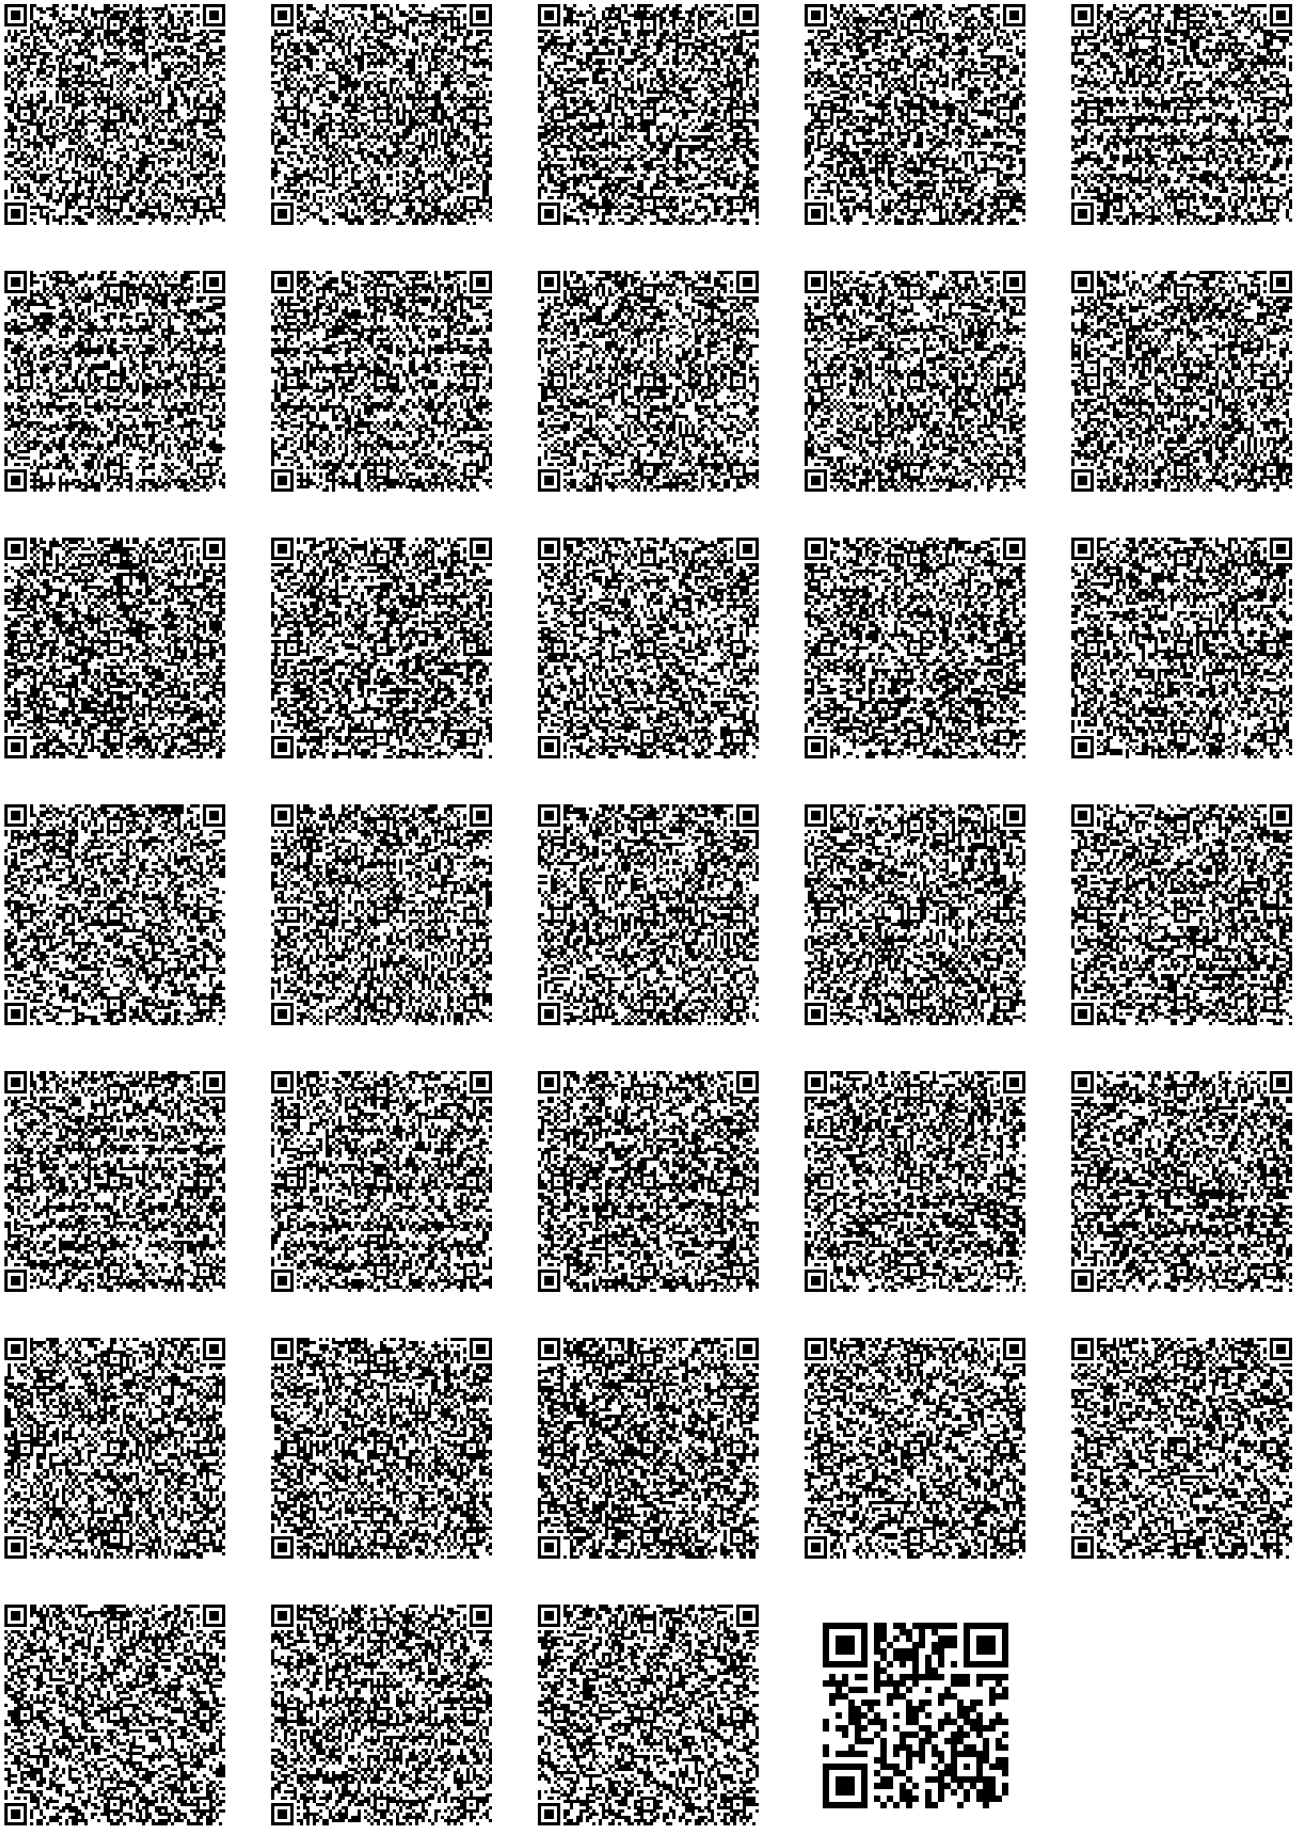

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Часофикация				
1	7	1121-0202-0103РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	1100	796	875 600
2	8	243-305-0403СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,0	км	1.024	471 794	483 117
3	9	243-304-0102РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.102	179 638	18 323
			Итого по локальной смете: Часофикация				**1 377 040**
			ИТОГО по акту:				**1 377 040**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)				1377040.176 x 6.30%	86 754
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1377040.176 + 86753.534	1 463 794
		Сметная прибыль, (5.00%)				1463793.710 x 5.00%	73 190
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				1463793.710 x 5.000%	73 190
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					1 610 173
		Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700				1610173.081 x 0.1700	273 729
		Итого в текущих ценах 2025 года к=1.155, к = 1.1550				273729.424 x 1.1550	316 157
		Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800				316157.485 x 0.9800	309 834
		НДС (12%)				309834.335 x 12%	37 180
		Итого с НДС				309834.335 + 37180.120	347 014

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	16.09.2025 17:38
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:31
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:35 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 10:09
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:32
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 12:52
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	19.09.2025 15:26

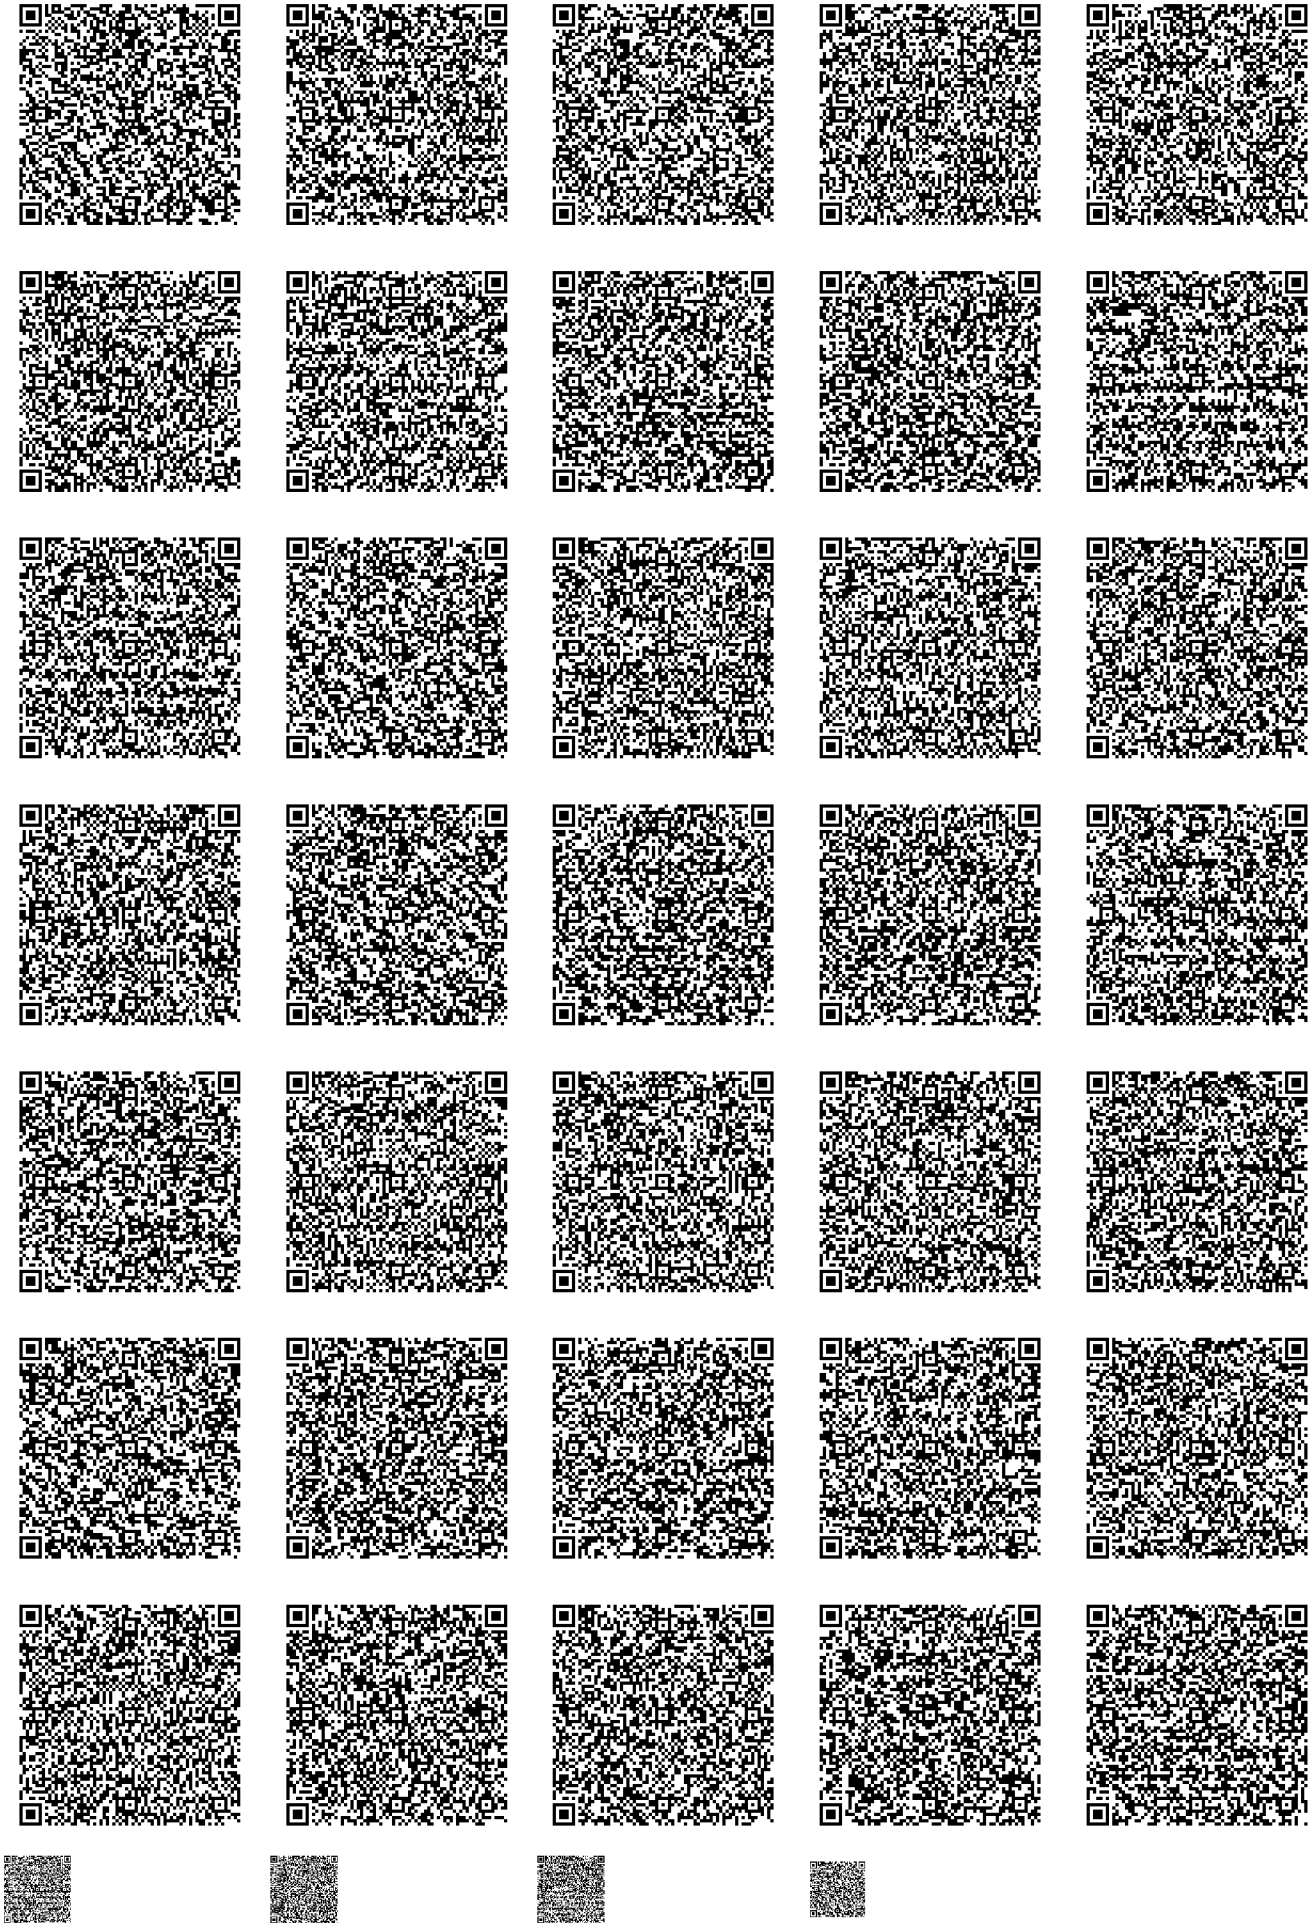

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Часофикация				
1	7	1121-0202-0103РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.20/	м	1100	796	875 600
2	8	243-305-0403СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,0	км	1.024	471 794	483 117
3	9	243-304-0102РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.102	179 638	18 323
			Итого по локальной смете: Часофикация				**1 377 040**
			ИТОГО по акту:				**1 377 040**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)				1377040.176 x 6.30%	86 754
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1377040.176 + 86753.534	1 463 794
		Сметная прибыль, (5.00%)				1463793.710 x 5.00%	73 190
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				1463793.710 x 5.000%	73 190
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					1 610 173
		Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300				1610173.081 x 0.8300	1 336 444
		Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750				1336443.657 x 1.0750	1 436 677
		Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800				1436676.932 x 0.9800	1 407 943
		НДС (12%)				1407943.393 x 12%	168 953
		Итого с НДС				1407943.393 + 168953.207	1 576 897

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	16.09.2025 17:36
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:30
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:34 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:29
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 10:08
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:24
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:33

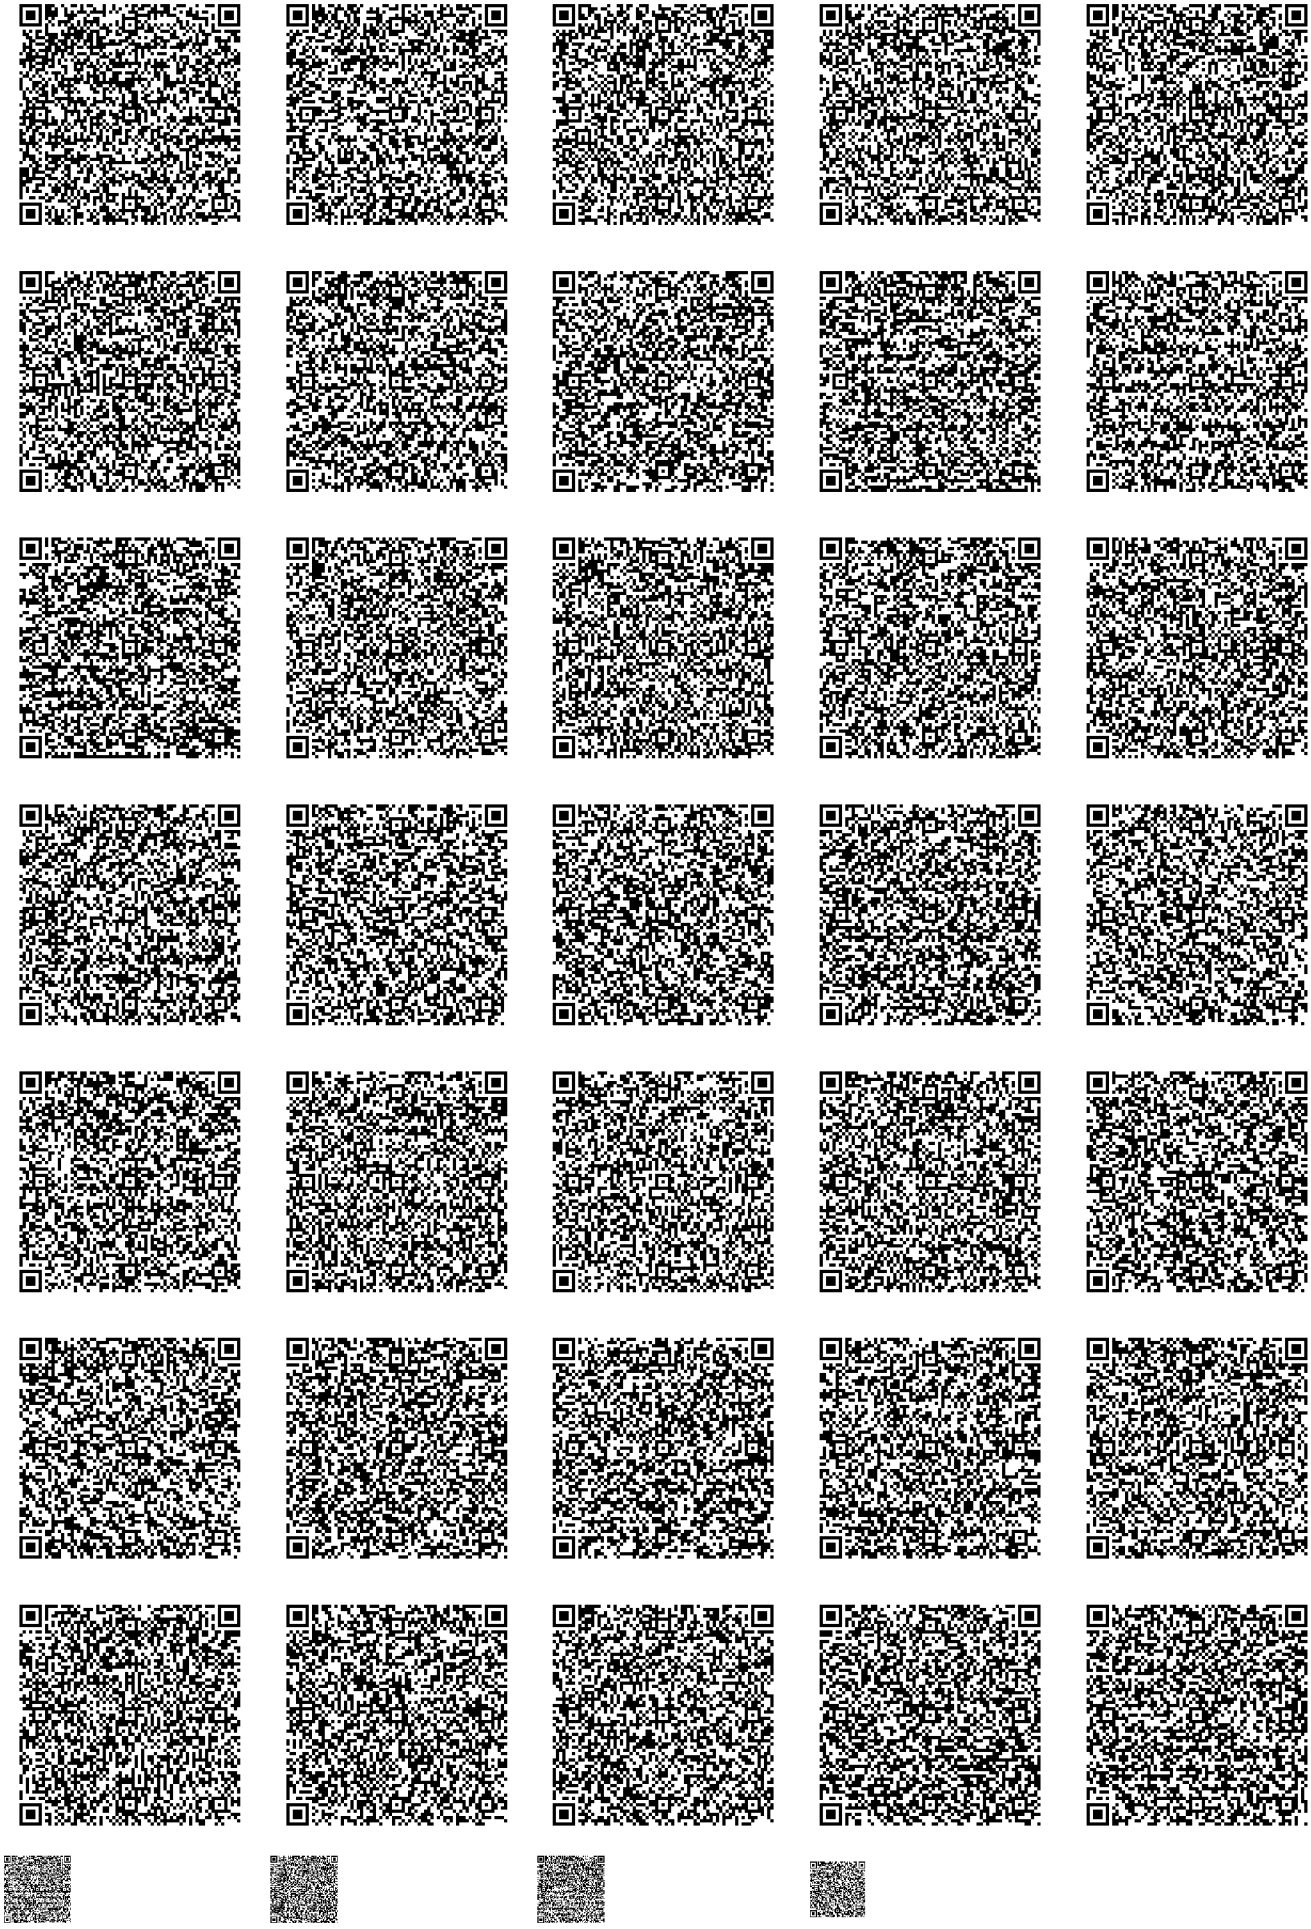

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроосвещение				
			Раздел: Кабельные изделия				
1	33	1121-0202-0103 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.25/	м	2000	708	1 416 000
2	34	1121-0202-0103 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.32/	м	1200	710	852 000
3	35	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	200	1 727	345 400
4	36	243-107-0501РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.4	419 775	167 910
5	37	243-107-0301РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	2.04	257 126	524 537
6	38	243-108-0501РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1.224	554 723	678 981
7	39	243-108-0301РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0.204	413 695	84 394
			Итого по разделу: Кабельные изделия				**4 069 222**
			Итого по локальной смете: Электроосвещение				**4 069 222**
			ИТОГО по акту:				**4 069 222**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)				4069221.889 x 6.30%	256 361
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4069221.889 + 256360.987	4 325 583
		Сметная прибыль, (5.00%)				4325582.875 x 5.00%	216 279
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				4325582.875 x 5.000%	216 279
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 758 141

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300				4758141.163 x 0.8300	3 949 257
		Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750				3949257.165 x 1.0750	4 245 451
		Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800				4245451.453 x 0.9800	4 160 542
		НДС (12%)				4160542.424 x 12%	499 265
		Итого с НДС				4160542.424 + 499265.091	4 659 808

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	16.09.2025 17:29
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:28
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:30 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:30
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 10:07
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	22.09.2025 17:32
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:28

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроосвещение				
			Раздел: Кабельные изделия				
1	33	1121-0202-0103 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.25/	м	2000	708	1 416 000
2	34	1121-0202-0103 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в полу/Д.32/	м	1200	710	852 000
3	35	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	200	1 727	345 400
4	36	243-107-0501РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.4	419 775	167 910
5	37	243-107-0301РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	2.04	257 126	524 537
6	38	243-108-0501РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1.224	554 723	678 981
7	39	243-108-0301РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0.204	413 695	84 394
			Итого по разделу: Кабельные изделия				**4 069 222**
			Итого по локальной смете: Электроосвещение				**4 069 222**
			ИТОГО по акту:				**4 069 222**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)				4069221.889 x 6.30%	256 361
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4069221.889 + 256360.987	4 325 583
		Сметная прибыль, (5.00%)				4325582.875 x 5.00%	216 279
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				4325582.875 x 5.000%	216 279
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 758 141

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700				4758141.163 x 0.1700	808 884
		Итого в текущих ценах 2025 года к=1.155, к = 1.1550				808883.998 x 1.1550	934 261
		Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800				934261.017 x 0.9800	915 576
		НДС (12%)				915575.797 x 12%	109 869
		Итого с НДС				915575.797 + 109869.096	1 025 445

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	16.09.2025 17:32
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	18.09.2025 14:29
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	18.09.2025 14:33 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:29
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 10:08
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:07
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:32

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: автоматическое пожаротушение				
			Раздел: В23				
			Подраздел: Реле потока д100 в комплекте повысительной установки				
1	31	1116-0401-0205РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	9 477	947 700
2	33	1116-0401-0201РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4 962	148 860
3	34	1116-0401-0201РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	110	4 510	496 100
4	35	1116-0401-0201РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	500	4 360	2 180 000
5	36	1116-1101-0102РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	424	25 440
6	37	1116-1101-0101РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	418	20 064
			Итого по подразделу: Реле потока д100 в комплекте повысительной установки				**3 818 164**
			Итого по разделу: В23				**3 818 164**
			Итого по локальной смете: автоматическое пожаротушение				**3 818 164**
			ИТОГО по акту:				**3 818 164**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)	3818164.000 x 6.30%	240 544
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	3818164.000 + 240544.339	4 058 708
	Сметная прибыль, (5.00%)	4058708.339 x 5.00%	202 935
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	4058708.339 x 5.000%	202 935
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		4 464 579
	Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700	4464579.173 x 0.1700	758 978

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 2025 года к=1.155, к = 1.1550				758978.459 x 1.1550	876 620
		Договорной коэффициент = 0,98, к = 0.9800				876620.121 x 0.9800	859 088
		НДС (12%)				859087.718 x 12%	103 091
		Итого с НДС				859087.718 + 103090.526	962 178

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	10.09.2025 19:04
Представители технического надзора		
500910300359 - РАСПАЕВ ХАМИДОЛЛА АКЗАМОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.09.2025 15:41
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	12.09.2025 09:04
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:26
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 10:08
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:05
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:29

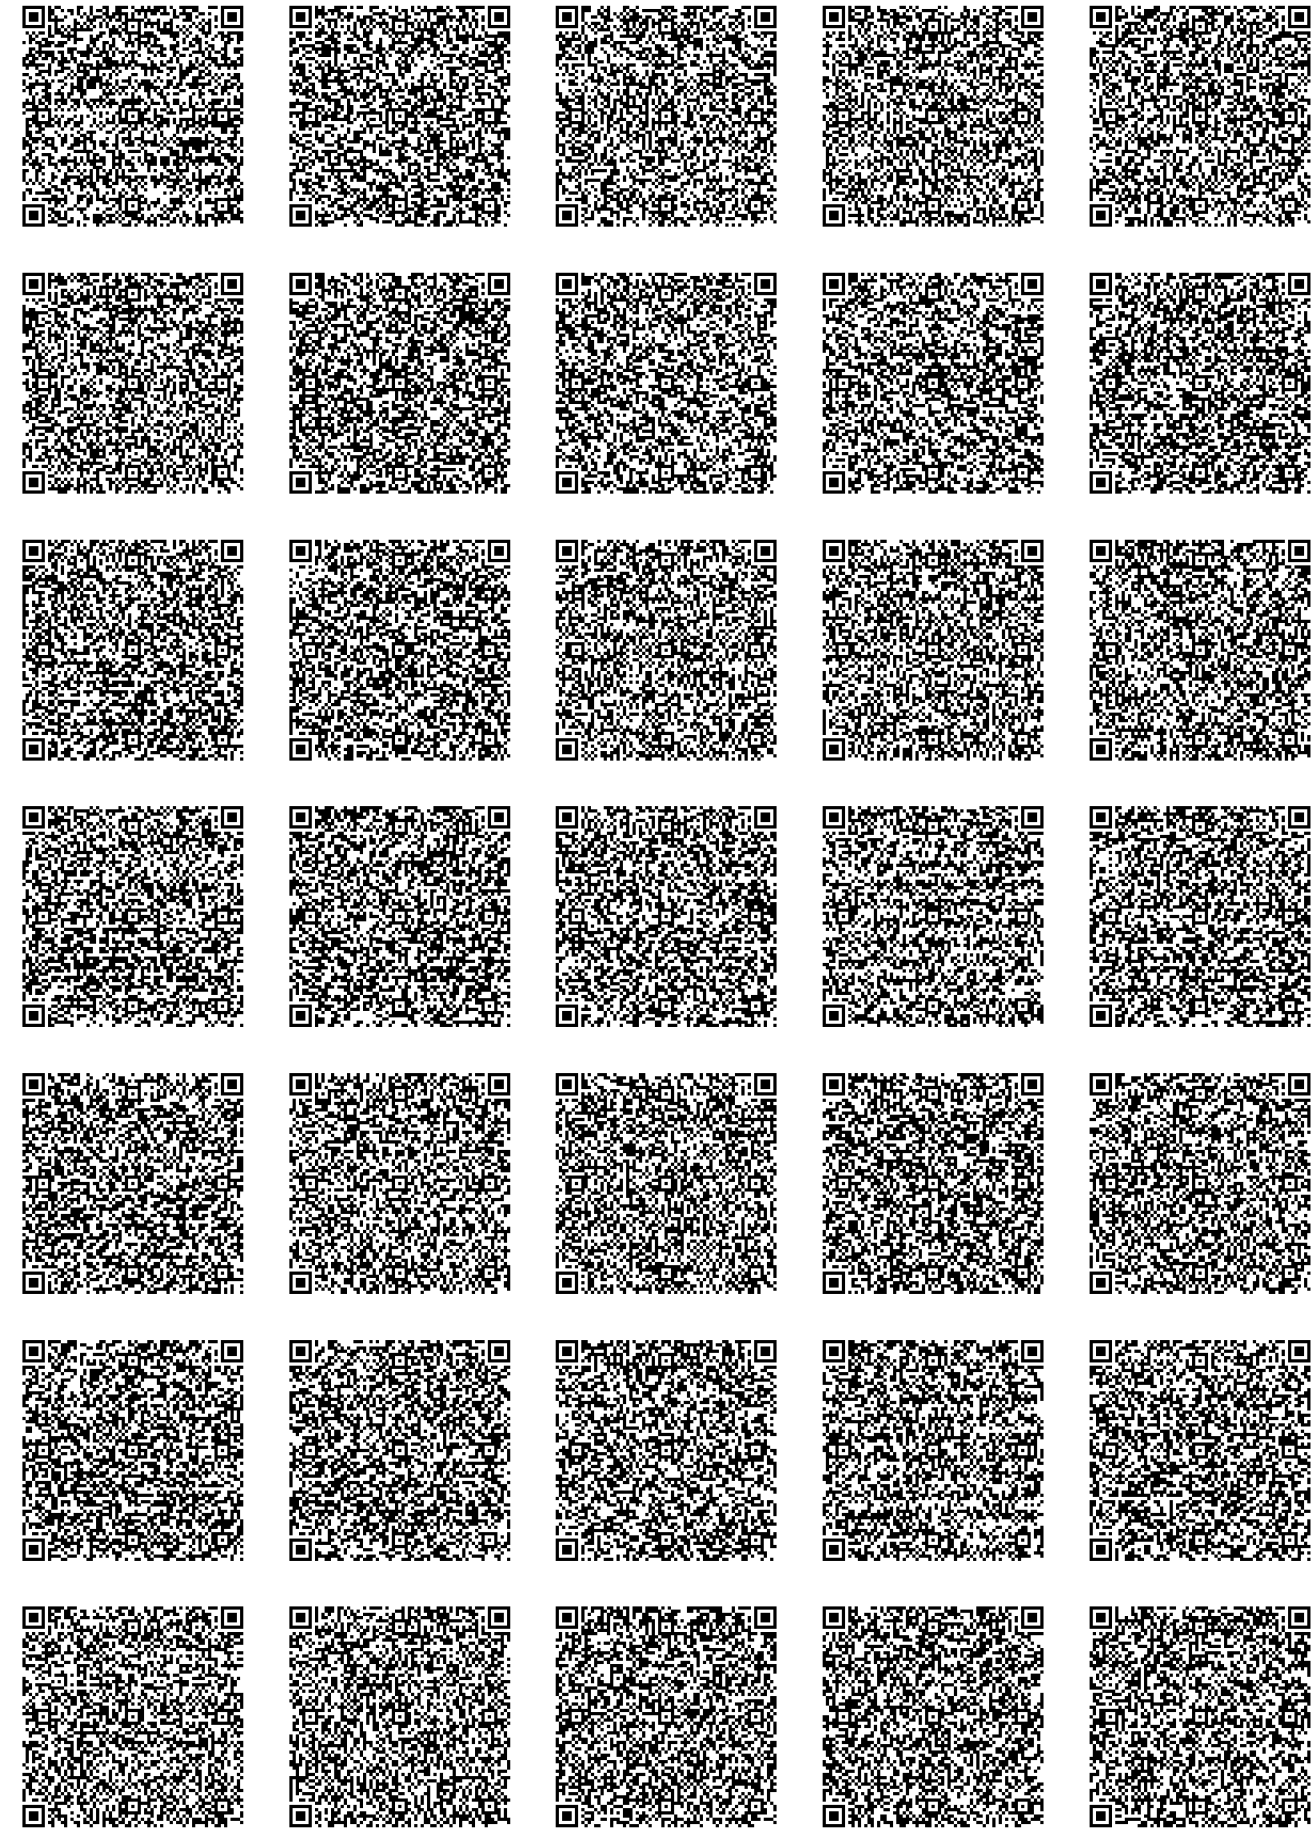

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: автоматическое пожаротушение				
			Раздел: В23				
			Подраздел: Реле потока д100 в комплекте повысительной установки				
1	31	1116-0401-0205РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	9 477	947 700
2	33	1116-0401-0201РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4 962	148 860
3	34	1116-0401-0201РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	110	4 510	496 100
4	35	1116-0401-0201РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	500	4 360	2 180 000
5	36	1116-1101-0102РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	424	25 440
6	37	1116-1101-0101РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	418	20 064
			Итого по подразделу: Реле потока д100 в комплекте повысительной установки				**3 818 164**
			Итого по разделу: В23				**3 818 164**
			Итого по локальной смете: автоматическое пожаротушение				**3 818 164**
			ИТОГО по акту:				**3 818 164**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)	3818164.000 x 6.30%	240 544
Итого с затратами на организацию и управление СМР	3818164.000 + 240544.339	4 058 708
Сметная прибыль, (5.00%)	4058708.339 x 5.00%	202 935
Непредвиденные расходы, (5.000%)	4058708.339 x 5.000%	202 935
Итого с непредвидемыми работами и затратами		4 464 579
Договорной коэффициент 0,98, к = 0.9800	4464579.173 x 0.9800	4 375 288

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300				4375287.590 x 0.8300	3 631 489
		Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750				3631488.699 x 1.0750	3 903 850
		НДС (12%)				3903850.352 x 12%	468 462
		Итого с НДС				3903850.352 + 468462.042	4 372 312

Лист согласования
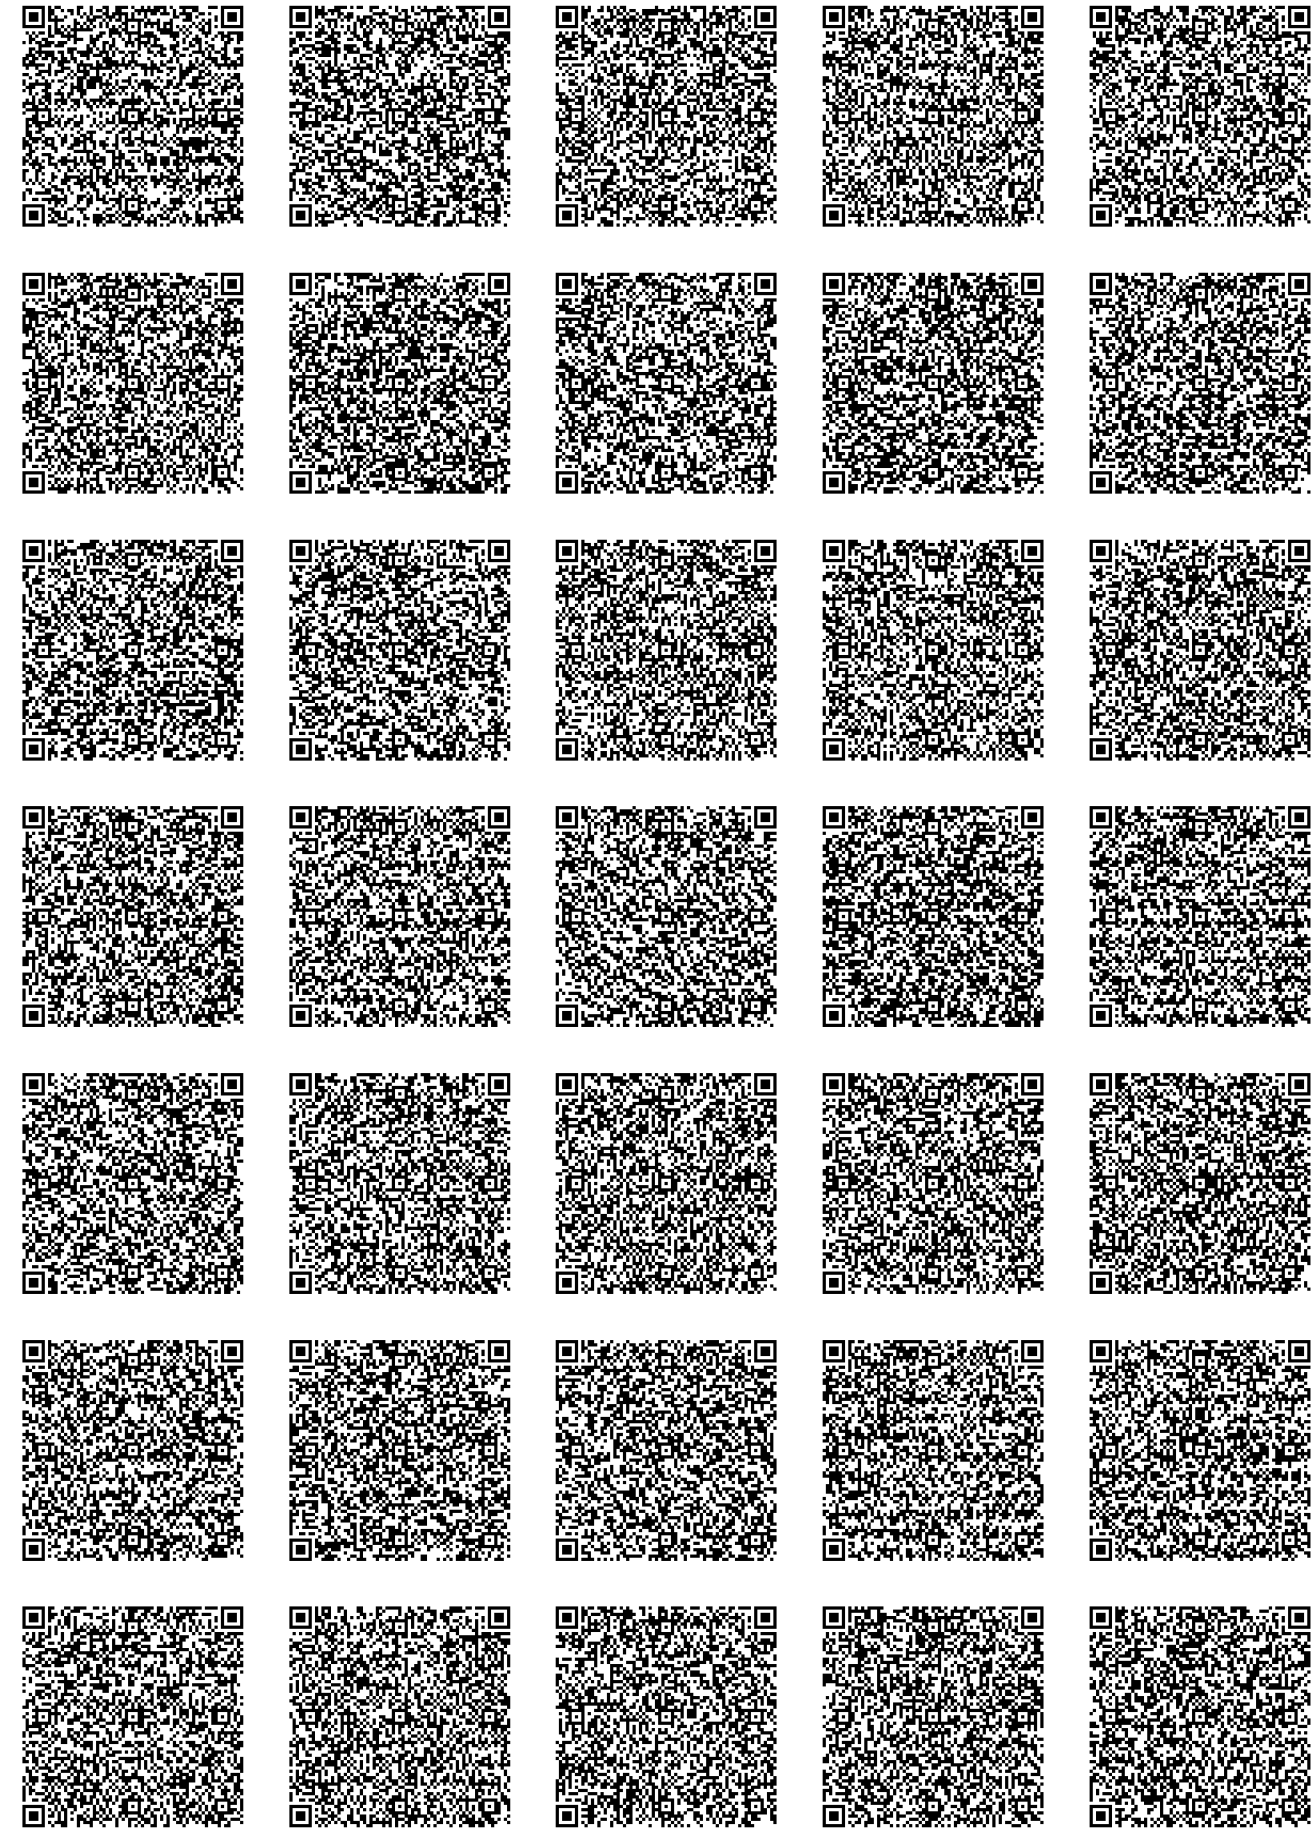
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	10.09.2025 19:08
Представители технического надзора		
500910300359 - РАСПАЕВ ХАМИДОЛЛА АКЗАМОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.09.2025 15:39
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	12.09.2025 09:05
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САҒЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:27
920316350175 - РАХИМЖАНОВ АРМАН БЕРИКОВИЧ	Заместитель директора ДИПГЗА МНВО РК	18.09.2025 18:30
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	23.09.2025 10:07
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	22.09.2025 10:07
