Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" декабря 2024 года

Заказчик КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо- Казахстанской области", руководитель Галеев К.Т.,БИН 030140002400, тел. 8(7152)36-16-24, 150000, Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «30» декабря 2024 года, ТОО «СК АЛЕМ», директор Ауельбеков Елжас Султанмуратулы, Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 41/2, кв. 37, БИН 150540008687, +7(701)-577-64-44,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «30» декабря 2024 года, ТОО «АТЛАНТИС-ПВ» , директор Аипов Арман Мейрамович, эксперт технического надзора Доль Виктор Егорович,№ KZ61VJE00069521 от 04.10.2021, БИН 040840006470, 87182687702,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)от «30» декабря 2024 года, ТОО «Севгражданпроект» директор Бралин Куаныш Еркенович,эксперт авторского надзора Каирбеков Алибек Тоганбекович, квалификационный аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года БИН 980340001576, 87152366610,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство медицинского пункта в селе Тюменка Аккайынского района Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей), II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным,

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Токушинский сельский округ, с.Тюменка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "30" декабря 2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Акимата Токушинского сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области "22" февраля 2024 года №3;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) **№KZ74VUA00907928 от 05.05.2023 г. КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области»**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **КГУ "Управление государственного архитектурно -строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области" № KZ85REA00395293 от 05.06.2024г.,№ KZ67REA00416957 от 09.09.2024г., № KZ89REA00423933 от 10.10.2024г.,№ KZ40REA00433157 от 22.11.2024г.,**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3)проекта (проектно-сметной документации) **АО «КазНИИСА», ГСЛ 000006, 1 категория от 14.10.2022 г., Рабочий проект №158.23**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», № 164 от 05.03.2024 года,**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2024 года;**

окончание работ **декабрь 2024 года;**

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**

фактически, месяц:**7;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Мощность	Посещ./ смену	25		25	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Медицинский пункт имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	154,70	154,70
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	903,4	903,4
Полезная площадь	м2	138,87	138,87
Расчетная площадь	м2	110,39	110,39
Площадь застройки	м2	223,15	223,15

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении, прямоугольной формы в плане, размерами в осях 13,0х12,0 м. Высота этажа – 3,0 м.

Конструктивная схема здания - стеновая, с несущими продольными кирпичными стенами.

Фундамент - ленточный монолитный из бетона, ФБС блоки 2 ряда.

Стены - кирпичные толщиной 380мм из полнотелого керамического кирпича, на цементно-песчаном растворе.

Перегородки - кирпичные из кирпича.

Перемычки - монолитные железобетонные из бетона.

Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм для сейсмических районов.

Кровля – скатная из профилированных листов по деревянным стропилам.

По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм.

Отопление. Система отопления автономная. Котел марки ЭВН-К-12 Э2 - 2шт, 12 кВт (каждый). В качестве нагревательных приборов предусмотрены биметаллические радиаторы РБС-500 в комплекте с терморегуляторами.

Вентиляция предусмотрена вытяжная с механическим побуждением, приток неорганизованный. Воздух удаляется системами естественной вентиляции через решетки в приставных каналах. Воздуховоды выводятся выше кровли и оборудуются шахтами с зонтами. Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали.

Внутренний водопровод и канализация. Водоснабжение медицинского пункта предусматривается от существующего водопровода. Трубопроводы внутреннего водоснабжения В1 монтируются из полиэтиленовых труб НДПЭ 100 SDR11. Подводящие трубопроводы В1 монтируются из трубы полиэтиленовой «питьевой»

НДПЭ 100 SDR11 Ø20х2 (Ø15) и прокладываются по стенам помещений. Подвод холодной воды В1 производится к санитарным приборам.

Система горячего водоснабжения здания медицинского пункта предусмотрена для подводки воды к санитарным приборам. Источником горячей воды является накопительный водонагреватель на 200 литров, мощностью 2,2 кВт. В процедурном кабинете предусмотрен электро-водонагреватель непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт. Средняя температура горячей воды равна 65 °С. Трубопроводы внутреннего горячего водоснабжения Т3 монтируются из полипропиленовых армированных труб PN20 Ø20х2 (Ø15) и прокладываются по стенам помещений. Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов самотеком в септик. Бытовая канализационная самотечная сеть принимается из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбами и уплотнительными кольцами, диметром 110 -50 мм.

Электротехнические решения. В здании предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Освещение принято светодиодное. Аварийное освещение предусмотрено по путям эвакуации в коридоре, в процедурной, в физиотерапевтическом кабинете. Светильники для аварийного освещения приняты с блоком аварийного питания.

Пожарная автоматическая сигнализация. Предусмотрен прибор, передающий сообщения (SMS) через встроенный модем на телефоны пользователей или пульт централизованной охраны. Предусмотрены дымовые пожарные извещатели на потолке. Система оповещения принята второго типа. Для оповещения используются светозвуковые оповещатели «ВЫХОД» и звуковые оповещатели. Для сетей пожарной сигнализации приняты огнестойкие кабели с медными жилами. Прокладка кабелей выполнена в кабельных каналах.

Системы связи. Подключение к внешней сети телефонизации и сети интернет осуществляется по сотовой связи. Для здания предусмотрена система видеонаблюдения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 152 047,964 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 102 675,108 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 26 386,926 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 141 658 488,52 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 115 271 562,5 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 26 386,926 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,16% и фактически применено 90 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - нормальный С;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство медицинского пункта в селе Тюменка Аккайынского района Северо-Казахстанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей). принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Галеев Кайрола Тюлюевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аккредитованная организация ТОО «АТЛАНТИС-ПВ», директор Аипов Арман Мейрамович
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт технического надзора Доль Виктор Егорович, № KZ48VJE00059182 от 06.11.2020 г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Севгражданпроект», директор Бралин Куаныш Еркенович

Каирбеков Алибек Тоганбекович, квалификационный аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СК Алем», директор Ауельбеков Елжас Султанмуратулы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Общие сведения										
Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство медицинского пункта в селе Тюменка Аккайынский район Северо-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**1**	-	**15**	**223,15**	**903,4**	**154,7**	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	электроснабжение	Благоустройство			
фундамент	стены	кровля			водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	Газо снабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ростверк, ФБС	**кирпичные**	**Односкатная, профлист**	**электрокотел**	**В проекте принято рабочее освещение на напряжение 220 В**	**Трубопроводы внутреннего водоснабжения В1 монтируются из полиэтиленовых труб НДПЭ 100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001. Подводящие трубопроводы В1 монтируются из трубы полиэтиленовой «питьвой» НДПЭ 100 SDR11 Ø20х2 (Ø15) по ГОСТ 18599-2001 и прокладываются по стенам помещений, а в коридорах - в конструкции пола. Подвод холодной воды В1 производится к санитарным приборам.**	**Источником горячей воды является накопительный водонагреватель на 200 литров, мощностью 2,2 кВт. В процедурном кабинете предусмотрен электро-водонагреватель непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт.**	**Система хоз-бытовой канализации предназначена для сбора и отвода сточной воды от санитарных приборов самотеком в септик.**	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	**63.44**	-	-	-	-	-
-	-	-	**75,43**	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы **одноэтажное**

План 1 этажа

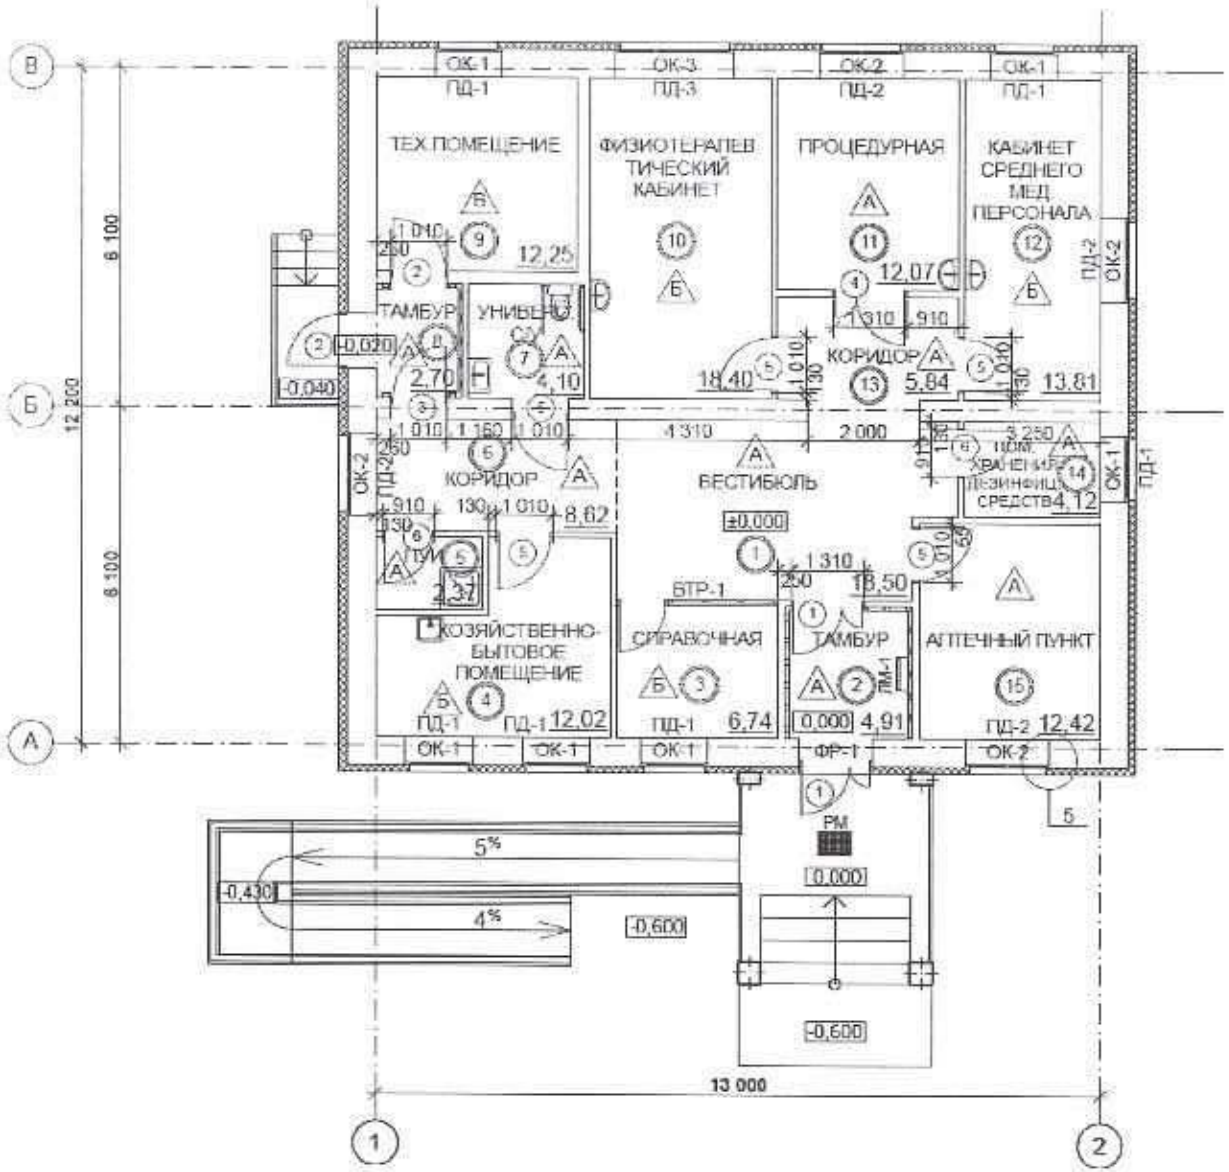

2. Экспликация к поэтажным планам **15 помещений**

Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь, м2
1	Вестибюль	18,50
2	Тамбур	4,91
3	Справочная	6,74
4	Хозяйственно-бытовое помещение	12,02
5	Помещение уборочного инвентаря	2,37
6	Коридор	8,62
7	Универсалный санузел	4,10
8	Тамбур	2,70
9	Техническое помещение	12,25
10	Физиотерапевтический кабинет	18,40
11	Процедурная	12,07
12	Кабинет среднего медперсонала	13,81
13	Коридор	5,84
14	Помещене хранения дезинфицирующих средств	4,12
15	Аптечный пункт	12,42

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,2012 га	**252,35**	**252,35**	-	**520.0**	**125.0**	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)										
оборудованные площадки				зеленые насаждения						
					в том числе					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-				-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	-	**Вестибюль**	**18,50**	**18,50**	-	**18,50**
1	**2**	-	**Тамбур**	**4,91**	**4,91**	-	**4,91**
1	**3**	-	**Справочная**	**6,74**	**6,74**	-	**6,74**
1	**4**	-	**Хозяйственно-бытовое помещение**	**12,02**	**12,02**	-	**12,02**
1	**5**	-	**Помещение уборочного инвентаря**	**2,37**	**2,37**	-	**2,37**
1	**6**	-	**Коридор**	**8,62**	**8,62**	-	**8,62**
1	**7**	-	**Универсалный санузел**	**4,10**	**4,10**	-	**4,10**
1	**8**	-	**Тамбур**	**2,70**	**2,70**	-	**2,70**
1	**9**	-	**Техническое помещение**	**12,25**	**12,25**	-	**12,25**
1	**10**	-	**Физиотерапевтический кабинет**	**18,40**	**18,40**	-	**18,40**
1	**11**	-	**Процедурная**	**12,07**	**12,07**	-	**12,07**
1	**12**	-	**Кабинет среднего медперсонала**	**13,81**	**13,81**	-	**13,81**
1	**13**	-	**Коридор**	**5,84**	**5,84**	-	**5,84**
1	**14**	-	**Помещенс хранения дезинфицирующих средств**	**4,12**	**4,12**	-	**4,12**
1	**15**	-	**Аптечный пункт**	**12,42**	**12,42**	-	**12,42**

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	**138,87**	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		**ростверк, ФБС**
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		**кирпичные**
	2) перегородки		**кирпичные**
3	Перекрытия	чердачное	**плиты покрытия многопустотные**
		междуэтажное	-
4	Крыша		**односкатная . из профилированных листов по деревянным стропилам**
5	Полы	1-го этажа	**грунт основания с втрамбованным щебнем фракцией - 40-60 мм, подстилающий слой из бетона класса С8/10, стяжка из п/п раствора, чистовой пол (линолеум, плитка, наливной пол)**
		последующих этажей	-
6	Проемы	окна	**из ПВХ**
		двери	**деревянные, металлические**
7	Отделочные работы	внутренние	**штукатурка, чистовая отделка (выравнивание сухими смесями и покраска, облицовка плитками)**
		наружные	**утеплитель, штукатурка по сетке, покраска**
8	Горячее водоснабжение		**источником горячей воды является накопительный водонагреватель**
9	Водопровод		**полиэтиленовые трубы диаметром 20-32мм**
10	Канализация		**трубопроводы канализации Ø50, Ø110 самотеком в септик**
11	Электроосвещение		**принято рабочее освещение на напряжение 220 В. Светильники запроектированы**

				светодиодные, выбранные в зависимости от назначения, характера среды и архитектурно-строительных особенностей помещений
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			Электрокотлы 2 шт

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение	Заглубление спланированной	Описание элементов

отдельных частей строения	поверхности земли до пола подвала	стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
наружные		-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-

Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

1) **Авторский надзор: ТОО «Севгражданпроект» директор Бралин Куаныш Еркенович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

2) **Аттестованный эксперт Каирбеков Алибек Тоганбекович, №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)
