Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ",Г.АСТАНА , РАЙОН ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ ҚАБАНБАЙ БАТЫР, 119, тел.: +77172777-117/777-179/777-278**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030340001539**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЖЭГ-Астана",г. Астана, ул. Бейтбишилик 25, офис 301**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060640009154

Договор (контракт) 16-25 ГЗ ЖМС от 15.08.2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
49	23.09.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт аэродромных покрытий, который находится г. Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт/ работы по ремонту взлетно-посадочной полосы			Работа	1	224 151 649,00	224 151 649,00	24 016 248,11
				Итого	1	x	224 151 649,00	24 016 248,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гюлбудагян Э.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Первый заместитель Председателя Правления / _____ / Пыштанов Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта - Текущий ремонт аэродромных покрытий, который находится г. Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		16-25 ГЗ ЖМС	**15.08.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	702 506 850,89								84 300 822,11	786 807 673
в т.ч.:										
СМР	702 506 850,89									
Оборудование										
В отчётном месяце:		200 135 400,89							24 016 248,11	224 151 649
в т.ч.:										
СМР		**200 135 400,89**								
Оборудование									**24 016 248,11**	**224 151 649**

Заказчик:
Первый заместитель Председателя Правления

МП _____ **Пыштанов Р.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АЖЭГ-Астана

МП _____ **Гюлбудагян Э.Ж.**

Заказчик: АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Подрядчик: ТОО "АЖЭГ-Астана"

Наименование объекта - Текущий ремонт аэродромных покрытий, который находится г. Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт

АКТ №2 выполненных работ за сентябрь 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**197 884 403**
		Раздел 1. Фрезерование				**12764 931**
		Коэффициент 1,5 к нормам затрат труда, времени				
1	**Е12-200101-0709** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия асфальтобетонные. Срезка методом холодного фрезерования дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью свыше 150 до 250 м^2, толщина слоя до 70 мм**	**м^2**	**2 203,5**	**1 941**	**4276 994**
		ИВПП				
2	**С3412-102-0205**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**1 101,3093**	**92**	**101 320**
		МРД чарли браво				
3	**Е12-200101-0504** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 150 мм**	**м^2**	**1 322**	**2 311**	**3055 142**
4	**С3412-102-0205**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**1 415,862**	**92**	**130 259**
		МС24-25, МС-9 РД-BRAVO				
5	**Е12-200101-0504** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 150 мм**	**м^2**	**2 158,6**	**2 311**	**4988 525**
6	**С3412-102-0205**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**2 311,8606**	**92**	**212 691**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2. ИВПП					**15824 855**
7	E1127-0602-0901 *Кзтр и Кзм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	1,7628	231 942	408 867
8	E1127-901-106 *Кзтр и Кзм=1,12*	Разогревание битума в котле, вместимость 400 л	т битума	1,815684	90 398	164 134
9	E1127-0602-0302 *Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2 покрытия	2 203,5	800	1762 800
10	E1127-0602-0402 *Кзтр и Кзм=1,12* *К=6*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0302 /до 7 см/	м^2 покрытия	2 203,5	93	204 926
11	C1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	396,1893	26 212	10384 914
12	C1271-704-0504	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	1 089,520575	2 661	2899 214
	Раздел 3. РД, МРД чарли браво					**19992 239**
13	E1127-0602-0901 *Кзтр и Кзм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	1,0576	231 942	245 302
14	E1127-901-106 *Кзтр и Кзм=1,12*	Разогревание битума в котле, вместимость 400 л	т битума	1,089328	90 398	98 473
15	E1127-0602-0302 *Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2 покрытия	1 322	800	1057 600
16	E1127-0602-0402 *Кзтр и Кзм=1,12* *К=8*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0302 /до 8 см/	м^2 покрытия	1 322	124	163 928
17	C1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	271,5388	26 212	7117 575
18	C1271-704-0504	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	746,7317	2 661	1987 053
19	E1127-0602-0901 *Кзтр и Кзм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	0,5288	231 942	122 651
20	E1127-901-106 *Кзтр и Кзм=1,12*	Разогревание битума в котле, вместимость 400 л	т битума	0,544664	90 398	49 237
21	E1127-0602-0302 *Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2 покрытия	1 322	800	1057 600
22	E1127-0602-0402 *Кзтр и Кзм=1,12* *К=6*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0302 /до 7 см/	м^2 покрытия	1 322	93	122 946
23	C1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	237,6956	26 212	6230 477
24	C1271-704-0504	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	653,6629	2 661	1739 397
	Раздел 4. МС-9 РД-BRAVO					**32643 908**

1	2	3	4	5	6	7
25	E1127-0602-0901 *Кзтр и Кэм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	1,72688	231 942	400 536
26	E1127-901-106 *Кзтр и Кэм=1,12*	Разогревание битума в котле, вместимость 400 л	т битума	1,7786864	90 398	160 790
27	E1127-0602-0302 *Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2 покрытия	2 158,6	800	1726 880
28	E1127-0602-0402 *Кзтр и Кэм=1,12* *К=8*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0302 /до 8 см/	м^2 покрытия	2 158,6	124	267 666
29	C1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	443,37644	26 212	11621 783
30	C1271-704-0504	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	1 219,28521	2 661	3244 518
31	E1127-0602-0901 *Кзтр и Кэм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	0,86344	231 942	200 268
32	E1127-901-106 *Кзтр и Кэм=1,12*	Разогревание битума в котле, вместимость 400 л	т битума	0,8893432	90 398	80 395
33	E1127-0602-0302 *Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2 покрытия	2 158,6	800	1726 880
34	E1127-0602-0402 *Кзтр и Кэм=1,12* *К=6*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0302 /до 7 см/	м^2 покрытия	2 158,6	93	200 750
35	C1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	388,11628	26 212	10173 304
36	C1271-704-0504	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	1 067,31977	2 661	2840 138
	Раздел 5.	**Устройство швов, нанесение маркировочных знаков**				78918 685
37	E1127-601-602 *Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство шва деформационного при неармированных цементобетонных покрытиях: шов расширения	м шва	5 807	12 617	73266 919
38	C1251-201-0101	Профиль уплотнительный для бетонных дорог толщиной 6 мм продольный	м	5 807	972	5644 404
39	C1235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,5807	2 117	1 229
40	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,3169584	1 389	4 607
41	C3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км	т·км	16,584792	92	1 526
	Отдел 1.	**Исключаемое включаемое**				37739 785
	Раздел 6.	**Траверз МС 24-28 /включаемое/**				37739 785
						Фрезерование МС 24-25

1	2	3	4	5	6	7
42	E12-200101-0502 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	$м^2$	4 429,203	1 293	5726 959
43	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 213,7156594	92	203 662
			Асфальтобетонное покрытие			
44	E1127-0602-0901 *Кзтр и Кзм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	1,76624	231 942	409 665
45	E1127-901-106 *Кзтр и Кзм=1,12*	Разогревание битума в котле, вместимость 400 л	т битума	1,8192272	90 398	164 455
46	E1127-0602-0302 *Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более	$м^2$ покрытия	2 207,8	800	1766 240
47	E1127-0602-0402 *Кзтр и Кзм=1,12* *К=6*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0302 /до 7 см/	$м^2$ покрытия	2 207,8	93	205 325
48	С1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	396,96244	26 212	10405 179
49	С1271-704-0504	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	1 091,64671	2 661	2904 872
			Добавочная площадь			
50	E1127-0602-0901 *Кзтр и Кзм=1,12*	Розлив вяжущих материалов	т	1,7771224	231 942	412 189
51	E1127-901-106 *Кзтр и Кзм=1,12*	Разогревание битума в котле, вместимость 400 л	т битума	1,8304361	90 398	165 468
52	E1127-0602-0302 *Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более	$м^2$ покрытия	2 221,403	800	1777 122
53	E1127-0602-0402 *Кзтр и Кзм=1,12* *К=6*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0302 /до 7 см/	$м^2$ покрытия	2 221,403	93	206 590
54	С1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	399,4082594	26 212	10469 289
55	С1271-704-0504	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019	кг	1 098,3727134	2 661	2922 770

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО				***197 884 403***
		с плановыми накоплениями 5%				***207 778 623***
		С понижающим коэффициентом		К= 0,963214586		***200 135 400***
		НДС 12%				***24 016 248***
		ВСЕГО с НДС				***224 151 649***

АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Первый заместитель председателя правления _____ **Пыштанов Р.К.**

Главный инженер _____ Рустюмов А.Е.

Начальник АС _____ Куанышбеков С.М.

Инженер по ЭА и Т _____ Мукажанов А.З.

Инженер по ЭА и Т _____ Кусаинов А.Е.

Инженер геодезист АС _____ Рамазан К.Қ.

Инженер-сметчик РСС _____ Тұрсұнқан Б.

ТОО "АЖЭГ-Астана"

Директор _____ **Гюлбудагян Э.Ж.**

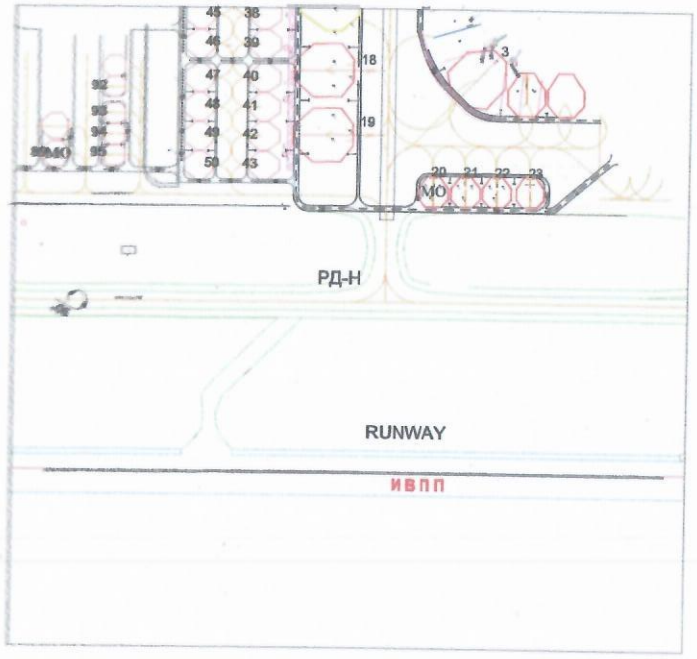

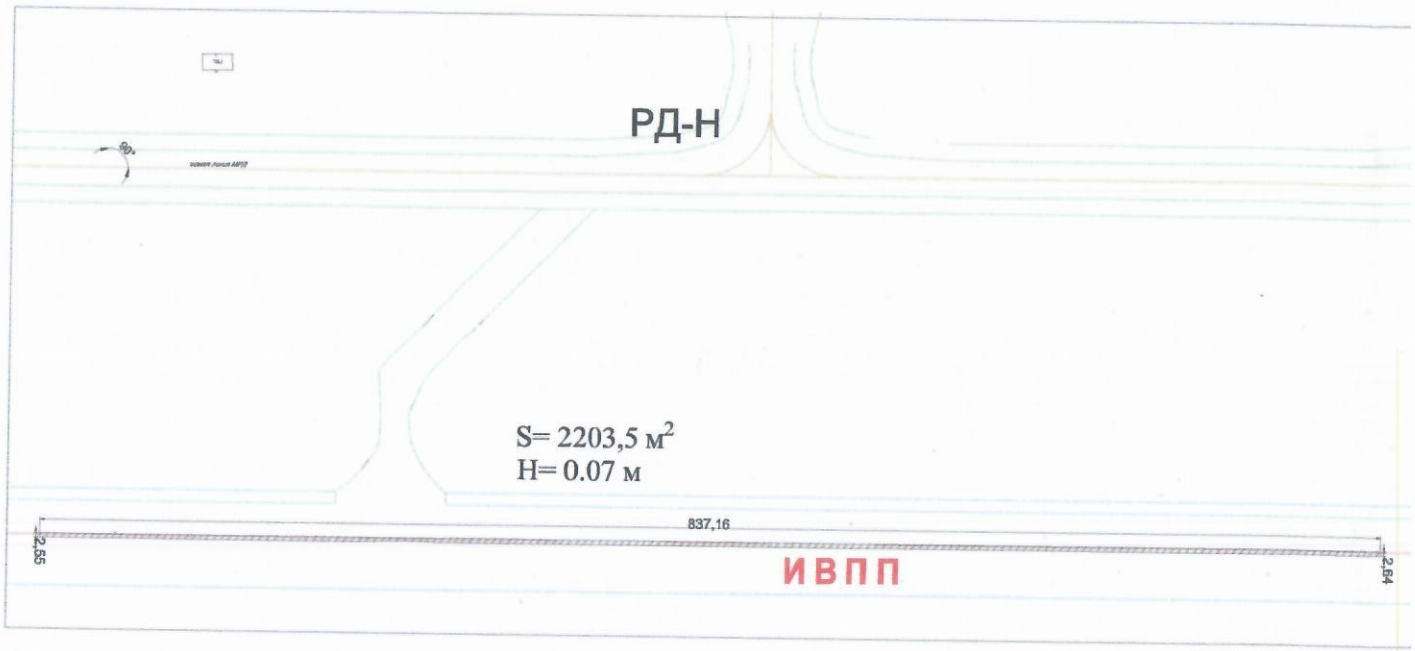

Объмы работ:

1. **Фрезерование S = 2203,5 м^2. H = 0.07м.**

Примечпние:

1. **Все размеры даны в метрах.**

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.			
Выполнил Нач.участка ТОО АЖЭГ Астана						ИВПП осевая	Стадия	Лист	Листо
							ИС	1	
Проверил Инженер по эксплуатации аэродрома и технике АО "Международный аэропорт Астана"						Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной H=0.07м.	ТОО "АЖЭГ - Астана"		

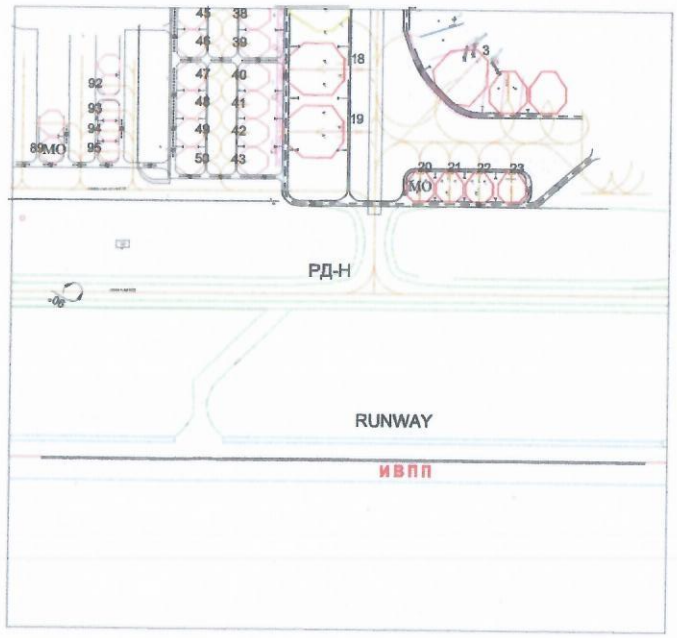

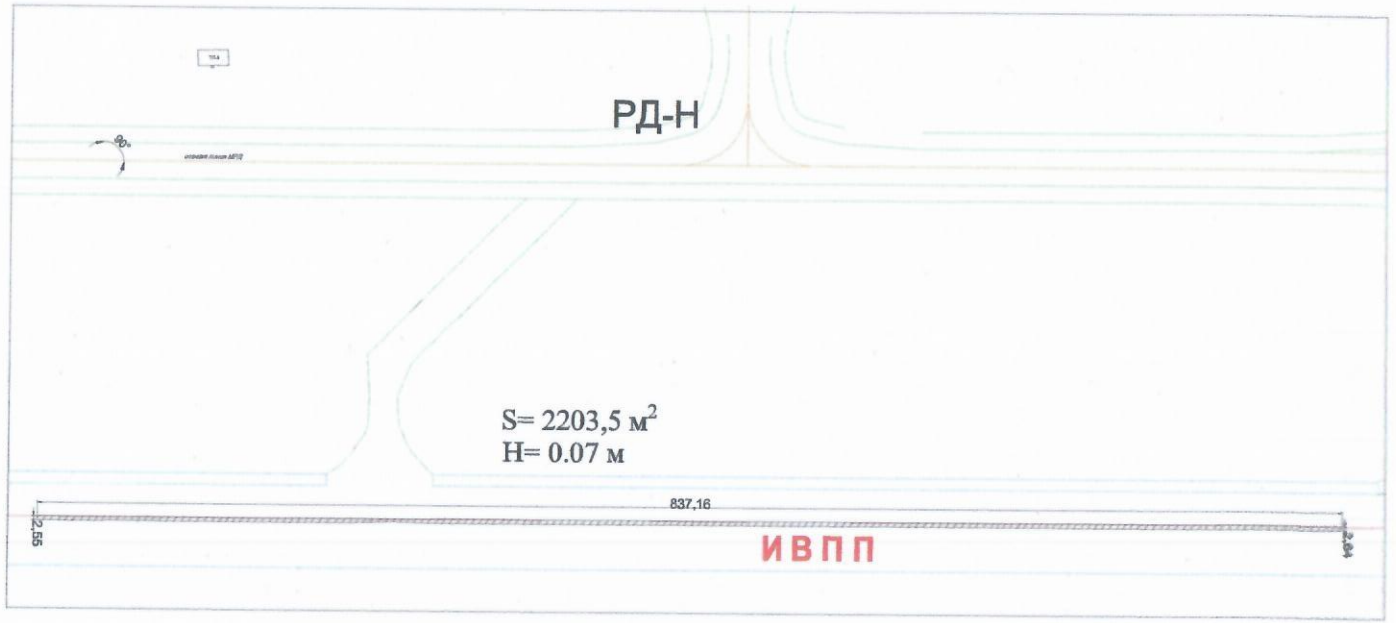

Объмы работ:

1. Укладка м/з а/б S = 2203,5 м^2. H = 0.07м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.			
Выполнил						ИВПП осевая	Стадия	Лист	Листов
Начучастка ТОО АЖЭГ Астана							ИС	3	
Проверил						Укладка м/з асфальтобетонного покрытия толщиной H=0.07м.	ТОО "АЖЭГ - Астана"		
Инженер по эксплуатации аэродрома и технике АО "Международный аэропорт Астана"									

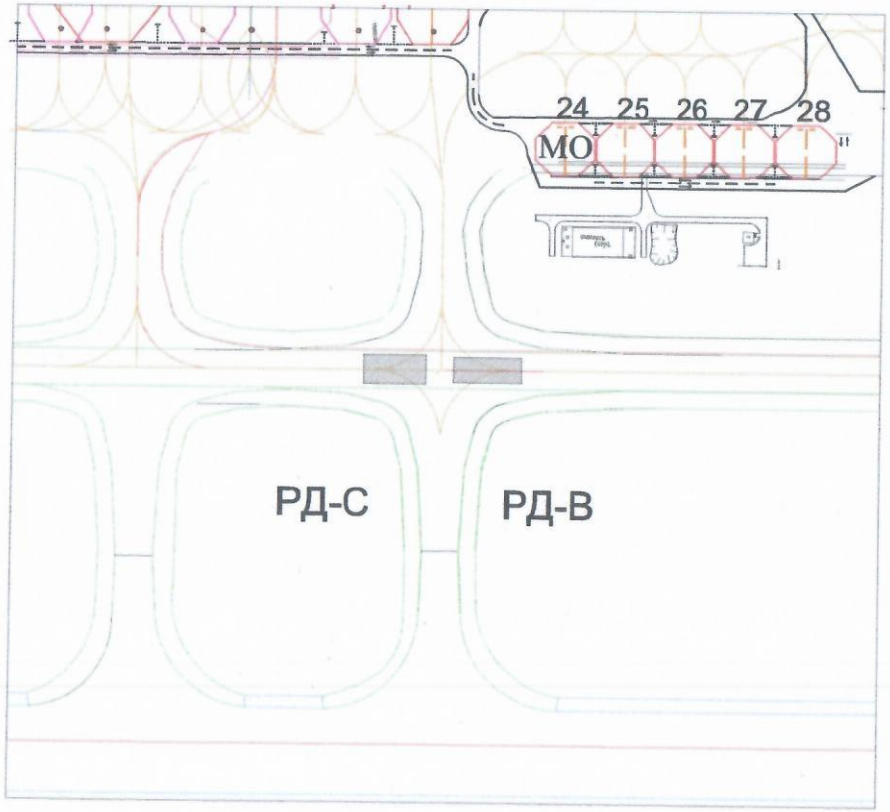

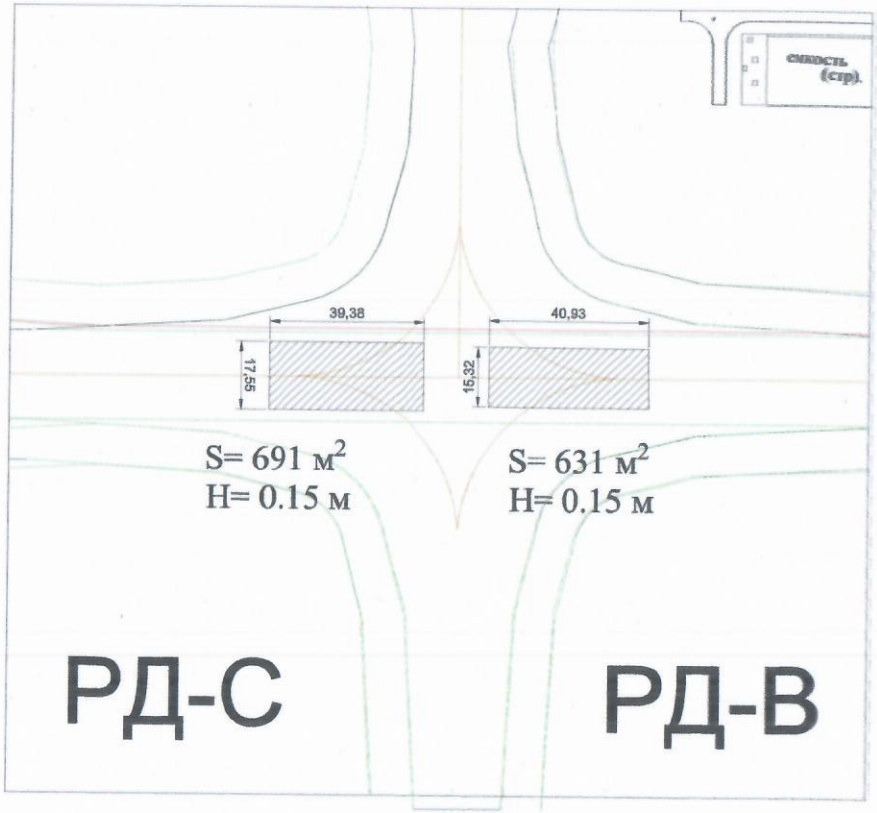

Объмы работ:

1. Фрезерование S = 1322 м^2. H = 0.15м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Начучастка ТОО АЖЭГ Астана					
Проверил					
Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"					

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

	Стадия	Лист	Листов
МРД чарли право	ИС	1	
Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной H=0.15м.	ТОО "АЖЭГ – Астана"		

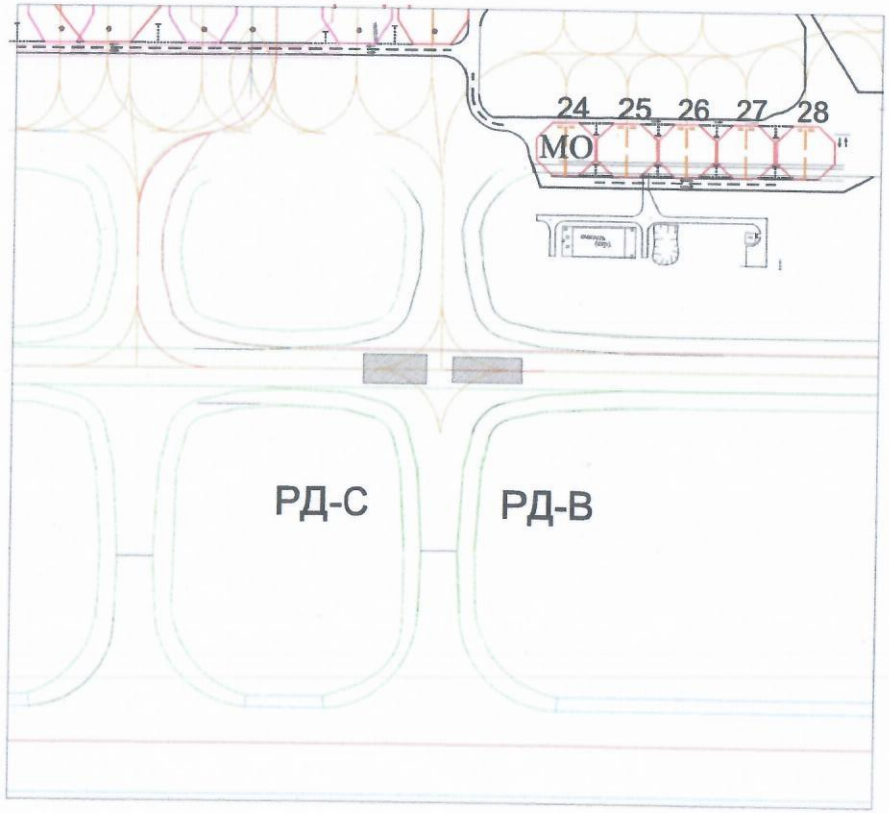

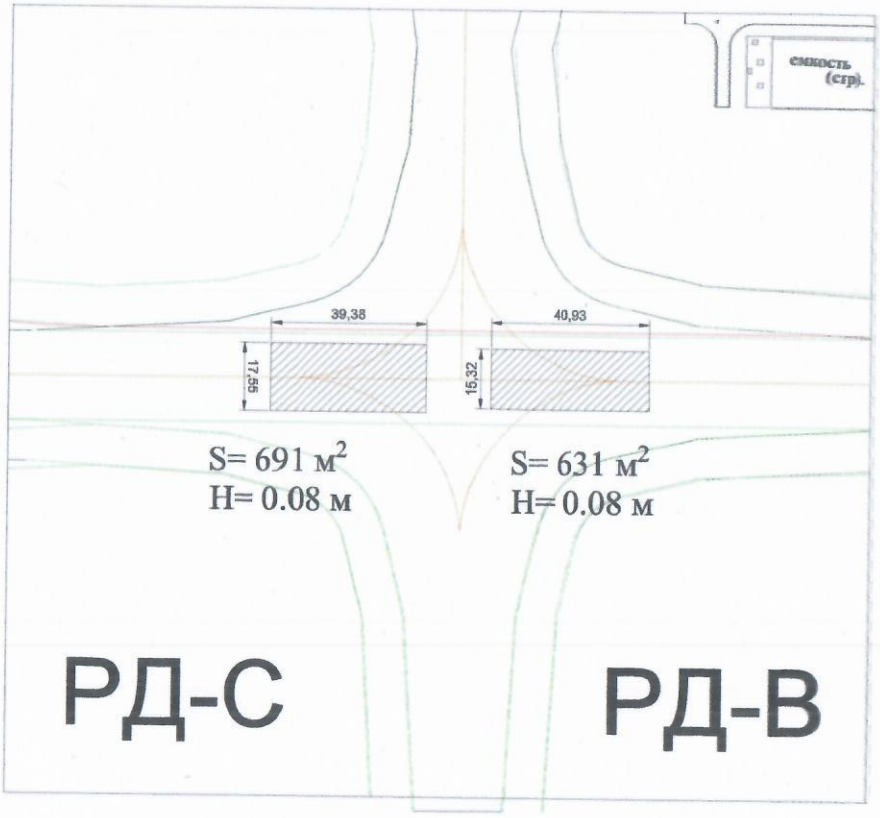

Объмы работ:

1. Укладка м/з а/б S = 1322 м^2. H = 0.08м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил	Нач.участка ТОО АЖЗГ Астана				
Проверил	Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"				

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

	Стадия	Лист	Листов
МРД чарли право	ИС	2	
Укладка м/з асфальтобетонного покрытия толщиной H=0.08м.	ТОО "АЖЗГ - Астана"		

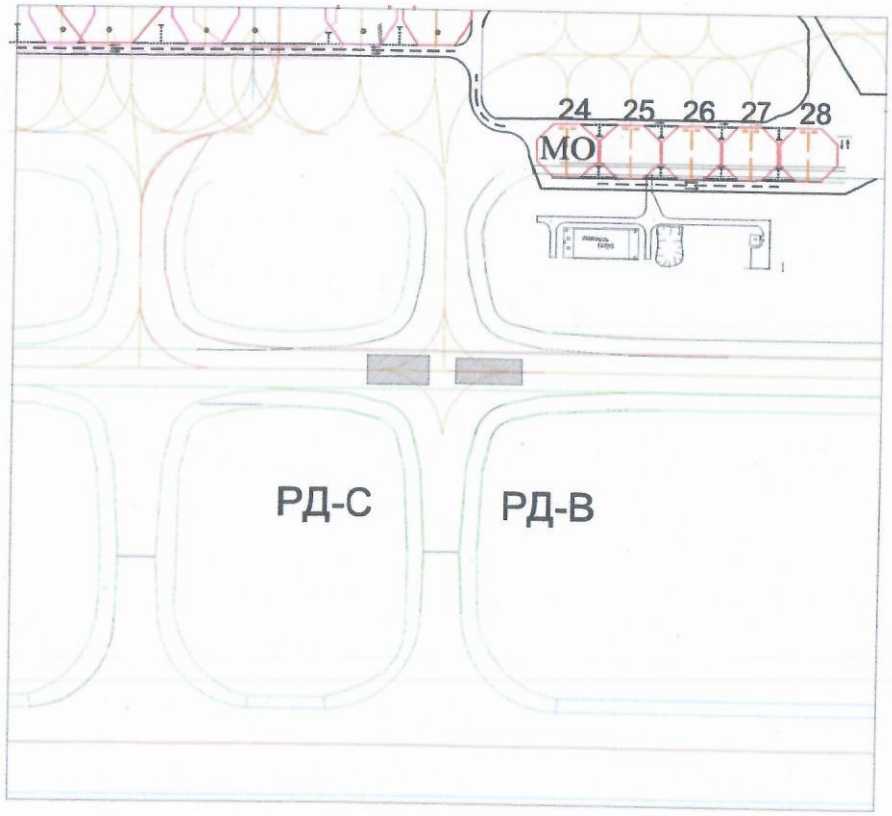

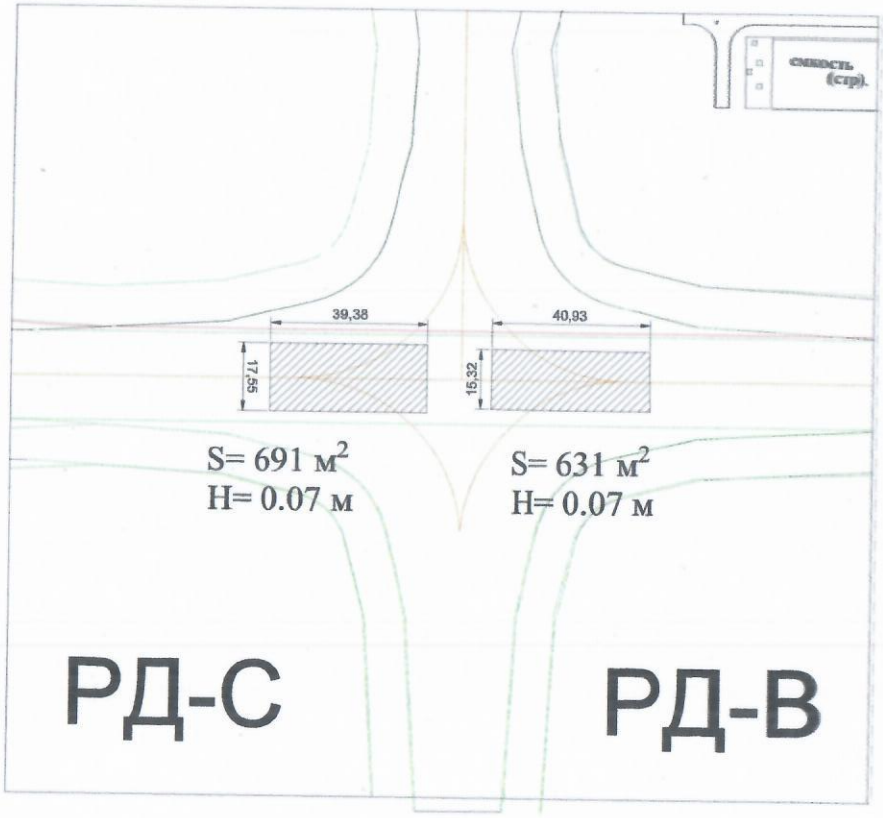

Объмы работ:

1. Укладка м/з а/б S = 1322 м^2. H = 0.07м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Нач.участка ТОО АЖЗГ Астана					
Проверил					
Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"					

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

	Стадия	Лист	Листов
МРД чарли право	ИС	3	
Укладка м/з асфальтобетонного покрытия толщиной H=0.07м.	ТОО "АЖЗГ - Астана"		

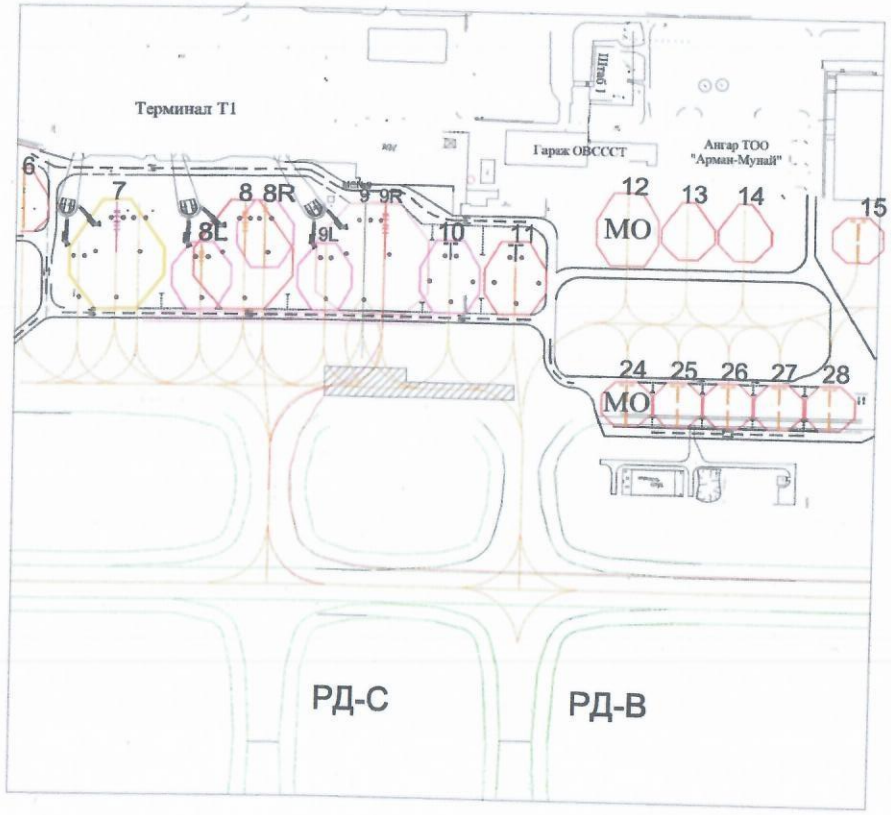

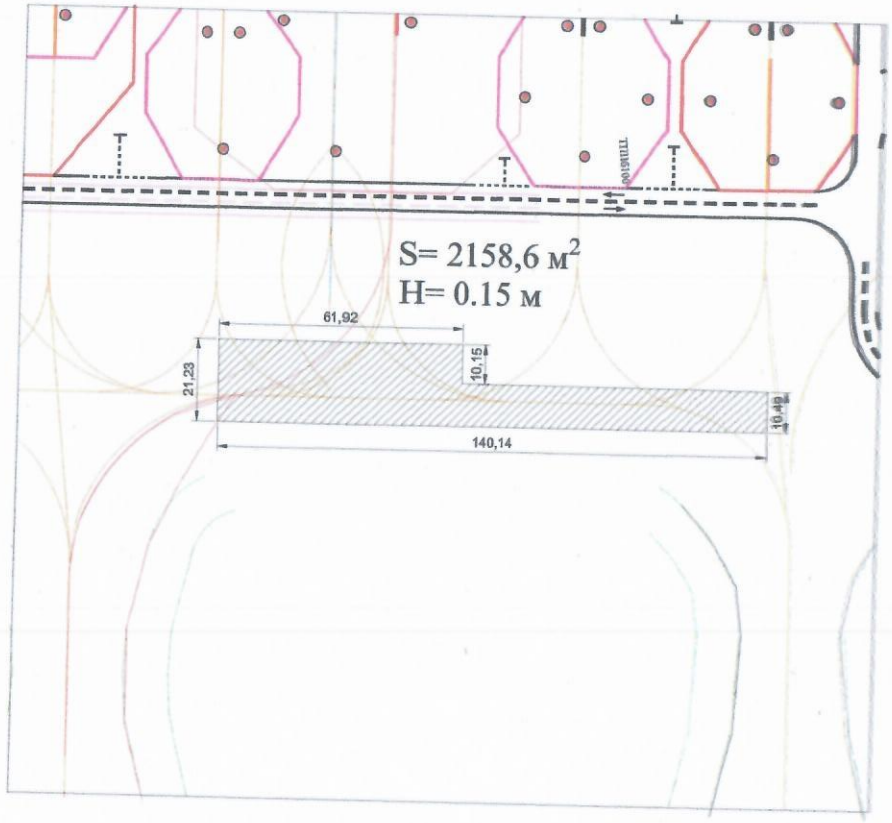

Объмы работ:

1. Фрезерование S = 2158,6 м^2. H = 0.15м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Нач.участка ТОО АЖЭГ Астана					
Проверил					
Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"					

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

Трайверз МС-9 РД-BRAVO	Стадия	Лист	Листов
	ИС	1	
Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной H=0.15м.	ТОО "АЖЭГ - Астана"		

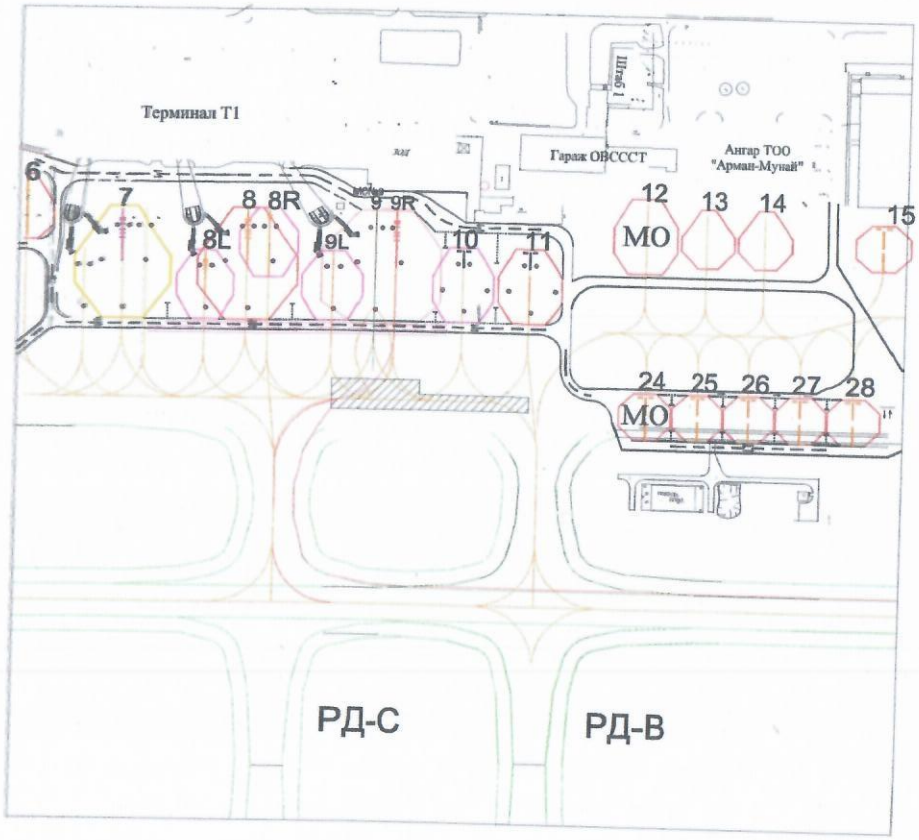

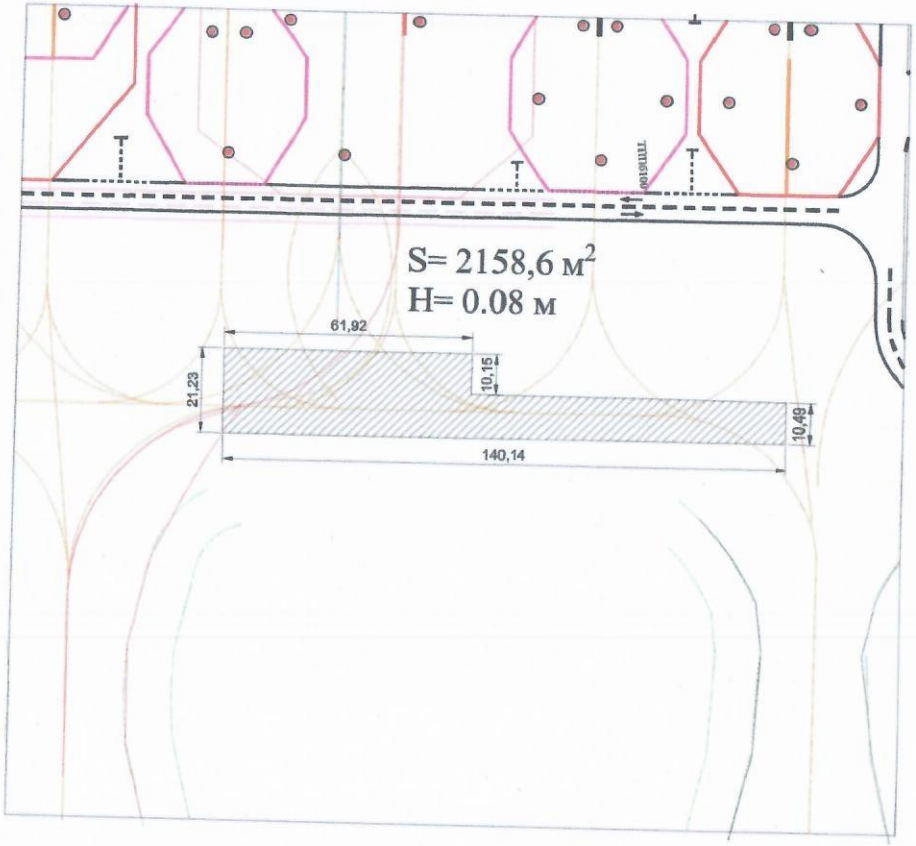

Объмы работ:

1. Укладка м/з а/б S = 2158,6 м². H = 0.08м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Нач.участка ТОО АЖЭГ Астана					
Проверил					
Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"					

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

	Стадия	Лист	Листов
Трайверз МС-9 РД-BRAVO	ИС	2	
Укладка м/з асфальтобетонного покрытия толщиной H=0.08м.	ТОО "АЖЭГ – Астана"		

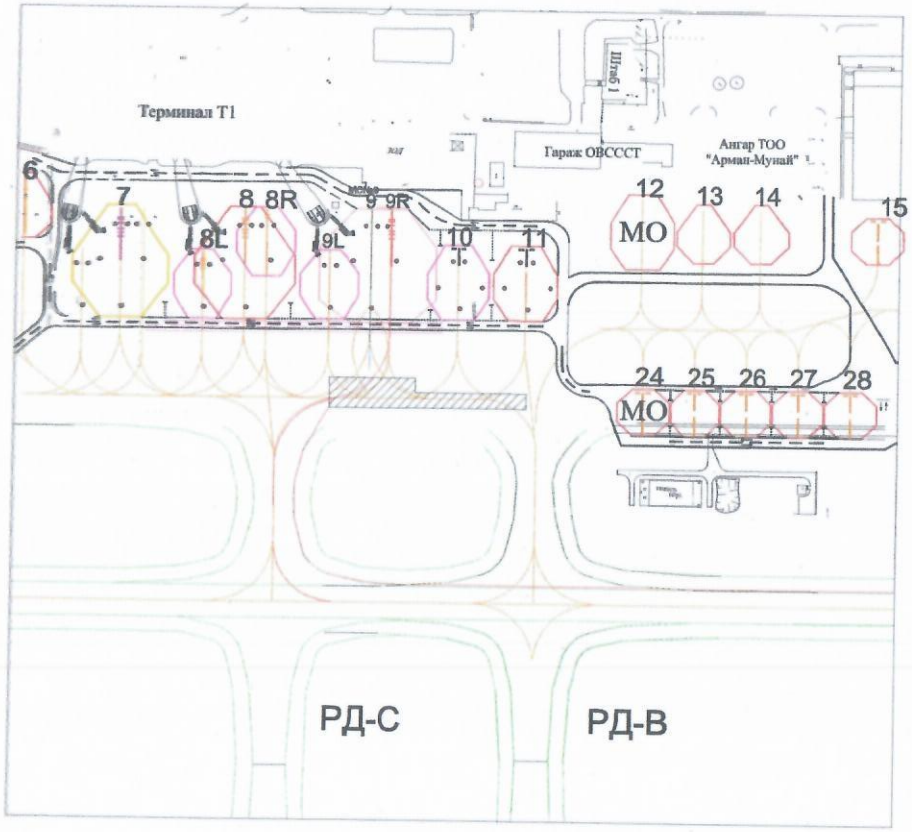

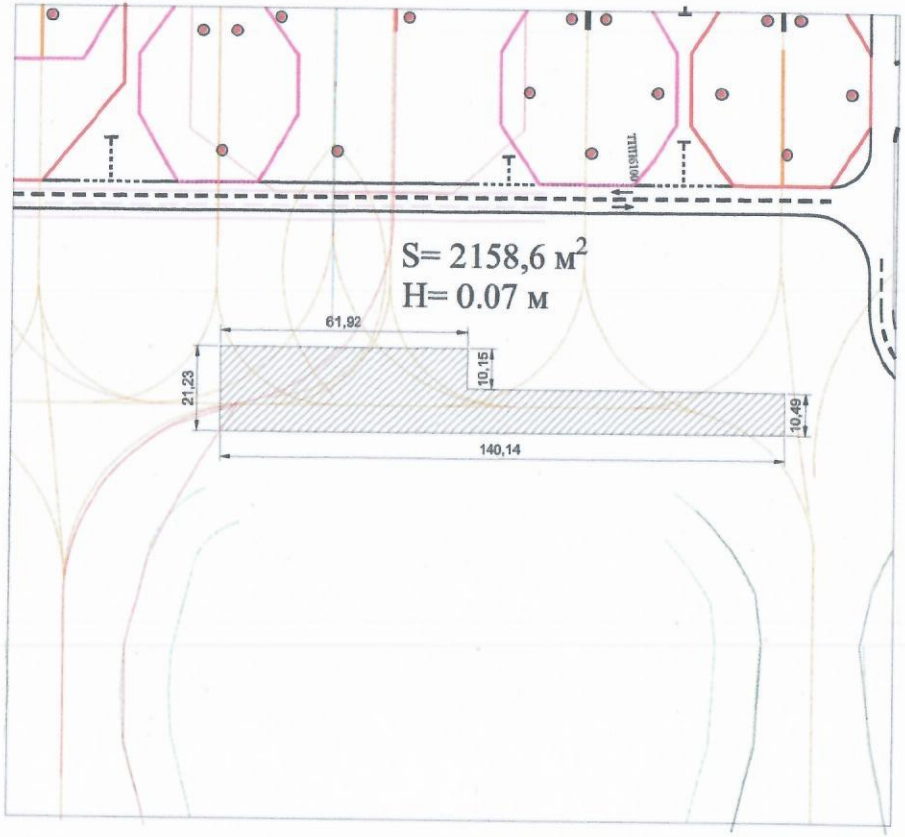

Объмы работ:

1. **Укладка м/з а/б S = 2158,6 м^2. H = 0.07м.**

Примечпние:

1. **Все размеры даны в метрах.**

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Начучасткa ТОО АЖЭГ Астана					
Проверил					
Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"					

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

Трайверз МС-9 РД-BRAVO	Стадия	Лист	Листов
	ИС	3	
Укладка м/з асфальтобетонного покрытия толщиной H=0.07м.	ТОО "АЖЭГ - Астана"		

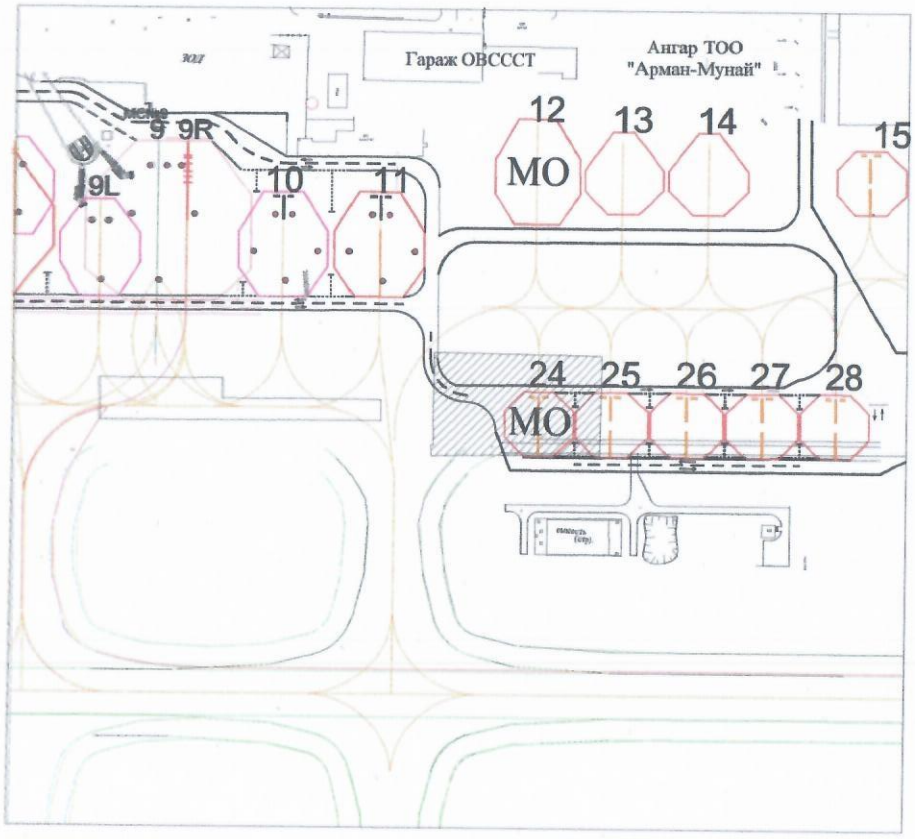

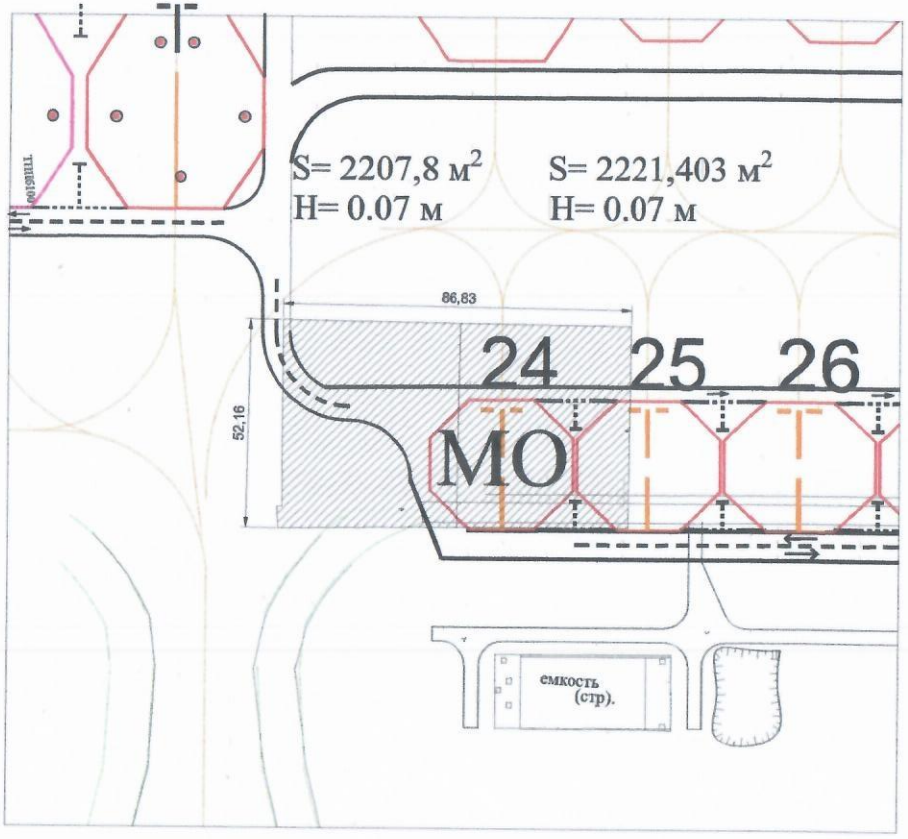

Объмы работ:

1. **Фрезерование S = 4429,203 м^2. H = 0.07м.**

Примечпние:

1. **Все размеры даны в метрах.**

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Нач.участка ТОО АЖЭГ Астана					
Проверил					
Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"					

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

	Стадия	Лист	Листо
МС 24-25	ИС	1	
Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной H=0.07м.	ТОО "АЖЭГ - Астана"		

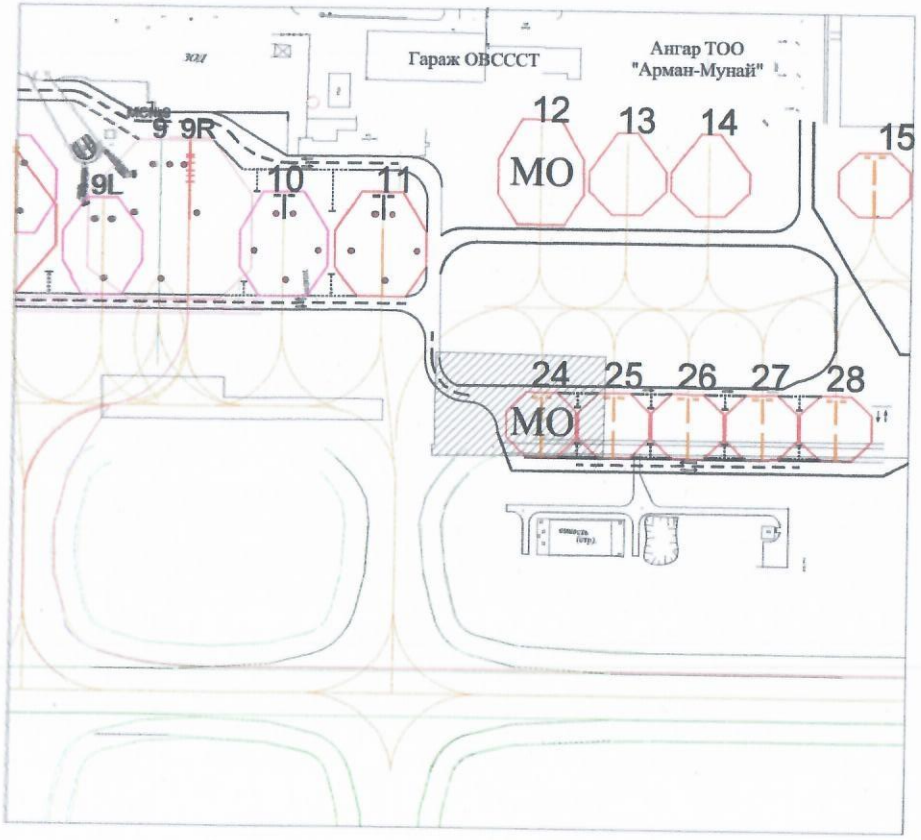

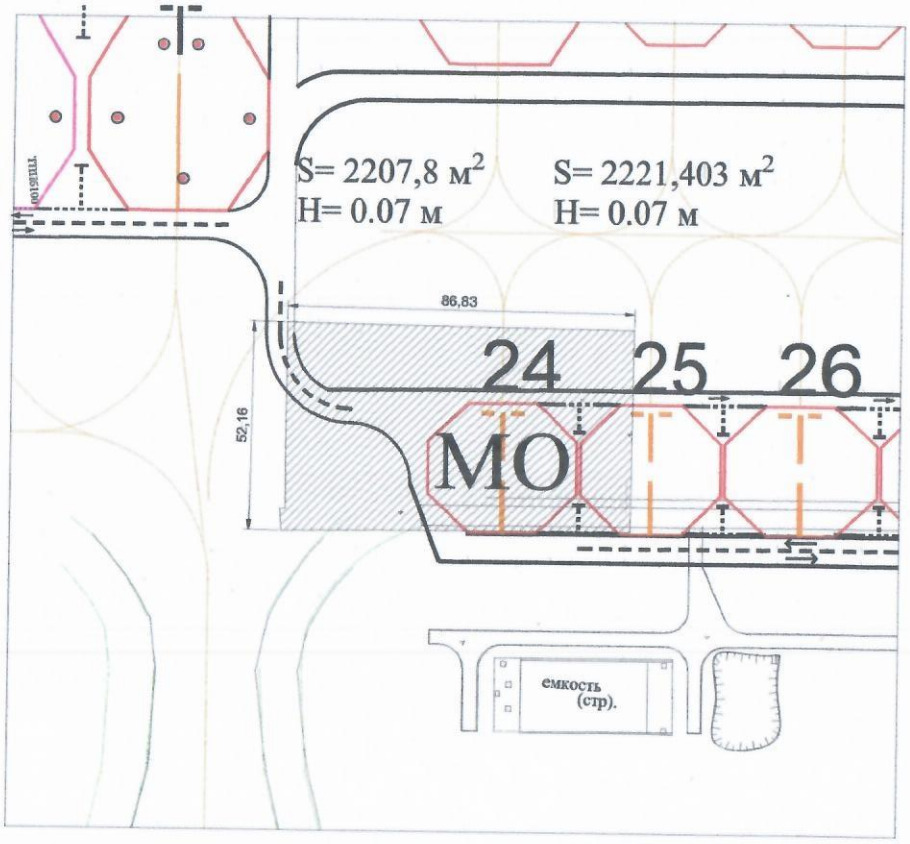

Объмы работ:

1. Укладка м/з а/б S = 4429,203 м^2. H = 0.07м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Нач.участка ТОО АЖЭГ Астана					
Проверил					
Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"					

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

	Стадия	Лист	Листов
МС 24-25	ИС	3	
Укладка м/з асфальтобетонного покрытия толщиной H=0.07м.	ТОО "АЖЭГ – Астана"		

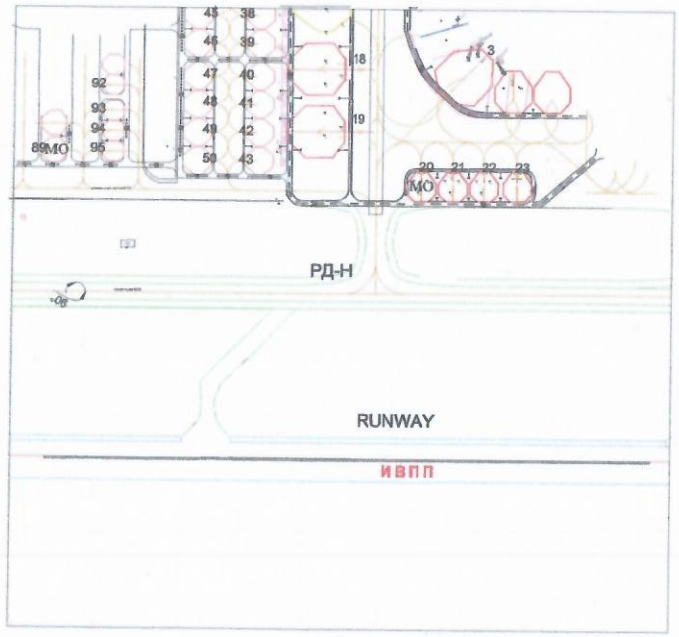

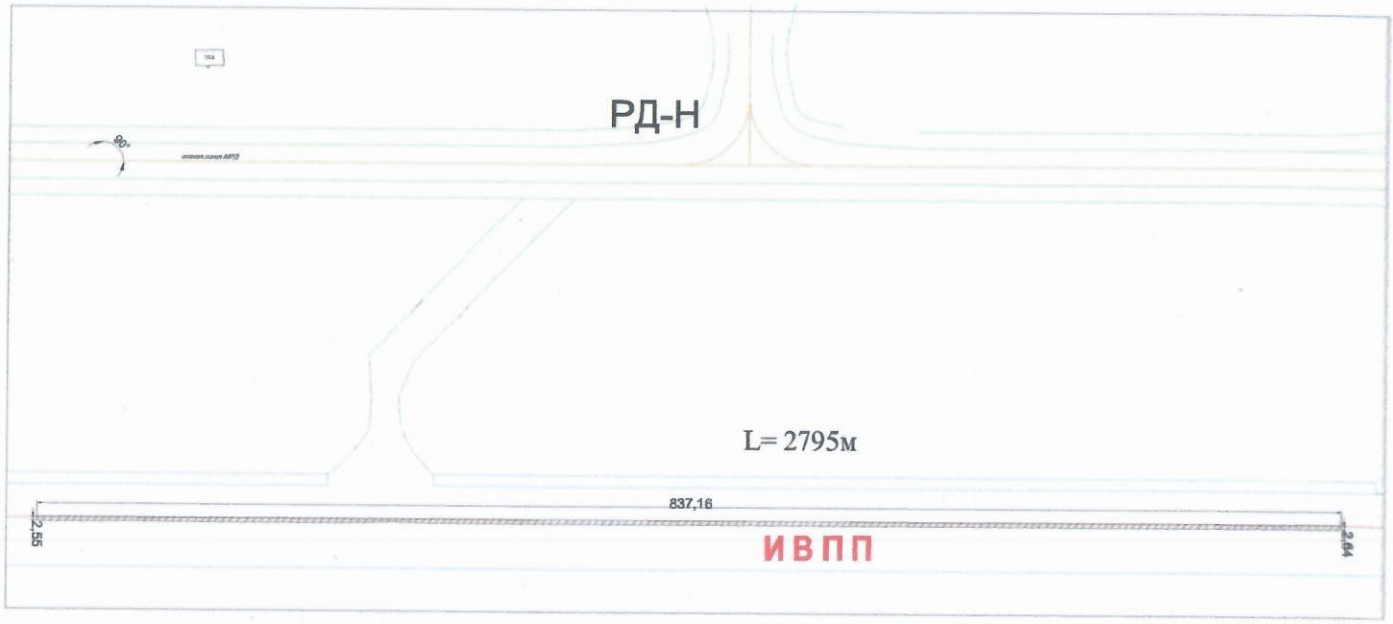

Объмы работ:

1. Заливка швов L = 2795 м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.			
Выполнил						ИВПП осевая	Стадия	Лист	Листов
Начучастка ТОО АХЭГ Астана							ИС	3	
Проверил						Заливка швов	ТОО "АХЭГ – Астана"		
Инженер по эксплуатации аэродрома и технике АО "Международный аэропорт Астана"									

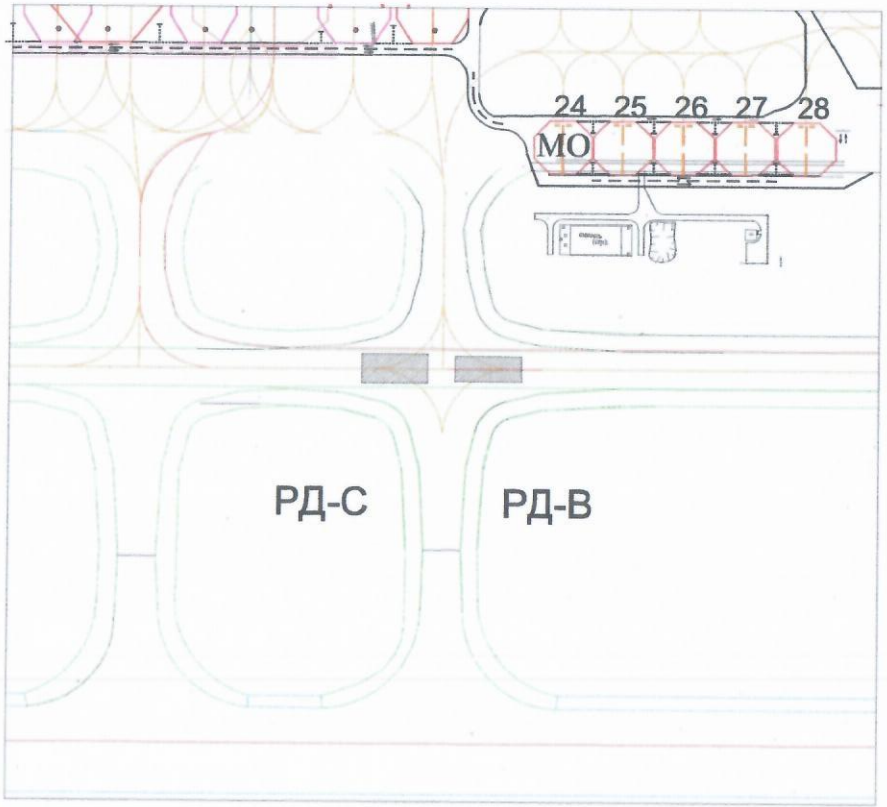

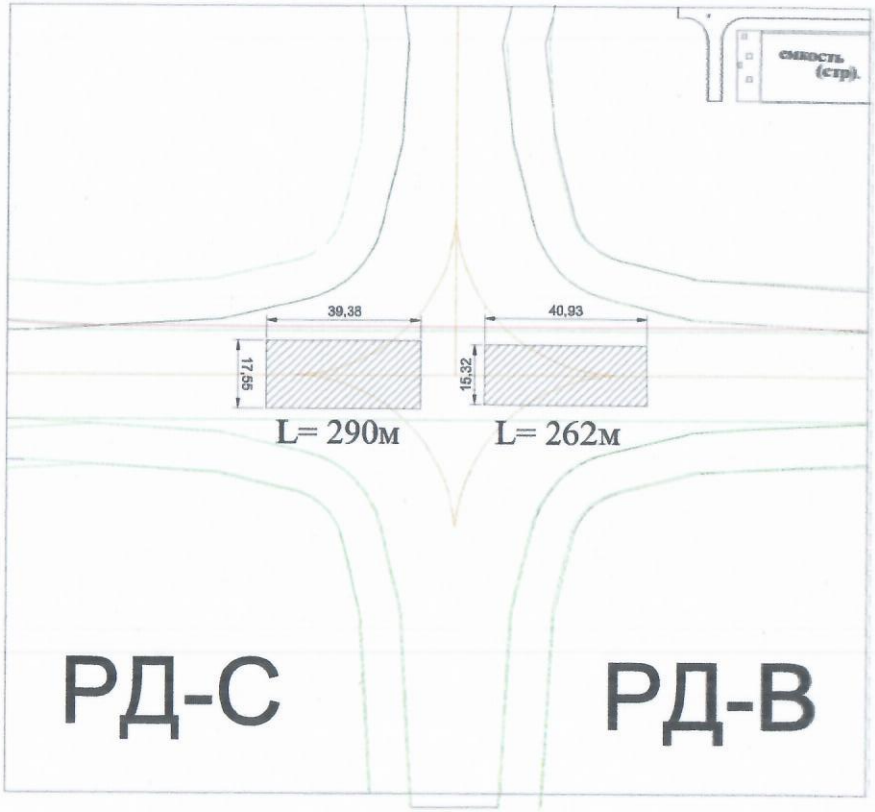

Объмы работ:

1. Заливка швов L = 552 м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Нач.участка ТОО АЖЭГ Астана					
Проверил					
Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"					

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

	Стадия	Лист	Листов
МРД чарли право	ИС	4	
Заливка швов	ТОО "АЖЭГ – Астана"		

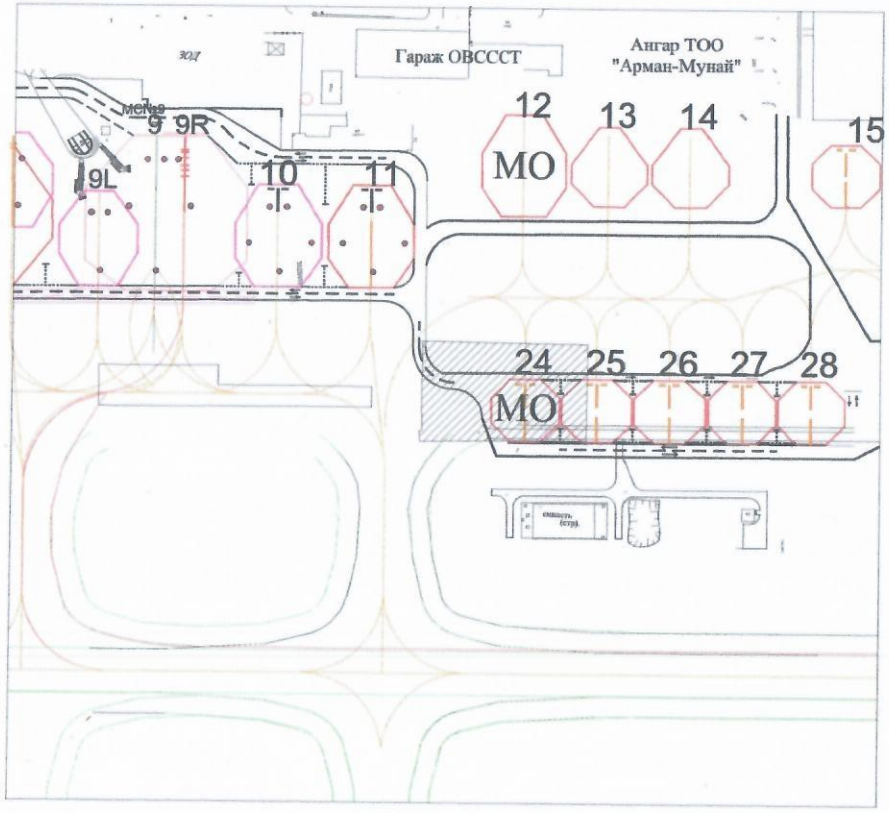

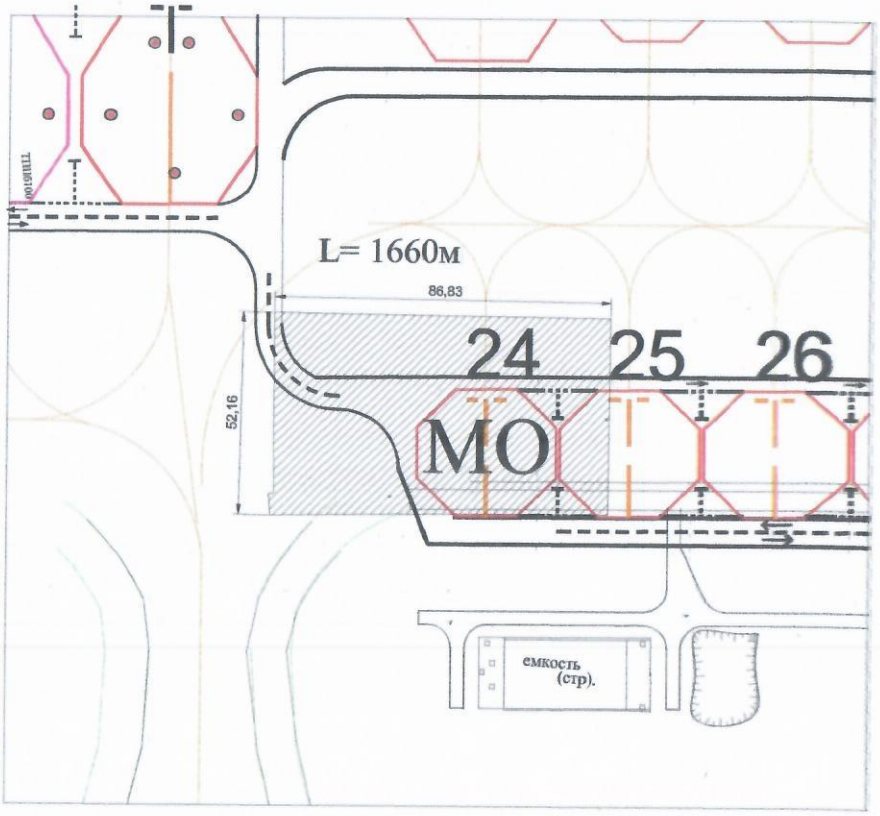

Объмы работ:

1. Заливка швов L = 1660 м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Нач.участка ТОО АЖЭГ Астана					
Проверил					
Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"					

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

	Стадия	Лист	Листов
МС 24-25	ИС	4	
Заливка швов	ТОО "АЖЭГ – Астана"		

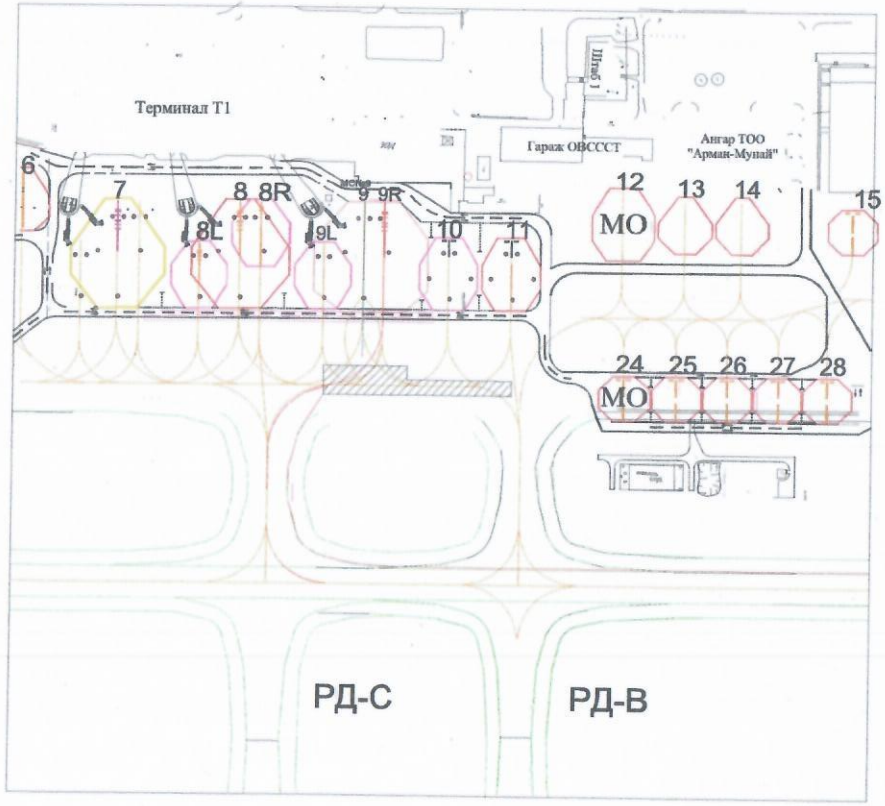

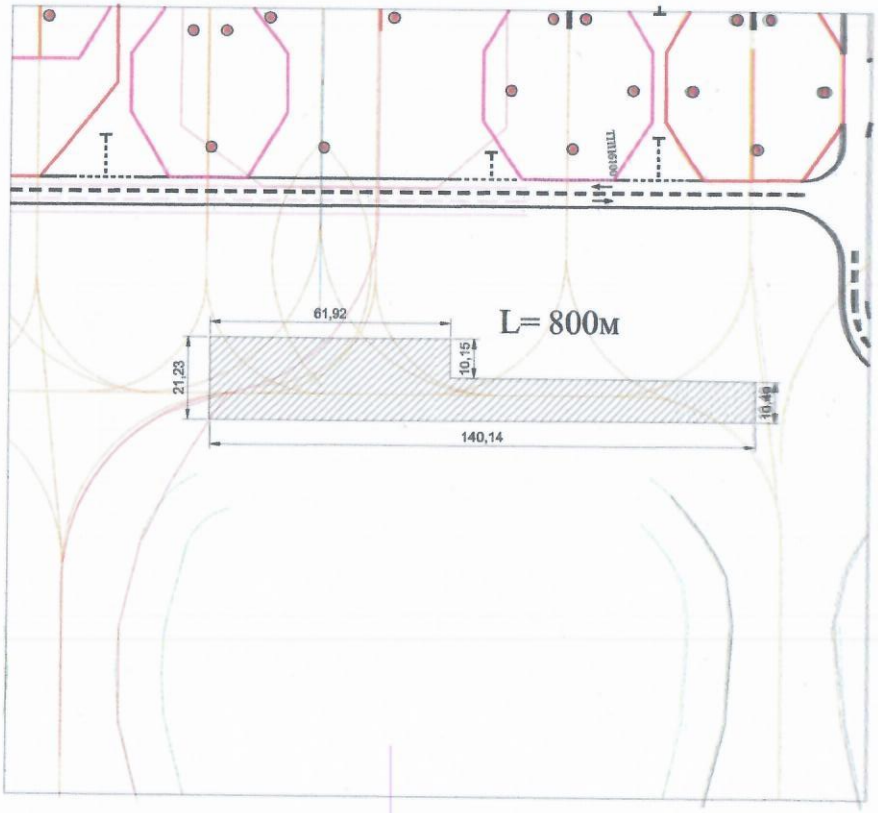

Объмы работ:

1. Заливка швов L = 800 м.

Примечпние:

1. Все размеры даны в метрах.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил					
Нач.участка ТОО АЖЭГ Астана					
Проверил					
Ведущий инженер АО "Международный аэропорт Астана"					

Ремонт аэродромных покрытий международного аэропорта г.Астана.

	Стадия	Лист	Листов
Трайверз МС-9 РД-BRAVO	ИС	4	
Заливка швов	ТОО "АЖЭГ – Астана"		

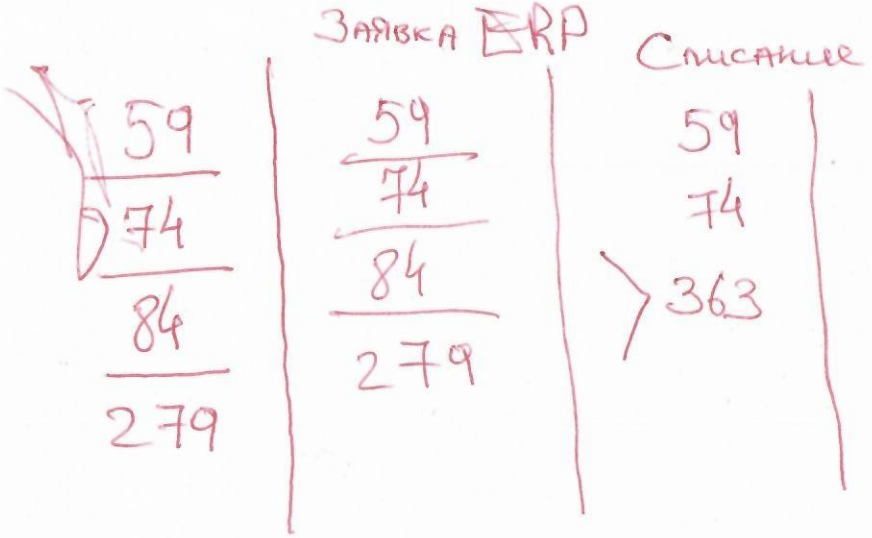
Заявка ERP
Списание
59
74
84
279
59
74
84
279
59
74
363
