Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060540003598 - ТОО Бабэк-Курылыс**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Саяжай-1" города Актобе Актюбинской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **165 от 17.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Август 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				
			Раздел: Кровля				
			Подраздел: Р Основное здание школы				
1	1	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /в 2 слоя/	м2	-1008.44	2 672	-2 694 552
2	2	234-101-0204РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	-83.09	31 847	-2 646 167
3	3	234-101-0202РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	-51.932	19 185	-996 315
4	6	6106-0401-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	-1048.32	2 176	-2 281 144
5	7	224-102-1005РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	-1205.568	3 516	-4 238 777
6	8	6111-0403-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых /2 слоя/	м2	-1048	348	-364 704
7	9	232-104-0103РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	м2	-2158.88	2 561	-5 528 892
8	10	6111-0402-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	-230.6304	34 801	-8 026 168
9	12	6110-0302-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	-2096.64	1 664	-3 488 809
10	13	6110-0302-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	-2096.64	1 096	-2 297 918
11	14	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	-4.192	62 969	-263 966
12	15	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	-4.192	432 100	-1 811 363
			Итого по подразделу: Р Основное здание школы				**-34 638 776**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Кровля				**-34 638 776**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				**-34 638 776**
			ИТОГО по акту:				**-34 638 776**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)			-34638775.611 x 6.90%	-2 390 076
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			-34638775.611 + -2390075.550	-37 028 851
			Сметная прибыль, (5.00%)			-37028851.161 x 5.00%	-1 851 443
			Непредвиденные расходы, (2.000%)			-37028851.161 x 2.000%	-740 577
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				-39 620 871
			в том числе на III квартал 2024 г., к = 1.0557			-39620870.742 x 1.0557	-41 827 753
			НДС (12%)			-41827753.242 x 12%	-5 019 330
			Итого с НДС			-41827753.242 + -5019330.389	-46 847 084

Лист согласования
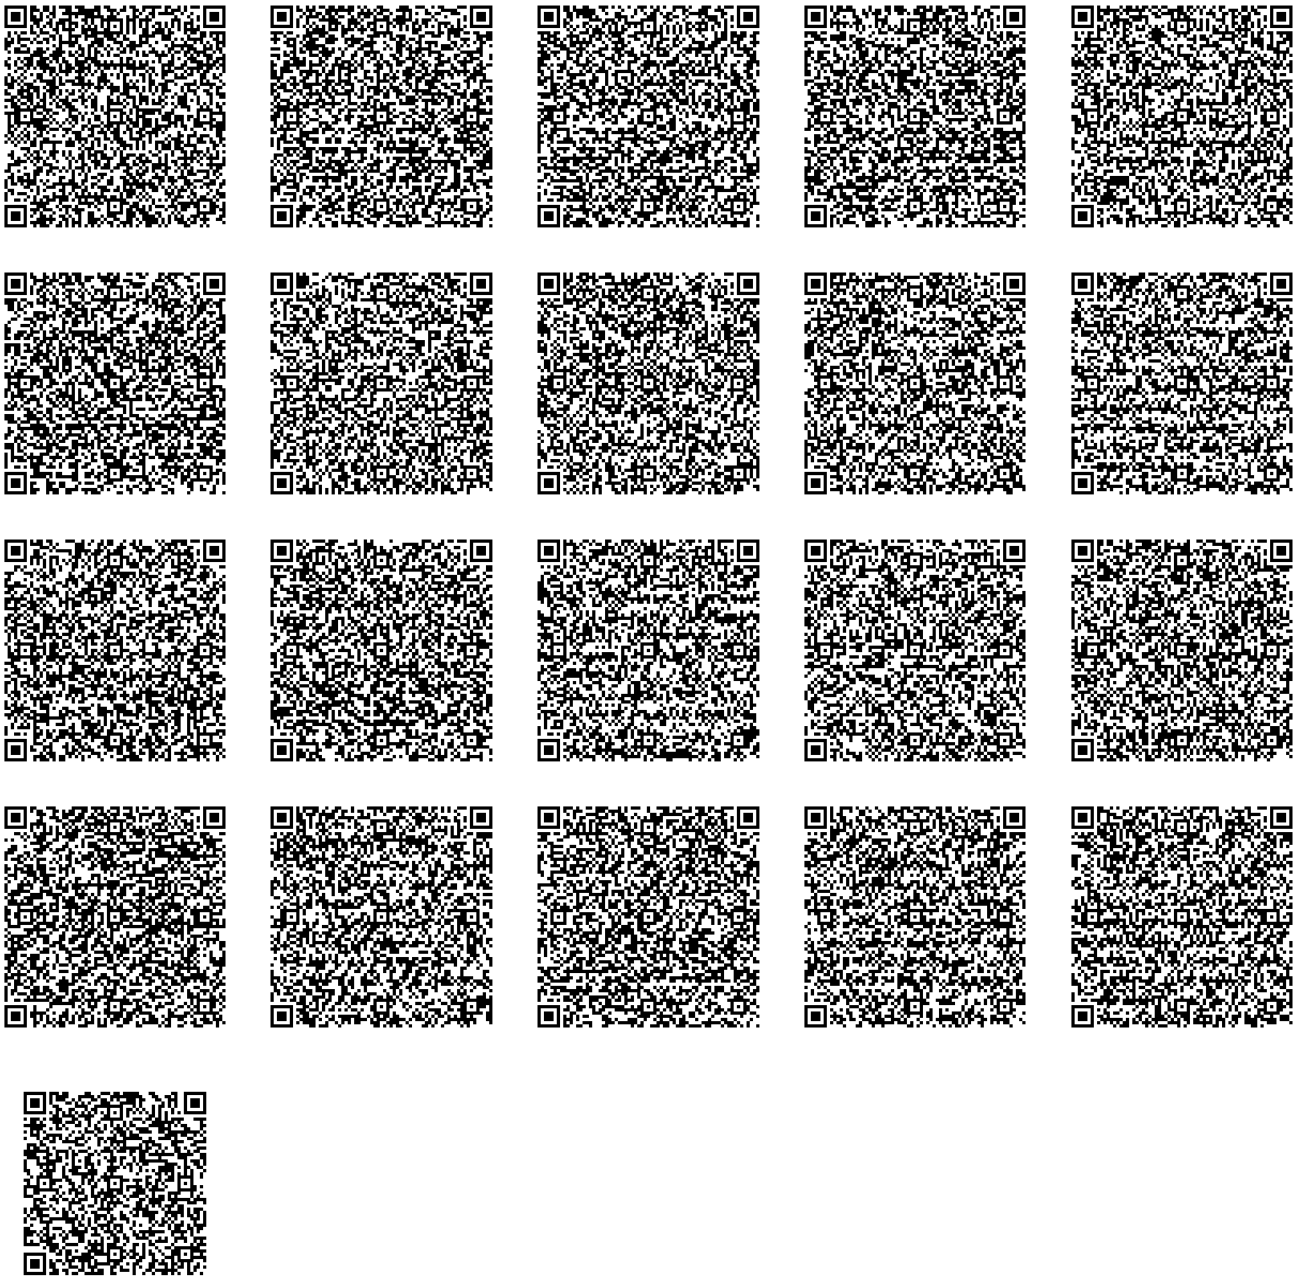
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650601300100 - АЗИЗОВ РАХИБ ХАЗАЙЫР ОГЛЫ	Директор	01.08.2025 12:31
Представители технического надзора		
590105303772 - БАЙМАГАМБЕТОВ БИСЕНБАЙ ТАНИРБЕРГЕНОВИЧ	Технический надзор	01.08.2025 14:12
Представители авторского надзора		
570914301817 - ТАСИМЕНОВ БИСЕМБАЙ АБИЛХАИРОВИЧ	Авторский надзор	01.08.2025 15:43
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	04.08.2025 12:29
970606300144 - АЛДАБЕРГЕНОВ АСЛАН ЕСЕНГАЛИУЛЫ	И.о. директора регионального подразделения	04.08.2025 18:28
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	04.08.2025 18:07 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	04.08.2025 18:28
