Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **080240012391 - ТОО Сервис Строй Инновац**

Стройка: **Строительство велосипедной и пешеходной дорожки вдоль побережья озера Большое Чебачье от курортной зоны «AQBURA» до озера Бурабай**

Договор подряда (контракт) №: **- от - года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета: Земляные работы					
1	4	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из отвала для устройства газонов, укрепел.обочин	м3 грунта	1535	263	490 486	Казахстан
2	5	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9210	47	467 499	
3	6	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	10218.79	49	802 214	
4	7	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/непригодный грунт	м3 грунта	327.6	263	104 679	
5	8	412-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км/34км	т·км	20054.2	24	519 805	
6	9	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/корытом	м3 грунта	831	263	265 533	
7	10	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/корытом	м3 грунта	82	280	27 848	
8	11	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/корытом	м3 грунта	85.5	367	38 143	
9	12	1101-0102-0382 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/корытом	м3 грунта	238.5	455	131 803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	13	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	11804.6	47	599 201	
11	14	1101-0102-0382 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/корытом	м3 грунта	891	455	492 397	
12	15	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3527.28	87	331 423	
13	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/тех часть сб.27, п.1,6	м3 материала основания в плотном теле	55	7 074	448 792	
14	17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	891	72	90 373	
15	18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	891	35	41 444	
16	19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой/тех часть сб.27, п.1,6, 10% от объема грунта	м3 уплотненного грунта	891	114	133 012	
17	20	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из отвала присып.обочины	м3 грунта	1237	263	395 264	
18	21	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	11565.95	47	587 087	
19	22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1237	72	125 467	
			Итого по локальной смете: Земляные работы				**6 092 473**	
			Локальная смета: Дорожная одежда					
20	11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/тех часть сб.27, п.1,6	м2 основания	11200	1 297	17 301 131	
21	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2.1	188 898	431 044	
22	14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3500	1 511	6 580 153	
23	15	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	3500	931	4 075 755	
			Итого по локальной смете: Дорожная одежда				**28 388 083**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту:				**34 480 556**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			34480555.555 + 0.000	34 480 556	
			Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)			34480555.555 x 2.000%	689 611	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				35 170 167	
			Временные здания и сооружения, к = 1.0200			35170166.667 x 1.0200	35 873 570	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время , к = 1.0277			35873570.000 x 1.0277	36 867 985	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514, к = 1.0501			36867985.360 x 1.0501	38 713 280	
			Итого с понижающим коэф.к=0,98, к = 0.9800			38713279.643 x 0.9800	37 939 014	
			НДС (12%)			37939014.050 x 12%	4 552 682	
			Итого с НДС			37939014.050 + 4552681.686	42 491 696	

Лист согласования
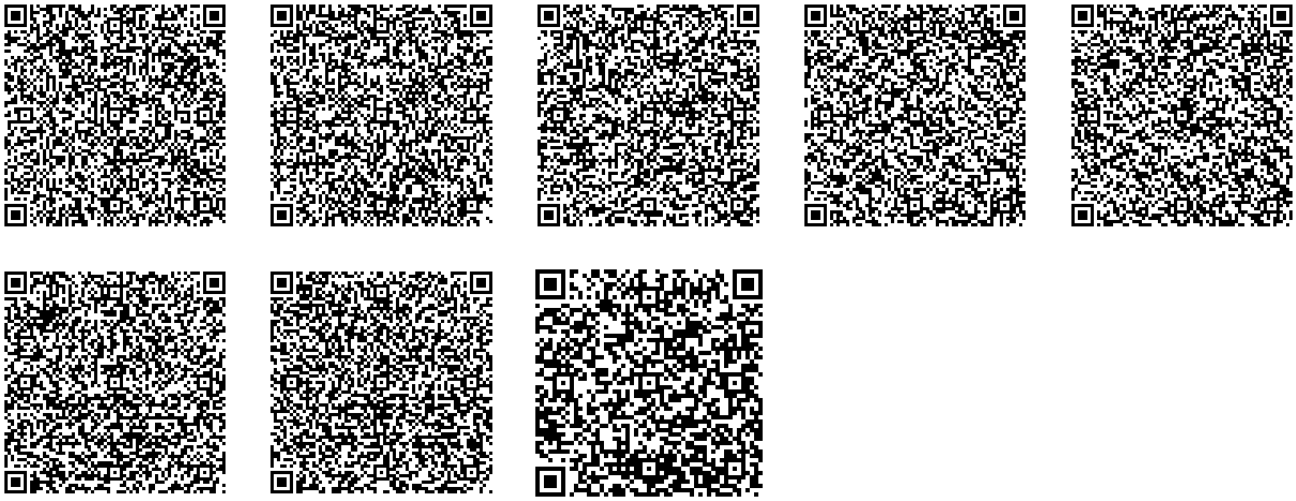
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
821228301120 - ТАСЫБЕКОВ БАУЫРЖАН КУШЕРБАЕВИЧ	Генеральный подрядчик	28.06.2025 16:25
Представители технического надзора		
970903300595 - АҚЖІГІТ ИСМАЙЫЛ ЖАҚСЫКЕЛДІҰЛЫ	эксперт	28.06.2025 16:34
Представители авторского надзора		
570630300072 - ЛОМАКО АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	начальник отдела авторского надзора	28.06.2025 16:28
Представители заказчика		
771101300182 - НУРМАГАНБЕТОВ ДАУРЕН ДЕМЕСИНОВИЧ	Заведующий сектором	28.06.2025 17:38
