Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 17 » 09 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с органиченной ответственностью «Горэлектросеть», Павлодарская обл., город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, 12
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Председателя Правления Олжабаевой Майгуль Аскаровны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство линий освещения в микрорайонах города Экибастуз» , Павлодарская область, город Экибастуз**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого, является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз», руководитель Шарипов Ринат Жасуланович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Region Build»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз», приказ №149/1 от 26.11.2024года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди
Напряжение сети	кВ	0,4		0,4	
Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт	663		703	
Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 6-4 70/136-А, толщиной 4, высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт	362		334	
Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	шт	1025		1037	
Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт,IP67	шт	1249		1212	
Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт	1249		1212	
Провод самонесущий изолированный, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	29687,1		28257,06	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство линий освещения выполнено самонесущим изолированным проводом СИП-4 на стальных опорах с установкой консольных светильников марки ДКУ LED 0,4 120W со светодиодными светильниками.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2025 года ;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2025 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 3 ;
фактически, месяцев: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически примерно 80% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному обеспечению:

ТОО «Горэлектросеть» Олжабаева М.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованным испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – не требуется;

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ - _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство линий освещения в микрорайонах города Экибастуз»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Олжабаева Майгуль Аскаровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П. (при наличии)
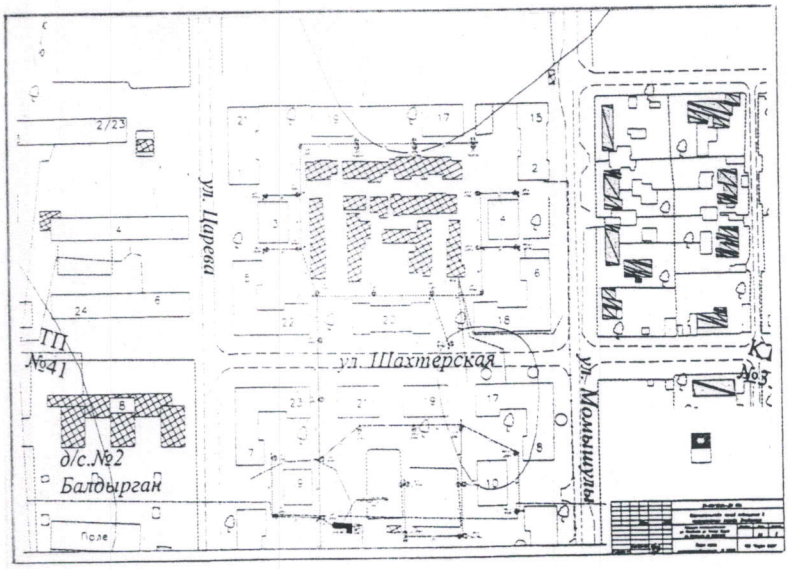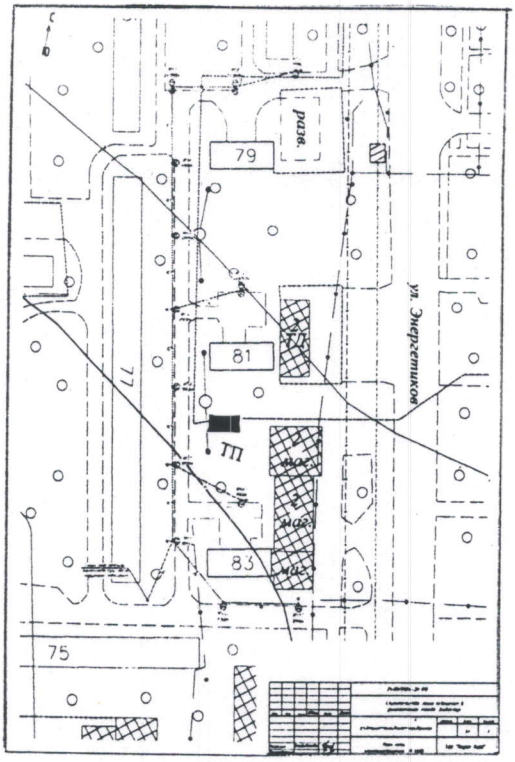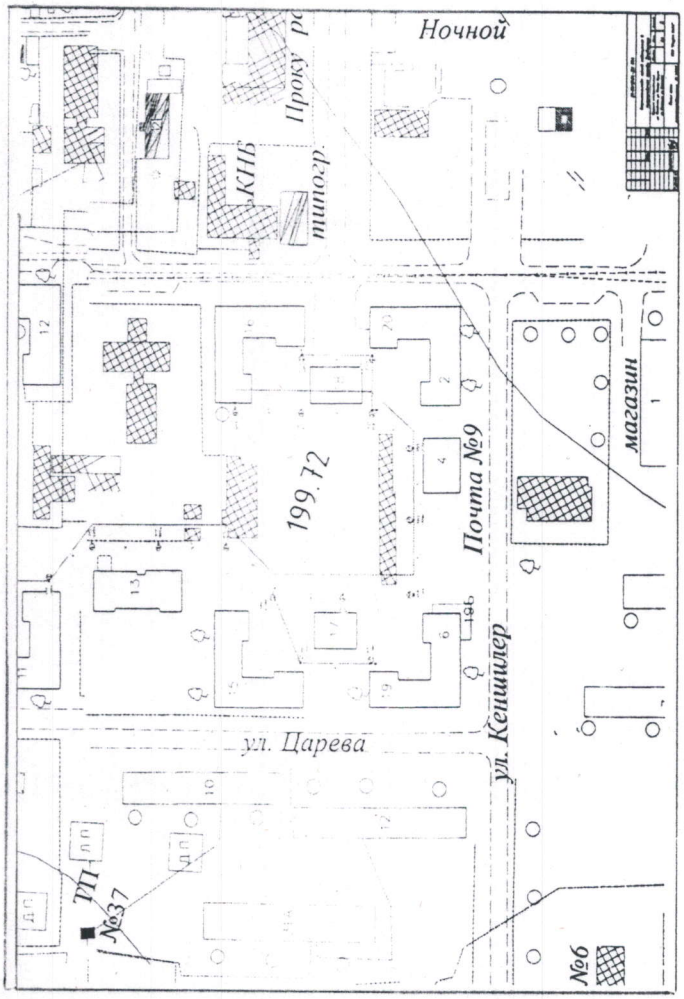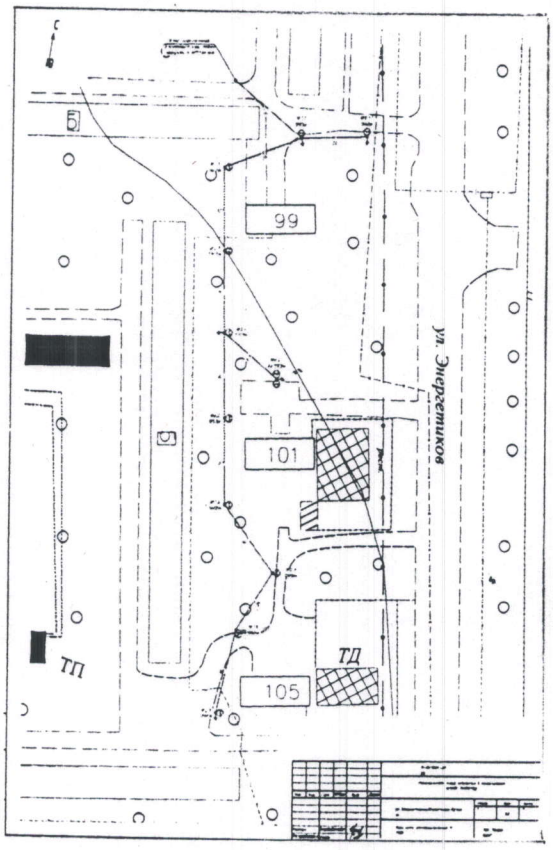
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)
