Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **080240012391 - ТОО Сервис Строй Инновац**

Стройка: **Строительство велосипедной и пешеходной дорожки вдоль побережья озера Большое Чебачье от курортной зоны «AQBURA» до озера Бурабай**

Договор подряда (контракт) №: **- от - года**

Акт выполненных работ
за Июль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Дорожная одежда				
1	11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/тех часть сб.27, п.1,6	м2 основания	1750	1 297	2 703 302
2	14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2250	1 511	4 230 098
3	15	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2250	931	2 620 128
			Итого по локальной смете: Дорожная одежда				**9 553 528**
			ИТОГО по акту:				**9 553 528**

Итого с затратами на организацию и управление СМР	9553528.146 + 0.000	9 553 528
Непредвиденные расходы, (2.000%)	9553528.146 x 2.000%	191 071
Итого с непредвидемыми работами и затратами		9 744 599
Временные здания и сооружения, к = 1.0200	9744598.709 x 1.0200	9 939 491
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время , к = 1.0277	9939490.683 x 1.0277	10 215 013
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514, к = 1.0501	10215013.365 x 1.0501	10 726 289
Итого с понижающим коэф.к=0,98, к = 0.9800	10726289.085 x 0.9800	10 511 763
НДС (12%)	10511763.303 x 12%	1 261 412
Итого с НДС	10511763.303 + 1261411.596	11 773 175

Лист согласования
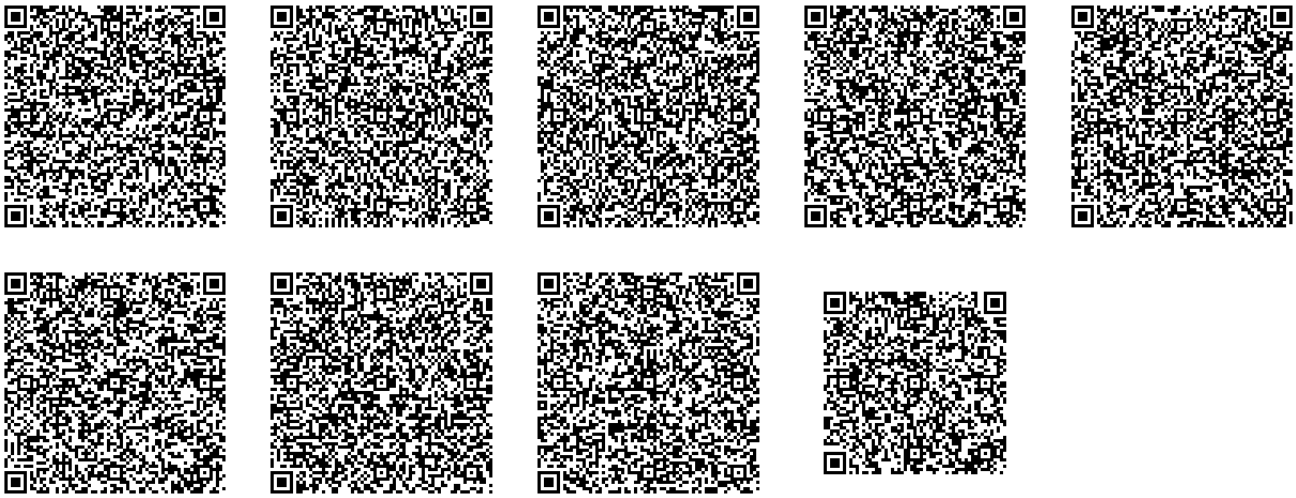
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
821228301120 - ТАСЫБЕКОВ БАУЫРЖАН КУШЕРБАЕВИЧ	Генеральный подрядчик	29.07.2025 12:14
Представители технического надзора		
970903300595 - АҚЖІГІТ ИСМАЙЫЛ ЖАҚСЫКЕЛДІҰЛЫ	эксперт	29.07.2025 12:17
Представители авторского надзора		
570630300072 - ЛОМАКО АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	начальник отдела авторского надзора	29.07.2025 14:11
Представители заказчика		
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий ОКС УДП РК	29.07.2025 19:32
890128350782 - АЛПЫСБАЕВ МУРАТ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ	главный эксперт	29.07.2025 18:07
