Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **080240012391 - ТОО Сервис Строй Инновац**

Стройка: **Строительство велосипедной и пешеходной дорожки вдоль побережья озера Большое Чебачье от курортной зоны «AQBURA» до озера Бурабай**

Договор подряда (контракт) №: **- от - года**

Акт выполненных работ
за Август 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Обустройство дороги, организация и безопасность движения				
			Раздел: Дорожные знаки				
1	1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	38	5 476	421 738
2	3	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±900 мм	шт.	15	10 382	168 188
3	4	251-101-0218 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	26 965	29 122
4	5	251-101-0207 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В±900 мм	шт.	6	15 410	99 857
5	6	251-101-0210 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D±700 мм	шт.	24	10 952	283 876
6	7	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В±700 мм	шт.	14	11 355	171 688
7	8	251-101-0227 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	20	6 038	130 421
8	9	251-102-0723 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.55	шт.	8	18 520	160 013
9	10	251-102-0717 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50	шт.	6	13 215	85 633

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	6 720	14 515
11	12	251-102-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическаядля дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	23	8 801	218 617
			Подраздел: Устройство фундаментов под дорожные знаки				
12	13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3.12	35 512	138 527
			Итого по подразделу: Устройство фундаментов под дорожные знаки				**138 527**
			Итого по разделу: Дорожные знаки				**1 922 195**
			Раздел: Ограждение				
13	17	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж (прим. ОДД-5)	т конструкций	0.76192	65 996	86 014
14	18	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (декоративное ограждение ОДД-5 длиной 12м высотой 1,0 м)	т	0.76192	908 785	747 815
15	19	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходные металлические. Устройство/ОДД-6	м	365	967	671 349
16	20	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (декоративное ограждение ОДД-6 секциявысотой 2,0 м и высота 1,0 м)	т	13.75305	908 785	13 498 450
17	21	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11.73	25 202	319 269
18	22	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.76	3 008	5 718
19	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1279.4	98	185 520
20	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	225.35	166	50 782
			Итого по разделу: Ограждение				**15 564 918**
			Итого по локальной смете: Обустройство дороги, организация и безопасность движения				**17 487 113**
			ИТОГО по акту:				**17 487 113**

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	17487112.542 + 0.000	17 487 113
	Непредвиденные расходы, (2.000%)	17487112.542 x 2.000%	349 742
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		17 836 855

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения, к = 1.0200				17836854.793 x 1.0200	18 193 592
		Итого с понижающим коэф.к=0,98, к = 0.9800				18193591.889 x 0.9800	17 829 720
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514, к = 1.0501				17829720.051 x 1.0501	18 722 119
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время , к = 1.0277				18722118.935 x 1.0277	19 241 105
		НДС (12%)				19241104.872 x 12%	2 308 933
		Итого с НДС				19241104.872 + 2308932.585	21 550 037

Лист согласования
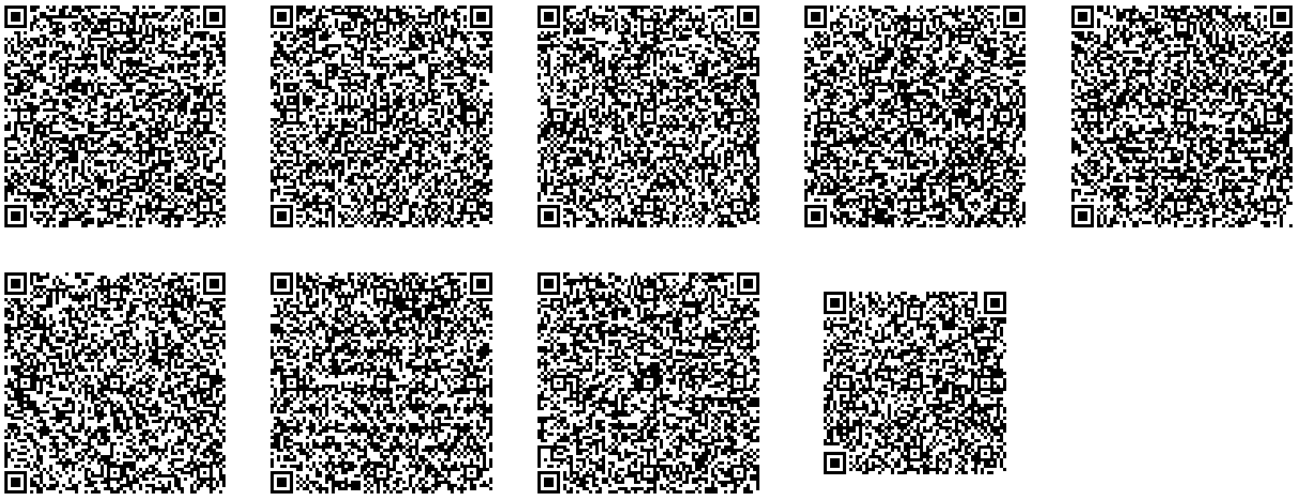
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
821228301120 - ТАСЫБЕКОВ БАУЫРЖАН КУШЕРБАЕВИЧ	Генеральный подрядчик	26.08.2025 15:37
Представители технического надзора		
970903300595 - АҚЖІГІТ ИСМАЙЫЛ ЖАҚСЫКЕЛДІҰЛЫ	эксперт	26.08.2025 15:45
Представители авторского надзора		
570630300072 - ЛОМАКО АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	начальник отдела авторского надзора	26.08.2025 16:08
Представители заказчика		
890128350782 - АЛПЫСБАЕВ МУРАТ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ	главный эксперт	27.08.2025 15:28
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий ОКС УДП РК	27.08.2025 16:14
