Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **080240012391 - ТОО Сервис Строй Инновац**

Стройка: **Строительство велосипедной и пешеходной дорожки вдоль побережья озера Большое Чебачье от курортной зоны «AQBURA» до озера Бурабай**

Договор подряда (контракт) №: **27 от 19.03.2025 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Обустройство дороги, организация и безопасность движения				
			Раздел: Ограждение				
1	19	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходные металлические. Устройство/ОДД-6	м	47	967	86 448
2	20	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (декоративное ограждение ОДД-6 секциявысотой 2,0 м и высота 1,0 м)	т	2.23887	908 785	2 197 424
			Итого по разделу: Ограждение				**2 283 871**
			Раздел: Обустройство парковок				
3	26	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	12	47 552	672 096
			Итого по разделу: Обустройство парковок				**672 096**
			Итого по локальной смете: Обустройство дороги, организация и безопасность движения				**2 955 967**
			Локальная смета: Обустройство дороги,организация и безопасность движения				
			Раздел: Горизонтальная дорожная разметка				
4	8	1127-0903-0114 РСНБ РК 2015	Разметка дорожная двойная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км линии	21.099	190 078	4 516 507
5	9	1127-0903-0120 РСНБ РК 2015	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км линии	9.462	31 163	382 430
6	10	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов/эмалью	м2 разметки	83.87	1 047	129 190
			Итого по разделу: Горизонтальная дорожная разметка				**5 028 127**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Обустройство дороги,организация и безопасность движения				**5 028 127**
			Локальная смета: Земляные работы				
7	4	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из отвала для устройства газонов, укрепел.обочин	м3 грунта	1040	263	332 316
8	5	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6240	47	316 742
9	6	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	4000	49	314 015
			Итого по локальной смете: Земляные работы				**963 074**
			Локальная смета: Дорожная одежда				
10	11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/тех часть сб.27, п.1,6	м2 основания	3608.6133	1 297	5 574 383
11	12	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-16558.6133	149	-2 793 787
12	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10.59461	188 898	2 174 638
13	14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9314.405	1 511	17 511 489
14	15	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	9314.405	931	10 846 637
15	16	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/тех часть сб.27, п.1,6	м2 покрытия обочин	9571	214	3 209 651
16	17	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1189.622	6 134	7 881 016
			Итого по локальной смете: Дорожная одежда				**44 404 027**
			ИТОГО по акту:				**53 351 195**

Итого с затратами на организацию и управление СМР	53351194.865 + 0.000	53 351 195
Непредвиденные расходы, (2.000%)	53351194.865 x 2.000%	1 067 024
Итого с непредвидемыми работами и затратами		54 418 219
Временные здания и сооружения, к = 1.0200	54418218.762 x 1.0200	55 506 583
Итого с понижающим коэф.к=0,98, к = 0.9800	55506583.137 x	54 396 451

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						0.9800	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время , к = 1.0277			54396451.475 x 1.0277	55 904 321
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514, к = 1.0512			55904321.109 x 1.0512	58 768 829
			НДС (12%)			58768829.453 x 12%	7 052 260
			Итого с НДС			58768829.453 + 7052259.534	65 821 089

Лист согласования
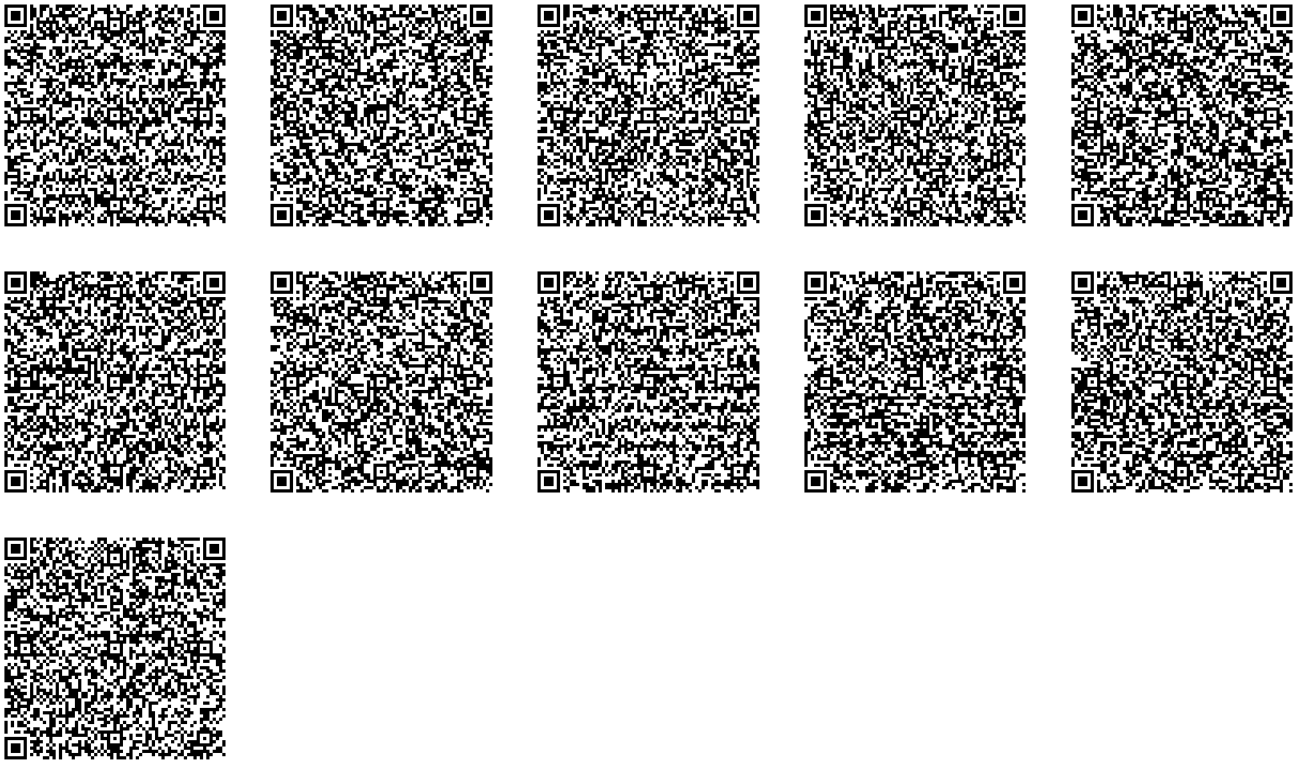
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
821228301120 - ТАСЫБЕКОВ БАУЫРЖАН КУШЕРБАЕВИЧ	Генеральный подрядчик	13.10.2025 16:21
Представители технического надзора		
970903300595 - АҚЖІГІТ ИСМАЙЫЛ ЖАҚСЫКЕЛДІҰЛЫ	эксперт	13.10.2025 16:34 Комментарий: Согласование акта выполненных работ
Представители авторского надзора		
570630300072 - ЛОМАКО АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	начальник отдела авторского надзора	13.10.2025 16:47
Представители заказчика		
890128350782 - АЛПЫСБАЕВ МУРАТ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ	главный эксперт	13.10.2025 19:52
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий ОКС УДП РК	14.10.2025 11:03
