Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» 09 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЭКСПО-ТРАНС», 110000, Костанайский область, г. Костанай, ул. Спортивная, 3
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Бижанова Кайрата Халикановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. «Береке» в г. Костанай. Корректировка сметной документациии.»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Костаная " руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:

ТОО «Nexpo Uniq», БИН 240540022324, ГСЛ №24023166 от 05.07.2024года
наименование организации, БИН, № лицензии и дата получения
в лице директора Бижанова Айбека Кайратұлы
фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
ТОО «Stroy times KZ», БИН 220540007822, ГСЛ №22010674 от 06.06.2022 года
наименование организации, БИН, № лицензии и дата получения
в лице директора Халиканова Аянбека Кайратовича
фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
ТОО «Костанай Строй KST», БИН 121240006062, ГСЛ № 24034280 от 02.12.2024года
наименование организации, БИН, № лицензии и дата получения
в лице директора Иманбекова Дастана Рустемовича
фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Институт «Агропромпроект»,(лицензия №24033813 от 26.11.2024 года). Рабочий проект: №3-21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел строительства города Костаная» № 269 от 05.11.2021года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка по акту на землю	га	50,4389		50,4389	
Площадь застройки	$м^2$	1327,08		1327,08	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь:	$м^2$	4374,28	4374,28
Число этажей:	Этаж	5	5
Общая площадь квартир	$м^2$	3835,80	3835,80
Общий строительный объем	$м^3$	19700,28	19700,28
Площадь застройки	$м^3$	1327,08	1327,08
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений.	$м^2$	-	-

Показатели	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	60	3414,96	1856,96	60	3414,96	1856,96
однокомнатных	20	806,6	334,6	20	806,6	334,6
двухкомнатных	24	1424,52	799,32	24	1424,52	799,32
трехкомнатных	16	1183,84	723,04	16	1183,84	723,04
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание представляет собой пятиэтажный жилой дом, с размерами в осях 16,88*73,8м. с техническим подпольем и чердаком. Высота этажей 2,85м. высота подвала 1,8м. Здание двухсекционное , четырехподъездное со входами с двух сторон. Уровень ответственности здания –II. Фундаменты – ленточные из сборных ж/б подушек и бетонных стен подвалов. Наружные стены многослойные, кирпичные толщиной 640мм, с утеплением мин. плитой и облицованные кирпичной кладкой. Внутренние стены кирпичные толщиной 380мм, перегородки –камни бетонные толщиной 90мм, керамзитобетонные блоки толщиной 190мм и гипсокартонные. Перекрытия и покрытия- сборные пустотные ж/б плиты. Крыша ж/б, чердачная, вентилируемая. Кровля рулонная, с организованным внутренним водостоком. Двери стальные и деревянные, окна из ПВХ профилей с остеклением 2-х камерными стеклопакетами.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «31» 05 2024года;
месяц, год

окончание работ «30» 09 2025года.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь);
фактически, месяц: 16 .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) предусмотрены проектно – сметной документацией обеспечивают (здания, сооружения, помещения);
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

_____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

_____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

_____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается): не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
Согласовано в соот с Раб. Проектом, рук КУОЗа СЙ Маматова А.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

мкр. Берке 127 26.09.25

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. «Береке» в г. Костанай. Корректировка сметной документации».**

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Бижанов Кайрат Халиканович _____ 25.09.25

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ „ЭКСПО-ТРАНС" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. КОСТАНАЙ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ

«ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БӨЛІМІ»
мемлекеттік мекемесі

№ЗТ-2025-02982623
«16» 09 2025 ж.

Қостанай қ.
4-ші Костанай к-сі, 23/1
К.Х.Бижановқа

Құрметті Кайрат Халиканович!

Сіздің 2025 жылғы 29 тамыздағы №ЗТ-2025-02982623 «Қостанай қаласы Береке ықшам ауданындағы №127 бес қабатты үй құрылысы» мүмкіндігі шектеулі азаматтардың нысанға қолжетімділігін қамтамасыз ету туралы өтінішіңіз қанағаттандырылды.

Жұмыс жобасына сәйкес мүгедектерге қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін сәйкестік декларациясы келісілді.

Осы шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасы ӘҚБтК-нің 91-бабына сәйкес жоғары тұрған органға немесе сотқа шағымдануға құқылысыз.

Басшы **А. Манатова**

Орынд. Б.Хасенова
Тел. 50-08-37

KZ.T.11.0264 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №037 нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сарапатма орталығы» ШЖҚ РМК Қостанай облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Костанайской области г. Костанай	Медицинская документация Форма №037 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшауланyын өлшеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ измерения уровней шума, звукоизоляций

№1250001005577303 22.08.2025 ж. (г.)

1. Шаруашылық объектісінің толық атауы, мекенжайы(Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес): ТОО "Экспо-Транс", г.Костанай, ул.Спортивная, 3
цех, участке(цех, участок): "Строительство пятиэтажного дома № 127 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай"
2. Өлшеу мақсаты(Цель измерения): по договору № 1013-364 от 21.08.2025г.
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді(Замеры проводились в присутствии представителя объекта): директор Бижанов К.Х.
4. Өлшеу құралдары атауы, түрі, инвентарлық нөмірі(Средства измерений, наименование, тип, инвентарный номер): шумомер-виброметр,анализатор спектра Экофизика-110А, заводской номер № БА200802.; всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360, заводской номер № 200059.; усилитель-генератор OED-PA360, заводской номер № 200060.; калибратор акустический типа АК-1000 заводской номер № 1160.; микрофонный предусилитель Р 200, заводской номер № 206414.; УМ-10 Машина ударная стандартная, заводской номер № 200048.; Метеометр МЭС-200А, заводской номер № 3409
5. Тексеру туралы мәліметтер(Сведения о поверке): № UI-12-24-1156503 от 22.08.2024г.; № ВА-12-25-3744304 от 06.08.2025г.; № UI-10-24-1616706 от 05.11.2024г.
6. Куәліктің берілген күні мен нөмірі(Дата и номер свидетельства):
7. Жүргізілген өлшеулер мына нормативтік құжатқа (НҚ) сай жүргізілді(Нормативный документ (НД), в соответствии с которой проводились измерения): ГОСТ 27296-2012
8. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты(Основные источники шума и характер создаваемого ими шума): оборудование для проведения шумоизоляции
9. Жұмыс істейтін адамдардың саны(Количество работающих человек):
10. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, қол машинасының). Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері.(Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием

стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров):

11. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді.(Исследование проводились на соответствие НД): СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий"

16. Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Тіркеу нөмірі (Регистрационный номер)	Кескіні бойынша нүкте нөмірі (Номер точки по эскизу)	Өлшеу орны (жабдықтың маркасы, түрі, құжат деректері көрсетілсін) (Место замера (указать марку, тип, паспортные данные оборудования))	Қосымша мәліметтер (өлшеу шарттары, шудың жұмыс ауысыма ішіндегі әсерінің ұзақтығы) (Дополнительные сведения (условия замера, продолжительность воздействия шума в течение рабочей смены))	Шудың сипаты Характер шума					
				Спектр бойынша По спектру		Уақыт сипаттамалары бойынша По временным характеристикам			
				Кеңқуысты (Широкополостной)	Тонды (Тональный)	Тұрақты (Постоянный)	Толқымалы	Үзілмелі (Прерывистый)	Импульсті (Импульсный)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

17. Кестенің жалғасы (Продолжение таблицы):

Продолжение таблицы	

Октавалық жолақта дБ-мен ортагеометриялық жиілігі Гц-дағы дыбыстық қысымның деңгейлері (Уровни звукового давления в дБ октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц)														LA дыбыс деңгейі (дыбыстың балама деңгеі)/ LA, дБА дыбыстың ең жоғарғы деңгейі (Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука)) / (Максимальный уровень звука LA, дБА)	Норма бойынша LA дыбыстың рұқсат етілетін деңгейі / LA, дБА дыбысының ең жоғарғы рұқсат берілетін деңгейі (Допустимый уровень звука LA по норме) / (Максимальный допустимый уровень звука LA, дБА)	
1	25	26	8	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

18. Кестенің жалғасы (Продолжение таблицы):

Продолжение таблицы

Октавалық жолақта дБ-мен үштен бірі ортагеометриялық жиілігі Гц-дағы дыбыстық қысымның деңгейлері (Уровни звукового давления в дБ третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц)															
100	125	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
60	60	60	60	60	60	59	58	57	56	55	52	49	46	43	40
60	60	60	60	60	60	59	58	57	56	52	50	46	43	40	38
59	59	59	59	59	59	58	57	56	55	54	51	48	45	42	39
33	35	38	42	45	48	52	53	54	55	56	59	59	59	59	59
33	37	40	41	43	45	48	51	53	54	54	58	59	59	59	59
33	35	37	40	45	48	50	52	53	54	55	57	59	59	59	59

19. Кестенің жалғасы (Продолжение таблицы):

Продолжение таблицы

Ауа шуын оқшаулау индексі Rw -дБ (Индекс изоляции воздушного шума Rw –дБ)		Соққы шуының келтірілген деңгей индексі Lnw-дБ (Индекс изоляции приведенного ударного шума Lnw-дБ)	
Өлшеулер (Измеренное)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)	Өлшеулер (Измеренное)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)
43	44	45	46
		58	60

		58	60
		57	60
53	50		
51	50		
52	50		

зертханашы (Лаборант)	Қол қойылды(Подписано)	Қайрғали Нұрбол Қайратұлы
Заведующий лабораторией	Қол қойылды(Подписано)	Танатканова Гульнур Сактагановна
Заместитель директора	Қол қойылды(Подписано)	Бухарбаева Шолпан Тулеуовна

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 22.08.2025 ж. (г.)
Парактар саны (Количество страниц)
Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады
(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің,химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы
(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы " Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заны 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжаттың бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

А и Б - точки расположения всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360

1-66 - точки расположения анализатор спектра ЭКОФИЗИКА - 110А

УМ - места расположения ударной машины

Измерение изоляции воздушного шума

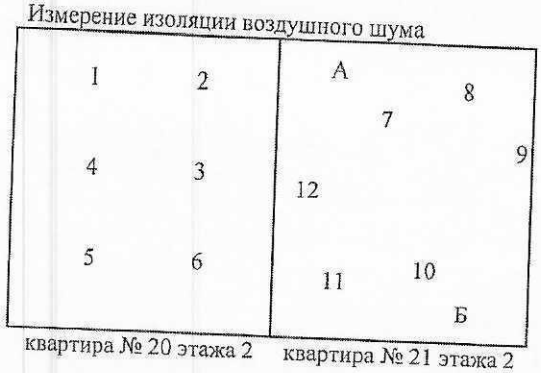

квартира № 20 этажа 2 квартира № 21 этажа 2

Измерение фонового шума

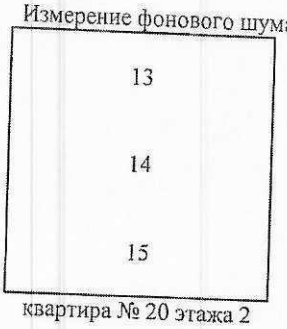

квартира № 20 этажа 2

Измерение времени реверберации

квартира № 20 этажа 2

Измерение ударного шума

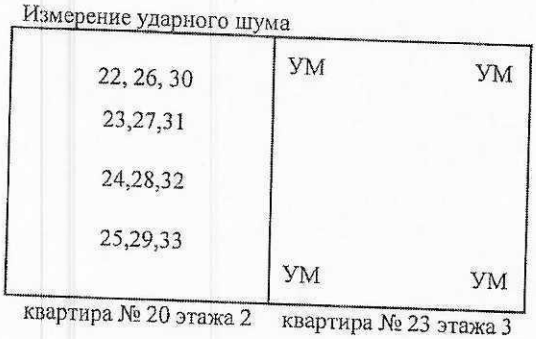

квартира № 20 этажа 2 квартира № 23 этажа 3

Измерение изоляции воздушного шума

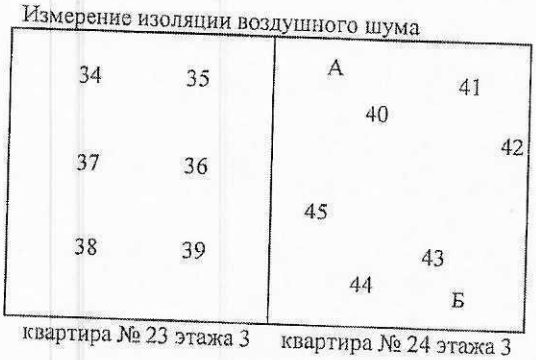

квартира № 23 этажа 3 квартира № 24 этажа 3

Измерение фонового шума

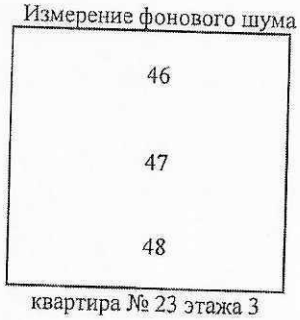

квартира № 23 этажа 3

Измерение времени реверберации

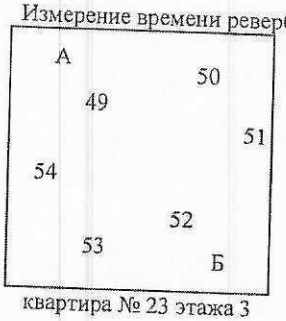

квартира № 23 этажа 3

Измерение ударного шума

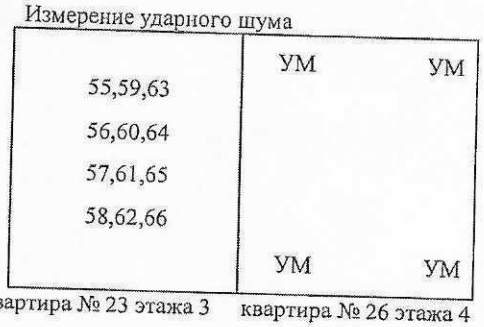

квартира № 23 этажа 3 квартира № 26 этажа 4

Измерение изоляции воздушного шума

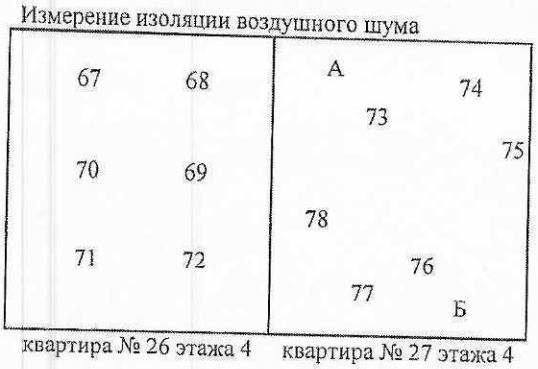

квартира № 26 этажа 4 квартира № 27 этажа 4

А и Б - точки расположения всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360

67-99 - точки расположения анализатор спектра ЭКОФИЗИКА -110А

УМ - места расположения ударной машины

Измерение фонового шума

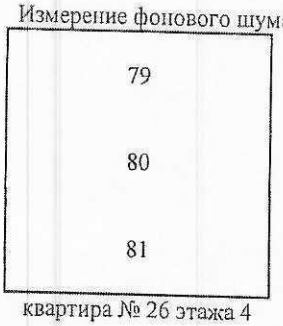

квартира № 26 этажа 4

Измерение времени реверберации

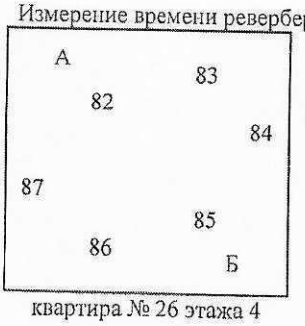

квартира № 26 этажа 4

Измерение ударного шума

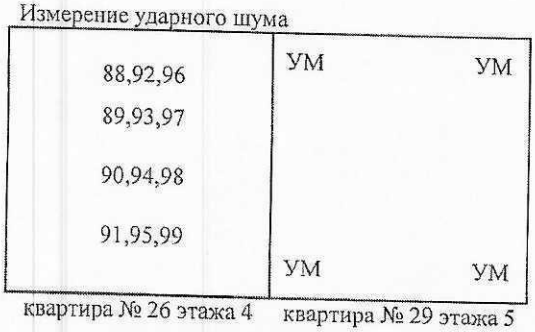

квартира № 26 этажа 4 квартира № 29 этажа 5

Приложение к протоколу № 1250001005577303 от 22.08.2025г.

Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Қостанай облысы бойынша филиалы
110000, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 113 тел./факс 54-57-13 Қостанай қаласы, БСН 150741018479 e-mail: kostanay-obl@nce.kz
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здрвавоохранения Республики Казахстан по Костанайской области
110000, г, Костанай, ул.Аль-Фараби, 113, тел/факс 54-57-13 г. Костанай БИН 150741018479 e-mail: kostanay-obl@nce.kz

Дыбыс оқшаулауың өлшеу бойынша сараптамалық қорытынды
(Экспертное заключение по измерению звукоизоляции)
№ 133
от «22» августа 2025 года

1. Өтініш беруші (Заявитель): «Экспо-Транс» ЖШС / ТОО «Экспо-Транс»
2. Мекен-жайы (Адрес): Қостанай қаласы, Спортивная көшесі, 3 / город Костанай, улица Спортивная, 3
3. Нысан атауы (Наименование объекта):
«Қостанай қаласындағы «Береке» шағын ауданында № 127 бес қабатты үй салу» / «Строительство пятиэтажного дома № 127 в микрорайоне «Береке» в городе Костанай»
4. Негізі (Основание) : 2025 ж.08.21.№ 1013-364 келісімшарт бойынша / договор № 1013-364 от 21.08.2025г.
5. Өлшеу мақсаты (Цель измерений): Қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулауын анықтау / определение звукоизоляции ограждающих конструкций
6. Өлшеу құралы атауы, тексерілген мерзімі (Средства измерений наименование, дата поверки):
   - шуөлшеуіш-дірілөлшеуіші спектрінің анализаторы Экофизика-110А (шумомер-виброметр анализатор спектра Экофизика-110А) зауыт номері / заводской номер № БА 200802, сертификат о поверке № UI-12-24-1156503 от 22.08.2024г.
   - барлық бағыттағы дыбыс көзі(додекаэдр) (всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360 зауыт номері / заводской номер № 200059
   - күшейткіш-генератор (усилитель-генератор) OED-PA360, зауыт номері / заводской номер № 200060.
   - АК-1000 типті акустикалық калибратор (калибратор акустический типа АК-1000 зауыт номері / заводской номер № 1160, сертификат о поверке № ВА-12-25-3744304 от 06.08.2025г.
   - микрофондық предусилитель (микрофонный предусилитель) Р 200, зауыт номері/ заводской номер № 206414

- Стандартты соққы машинасы СМ-10 (УМ-10. Машина ударная стандартная) зауыт номері / заводской номер № 200048.
- метеометр МЭС-200А, зауыт номері / заводской номер № 3409, свидетельство о поверке № UI-10-24-1616706 от 05.11.2024г.

7. Нормативті-техникалық құжат (Нормативно-техническая документация)
   - ҚР СЕ 2.04-105-2012 «Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулауын жобалау Қазақстан Республикасының қағидалар жинағы»
     (СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»)
   - МЕСТ 27296-2012 "Ғимараттар мен құрылыстар. Қоршау конструкцияларының конструкцияларының дыбыс оқшаулауын өлшеу әдістері"
     (ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций»)
8. Зерттеу зертханасының / орталығының атауы, аккредиттеу аттестаты аккредиттеу субъектілерінің тізілмінде тіркелген (Наименование испытательной лаборатории / центра, аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации):

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қостанай облысы бойынша филиалы

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Костанайской области

Аккредиттеу аттестаты 2024ж.03.05.№ KZ.T.11.0264, 2029ж.03.05. жарамды.

Аттестат аккредитации № KZ.T.11.0264 от 05.03.2024г., действителен до 05.03.2029г.

9. Дыбыс оқшаулауын өлшеу хаттамасы 2025ж.08.22.№ 1250001005577303 (Протокол измерения звукоизоляции: № 1250001005577303 от 22.08.2025 года)

10.Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения):

Өлшеу кезінде ауа температурасы, ауа ылғалдылығы, ауа қозғалысының жылдамдығы, атмосфералық қысым өлшемдері жүргізілді (Во время измерений были сделаны замеры температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления):

- Ауа температурасы (Температура воздуха): 20,5 °С;
- Ауа ылғалдылығы (Влажность воздуха): 43 %;
- Ауа қозғалысының жылдамдығы (Скорость воздуха): < 0,13 м/с.
- Атмосфералық қысым өлшемдері (Атмосферное давление) 746 мм.рт.ст.

Сыналатын үй-жайлар мен конструкциялардың параметрлері туралы мәліметтер (Сведения о параметрах испытуемых помещений и конструкций):

11. Сараптамаға ұсынылған құжаттар (Документы представленные на экспертизу):

Жұмыс жобасы / Рабочий проект

«Қостанай қаласындағы «Береке» шағын ауданында № 127 бес қабатты үй салу» / «Строительство пятиэтажного дома № 127 в микрорайоне «Береке» в городе Костанай»

Сараптама нәтіжелері (Результаты экспертизы)

Ауа шуын оқшаулау индексі: белгіленген нормадан аспайды

Индекс изоляции воздушного шума: не превышает установленный нормы

ҚР СЕ талаптары 2.04-105-2012 «Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулауын жобалау» Қазақстан Республикасының қағидалар жинағы. В санатындағы тұрғын үйлер үшін ауа шуын оқшаулау индекстерінің нормативтік мәндері 50 дБ құрайды.

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума для жилых зданий категории В составляет **50 дБ**.

- сараптама нәтижелері бойынша № 20 пәтері және № 21 пәтері 2 қабат, үй-жайлардың арасындағы қабырғаның ауа шуын оқшаулау индексі 53 **дБ** құрады, нормасы 50 дБ

по результатам экспертизы индекс изоляции воздушного шума стены между смежными помещениями квартиры № 20 и квартиры № 21 этажа 2 составил 53 **дБ**, при норме 50 дБ

- сараптама нәтижелері бойынша № 23 пәтері және № 24 пәтері 3 қабат, үй-жайлардың арасындағы қабырғаның ауа шуын оқшаулау индексі 51 **дБ** құрады, нормасы 50 дБ

по результатам экспертизы индекс изоляции воздушного шума стены между смежными помещениями квартиры № 23 и квартиры № 24 этажа 3 составил 51 **дБ**, при норме 50 дБ

- сараптама нәтижелері бойынша № 26 пәтері және № 27 пәтері 4 қабат, үй-жайлардың арасындағы қабырғаның ауа шуын оқшаулау индексі 52 **дБ** құрады, нормасы 50 дБ

по результатам экспертизы индекс изоляции воздушного шума стены между смежными помещениями квартиры № 26 и квартиры № 27 этажа 4 составил 52 **дБ**, при норме 50 дБ

Еден аралық плита үшін келтірілген соққы шуының индексі: белгіленген нормадан аспайды

Индекс приведенного уровня ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия: не превышает установленный нормы

ҚР СЕ талаптары 2.04-105-2012 Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулауын жобалау Қазақстан Республикасының қағидалар жинағы. В санатындағы тұрғын үйлер үшін соққы шуының келтірілген деңгейі индекстерінің нормативтік мәндері 60 дБ құрайды

Требования СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Нормативные значения индексов приведенного уровня ударного шума для жилых зданий категории В составляет **60 дБ**.

- пәтерлерді бөлетін қабаттасу плитасы үшін келтірілген соққы шу индексі № 20 пәтері 2 қабат және № 23 пәтері 3 қабат 58 **дБ** құрады, нормасы 60 дБ

индекс приведенного уровня ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия разделяющей квартиры № 20 этажа 2 и квартиры № 23 этажа 3 составил 58 **дБ**, при норме 60 дБ

- пәтерлерді бөлетін қабаттасу плитасы үшін келтірілген соққы шу индексі № 23 пәтері 3 қабат және № 26 пәтері 4 қабат 58 **дБ** құрады, нормасы 60 дБ

индекс приведенного уровня ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия разделяющей квартиры № 23 этажа 3 и квартиры № 26 этажа 4 составил 58 **дБ**, при норме 60 дБ

- пәтерлерді бөлетін қабаттасу плитасы үшін келтірілген соққы шу индексі № 26 пәтері 4 қабат және № 29 пәтері 5 қабат 57 **дБ** құрады, нормасы 60 дБ

индекс приведенного уровня ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия разделяющей квартиры № 26 этажа 4 и квартиры № 29 этажа 5 составил 57 **дБ**, при норме 60 дБ

Орындаушылар

Исполнители Тюменцев Д.С.

Қайрғали Н.Қ.

Зертхана меңгерушісі

Заведующая лабораторией Танатканова Г.С.

Директорының м.а.

И.о. директора Бухарбаева Ш.Т.
