Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«07» 02 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО Титан - Север. Г. Алматы, улица-Муканова-113. тел- 52-96-45.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице
Директор - Недогарко Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «**Строительство линии по производству кирпича в с. Подгорное Кызылжарского района СКО. 1-очередь Строительство навеса для линии по производству кирпича»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ТОО Кирпич СК. Бернецян Гарик Симовонович. СКО. Кызылжарский район. с. Подгорное
(наименование организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Модуль - Проект СК». № 15.11/19
(наименование проектной организации), (номер проекта, номер серии по типовым проектам)

утверждена: Приказ ТОО «Кирпич СК» № 25 от 02.09.2020г.
(наименование организации утвердившей проект и дата утверждения)

3. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

- навес для линии по производству кирпича – одноэтажное сооружение с каркасом из металлических конструкций.;

- пространственную жесткость и геометрическую неизменяемость каркаса обеспечивает совместная работа колонн, балок, горизонтальных и вертикальный связей, образующих геометрически неизменяемую систему.

- фундаменты под колонны - куст из четырех буронабивных свай диаметром 350 мм с монолитным железобетонным ростверком.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Строительство навеса для линии по производству кирпича имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – $м^2$)	14682	14682
Общая площадь	га	7	7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	151 857,9	151 857,9

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **навес для линии по производству кирпича – одноэтажное сооружение с каркасом из металлических конструкций.**;

-пространственную жесткость и геометрическую неизменяемость каркаса обеспечивает совместная работа колонн, балок, горизонтальных и вертикальный связей, образующих геометрически неизменяемую систему;

-фундаменты под колонны -куст из четырех буронабивных свай диаметром 350 мм с монолитным железобетонным ростверком.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - сентябрь 2020 года
окончание работ - январь 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту - 8 месяцев;
фактически - 16 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта-не предусмотрено.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания **не предусмотрена.**
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрен.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство линии по производству кирпича в с. Подгорное Кызылжарского района СКО. 1-очередь Строительство навеса для линии по производству кирпича.**
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Титан Север»**

Недогарко А. А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

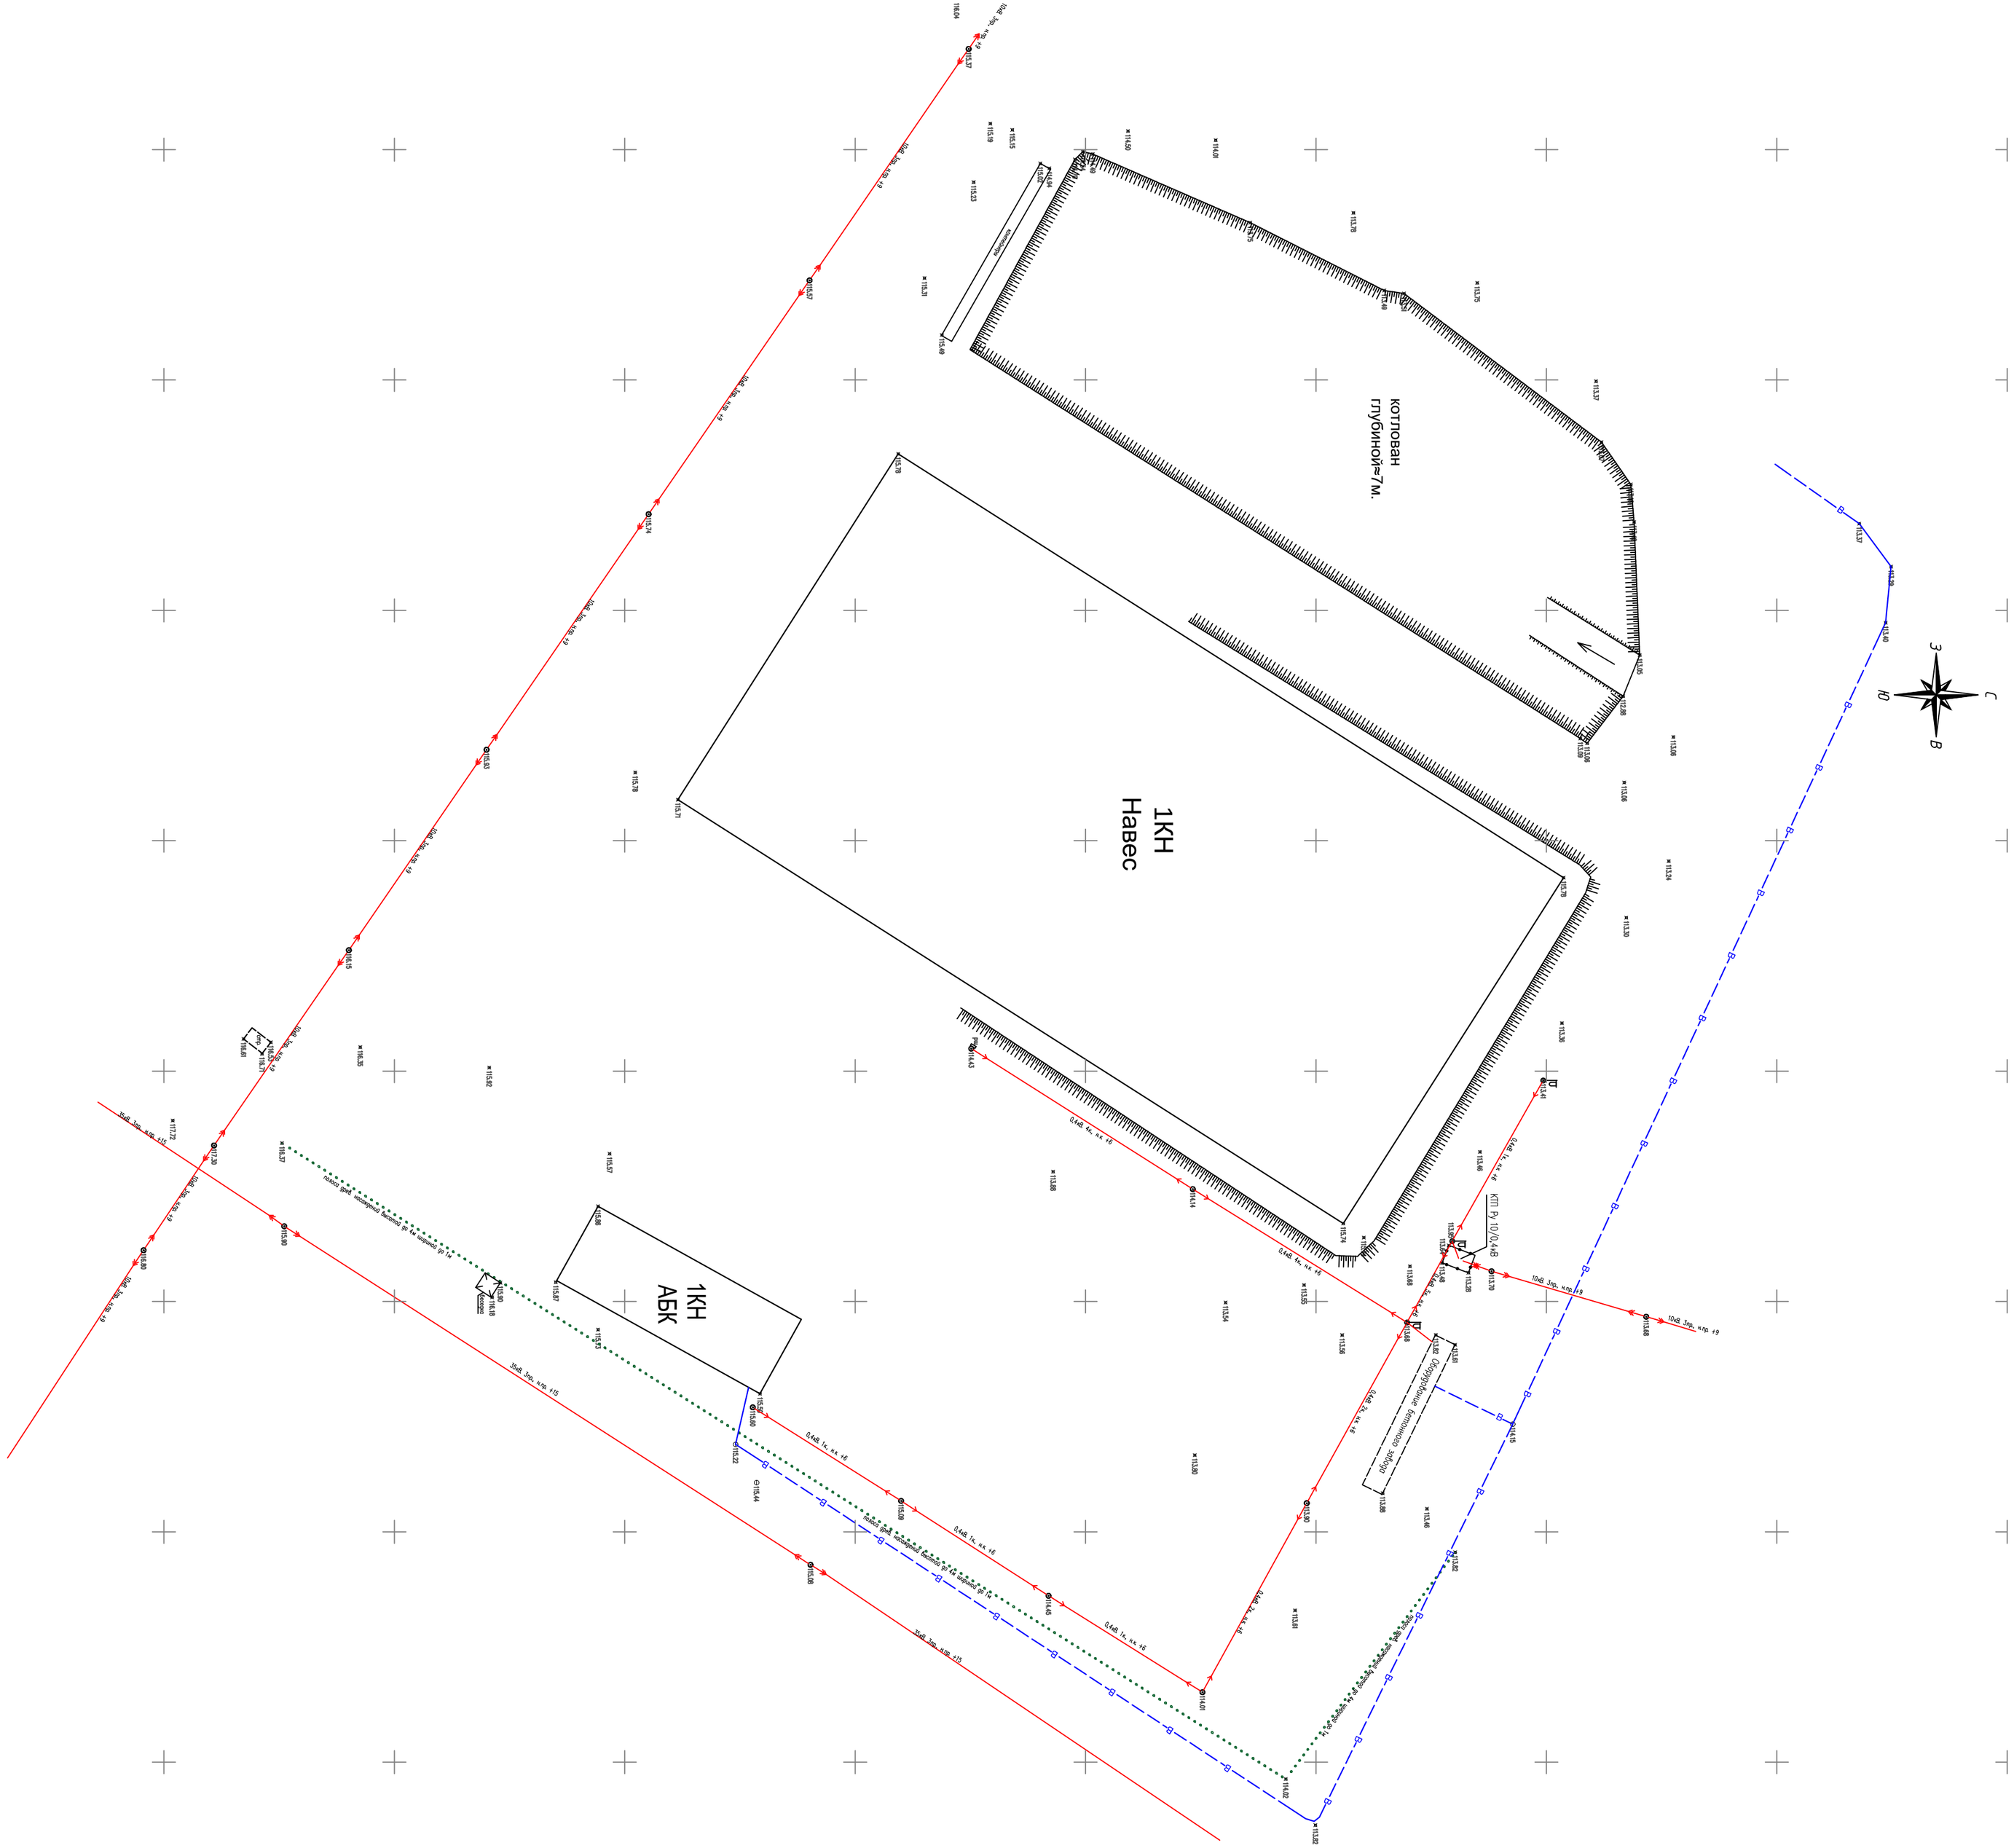
котлован
глубиной=7м.
1КН
Навес
1КН
АБК
Сооружение
Сооружение
КТП Ру 10/0,4кВ
С
З
В
Ю

35кВ. 3пр., н.пр. +15

115.90

10кВ

Директордың м.а. ИО Директор	Иманов М.С.			Кадастровый план территории (топографическая съемка)			
Бас маман Гл.специалист	Мухамадиев А.Г.						
Орындаушы Исполнитель	Коханович В.Д.			Заказчик: ТОО "Кирпич СК" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск			
				Строительство линии по производству кирпича. 1-очередь. Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу: СКО, Кызылжарский районЮ Кызылжарский сельский округ, с. Подгорное	Кезеңі/ стадия	Парақ/ лист	Масштаб/ Масштаб
					И	1	1:500
				Исполнительная геодезическая съемка навеса для линии по производству кирпича в масштабе 1:500	"Мемқалақұрылыскадастры" РМК Солтүстік Қазақстандағы филиалы Северо-Казахстанский филиал		
