Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана", БИН200340006704, г.Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30
Подрядчик: ТОО Гарант строй Астана, БИН170440033668, г.Астана, район Сарыарка, Проспект Республики, 54, 417
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция пожарной части № 8, расположенной по адресу: город Астана, улица Аксай, здание 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	170440033668			25/30	13.05.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненнных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включетельно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	Из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке								
в том числе: за октябрь месяц 2025 года	33 182 309	33 182 309.46	29 627 062.01				3 555 247.44	33 182 309

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана", БИН200340006704, г.Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, 30
Подрядчик: ТОО Гарант строй Астана, БИН170440033668, г.Астана, район Сарыарка, Проспект Республики, 54, 417
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция пожарной части № 8, расположенной по адресу: город Астана, улица Аксай, здание 3

Реестр актов выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.

№ п/п	Дата АВР	Наименование смет	Сумма с НДС
1	09.10.2025	Архитектурно-строительные работы	3 749 563.53
2	09.10.2025	Демонтажные работы	29 098 432.13
3	09.10.2025	Вертикальная планировка	334 313.79
		ИТОГО:	33 182 309.46

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Представители заказчика		
820131350049 - АЙМАГАМБЕТОВ БАУРЖАН ИЛЬЯСОВИЧ	Заместитель руководителя	16.10.2025 21:37
Представители технического надзора		
690520300851 - ЖОЛЕУОВ ЖАНУЗАК ОМУРЗАКОВИЧ	Эксперт	16.10.2025 14:36
Представители подрядчика		
930815350127 - БЕРДИМУРАТОВ БОЛАТБЕК БАХТБЕКОВИЧ	Директор	15.10.2025 17:32
Представители технического надзора		
661211350250 - ШАДИЕВ КАИЫРГЕЛЬДЫ КАЙСИНОВИЧ	Руководитель службы технического надзора ТОО "BK-top"	16.10.2025 14:13

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **200340006704 - ГУ "Управление строительства города Астана"**

Подрядчик: **170440033668 - ТОО Гарант строй Астана**

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция пожарной части № 8, расположенной по адресу: город Астана, улица Аксай, здание 3**

Договор подряда (контракт) №: **25/30 от 13.05.2025 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительные работы				
			Раздел: Подземная часть				
			Подраздел: Фундамент ФМ-1(6шт)				
1	1	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2.4	30 120	72 288
2	2	6103-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8.7	69 596	605 485
3	3	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.05196	345 153	17 934
4	4	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0.0456	336 740	15 355
5	5	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0.11448	336 740	38 550
6	6	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм	т	0.171	326 370	55 809
			Итого по подразделу: Фундамент ФМ-1(6шт)				**805 421**
			Подраздел: Фундамент ФМ-2(4шт)				
7	7	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.6	30 120	48 192
8	8	6103-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5.8	69 596	403 657
9	9	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03464	345 153	11 956
10	10	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0.0304	336 740	10 237
11	11	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0.07632	336 740	25 700

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм	т	0.114	326 370	37 206
			Итого по подразделу: Фундамент ФМ-2(4шт)				**536 948**
			Подраздел: Фундамент ФМ-3(2шт)				
13	13	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.8	30 120	24 096
14	14	6103-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2.9	69 596	201 828
15	15	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01732	345 153	5 978
16	16	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0.0152	336 740	5 118
17	17	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0.03816	336 740	12 850
18	18	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм	т	0.057	326 370	18 603
			Итого по подразделу: Фундамент ФМ-3(2шт)				**268 473**
			Подраздел: Ленточный фундамент лист 4				
19	20	6103-0101-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	18.58	45 864	852 153
20	21	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89.76	4 391	394 136
21	22	6111-0401-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	14.96	2 810	42 038
			Итого по подразделу: Ленточный фундамент лист 4				**1 288 327**
			Итого по разделу: Подземная часть				**2 899 169**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительные работы				**2 899 169**
			ИТОГО по акту:				**2 899 169**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)	2899169.000 x 6.30%	182 648
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2899169.000 + 182647.653	3 081 817
	Сметная прибыль, (5.00%)	3081816.653 x 5.00%	154 091
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		3 235 907
	III квартал 2024 г., к = 1.0557	3235907.485 x 1.0557	3 416 148
	НДС (12%)	3416147.532 x 12%	409 938
	Итого с НДС	3416147.532 + 409937.704	3 826 085
	Итого со скидкой	3826085.236 - 2.00%	3 749 564

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
930815350127 - БЕРДИМУРАТОВ БОЛАТБЕК БАХТБЕКОВИЧ	Директор	09.10.2025 12:00
Представители технического надзора		
690520300851 - ЖОЛЕУОВ ЖАНУЗАК ОМУРЗАКОВИЧ	Эксперт	09.10.2025 14:33
Представители авторского надзора		
830615300462 - НУРТАЕВ ГАЛЫМЖАН АЛЬШЕРОВИЧ	Вед.инженер	09.10.2025 14:47
Представители заказчика		
820131350049 - АЙМАГАМБЕТОВ БАУРЖАН ИЛЬЯСОВИЧ	Заместитель руководителя	13.10.2025 13:42
970710451011 - КОПЖАСАРОВА РАЗИЯ ЖАНДАРБЕКОВНА	главный специалист отдела строительства	09.10.2025 15:50 Комментарий: Согласовано в части расценок
001004500780 - МУЛЛАМУРАТ БАҚДӘУЛЕТ АРЫСТАНҰЛЫ	Главный специалист	10.10.2025 16:18
990628350590 - АБЕТАЕВ ДАМИР АРХАТОВИЧ	и.о. руководителя отдела	13.10.2025 12:09

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **200340006704 - ГУ "Управление строительства города Астана"**

Подрядчик: **170440033668 - ТОО Гарант строй Астана**

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция пожарной части № 8, расположенной по адресу: город Астана, улица Аксай, здание 3**

Договор подряда (контракт) №: **25/30 от 13.05.2025 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вертикальная планировка				
1	1	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка растительно гогрунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17	125	2 125
2	2	6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	17	463	7 871
3	3	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение до 50 м), ранее разрыхленных	м3	181	107	19 367
4	4	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	724	85	61 540
5	5	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (планировка с перемещением до 50 м)	м3	91.5	107	9 791
6	6	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	м3	366	85	31 110
7	7	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишнего)	м3 грунта	50	481	24 050
8	8	412-101-0115РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1312.5	75	98 438
9	9	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	50	84	4 200
			Итого по локальной смете: Вертикальная планировка				**258 492**
			ИТОГО по акту:				**258 492**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)			258492.000 x 6.30%	16 285
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			258492.000 + 16284.996	274 777
			Сметная прибыль, (5.00%)			274776.996 x 5.00%	13 739
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				288 516
			III квартал 2024 г., к = 1.0557			288515.846 x 1.0557	304 586
			НДС (12%)			304586.179 x 12%	36 550
			Итого с НДС			304586.179 + 36550.341	341 137
			Итого со скидкой			341136.520 - 2.00%	334 314

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
930815350127 - БЕРДИМУРАТОВ БОЛАТБЕК БАХТБЕКОВИЧ	Директор	09.10.2025 11:50
Представители технического надзора		
690520300851 - ЖОЛЕУОВ ЖАНУЗАК ОМУРЗАКОВИЧ	Эксперт	09.10.2025 14:37
Представители авторского надзора		
830615300462 - НУРТАЕВ ГАЛЫМЖАН АЛЬШЕРОВИЧ	Вед.инженер	09.10.2025 14:49
Представители заказчика		
970710451011 - КОПЖАСАРОВА РАЗИЯ ЖАНДАРБЕКОВНА	главный специалист отдела строительства	09.10.2025 15:50 Комментарий: Согласовано в части расценок
001004500780 - МУЛЛАМУРАТ БАҚДӘУЛЕТ АРЫСТАНҰЛЫ	Главный специалист	10.10.2025 16:20
990628350590 - АБЕТАЕВ ДАМИР АРХАТОВИЧ	и.о. руководителя отдела	13.10.2025 12:10
820131350049 - АЙМАГАМБЕТОВ БАУРЖАН ИЛЬЯСОВИЧ	Заместитель руководителя	13.10.2025 13:43

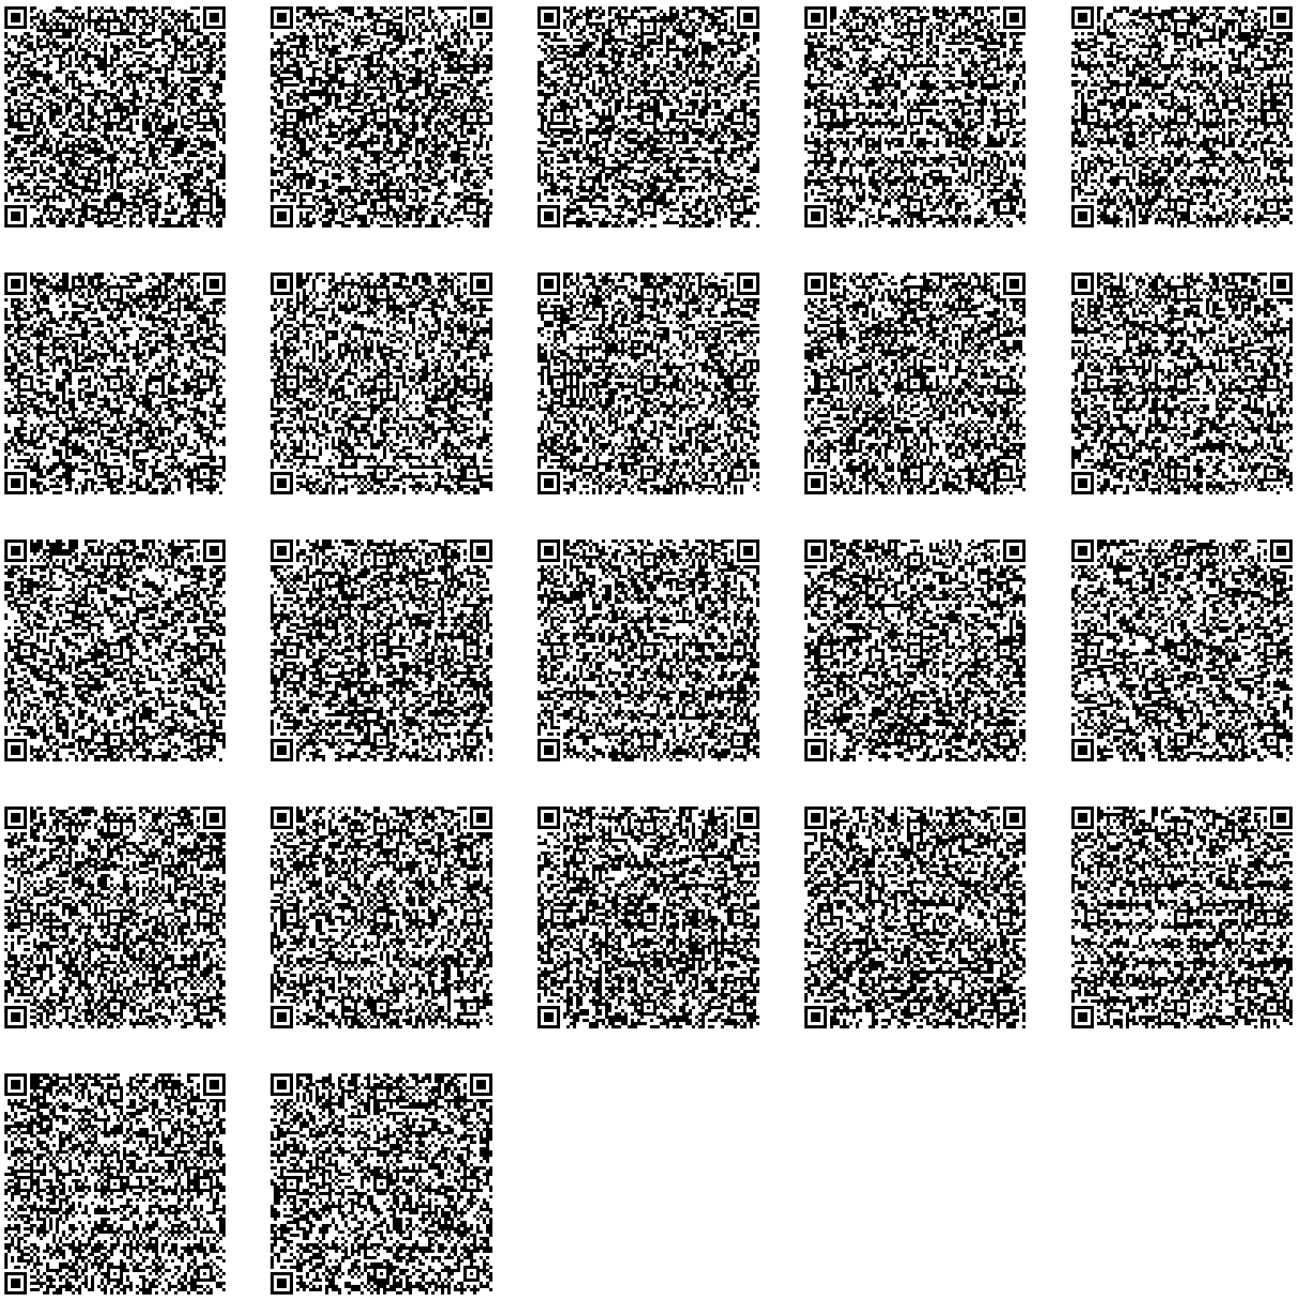

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **200340006704 - ГУ "Управление строительства города Астана"**

Подрядчик: **170440033668 - ТОО Гарант строй Астана**

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция пожарной части № 8, расположенной по адресу: город Астана, улица Аксай, здание 3**

Договор подряда (контракт) №: **25/30 от 13.05.2025 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Демонтажные работы				
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	1146-0201-0802РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2655.64	1 088	2 889 336
2	2	1213-0103-0105РСНБ РК 2022	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	291.84	3 709	1 082 435
3	3	1207-0101-0205РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	168.73	539	90 945
4	4	1207-0101-0207РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	520.89	3 983	2 074 705
5	5	1207-0101-0208РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	28.99	8 226	238 472
6	6	1207-0101-0101РСНБ РК 2022	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	101.86	663	67 533
7	7	1207-0101-0102РСНБ РК 2022	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	101.86	356	36 262
8	8	1207-0101-0201РСНБ РК 2022	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	101.86	1 623	165 319
9	9	1207-0101-0301РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	155.26	175	27 170
10	10	1146-0401-1101РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	74.4	9 059	673 990
11	11	1146-0401-1103РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	75.82	5 251	398 131
12	12	1203-0101-0202РСНБ РК 2022	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	12.1992	101 094	1 233 266
13	13	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м3	9.72	30 739	298 783

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1208-0101-0202РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	593.76	487	289 161
15	15	1208-0101-0103РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	593.76	1 411	837 795
16	16	1203-0101-0201РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	23.79	111 780	2 659 246
17	17	1146-0401-0103РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1.99	144 938	288 427
18	18	1208-0101-0202РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	7.71	487	3 755
19	19	1208-0101-0201РСНБ РК 2022	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	29.12	809	23 558
20	20	1146-0401-0106РСНБ РК 2022	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка	м3	2.48	88 755	220 112
21	21	414-104-0501РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	137.31	252	34 602
22	22	412-102-0115РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов (мусор) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2059.65	61	125 639
			Итого по разделу: Демонтажные работы				**13 758 642**
			Раздел: Демонтажные работы по отоплению и вентиляции				
23	23	1215-0102-0301РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	580	2 099	1 217 420
24	24	1215-0102-0302РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	580	3 037	1 761 460
25	25	1215-0102-0801РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	25	5 373	134 325
26	26	1215-0102-0304РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	28.5	3 687	105 080
27	27	1215-0101-0301РСНБ РК 2022	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	72	317	22 824
28	28	1215-0102-0301РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	8	2 099	16 792
29	29	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	4	50 745	202 980
30	30	1215-0102-0805РСНБ РК 2022	Теплообменник. Демонтаж	шт	2	881	1 762
31	31	1215-0103-0301РСНБ РК 2022	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	15	2 708	40 620
			Итого по разделу: Демонтажные работы по отоплению и вентиляции				**3 503 263**
			Раздел: Демонтажные работы по электроснабжению				
32	32	1217-0101-0706РСНБ РК 2022	Щиты освещения. Демонтаж	шт.	4	1 433	5 732

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	1217-0101-0703РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	60	295	17 700
34	34	1217-0101-0706РСНБ РК 2022	Шкаф управления. Демонтаж	шт.	7	1 433	10 031
35	35	1217-0101-0601РСНБ РК 2022	Кабель. Демонтаж	м	4030	449	1 809 470
			Итого по разделу: Демонтажные работы по электроснабжению				**1 842 933**
			Раздел: Демонтажные и монтажные работы по наружному водопроводу и канализации				
36	36	1215-0101-0403РСНБ РК 2022	Мойка. Демонтаж	прибор	4	5 753	23 012
37	37	1215-0101-0402РСНБ РК 2022	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	3 566	14 264
38	38	1215-0101-0404РСНБ РК 2022	Поддон. Демонтаж	прибор	10	16 458	164 580
39	39	1215-0101-0802РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	230	4 298	988 540
40	40	1215-0101-0317РСНБ РК 2022	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	6 975	6 975
41	41	1215-0101-0801РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	250	4 041	1 010 250
			Итого по разделу: Демонтажные и монтажные работы по наружному водопроводу и канализации				**2 207 621**
			Раздел: Демонтажные работы по генплану				
42	42	1218-0101-1302РСНБ РК 2022	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	798.23	460	367 186
43	43	1218-0101-0402РСНБ РК 2022	Демонтаж озеленения	м2	166.48	60	9 989
44	44	1220-0401-0102РСНБ РК 2022	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	163.32	4 799	783 773
45	45	1220-0501-0101РСНБ РК 2022	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	15.3	1 670	25 551
			Итого по разделу: Демонтажные работы по генплану				**1 186 499**
			Итого по локальной смете: Демонтажные работы				**22 498 958**
			ИТОГО по акту:				**22 498 958**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)	22498958.000 x 6.30%	1 417 434
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	22498958.000 + 1417434.397	23 916 392
	Сметная прибыль, (5.00%)	23916392.397 x 5.00%	1 195 820
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		25 112 212
	III квартал 2024 г., к = 1.0557	25112212.017 x 1.0557	26 510 962
	НДС (12%)	26510962.226 x 12%	3 181 315
	Итого с НДС	26510962.226 +	29 692 278

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						3181315.467	
		Итого со скидкой				29692277.693 - 2.00%	29 098 432

Лист согласования
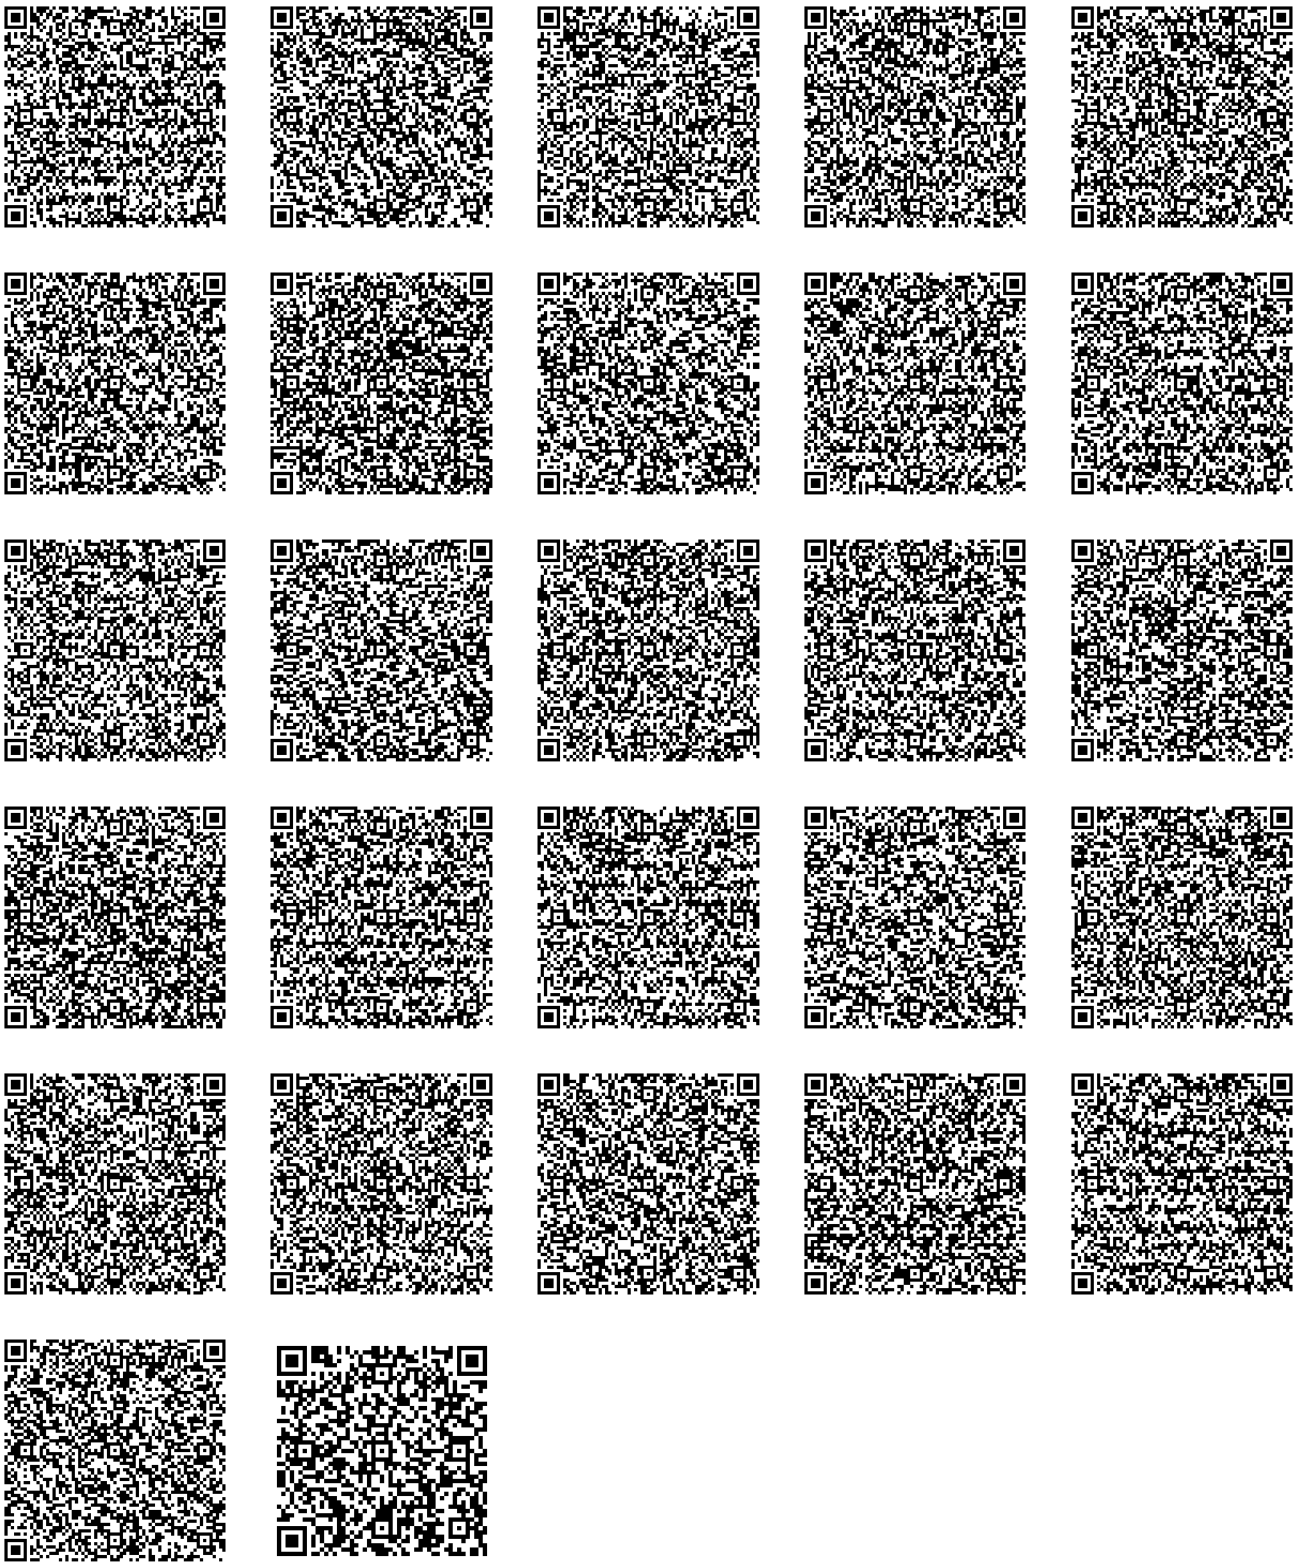
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
930815350127 - БЕРДИМУРАТОВ БОЛАТБЕК БАХТБЕКОВИЧ	Директор	09.10.2025 11:57
Представители технического надзора		
690520300851 - ЖОЛЕУОВ ЖАНУЗАК ОМУРЗАКОВИЧ	Эксперт	09.10.2025 14:36
Представители авторского надзора		
830615300462 - НУРТАЕВ ГАЛЫМЖАН АЛЬШЕРОВИЧ	Вед.инженер	09.10.2025 14:48
Представители заказчика		
970710451011 - КОПЖАСАРОВА РАЗИЯ ЖАНДАРБЕКОВНА	главный специалист отдела строительства	09.10.2025 15:50 Комментарий: Согласовано в части расценок
001004500780 - МУЛЛАМУРАТ БАҚДӘУЛЕТ АРЫСТАНҰЛЫ	Главный специалист	10.10.2025 16:19
820131350049 - АЙМАГАМБЕТОВ БАУРЖАН ИЛЬЯСОВИЧ	Заместитель руководителя	13.10.2025 13:42
990628350590 - АБЕТАЕВ ДАМИР АРХАТОВИЧ	и.о. руководителя отдела	13.10.2025 12:10
