*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Управление строительства города Астана",Республика Казахстан, Астана, район "Сарыарка", С.Сейфуллина 30** | **200340006704** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227** | **060940004614** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор №25/27 от 20.05.2025 г (Пристройка Астана - 2 062 224 902,77)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **61** | **28.11.2025** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство пристройки к школе-гимназии №91, расположенной в городе Астана, район Алматы, ул. А. Храпатого 10 | | | Работа | 1 | 45 394 211,00 | 45 394 211,00 | 4 863 665,46 |
| | | | | Итого | 1 | x | 45 394 211,00 | 4 863 665,46 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. руководитель / _____ / Б.Абдиалиев
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2025

М.П.

**Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана", БИН200340006704, г. Астана, ул. Сакен Сейфуллина, 30**
**Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана", БИН060940004614, Карагандинская область, г. Караганда, проспект Н. Назарбаева, 37 н.п. 1**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки к школе-гимназии №91, расположенной в городе Астана, район Алматы, ул. А. Храпатого, 10**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за ноябрь месяц 2025 года**

| БИН | | КОПФ | | | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ специфики | код |
| 200340006704 | 060940004614 | | | 25/27 | 20.05.2025г. | | |
| | | | | дополнительное соглашение № 1 от 22.07.2025г. | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненнных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС | с начала года по отчетный месяц включетельно, с НДС | в отчетном месяце, без НДС | Из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Всего по стройке | 88 257 911 | 88 257 911 | 40 530 546 | | | | 88 257 911 | 88 257 911 |
| | | | | | | | | |
| в том числе: за ноябрь месяц 2025 года | 45 394 211 | 45 394 211 | 40 530 546 | | | | 4 863 665 | 45 394 211 |

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астана", БИН200340006704, г. Астана, ул. Сакен Сейфуллина, 30
Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана", БИН060940004614, Карагандинская область, г. Караганда, проспект Н. Назарбаева, 37 н.п. 1
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки к школе-гимназии №91, расположенной в городе Астана, район Алматы, ул. А. Храпатого, 10

Реестр актов выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.

| № п/п | Дата АВР | Наименование смет | Сумма с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.2025 | Общестроительные работы-КЖ,КМ | 45 394 211 |
| | | ИТОГО: | 45 394 211 |

**Лист согласования**

| ФИО | Должность | Данные ЭЦП |
|---|---|---|
| Представители заказчика | | |
| 820131350049 - АЙМАГАМБЕТОВ БАУРЖАН ИЛЬЯСОВИЧ | заместитель руководителя | 28.11.2025 10:50 |
| Представители подрядчика | | |
| 880301350877 - МУКАШЕВ ИЛЬЯС СЕРГАЛИЕВИЧ | Генеральный подрядчик | 27.11.2025 19:06 |
| Представители технического надзора | | |
| 821011301228 - КАРПЕЕВ ДУЛАТ САБЫРХАНОВИЧ | эксперт | 27.11.2025 19:48 |
| Представители технического надзора | | |
| 741114302332 - МАЛГАЖДАРОВ МУСЛИМ НУРЛЫБЕКОВИЧ | технический надзор /директор | 28.11.2025 10:40 |

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **200340006704 - ГУ "Управление строительства города Астана"**

Подрядчик: **060940004614 - ТОО "Казбайлық Астана"**

Стройка: **Строительство пристройки к школе-гимназии №91, расположенной в городе Астана, район Алматы, ул. А. Храпатого, 10**

Договор подряда (контракт) №: **№ 25/27 от 20.05.2025 года**

# Акт выполненных работ
# за Ноябрь 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Общестроительные работы-КЖ,КМ** | | | | |
| | | | **Раздел: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | |
| | | | **Подраздел: Ленточные** | | | | |
| 1 | 16 | 6103-0101-0209ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 100 | 62 982 | 6 298 200 |
| 2 | 17 | 6103-0101-0302ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм | м3 | 160 | 78 252 | 12 520 320 |
| | | | **Итого по подразделу: Ленточные** | | | | **18 818 520** |
| | | | **Подраздел: Каркас КП-1,2,3** | | | | |
| 3 | 18 | 214-210-0202РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 9.712323 | 274 091 | 2 662 061 |
| 4 | 19 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2.582016 | 304 365 | 785 876 |
| 5 | 20 | 6103-0703-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 9.712323 | 98 216 | 953 905 |
| | | | **Итого по подразделу: Каркас КП-1,2,3** | | | | **4 401 841** |
| | | | **Подраздел: Анкерный выпуск Ав-1** | | | | |
| 6 | 21 | 6103-0701-0803ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0.47733 | 809 593 | 386 443 |
| 7 | 22 | 214-210-0202РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0.38766 | 274 091 | 106 254 |
| 8 | 23 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.08967 | 304 365 | 27 292 |
| | | | **Итого по подразделу: Анкерный выпуск Ав-1** | | | | **519 989** |
| | | | **Подраздел: ФМ-1(14шт)** | | | | |
| 9 | 24 | 6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 2.436 | 20 319 | 49 497 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 25 | 6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2.436 | 36 072 | 87 871 |
| 11 | 26 | 6103-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 | м3 | 13.58 | 76 464 | 1 038 381 |
| 12 | 27 | 214-403-0103РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.48804 | 392 731 | 191 668 |
| 13 | 28 | 214-210-0202РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0.39228 | 274 091 | 107 520 |
| 14 | 29 | 214-210-0201РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.06496 | 284 928 | 18 509 |
| 15 | 30 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0252 | 304 365 | 7 670 |
| | | | **Итого по подразделу: ФМ-1(14шт)** | | | | **1 501 116** |
| | | | **Подраздел: ФМ-2(10шт)** | | | | |
| 16 | 31 | 6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 2.56 | 20 319 | 52 017 |
| 17 | 32 | 6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2.56 | 36 072 | 92 344 |
| 18 | 33 | 6103-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 | м3 | 14.3 | 76 464 | 1 093 435 |
| 19 | 34 | 214-403-0103РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.546 | 392 731 | 214 431 |
| 20 | 35 | 214-210-0202РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0.398 | 274 091 | 109 088 |
| 21 | 36 | 214-210-0201РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0464 | 284 928 | 13 221 |
| 22 | 37 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.018 | 304 365 | 5 479 |
| | | | **Итого по подразделу: ФМ-2(10шт)** | | | | **1 580 015** |
| | | | **Подраздел: ФМ-3(4шт)** | | | | |
| 23 | 38 | 6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 1.024 | 20 319 | 20 807 |
| 24 | 39 | 6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.024 | 36 072 | 36 938 |
| 25 | 40 | 6103-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 | м3 | 5.56 | 76 464 | 425 140 |
| 26 | 41 | 214-403-0103РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.18648 | 392 731 | 73 236 |
| 27 | 42 | 214-210-0202РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0.11208 | 274 091 | 30 720 |
| 28 | 43 | 214-210-0201РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.01856 | 284 928 | 5 288 |
| 29 | 44 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0072 | 304 365 | 2 191 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по подразделу: ФМ-3(4шт)** | | | | **594 320** |
| | | | **Подраздел: ФМ-4(8шт)** | | | | |
| 30 | 45 | 6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 1.392 | 20 319 | 28 284 |
| 31 | 46 | 6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.392 | 36 072 | 50 212 |
| 32 | 47 | 6103-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 | м3 | 6.08 | 76 464 | 464 901 |
| 33 | 48 | 214-403-0103РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.27888 | 392 731 | 109 525 |
| 34 | 49 | 214-210-0202РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0.14768 | 274 091 | 40 478 |
| 35 | 50 | 214-210-0201РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.03712 | 284 928 | 10 577 |
| 36 | 51 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0144 | 304 365 | 4 383 |
| | | | **Итого по подразделу: ФМ-4(8шт)** | | | | **708 360** |
| | | | **Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | **28 124 161** |
| | | | **Раздел: МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ** | | | | |
| | | | **Подраздел: КОЛОННА К-1 /20шт/** | | | | |
| 37 | 52 | 1106-0501-0109РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 20 | 88 360 | 1 767 200 |
| 38 | 53 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1.3576 | 274 315 | 372 410 |
| 39 | 54 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.588 | 304 365 | 178 967 |
| 40 | 55 | 214-208-0103РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.072 | 368 263 | 26 515 |
| | | | **Итого по подразделу: КОЛОННА К-1 /20шт/** | | | | **2 345 092** |
| | | | **Подраздел: КОЛОННА К-2 /2шт/** | | | | |
| 41 | 56 | 1106-0501-0109РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 3.06 | 88 360 | 270 382 |
| 42 | 57 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.223 | 274 315 | 61 172 |
| 43 | 58 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0864 | 304 365 | 26 297 |
| 44 | 59 | 214-208-0103РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.0072 | 368 263 | 2 651 |
| | | | **Итого по подразделу: КОЛОННА К-2 /2шт/** | | | | **360 502** |
| | | | **Подраздел: КОЛОННА К-4 /10шт/** | | | | |
| 45 | 64 | 1106-0501-0109РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 4.9 | 88 360 | 432 964 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 65 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.321 | 274 315 | 88 055 |
| 47 | 66 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.132 | 304 365 | 40 176 |
| 48 | 67 | 214-208-0103РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.036 | 368 263 | 13 257 |
| | | | **Итого по подразделу: КОЛОННА К-4 /10шт/** | | | | **574 452** |
| | | | **Подраздел: КОЛОННА К-5 /10шт/** | | | | |
| 49 | 68 | 1106-0501-0109РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 18.3 | 88 360 | 1 616 988 |
| 50 | 69 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1.5908 | 274 315 | 436 380 |
| 51 | 70 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.476 | 304 365 | 144 878 |
| 52 | 71 | 214-208-0103РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.036 | 368 263 | 13 257 |
| | | | **Итого по подразделу: КОЛОННА К-5 /10шт/** | | | | **2 211 503** |
| | | | **Подраздел: КОЛОННА К-6 /4шт/** | | | | |
| 53 | 72 | 1106-0501-0109РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 6.52 | 88 360 | 576 107 |
| 54 | 73 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.48872 | 274 315 | 134 063 |
| 55 | 74 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.18 | 304 365 | 54 786 |
| 56 | 75 | 214-208-0103РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.0144 | 368 263 | 5 303 |
| | | | **Итого по подразделу: КОЛОННА К-6 /4шт/** | | | | **770 259** |
| | | | **Подраздел: КОЛОННА К-7 /4шт/** | | | | |
| 57 | 76 | 1106-0501-0109РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 7.16 | 88 360 | 632 658 |
| 58 | 77 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.54464 | 274 315 | 149 403 |
| 59 | 78 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.192 | 304 365 | 58 438 |
| 60 | 79 | 214-208-0103РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.0144 | 368 263 | 5 303 |
| | | | **Итого по подразделу: КОЛОННА К-7 /4шт/** | | | | **845 802** |
| | | | **Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ** | | | | **7 107 610** |
| | | | **Итого по локальной смете: Общестроительные работы-КЖ,КМ** | | | | **35 231 771** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **35 231 771** |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%) | | | | 35231771.295 x 7.30% | 2 571 919 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | 35231771.295 + 2571919.372 | 37 803 691 |
| | | Затраты по ликвидации снежных заносов, (0.300%) | | | | 37803690.667 x 0.300% | 113 411 |
| | | Сметная прибыль, (5.00%) | | | | 37917101.740 x 5.00% | 1 895 855 |
| | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | | 39 812 957 |
| | | **Коэффициент в текущих ценах 2025 года, к = 1.0388** | | | | 39812956.827 x 1.0388 | 41 357 700 |
| | | НДС (12%) | | | | 41357699.552 x 12% | 4 962 924 |
| | | **Итого с НДС** | | | | 41357699.552 + 4962923.946 | 46 320 623 |
| | | **Итого со скидкой** | | | | 46320623.498 - 2.00% | 45 394 211 |

Лист согласования
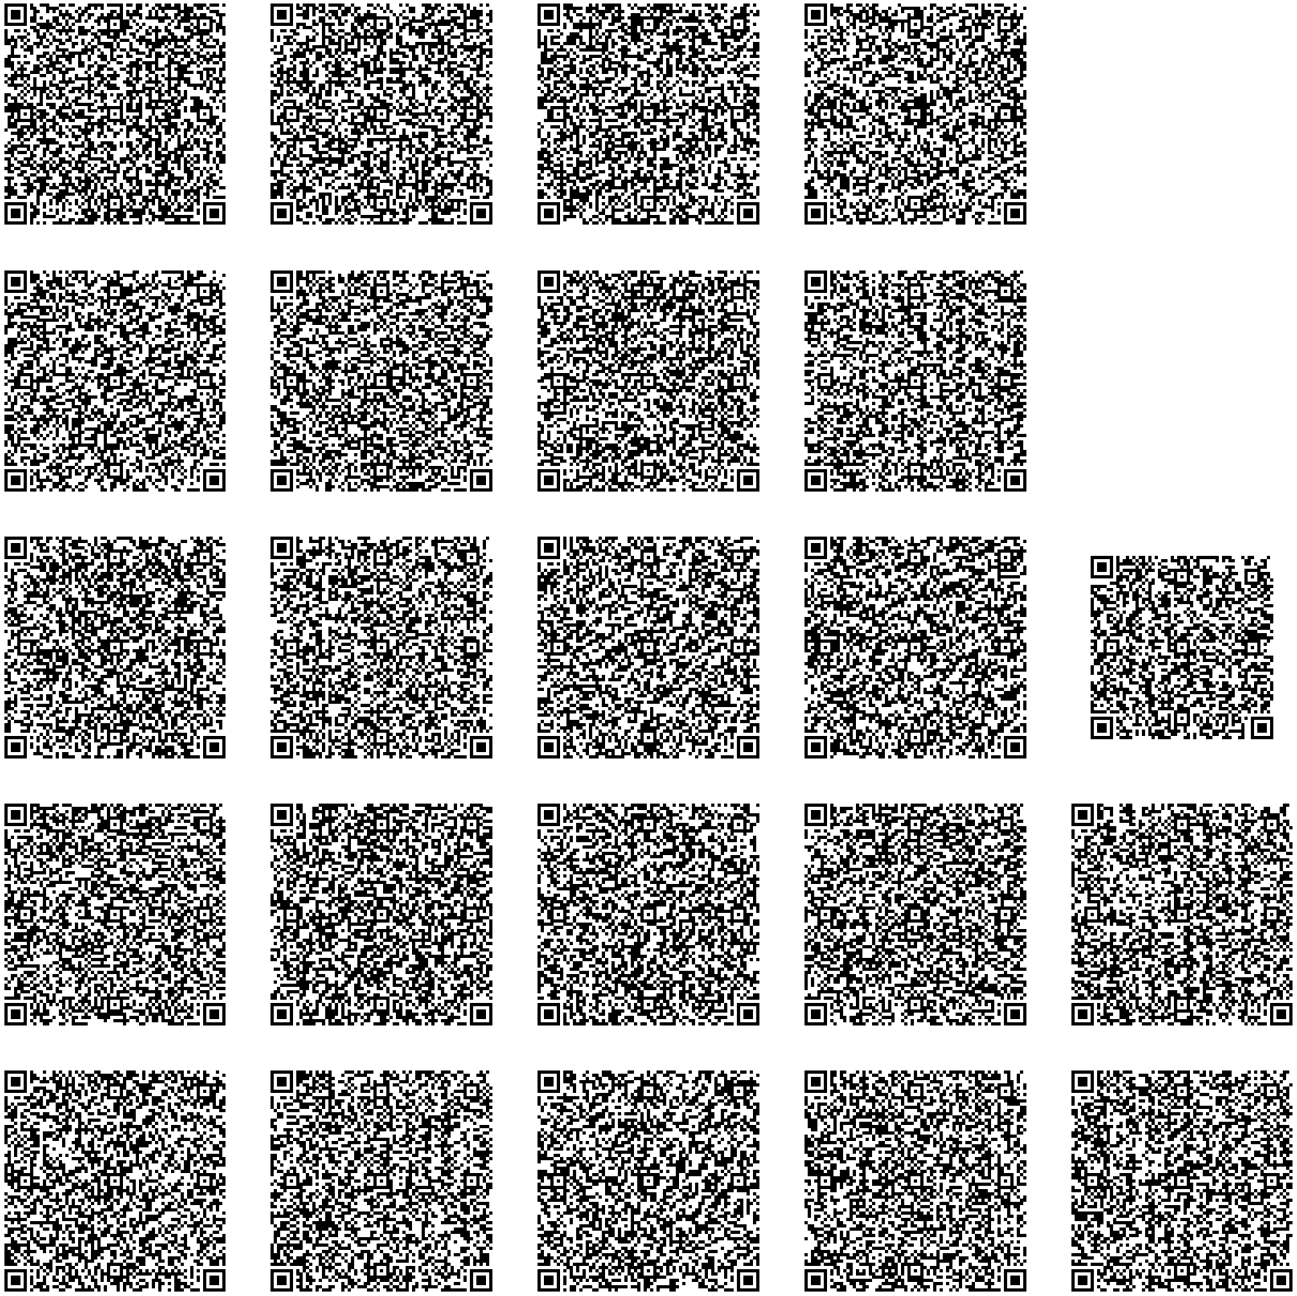
| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 880301350877 - МУКАШЕВ ИЛЬЯС СЕРГАЛИЕВИЧ | Генеральный подрядчик | 27.11.2025 14:43 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 821011301228 - КАРПЕЕВ ДУЛАТ САБЫРХАНОВИЧ | эксперт | 27.11.2025 14:49 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 840803301672 - ЖУНУСОВ САМАТ КАНЫБЕКОВИЧ | эксперт | 27.11.2025 14:46 |
| **Представители заказчика** | | |
| 820131350049 - АЙМАГАМБЕТОВ БАУРЖАН ИЛЬЯСОВИЧ | заместитель руководителя | 27.11.2025 18:29 |
| 970710451011 - КОПЖАСАРОВА РАЗИЯ ЖАНДАРБЕКОВНА | главный специалист отдела строительства | 27.11.2025 18:23 |
| 001004500780 - МУЛЛАМУРАТ БАҚДӘУЛЕТ АРЫСТАНҰЛЫ | и.о.руководителя отдела строительства | 27.11.2025 18:28 |
| 960710300653 - ЖИЕНӘЛІ ҚЫДЫР АРМАНҰЛЫ | главный специалист отдела строительства | 27.11.2025 18:23 |
