Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **070740016122 - ТОО "ЖӘРДЕМ-2007"**

Стройка: **Строительство школы в районе улиц E796 и E899 в районе Нұра города Астана на 2 000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **308 от 16.10.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вертикальная планировка				
			Раздел: Вертикальная планировка в границах участка				
1	1	6101-0104-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	151	184	27 784
2	2	6101-0104-0210ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202/до 50 м во временый отвал/	м3	151	620	93 620
3	3	6101-0101-0223ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	24463.25	372	9 100 329
4	4	412-102-0216РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	856213.8	31	26 542 627
5	5	6101-0104-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	24614.25	184	4 529 022
6	6	6101-0104-0210ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201/до 50 м/	м3	24614.25	465	11 445 626
7	7	6101-0107-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	24614.25	253	6 227 405
8	8	6101-0107-0108ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	24614.25	90	2 215 282
			Итого по разделу: Вертикальная планировка в границах участка				**60 181 696**
			Итого по локальной смете: Вертикальная планировка				**60 181 696**
			ИТОГО по акту:				**60 181 696**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				60181696.800 x 7.30%	4 393 263
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				60181696.800 + 4393263.981	64 574 960
		Сметная прибыль, 5.00%				64574960.781 x 5.00%	3 228 748
		Непредвиденные расходы, 2.000%				64574960.781 x 2.000%	1 291 499
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					69 095 208

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		коэф 2кв, к = 1.0368				69095208.036 x 1.0368	71 637 911
		НДС (12%)				71637911.692 x 12%	8 596 549
		Итого с НДС				71637911.692 + 8596549.403	80 234 461

Лист согласования
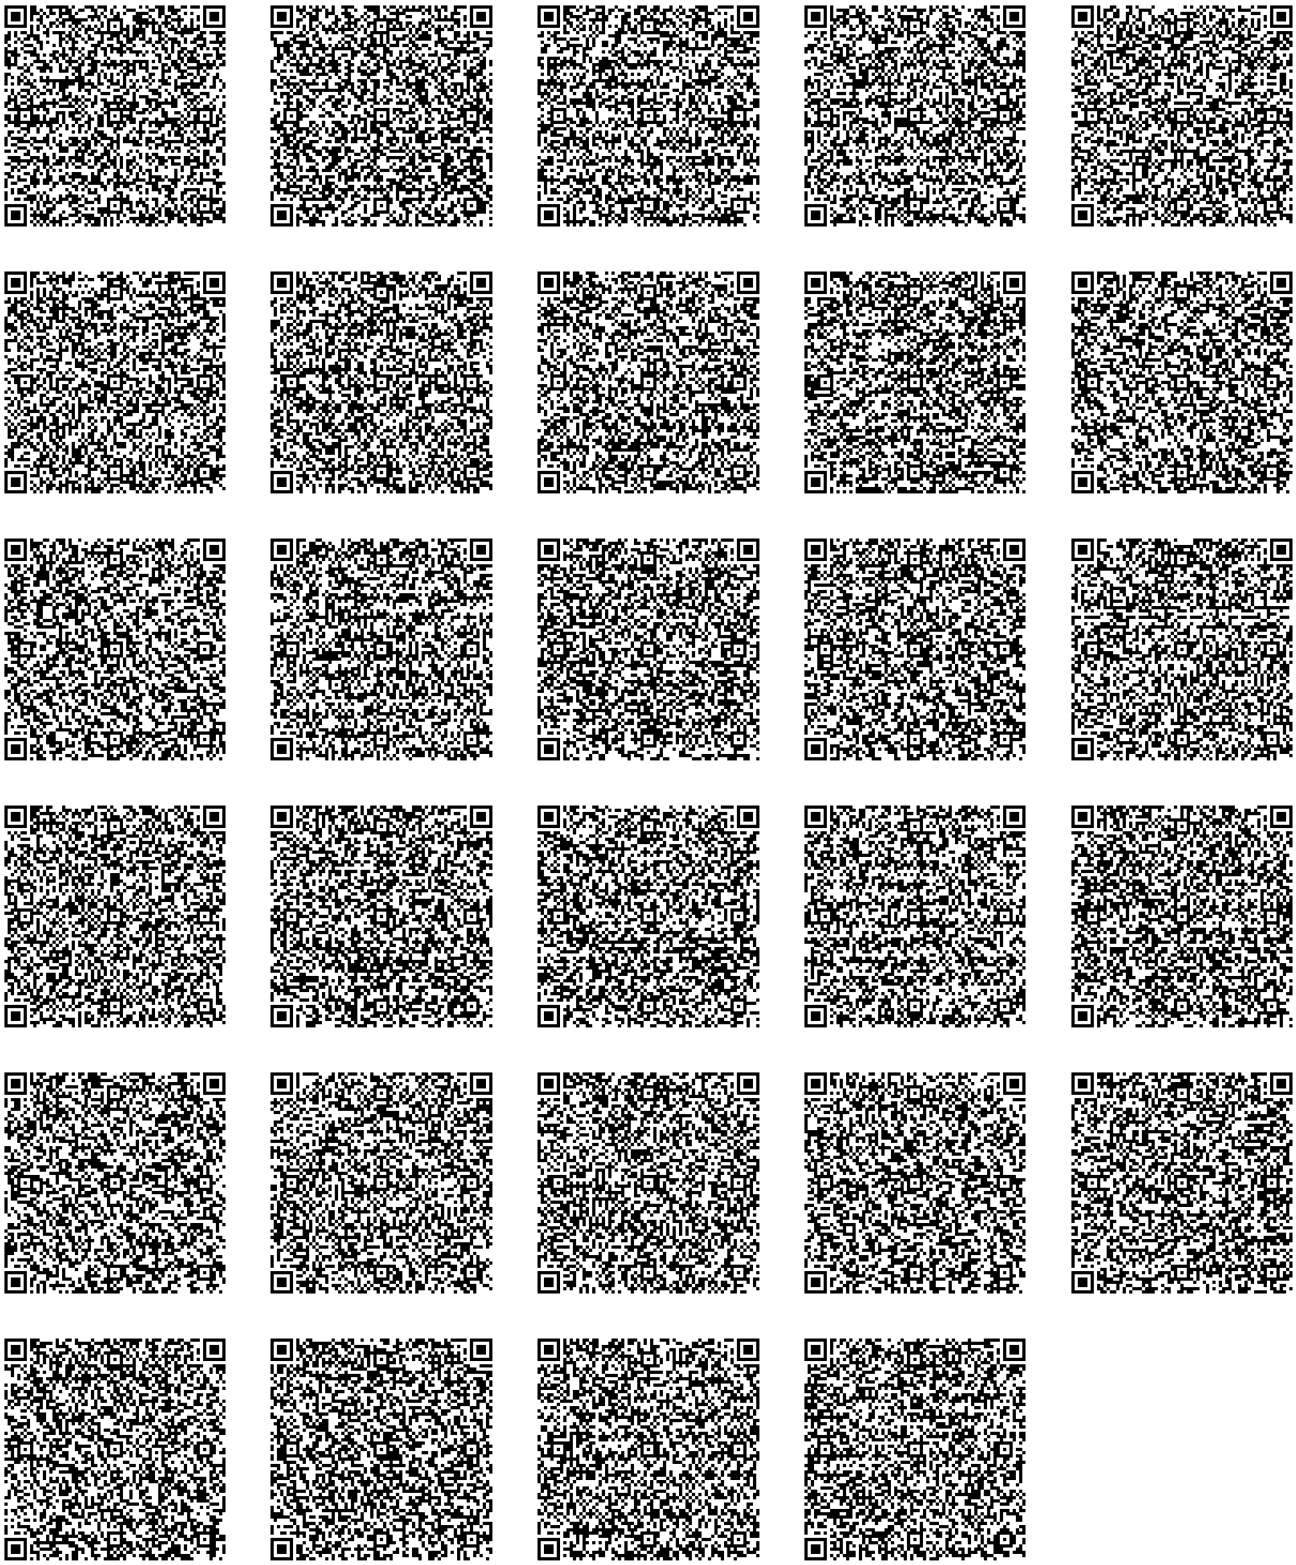
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
851008350168 - БЕКБАЕВ МАНАРБЕК МАУЛИЕВИЧ	Директор	13.12.2024 11:07
Представители технического надзора		
620420350297 - АЛИМАНОВ ДАУРЕНБЕК НУРЛАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	17.12.2024 07:13
Представители авторского надзора		
620730350143 - НУРГИСИН СЕРИК ЗИЯДОВИЧ	Инженер авторского надзора	13.12.2024 15:43
Представители заказчика		
820201401995 - ШУЛАКОВА ДИАНА РАШИДОВНА	Ведущий специалист	18.12.2024 13:25
910115350081 - КОЖАМЖАРОВ ДАМИР КАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	17.12.2024 14:16
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник сметного отдела	18.12.2024 17:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана	19.12.2024 04:29
