Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **070740016122 - ТОО "ЖӘРДЕМ-2007"**

Стройка: **Строительство школы в районе улиц Е796 и Е899 в районе Нұра города Астана на 2 000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **308 от 16.10.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ (ЭС)				
			Раздел: Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ				
			Подраздел: Т-1 - 77м				
1	1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	71.07	8 695	617 953
2	2	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	3.35	9 738	32 622
3	3	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	652.8	620	404 736
4	4	241-207-0605РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	652.8	4 288	2 799 206
5	5	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17651904	336 740	59 440
6	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	49.52	4 539	224 771
7	7	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	54.472	3 490	190 107
8	8	6101-0208-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	м3	71.07	2 793	198 498
9	9	412-102-0117РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2487.45	55	136 809
10	10	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	71.07	84	5 969

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Т-1 - 77м				**4 670 115**
			Подраздел: Колодцы смотровые				
11	48	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	61.2	495	30 293
12	49	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	27.75	70	1 942
13	50	6101-0208-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	м3	22.26	2 793	62 172
14	51	412-102-0117РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	779.1	55	42 850
15	52	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22.26	84	1 870
16	53	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	5.388	140 032	754 492
17	54	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6/0,02м3/	шт.	3	7 087	21 261
18	55	225-101-0101РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3/0,049м3/	шт.	3	13 772	41 316
19	56	225-101-0613РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1/0,55м3/	шт.	3	55 789	167 367
20	57	225-101-0111РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/0,587м3/	шт.	3	52 390	157 170
21	58	225-101-0603РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20/0,59м3/	шт.	3	68 415	205 245
22	59	261-107-0626РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	27	785	21 195
23	60	244-202-0108РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	63 066	189 198
24	61	6124-0201-1002 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг	шт.	6	1 894	11 364
25	62	243-907-0703РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	6	1 384	8 304
26	63	6124-0201-1005 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка полок кабельных, на стойках, масса до 0,7 кг	шт.	18	212	3 816
27	64	243-907-0508РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1163 УТ2,5	шт.	18	1 082	19 476
			Итого по подразделу: Колодцы смотровые				**1 739 333**
			Подраздел: Электромонтажные работы				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	65	6124-0201-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	504	2 381	1 200 024
29	66	6124-0201-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	112	2 381	266 672
30	67	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	616	2 754	1 696 464
31	68	6124-0201-0605 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	80	4 068	325 440
32	69	6124-0201-0605 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	720	4 068	2 928 960
33	70	243-123-7151РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 4х240 (мс)-1	м	2072	5 807	12 032 104
34	71	6124-0201-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	630	2 381	1 500 030
35	72	6124-0201-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	140	2 381	333 340
36	73	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	355.2	2 754	978 221
37	74	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	330	2 754	908 820
38	75	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	13	2 754	35 802
39	76	6124-0201-0605 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	6	4 068	24 408
40	77	6124-0201-0605 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	80	4 068	325 440
41	78	6124-0201-0605 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	480	4 068	1 952 640
42	79	243-123-7149РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 4х150 (мс)-1	м	2066	3 768	7 784 688
			Итого по подразделу: Электромонтажные работы				**32 293 053**
			Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ				**38 702 502**
			Итого по локальной смете: Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ (ЭС)				**38 702 502**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту:				**38 702 502**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)			38702502.174 x 7.30%	2 825 282
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			38702502.174 + 2825282.733	41 527 784
			Сметная прибыль, 5.00%			41527784.906 x 5.00%	2 076 389
			Непредвиденные расходы, 2.000%			41527784.906 x 2.000%	830 555
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				44 434 729
			коэф 2 кв, к = 1.0368			44434729.850 x 1.0368	46 069 927
			НДС (12%)			46069927.908 x 12%	5 528 391
			Итого с НДС			46069927.908 + 5528391.349	51 598 319

Лист согласования
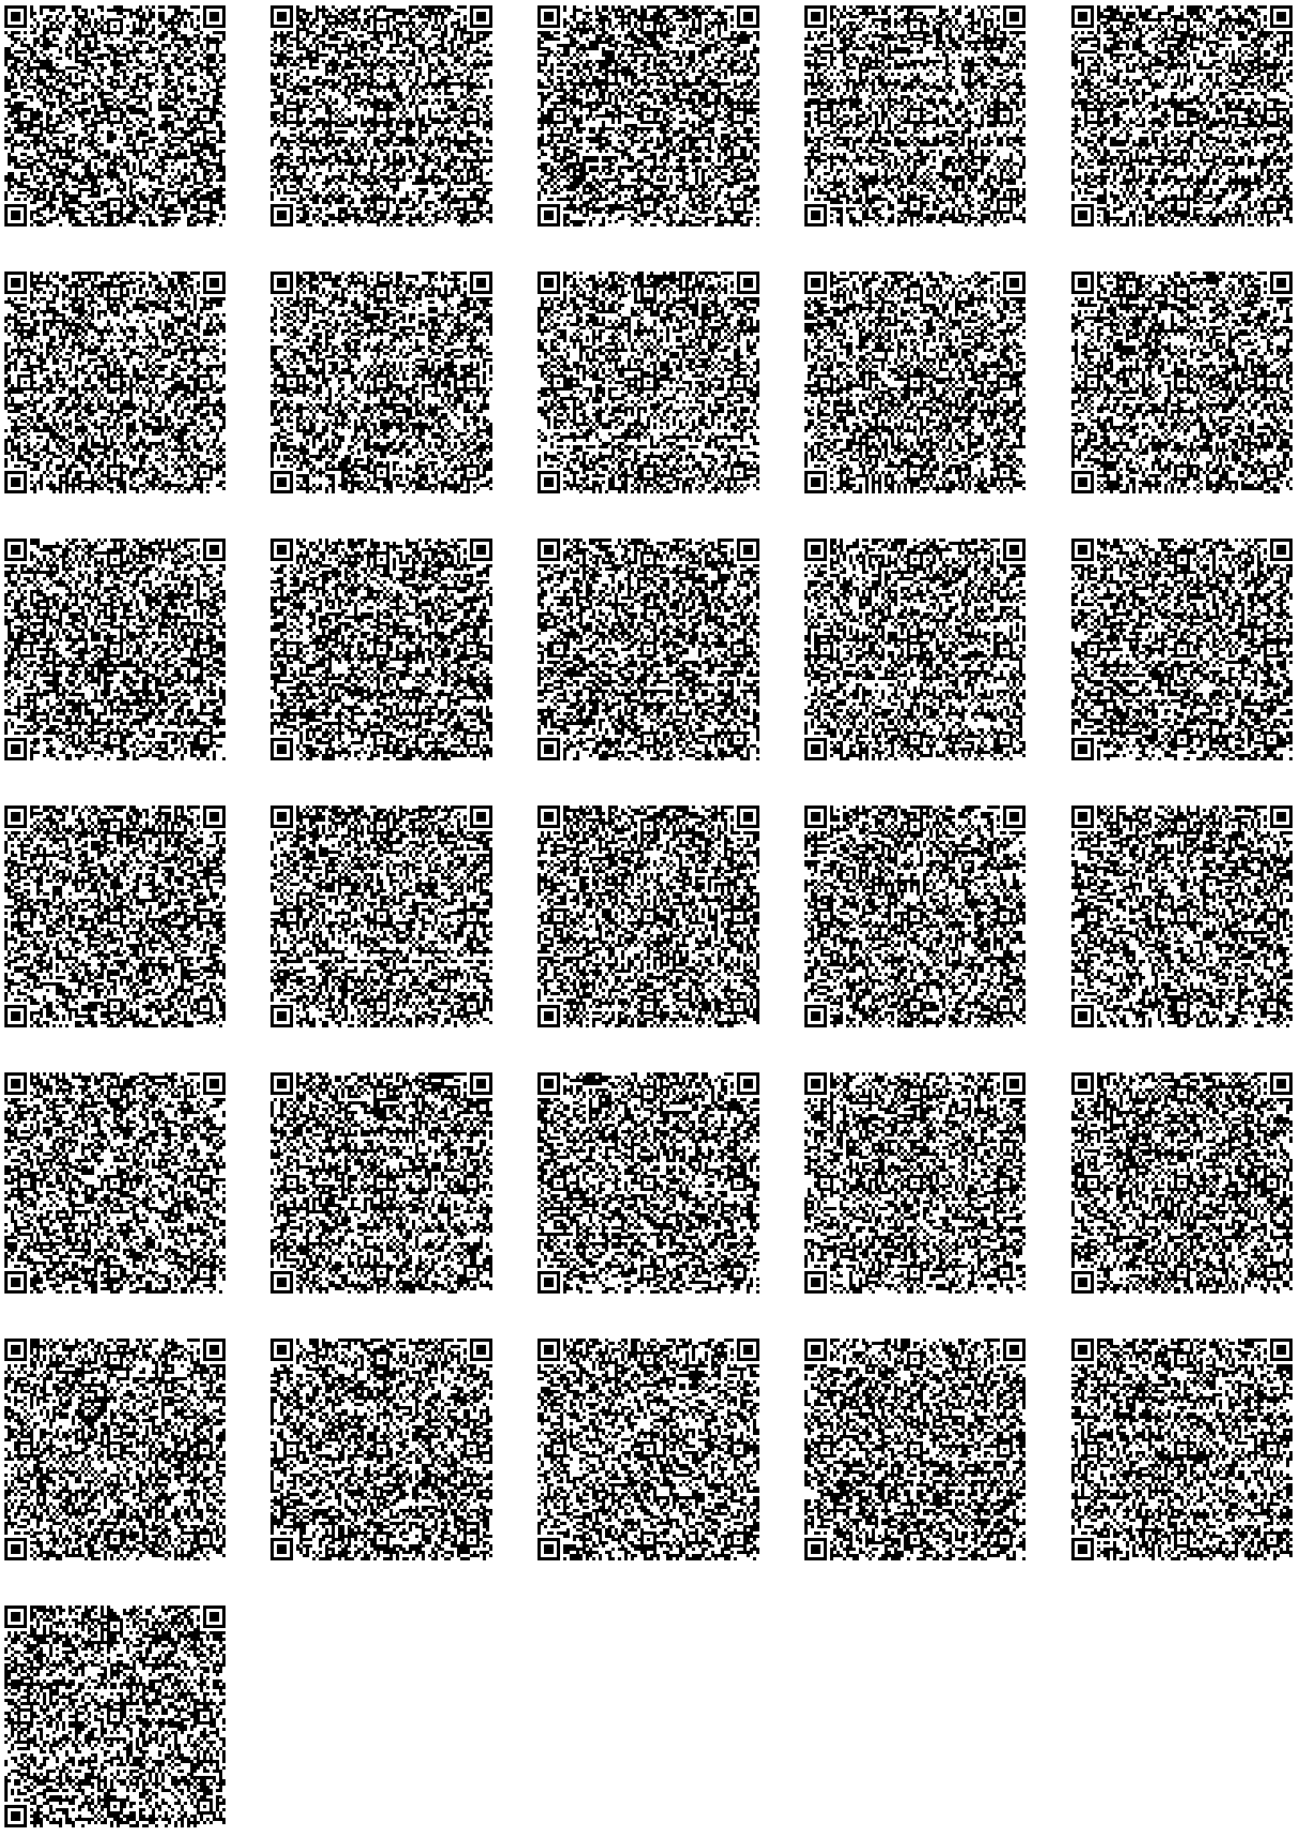
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
851008350168 - БЕКБАЕВ МАНАРБЕК МАУЛИЕВИЧ	Директор	20.12.2024 11:59
Представители технического надзора		
700306301975 - ТЕМЕРКАНОВ КЕНЖИБЕК ТСУПКАЛИЕВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 07:28
Представители авторского надзора		
620730350143 - НУРГИСИН СЕРИК ЗИЯДОВИЧ	Инженер авторского надзора	21.12.2024 05:24
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник сметного отдела	26.12.2024 15:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
910115350081 - КОЖАМЖАРОВ ДАМИР КАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	25.12.2024 04:13
820201401995 - ШУЛАКОВА ДИАНА РАШИДОВНА	Ведущий специалист	26.12.2024 12:28
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана	27.12.2024 05:20
