Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **070740016122 - ТОО "ЖӘРДЕМ-2007"**

Стройка: **Строительство школы в районе улиц Е796 и Е899 в районе Нұра города Астана на 2 000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **308 от 16.10.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Тепловые сети. Конструкции железобетонные				
1	1	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	274	495	135 629
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8.8152	10 434	91 978
3	3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /из временного отвала - 50м/	м3 грунта	127.1052	70	8 897
4	4	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	127.1052	279	35 462
5	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127.1052	709	90 117
6	6	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	18.606	9 738	181 185
7	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	82.31	4 539	373 605
8	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	90.541	3 490	315 988
9	9	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	155.71	500	77 855

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5449.85	59	321 541
11	11	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	155.71	84	13 080
12	12	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	43.36	39 429	1 709 641
13	13	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	24.5	126 854	3 107 923
14	14	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3.51	102 802	360 835
15	15	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	15.35	102 802	1 578 011
16	16	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10	78 062	780 620
			Итого по локальной смете: Тепловые сети. Конструкции железобетонные				**9 182 368**
			ИТОГО по акту:				**9 182 368**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	9182368.795 x 7.30%	670 312
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	9182368.795 + 670312.940	9 852 681
	Сметная прибыль, 5.00%	9852681.735 x 5.00%	492 634
	Непредвиденные расходы, 2.000%	9852681.735 x 2.000%	197 053
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		10 542 369
	коэф 2 кв, к = 1.0368	10542369.456 x 1.0368	10 930 328
	НДС (12%)	10930328.652 x 12%	1 311 639
	Итого с НДС	10930328.652 + 1311639.438	12 241 968

Лист согласования
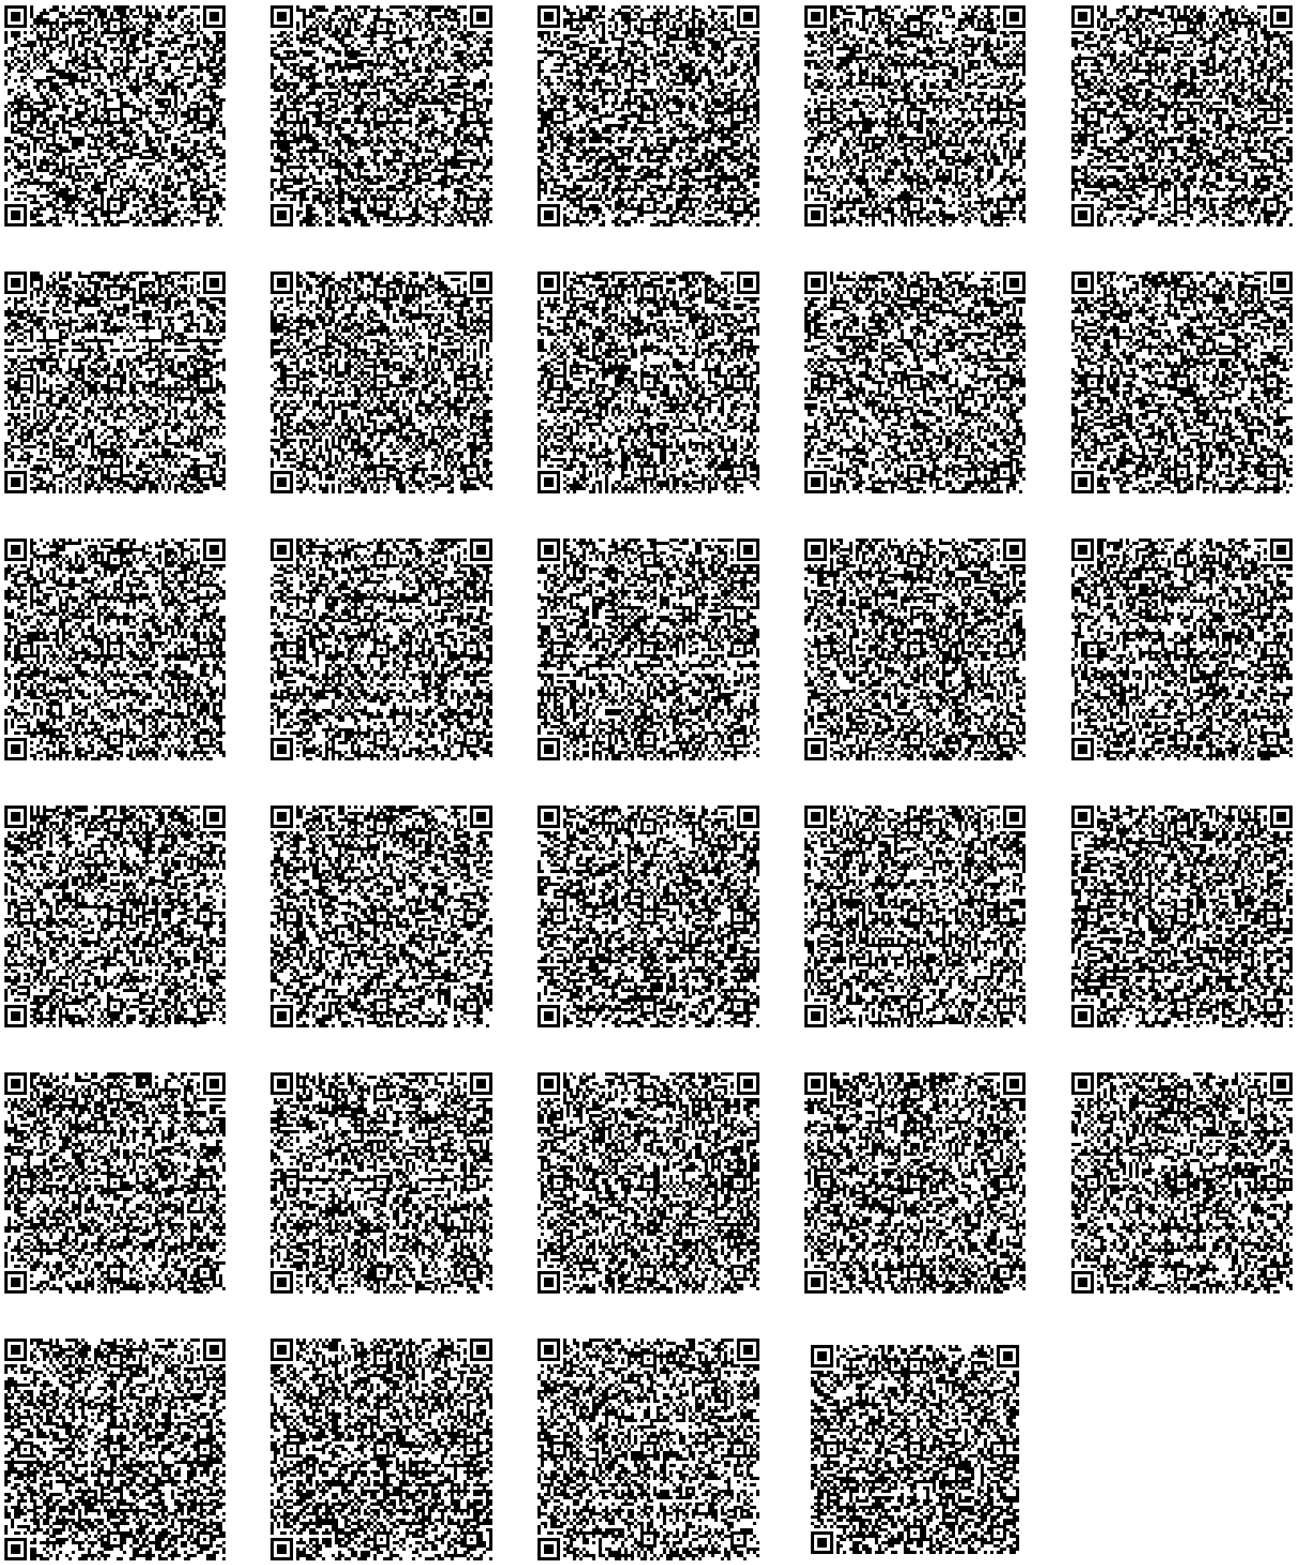
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
851008350168 - БЕКБАЕВ МАНАРБЕК МАУЛИЕВИЧ	Директор	24.12.2024 18:09
Представители технического надзора		
850203350571 - ЖУМАНБАЕВ ЖАНБЕК МУРАТБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	25.12.2024 11:39
Представители авторского надзора		
620730350143 - НУРГИСИН СЕРИК ЗИЯДОВИЧ	Инженер авторского надзора	24.12.2024 18:21
Представители заказчика		
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана	27.12.2024 05:23
820201401995 - ШУЛАКОВА ДИАНА РАШИДОВНА	Ведущий специалист	26.12.2024 12:45
910115350081 - КОЖАМЖАРОВ ДАМИР КАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	25.12.2024 13:51
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник сметного отдела	26.12.2024 15:36 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
