Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **070740016122 - ТОО "ЖӘРДЕМ-2007"**

Стройка: **Строительство школы в районе улиц Е796 и Е899 в районе Нұра города Астана на 2 000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **308 от 16.10.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Тепловые сети. Часть ТС				
1	1	6123-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм	км	0.2006	4 984 583	999 907
2	2	241-402-0116 СпрСЦ 04.2024	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	200.6	13 090	2 625 854
3	3	6123-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	18	100 985	1 817 730
4	4	241-406-0409 РСНБ РК 2022	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм	шт.	2	242 515	485 030
5	5	241-405-0109 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	12	66 044	792 528
6	6	241-414-0109 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
7	7	241-414-0109 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
8	8	241-408-0107 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	44	11 482	505 208
9	10	6111-0101-2202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	9.576	168 900	1 617 386

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	212.8	6 789	1 444 699
11	12	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200.6	26	5 216
12	13	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	200.6	125	25 075
			Итого по локальной смете: Тепловые сети. Часть ТС				**10 513 081**
			ИТОГО по акту:				**10 513 081**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	10513081.000 x 7.30%	767 454
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	10513081.000 + 767454.933	11 280 535
	Сметная прибыль, 5.00%	11280535.933 x 5.00%	564 026
	Непредвиденные расходы, 2.000%	11280535.933 x 2.000%	225 610
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		12 070 173
	коэф 2 кв, к = 1.0368	12070173.448 x 1.0368	12 514 355
	НДС (12%)	12514355.831 x 12%	1 501 722
	Итого с НДС	12514355.831 + 1501722.700	14 016 078

Лист согласования
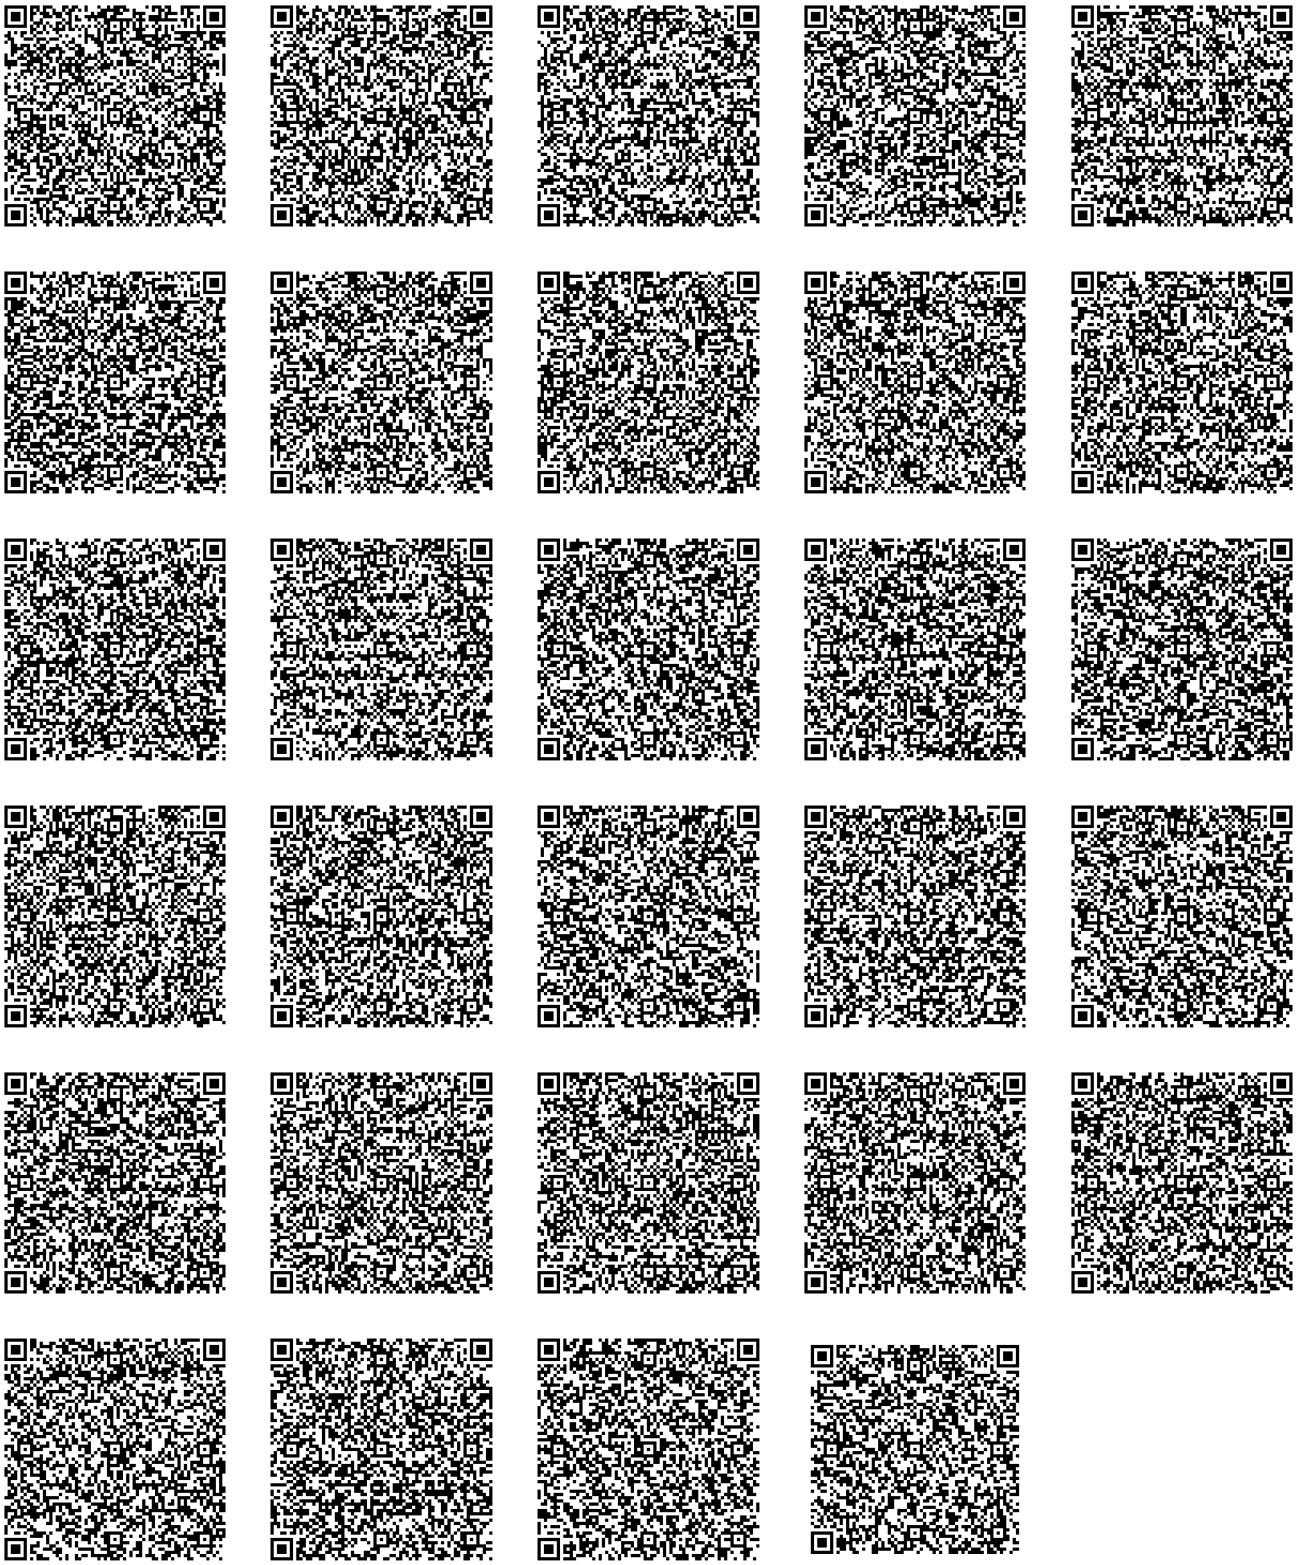
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
851008350168 - БЕКБАЕВ МАНАРБЕК МАУЛИЕВИЧ	Директор	24.12.2024 18:09
Представители технического надзора		
850203350571 - ЖУМАНБАЕВ ЖАНБЕК МУРАТБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	25.12.2024 11:34
Представители авторского надзора		
620730350143 - НУРГИСИН СЕРИК ЗИЯДОВИЧ	Инженер авторского надзора	24.12.2024 18:20
Представители заказчика		
910115350081 - КОЖАМЖАРОВ ДАМИР КАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	25.12.2024 13:50
820201401995 - ШУЛАКОВА ДИАНА РАШИДОВНА	Ведущий специалист	26.12.2024 12:53
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник сметного отдела	26.12.2024 15:37 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана	27.12.2024 05:23
