Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **070740016122 - ТОО "ЖӘРДЕМ-2007"**

Стройка: **Строительство школы в районе улиц Е796 и Е899 в районе Нұра города Астана на 2 000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **308 от 16.10.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные ниже 0.000 (КЖ)				
			Раздел: Блок 1				
			Подраздел: Фм-2 /л.КЖ-112/				
1	23	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3.37	41 515	139 906
2	24	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00456	345 153	1 574
3	25	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.33158	326 979	108 420
			Итого по подразделу: Фм-2 /л.КЖ-112/				**249 900**
			Подраздел: Фм-3 /л.КЖ-113/				
4	26	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3.16	41 515	131 187
5	27	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00304	345 153	1 049
6	28	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.28552	326 979	93 359
			Итого по подразделу: Фм-3 /л.КЖ-113/				**225 595**
			Подраздел: Фм-4 /л.КЖ-119/				
7	29	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	16.9	16 177	273 391
8	30	6111-0403-0203ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	169	355	59 995
9	31	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	16.9	31 613	534 260
10	32	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	65.84	41 515	2 733 348

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	33	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6.68287	326 979	2 185 158
			Итого по подразделу: Фм-4 /л.КЖ-119/				**5 786 152**
			Подраздел: Стены цоколя СЦм-2/л.КЖ-114/				
12	56	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.76	95 269	72 404
13	57	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00734	345 153	2 533
14	58	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.02784	339 262	9 445
			Итого по подразделу: Стены цоколя СЦм-2/л.КЖ-114/				**84 382**
			Подраздел: Стены цоколя СЦм-3/л.КЖ-115/				
15	59	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.62	95 269	59 067
16	60	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00842	345 153	2 906
17	61	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.02748	339 262	9 323
			Итого по подразделу: Стены цоколя СЦм-3/л.КЖ-115/				**71 296**
			Подраздел: Стены цоколя СЦм-4/л.КЖ-123/				
18	62	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	38.08	95 269	3 627 844
19	63	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.38127	345 153	131 596
20	64	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1.374	339 262	466 146
			Итого по подразделу: Стены цоколя СЦм-4/л.КЖ-123/				**4 225 586**
			Подраздел: Рампа РМм-1 /л.КЖ-124/				
21	65	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	28.39	40 941	1 162 315
22	66	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.10488	345 153	36 200
23	67	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10.2294	326 979	3 344 799
			Итого по подразделу: Рампа РМм-1 /л.КЖ-124/				**4 543 314**
			Итого по разделу: Блок 1				**15 186 225**
			Раздел: Блок 4				
			Подраздел: Фм-2 /л.КЖ-57/				
24	185	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3.63	16 177	58 723
25	186	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	3.63	31 613	114 755

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	187	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	13.29	41 515	551 734
27	188	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01638	345 153	5 654
28	189	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.09702	339 262	32 915
29	190	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.31208	326 979	429 023
			Итого по подразделу: Фм-2 /л.КЖ-57/				**1 192 804**
			Подраздел: Фм-3 /л.КЖ-60/				
30	191	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.92	16 177	47 237
31	192	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	2.92	31 613	92 310
32	193	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	10.84	41 515	450 023
33	194	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01092	345 153	3 769
34	195	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.05852	339 262	19 854
35	196	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4724	326 979	154 465
			Итого по подразделу: Фм-3 /л.КЖ-60/				**767 658**
			Подраздел: Фм-4 /л.КЖ-61/				
36	197	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.52	16 177	40 766
37	198	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	2.52	31 613	79 665
38	199	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	9.18	41 515	381 108
39	200	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00936	345 153	3 231
40	201	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0462	339 262	15 673
41	202	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.77274	326 979	252 670
			Итого по подразделу: Фм-4 /л.КЖ-61/				**773 114**
			Подраздел: Стены цоколя СЦм-3/л.КЖ-58/				
42	242	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	7.41	95 269	705 943
43	243	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06813	345 153	23 515

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	244	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.2565	339 262	87 021
			Итого по подразделу: Стены цоколя СЦм-3/л.КЖ-58/				**816 479**
			Подраздел: Стены цоколя СЦм-4/л.КЖ-62/				
45	245	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	3.93	95 269	374 407
46	246	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03753	345 153	12 954
47	247	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.07857	339 262	26 656
48	248	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.00924	326 979	3 021
			Итого по подразделу: Стены цоколя СЦм-4/л.КЖ-62/				**417 038**
			Итого по разделу: Блок 4				**3 967 093**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные ниже 0.000 (КЖ)				**19 153 318**
			ИТОГО по акту:				**19 153 318**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	19153318.000 x 7.30%	1 398 192
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	19153318.000 + 1398192.251	20 551 510
	Сметная прибыль, 5.00%	20551510.251 x 5.00%	1 027 575
	Непредвиденные расходы, 2.000%	20551510.251 x 2.000%	411 030
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		21 990 115
	коэф 2 кв, к = 1.0368	21990115.968 x 1.0368	22 799 352
	НДС (12%)	22799352.236 x 12%	2 735 922
	Итого с НДС	22799352.236 + 2735922.268	25 535 274

Лист согласования
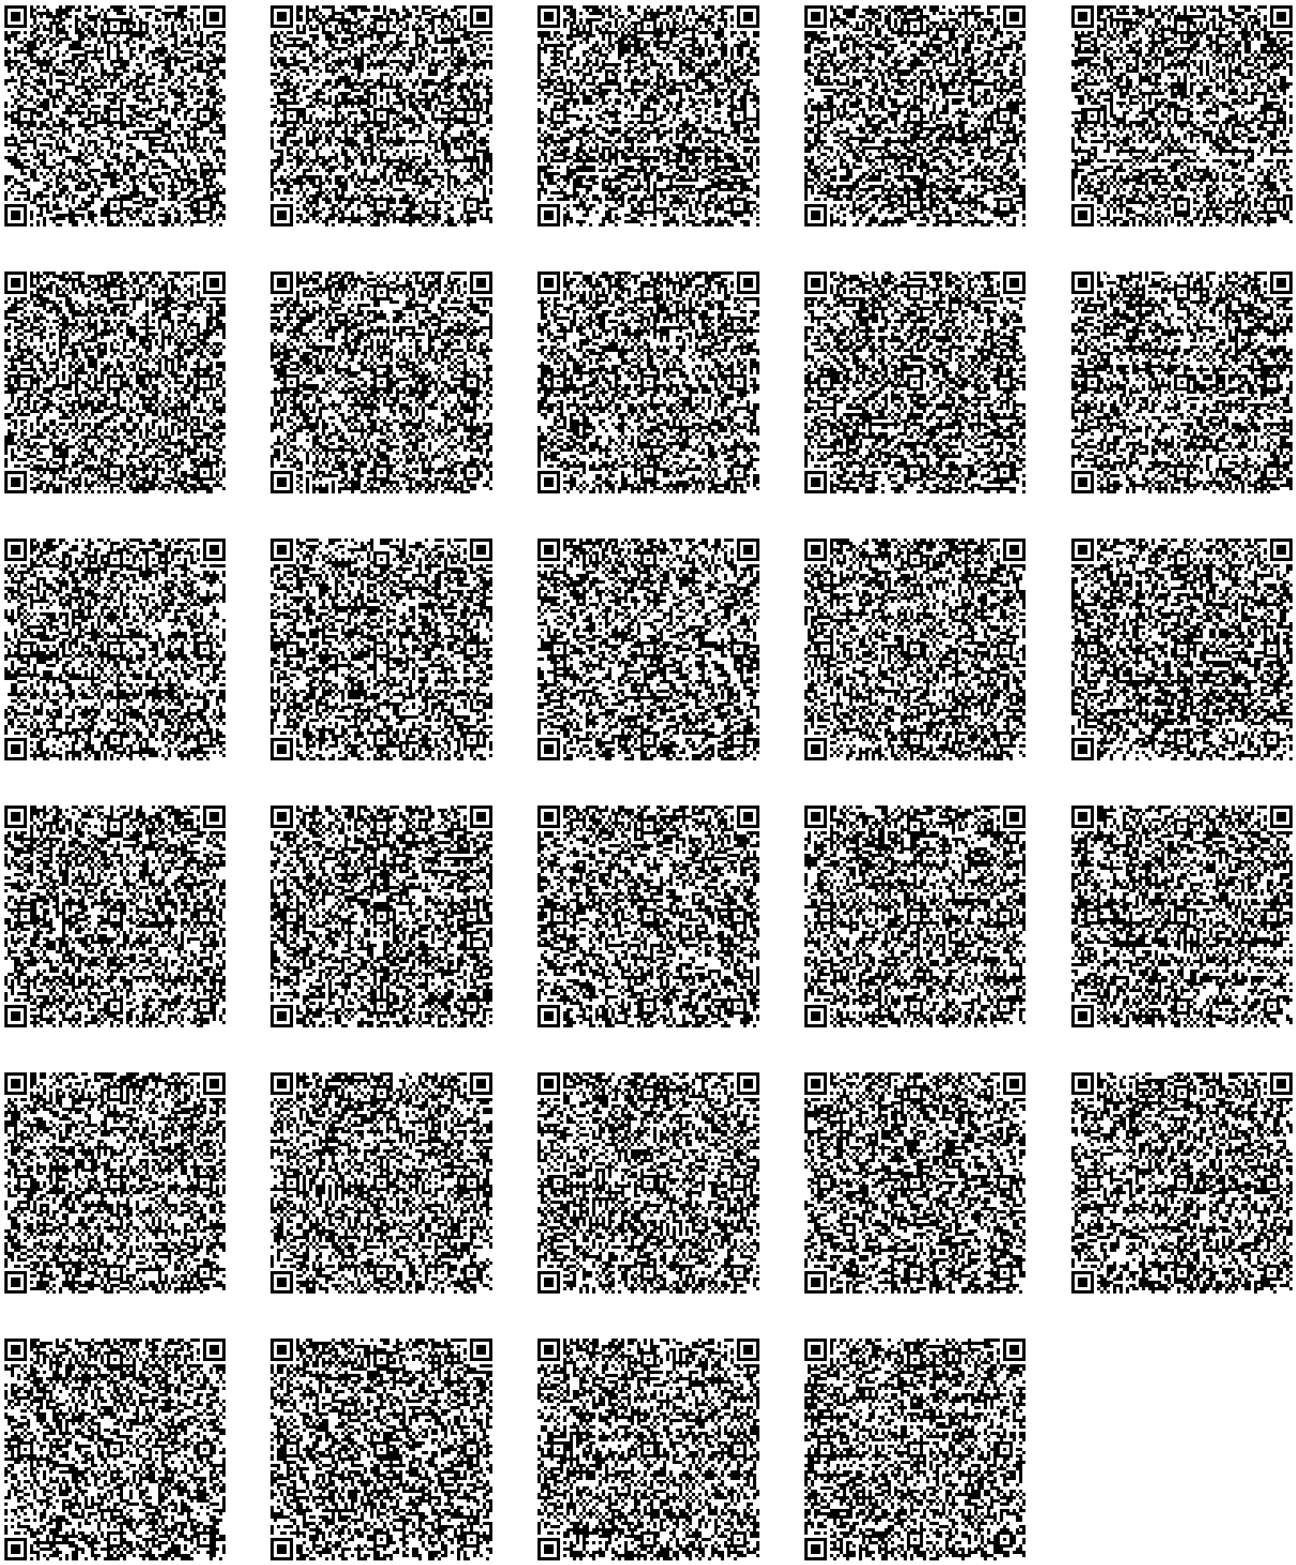
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
851008350168 - БЕКБАЕВ МАНАРБЕК МАУЛИЕВИЧ	Директор	23.12.2024 14:14
Представители технического надзора		
620420350297 - АЛИМАНОВ ДАУРЕНБЕК НУРЛАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 07:25
Представители авторского надзора		
620730350143 - НУРГИСИН СЕРИК ЗИЯДОВИЧ	Инженер авторского надзора	23.12.2024 15:58
Представители заказчика		
820201401995 - ШУЛАКОВА ДИАНА РАШИДОВНА	Ведущий специалист	26.12.2024 12:40
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник сметного отдела	26.12.2024 15:32 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
910115350081 - КОЖАМЖАРОВ ДАМИР КАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	25.12.2024 04:16
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана	27.12.2024 05:22
