Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **070740016122 - ТОО "ЖӘРДЕМ-2007"**

Стройка: **Строительство школы в районе улиц Е796 и Е899 в районе Нұра города Астана на 2 000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **308 от 16.10.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вертикальная планировка				
			Раздел: Вертикальная планировка в границах участка				
1	3	6101-0101-0223ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	7920.1	372	2 946 277
2	4	412-102-0216РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	277203.5	31	8 593 308
3	5	6101-0104-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	7920.1	184	1 457 298
4	6	6101-0104-0210ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201/до 50 м/	м3	7920.1	465	3 682 846
5	7	6101-0107-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7920.1	253	2 003 785
6	8	6101-0107-0108ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7920.1	90	712 809
			Итого по разделу: Вертикальная планировка в границах участка				**19 396 324**
			Итого по локальной смете: Вертикальная планировка				**19 396 324**
			ИТОГО по акту:				**19 396 324**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	19396324.900 x 7.30%	1 415 931
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	19396324.900 + 1415931.755	20 812 256
	Сметная прибыль, 5.00%	20812256.655 x 5.00%	1 040 612
	Непредвиденные расходы, 2.000%	20812256.655 x 2.000%	416 245
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		22 269 114
	коэф 2 кв, к = 1.0368	22269114.621 x 1.0368	23 088 618
	НДС (12%)	23088618.039 x 12%	2 770 634
	Итого с НДС	23088618.039 + 2770634.165	25 859 252

Лист согласования
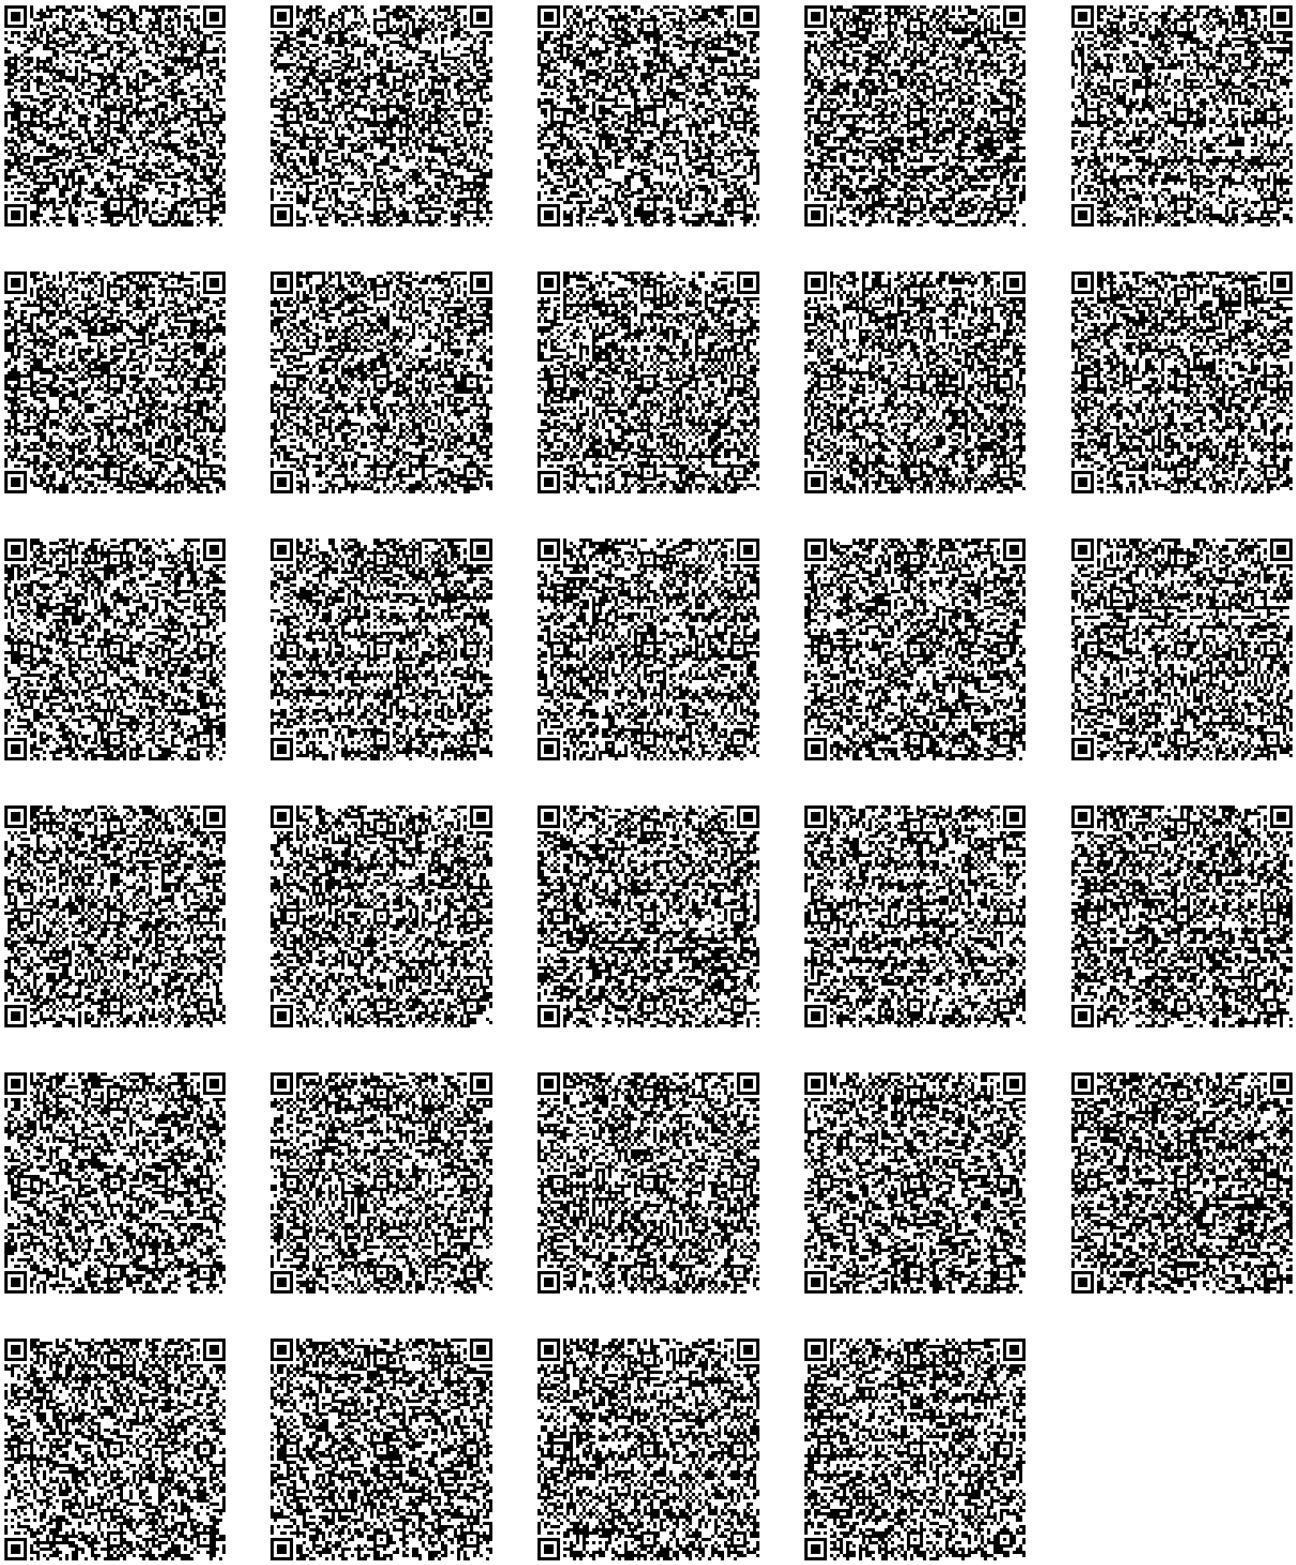
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
851008350168 - БЕКБАЕВ МАНАРБЕК МАУЛИЕВИЧ	Директор	23.12.2024 10:54
Представители технического надзора		
620420350297 - АЛИМАНОВ ДАУРЕНБЕК НУРЛАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 07:26
Представители авторского надзора		
620730350143 - НУРГИСИН СЕРИК ЗИЯДОВИЧ	Инженер авторского надзора	23.12.2024 11:52
Представители заказчика		
910115350081 - КОЖАМЖАРОВ ДАМИР КАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	25.12.2024 06:21
820201401995 - ШУЛАКОВА ДИАНА РАШИДОВНА	Ведущий специалист	26.12.2024 12:34
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник сметного отдела	26.12.2024 15:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана	27.12.2024 05:21
