Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **161240012559 - ТОО Prof-Facade**

Стройка: **Строительство объектов (сооружений) для массового пребывания посетителей на территории ГНПП «Бурабай» с размещением парковочных мест**

Договор подряда (контракт) №: **26 от 18.03.2025 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструктивные решения. Иманаевский ручей				
			Раздел: Металлоконструкции				
1	23	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	0.5	772 122	386 061
2	24	222-507-0602РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	0.52	1 126 609	585 837
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**971 898**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Иманаевский ручей				**971 898**
			Локальная смета: Конструктивные решения. Долина любви				
			Раздел: Земляные работы				
3	1	6101-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 6.	м3	4.6	57 924	266 450
			Итого по разделу: Земляные работы				**266 450**
			Раздел: Металлоконструкции				
4	6	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	1.9	772 122	1 467 032
5	7	222-507-0602РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	1.976	1 126 609	2 226 179
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**3 693 211**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Долина любви				**3 959 661**
			Локальная смета: Конструктивные решения. Скала аютас				
			Раздел: Металлоконструкции				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	23	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	5	772 122	3 860 610
7	24	222-507-0602РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	5.2	1 126 609	5 858 367
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**9 718 977**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Скала акотас				**9 718 977**
			Локальная смета: Конструктивные решения. Мыс горелый				
			Раздел: Земляные работы				
8	1	6101-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 6.	м3	6.3	57 924	364 921
			Итого по разделу: Земляные работы				**364 921**
			Раздел: Фундаменты				
9	2	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-1/	м3	6.11	42 868	261 923
10	3	212-101-0902РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	6.20165	29 094	180 431
			Итого по разделу: Фундаменты				**442 354**
			Раздел: Металлоконструкции				
11	6	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	6.753	772 122	5 214 140
12	7	222-507-0602РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	7.02312	1 126 609	7 912 310
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**13 126 450**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Мыс горелый				**13 933 725**
			Локальная смета: Дорожное покрытие. Парк Бишы Кайын				
			Раздел: ТИП 5. Покрытие тропы здоровья				
13	15	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м3	0.869	19 140	16 633
14	16	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Галька	тн	1.3335	183 893	245 221
			Итого по разделу: ТИП 5. Покрытие тропы здоровья				**261 854**
			Раздел: ТИП 6. Покрытие тропы здоровья				
15	17	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	1.016	16 488	16 752

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	18	211-302-0302РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1.04648	28 978	30 325
			Итого по разделу: ТИП 6. Покрытие тропы здоровья				**47 077**
			Раздел: ТИП 7. Покрытие тропы здоровья				
17	19	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м3	0.995	19 135	19 039
18	20	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Мульча /9,95 м2-60 л на 1 м2±597 литров/	л.	597	5 421	3 236 594
			Итого по разделу: ТИП 7. Покрытие тропы здоровья				**3 255 633**
			Раздел: ТИП 8. Покрытие тропы здоровья				
19	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м3	1.763	19 140	33 744
20	22	211-501-0103РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	2.25664	4 406	9 943
			Итого по разделу: ТИП 8. Покрытие тропы здоровья				**43 687**
			Раздел: ТИП 9. Покрытие тропы здоровья				
21	23	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	1.135	21 890	24 845
			Итого по разделу: ТИП 9. Покрытие тропы здоровья				**24 845**
			Раздел: ТИП 10. Покрытие тропы здоровья				
22	24	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	1.075	16 342	17 568
23	25	211-101-0102РСНБ РК 2022	Земля растительная	м3	1.204	1 765	2 125
			Итого по разделу: ТИП 10. Покрытие тропы здоровья				**19 693**
			Раздел: ТИП 11. Покрытие тропы здоровья				
24	26	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	1.482	19 765	29 292
25	27	211-201-0601РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.42978	4 602	1 978
26	28	211-201-0604РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.13338	4 034	538
27	29	211-201-0607РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1.482	3 946	5 848
			Итого по разделу: ТИП 11. Покрытие тропы здоровья				**37 656**
			Отдел: Включаемые работы				
			Раздел: Подгтовительные работы				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	33	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	261.3454154	120	31 361
29	34	6101-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	261.3454154	595	155 500
30	35	412-102-0118РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	14635.3432629	52	761 038
31	36	6101-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	261.3454154	65	16 987
			Итого по разделу: Подгтовительные работы				**964 887**
			Раздел: ТИП 1. Покрытие детских площадок				
32	37	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.	м	466	5 521	2 572 786
33	38	255-101-0102РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м3	7.456	85 344	636 325
34	39	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	103.8224	10 485	1 088 578
35	40	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	105.898848	27 958	2 960 720
			Итого по разделу: ТИП 1. Покрытие детских площадок				**7 258 409**
			Раздел: ТИП 2. Покрытие тропы здоровья				
36	41	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.	м	90	5 521	496 890
37	42	255-101-0102РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м3	1.44	85 344	122 895
			Подраздел: РПокрытие спортивных площадок				
38	43	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	43.4049	10 485	455 100
39	44	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44.272998	27 958	1 237 784
			Итого по подразделу: РПокрытие спортивных площадок				**1 692 884**
			Итого по разделу: ТИП 2. Покрытие тропы здоровья				**2 312 669**
			Итого по отделу: Включаемые работы				**10 535 965**
			Итого по локальной смете: Дорожное покрытие. Парк Бишы Кайын				**14 226 410**
			Локальная смета: Конструктивные решения. Скала максимка				
			Раздел: Металлоконструкции				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	6	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	8	772 122	6 176 976
41	7	222-507-0602РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	8.32	1 126 609	9 373 387
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**15 550 363**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Скала максимка				**15 550 363**
			Локальная смета: Дорожное покрытие. Парк Биппы Кайын				
			Раздел: ТИП 1. Покрытие детских площадок				
42	1	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.66	68 224	45 028
43	2	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.663	382 476	253 582
			Итого по разделу: ТИП 1. Покрытие детских площадок				**298 610**
			Раздел: Покрытие спортивных площадок				
44	3	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.15	68 224	10 234
45	4	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.15414	382 476	58 955
			Итого по разделу: Покрытие спортивных площадок				**69 189**
			Итого по локальной смете: Дорожное покрытие. Парк Биппы Кайын				**367 799**
			Локальная смета: МАФ. Парк Биппы Кайын				
			Раздел: Оборудование для спорта и детского развития				
46	28	8601-0201-0116 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)	комплект	1	941 457	941 457
47	30	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1 212 409	1 212 409
			Итого по разделу: Оборудование для спорта и детского развития				**2 153 866**
			Итого по локальной смете: МАФ. Парк Биппы Кайын				**2 153 866**
			Локальная смета: Устройство парковки №3				
			Отдел: Включаемые работы				
			Раздел: Переустройство КЛ-10 КВ				
			Подраздел: РТраншея				
48	39	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	27.804	510	14 180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	40	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	23.832	98	2 336
50	41	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	66.2	828	54 814
51	42	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4.3692	4 949	21 623
52	43	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	66.2	775	51 305
53	44	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.552	86 970	48 007
54	45	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	66.2	24	1 589
55	46	249-101-0502РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	66.2	67	4 435
			Итого по подразделу: РТраншея				**198 289**
			Подраздел: РКабель				
56	47	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	66.2	1 140	75 468
57	48	243-101-0307РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	км	0.066	5 240 809	345 893
58	49	6124-0201-1702 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	3	25 009	75 027
59	50	243-903-0502РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-70/120-СЛ-сб	комплект	3	30 898	92 694
			Итого по подразделу: РКабель				**589 082**
			Итого по разделу: Переустройство КЛ-10 КВ				**787 371**
			Итого по отделу: Включаемые работы				**787 371**
			Итого по локальной смете: Устройство парковки №3				**787 371**
			Локальная смета: Устройство парковки №2				
			Отдел: Включаемые работы				
			Раздел: Лоток для защиты коммуникаций				
60	42	6104-0903-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	3.4	35 561	120 907
61	43	261-101-0383РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3.4	57 413	195 204
			Итого по разделу: Лоток для защиты коммуникаций				**316 111**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по отделу: Включаемые работы				**316 111**
			Итого по локальной смете: Устройство парковки №2				**316 111**
			Локальная смета: Конструктивные решения. Скала туфелька				
			Раздел: Металлоконструкции				
62	16	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	2.5	772 122	1 930 305
63	17	222-507-0602РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	2.6	1 126 609	2 929 183
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**4 859 488**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Скала туфелька				**4 859 488**
			ИТОГО по акту:				**66 845 669**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.200%)	66845668.657 x 9.20%	6 149 801
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	66845668.657 + 6149801.389	72 995 470
	Сметная прибыль, (5.00%)	72995470.046 x 5.00%	3 649 774
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	72995470.046 x 5.000%	3 649 774
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		80 295 017
	В прогнозных ценах 2025 г, к = 1.1550	80295017.050 x 1.1550	92 740 745
	НДС (12%)	92740744.693 x 12%	11 128 889
	Итого с НДС	92740744.693 + 11128889.363	103 869 634
	Итого со скидкой	103869634.056 - 2.00%	101 792 241

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
931209300341 - МАҚМҰТОВ МҰХАМЕДЖАН АСҚАРҰЛЫ	Инженер ПТО	28.06.2025 11:02
Представители технического надзора		
580125302154 - РАЙКУЛОВ ЖАНГАЛИ МОЛДАТАЕВИЧ	Специалист по техническому надзору (эксперт)	28.06.2025 11:12
Представители авторского надзора		
801101399068 - ТАШКИН МАКСАТ АБАЕВИЧ	Начальник отдела авторского надзора	28.06.2025 11:15
Представители заказчика		
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК null	Заведующий отделом капитального строительства УДП РК	
771101300182 - НУРМАГАНБЕТОВ ДАУРЕН ДЕМЕСИНОВИЧ	Заведующий сектором капитального строительства ОКС УДП РК	28.06.2025 11:24

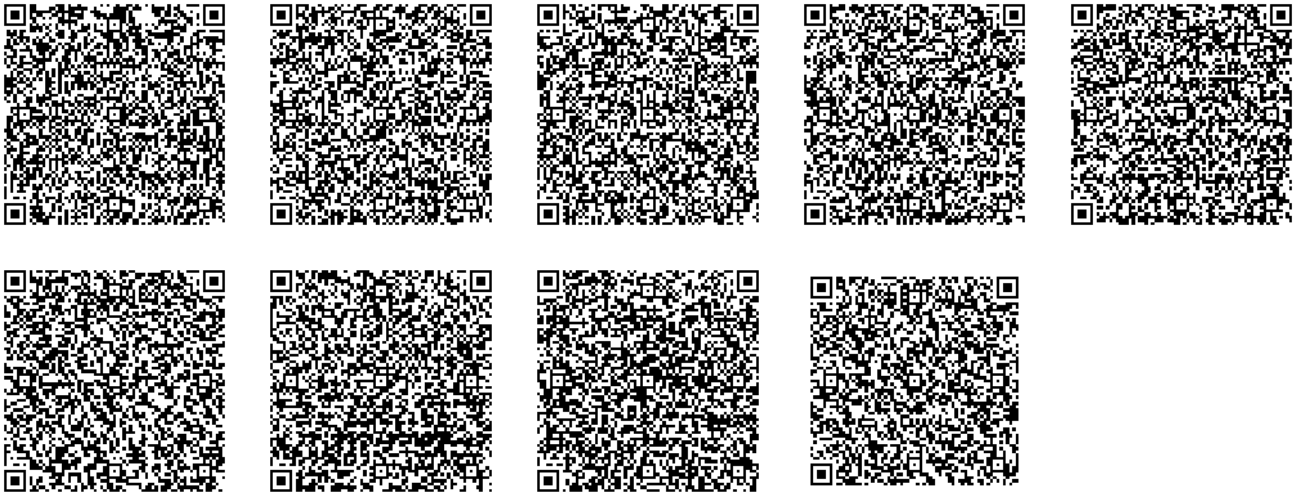

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **161240012559 - ТОО Prof-Facade**

Стройка: **Строительство объектов (сооружений) для массового пребывания посетителей на территории ГНПП «Бурабай» с размещением парковочных мест**

Договор подряда (контракт) №: **26 от 18.03.2025 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: МАФ. Парк Бишы Кайын				
			Раздел: Оборудование для спорта и детского развития				
1	15	Т перечень УСН РК 8.02-03-2023	Kenguru S-004. Стойка боксерская (с 2 мешками). КВ-002 Стойка боксерская (с 2 мешками). Габариты косплекса: в собранном виде- 2,5х0,45х3 м	шт	4	583 142	2 332 567
2	29	Т перечень УСН РК 8.02-03-2023	Брусья двойные для отжиманий разноуровневые К-009. К-009 Брусья двойные для отжиманий разноуровневые. Состав комплекса: Брусья-2шт Габариты компслекса (ДхШхВ): в собранном виде- 3,3х0,71х1,5 м	шт	2	317 448	634 896
			Итого по разделу: Оборудование для спорта и детского развития				**2 967 463**
			Итого по локальной смете: МАФ. Парк Бишы Кайын				**2 967 463**
			ИТОГО по акту:				**2 967 463**

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2967463.000 + 0.000	2 967 463
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	2967463.000 x 5.000%	148 373
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		3 115 836
	В прогнозных ценах 2025 г, к = 1.1550	3115836.150 x 1.1550	3 598 791
	НДС (12%)	3598790.753 x 12%	431 855
	Итого с НДС	3598790.753 + 431854.890	4 030 646
	Итого со скидкой	4030645.644 - 2.00%	3 950 033

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
931209300341 - МАҚМҰТОВ МҰХАМЕДЖАН АСҚАРҰЛЫ	Инженер ПТО	27.06.2025 22:32
Представители технического надзора		
580125302154 - РАЙКУЛОВ ЖАНГАЛИ МОЛДАТАЕВИЧ	Специалист по техническому надзору (эксперт)	28.06.2025 00:11
Представители авторского надзора		
801101399068 - ТАШКИН МАКСАТ АБАЕВИЧ	Начальник отдела авторского надзора	28.06.2025 10:40
Представители заказчика		
771101300182 - НУРМАГАНБЕТОВ ДАУРЕН ДЕМЕСИНОВИЧ	Заведующий сектором капитального строительства ОКС УДП РК	28.06.2025 11:27
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК null	Заведующий отделом капитального строительства УДП РК	
