Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **161240012559 - ТОО Prof-Facade**

Стройка: **Строительство объектов (сооружений) для массового пребывания посетителей на территории ГНПП «Бурабай» с размещением парковочных мест**

Договор подряда (контракт) №: **26 от 18.03.2025 года**

Акт выполненных работ
за Май 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструктивные решения. Иманаевский ручей				
			Раздел: Фундаменты				
1	1	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-1 из бетона кл. С25/30/	м3	0.36	74 560	26 842
2	2	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0864	1 601 064	138 332
3	3	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0474	285 993	13 556
4	4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.039	301 181	11 746
5	5	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.0762	1 486 435	113 266
6	6	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-2 из бетона кл. С25/30/	м3	0.6	74 560	44 736
7	7	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0942	1 601 064	150 820
8	8	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0546	285 993	15 615
9	9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0396	301 181	11 927

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.0732	1 486 435	108 807
11	11	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-3 из бетона кл. С25/30/	м3	0.48	74 560	35 789
12	12	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.1144	1 601 064	183 162
13	13	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0728	285 993	20 820
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0416	301 181	12 529
15	15	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.0808	1 486 435	120 104
16	16	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	36	3 377	121 572
17	17	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять. Количество слоев по 10 мм: 29	отверстие	36	1 064	38 304
18	18	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	36	3 377	121 572
19	19	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять. Количество слоев по 10 мм: 40	отверстие	36	1 468	52 848
20	20	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	3 377	162 096
21	21	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять. Количество слоев по 10 мм: 30	отверстие	48	1 101	52 848
22	22	217-103-0202 РСНБ РК 2022	Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл	шт.	36	30 269	1 089 684
			Итого по разделу: Фундаменты				**2 646 975**
			Раздел: Металлоконструкции				
23	23	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	0.78	772 122	602 255

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	222-507-0602 РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	0.8112	1 126 609	913 905
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**1 516 160**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Иманаевский ручей				**4 163 135**
			Локальная смета: Конструктивные решения. Скала аютас				
			Раздел: Фундаменты				
25	1	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-1 из бетона кл. С25/30 W6 F75/	м3	1.5	73 235	109 852
26	2	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.3585	1 601 064	573 981
27	3	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1975	285 993	56 484
28	4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.161	301 181	48 490
29	5	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.3175	1 486 435	471 943
30	6	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-2 из бетона кл. С25/30 W6 F75/	м3	1.2	73 235	87 882
31	7	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.18828	1 601 064	301 448
32	8	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1092	285 993	31 230
33	9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07908	301 181	23 817
34	10	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.1464	1 486 435	217 614
35	11	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-3 из бетона кл. С25/30 W6 F75/	м3	1.5	73 235	109 852
36	12	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.35775	1 601 064	572 781

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	13	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2275	285 993	65 063
38	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.13025	301 181	39 229
39	15	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.2525	1 486 435	375 325
40	16	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	150	3 377	506 550
41	17	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять. Количество слоев по 10 мм: 29	отверстие	150	1 064	159 600
42	18	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	72	3 377	243 144
43	19	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять. Количество слоев по 10 мм: 40	отверстие	72	1 468	105 696
44	20	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	150	3 377	506 550
45	21	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять. Количество слоев по 10 мм: 30	отверстие	150	1 101	165 150
46	22	217-103-0202 РСНБ РК 2022	Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл	шт.	112	30 269	3 390 128
			Итого по разделу: Фундаменты				**8 161 809**
			Раздел: Металлоконструкции				
47	23	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	1.101	772 122	850 106
48	24	222-507-0602 РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	1.145	1 126 609	1 289 967
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**2 140 074**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Скала аютас				**10 301 883**
			Локальная смета: Устройство парковки №1				
			Раздел: Земляные работы				
49	1	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	470	20	9 400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	47	156	7 332
51	3	6101-0104-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м3	47	131	6 157
52	4	6101-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	47	454	21 338
53	5	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1974	52	102 648
54	6	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	169.155	567	95 911
55	7	6101-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	40.532	454	18 402
56	8	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2127.93	52	110 652
57	9	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	128.623	177	22 766
58	10	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	128.623	272	34 985
59	11	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу добавлять. Количество дополнительных проходов по одному следу: 5.	м3	128.623	95	12 219
60	12	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	128.623	218	28 040
61	13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	12.8623	33	424
			Итого по разделу: Земляные работы				**470 274**
			Раздел: Водоотводной лоток				
62	14	7101-0301-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0.044	41 832	1 841
63	15	226-105-0101 РСНБ РК 2022	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	2	9 185	18 370
			Итого по разделу: Водоотводной лоток				**20 211**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
64	16	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	73	5 532	403 836
65	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	3.139	60 573	190 139
66	18	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	47	3 488	163 936
67	19	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	57.34	4 699	269 441
68	20	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	463	864	400 032
69	21	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя. Количество слоев по 1 см: 3.	м2	463	84	38 892
70	22	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	м3	111.6756	4 392	490 479
71	23	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0.4841	6 685	3 236
72	24	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.498623	167 783	83 660
73	25	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	470	503	236 410
74	26	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия. Количество слоев по 0,5 см: 4.	м2	470	37	17 390
75	27	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	68.62	24 248	1 663 898
			Итого по разделу: Дорожная одежда				**3 961 349**
			Раздел: Обустройство парковки				
			Подраздел: РДорожные знаки				
76	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0.48	61 714	29 623

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	29	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	20 095	60 285
78	30	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1	3 935	3 935
79	31	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8 449	25 347
80	32	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм	шт.	3	13 929	41 787
81	33	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	7 204	7 204
			Итого по подразделу: РДорожные знаки				**168 181**
			Подраздел: РДорожная разметка				
82	34	7101-0803-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0.0803	97 303	7 813
83	35	7101-0803-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	8	2 228	17 824
			Итого по подразделу: РДорожная разметка				**25 637**
			Итого по разделу: Обустройство парковки				**193 818**
			Итого по локальной смете: Устройство парковки №1				**4 645 652**
			Локальная смета: Дорожное покрытие. Парк Бишы Кайын				
			Раздел: ТИП 1. Покрытие детских площадок				
84	1	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	94.384	3 488	329 211
85	2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	115.14848	4 699	541 083
86	3	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	943.84	864	815 478
87	4	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	м3	189.71184	4 392	833 214
			Итого по разделу: ТИП 1. Покрытие детских площадок				**2 518 986**
			Раздел: ТИП 2. Покрытие спортивных площадок				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	6	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	39.459	3 488	137 633
89	7	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	48.13998	4 699	226 210
90	8	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	394.59	864	340 926
91	9	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	м3	79.31259	4 392	348 341
			Итого по разделу: ТИП 2. Покрытие спортивных площадок				**1 053 110**
			Итого по локальной смете: Дорожное покрытие. Парк Бишы Кайын				**3 572 096**
			Локальная смета: Конструктивные решения. Скала максимка				
			Раздел: Земляные работы				
92	1	6101-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 6.	м3	9.22	57 924	534 059
			Итого по разделу: Земляные работы				**534 059**
			Раздел: Фундаменты				
93	2	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-1 из бетона кл. С20/25 F100/	м3	11.31	42 868	484 837
94	3	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	11.47965	29 094	333 989
95	4	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	19.14	1 604	30 701
96	5	235-201-0102 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный	кг	45.936	1 312	60 268
			Итого по разделу: Фундаменты				**909 795**
			Раздел: Металлоконструкции				
97	6	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	5.2	772 122	4 015 034
98	7	222-507-0602 РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	5.408	1 126 609	6 092 702
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**10 107 736**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Скала максимка				**11 551 590**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Устройство парковки №4				
			Раздел: Земляные работы				
99	1	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	332	20	6 640
100	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	91.6	156	14 290
101	3	6101-0104-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м3	91.6	131	12 000
102	4	6101-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	91.6	454	41 586
103	5	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3847.2	52	200 054
104	6	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	756.035	567	428 672
105	7	6101-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	755.617	454	343 050
106	8	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	39669.8925	52	2 062 834
107	9	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	0.418	177	74
108	10	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	0.418	272	114
109	11	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу добавлять. Количество дополнительных проходов по одному следу: 5.	м3	0.418	95	40
110	12	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0.418	218	91
111	13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0.0418	33	1
			Итого по разделу: Земляные работы				**3 109 446**
			Раздел: Водоотводной лоток				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	14	7101-0301-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0.044	41 832	1 841
113	15	226-105-0101 РСНБ РК 2022	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	2	9 185	18 370
			Итого по разделу: Водоотводной лоток				**20 211**
			Раздел: Дорожная одежда				
114	16	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	113	5 532	625 116
115	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	4.859	60 573	294 324
116	18	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	92	3 488	320 896
117	19	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	112.24	4 699	527 416
118	20	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	905	864	781 920
119	21	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя. Количество слоев по 1 см: 3.	м2	905	84	76 020
120	22	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	м3	218.286	4 392	958 712
121	23	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0.93215	6 685	6 231
122	24	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.9601145	167 783	161 091
123	25	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	916	503	460 748
124	26	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия. Количество слоев по 0,5 см: 4.	м2	916	37	33 892
125	27	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	133.736	24 248	3 242 831
			Итого по разделу: Дорожная одежда				**7 489 197**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Обустройство парковки				
			Подраздел: РДорожные знаки				
126	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0.48	61 714	29 623
127	29	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	20 095	60 285
128	30	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1	3 935	3 935
129	31	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8 449	25 347
130	32	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм	шт.	3	13 929	41 787
131	33	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	7 204	7 204
			Итого по подразделу: РДорожные знаки				**168 181**
			Подраздел: РДорожная разметка				
132	34	7101-0803-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0.135	97 303	13 136
133	35	7101-0803-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	14	2 228	31 192
			Итого по подразделу: РДорожная разметка				**44 328**
			Итого по разделу: Обустройство парковки				**212 509**
			Итого по локальной смете: Устройство парковки №4				**10 831 363**
			Локальная смета: Устройство парковки №3				
			Раздел: Земляные работы				
134	1	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	592	20	11 840
135	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	59.2	156	9 235
136	3	6101-0104-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м3	59.2	131	7 755

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	4	6101-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	59.2	454	26 877
138	5	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2486.4	52	129 293
139	6	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	294.455	567	166 956
140	7	6101-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	269.815	454	122 496
141	8	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	14165.2875	52	736 595
142	9	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	24.64	177	4 361
143	10	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	24.64	272	6 702
144	11	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу добавлять. Количество дополнительных проходов по одному следу: 5.	м3	24.64	95	2 341
145	12	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	24.64	218	5 372
146	13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	2.464	33	81
			Итого по разделу: Земляные работы				**1 229 904**
			Раздел: Водоотводной лоток				
147	14	7101-0301-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0.044	41 832	1 841
148	15	226-105-0101 РСНБ РК 2022	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	2	9 185	18 370
			Итого по разделу: Водоотводной лоток				**20 211**
			Раздел: Дорожная одежда				
149	16	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	85	5 532	470 220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	3.655	60 573	221 394
151	18	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	59	3 488	205 792
152	19	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	71.98	4 699	338 234
153	20	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	584	864	504 576
154	21	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя. Количество слоев по 1 см: 3.	м2	584	84	49 056
155	22	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	м3	140.8608	4 392	618 661
156	23	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0.60152	6 685	4 021
157	24	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.6195656	167 783	103 953
158	25	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	592	503	297 776
159	26	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия. Количество слоев по 0,5 см: 4.	м2	592	37	21 904
160	27	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	86.432	24 248	2 095 803
			Итого по разделу: Дорожная одежда				**4 931 390**
			Раздел: Обустройство парковки				
			Подраздел: РДорожные знаки				
161	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0.48	61 714	29 623
162	29	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	20 095	20 095
163	30	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1	3 935	3 935

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	31	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8 449	25 347
165	32	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм	шт.	3	13 929	41 787
166	33	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	7 204	7 204
			Итого по подразделу: РДорожные знаки				**127 991**
			Подраздел: РДорожная разметка				
167	34	7101-0803-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0.1264	97 303	12 299
168	35	7101-0803-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	13	2 228	28 964
			Итого по подразделу: РДорожная разметка				**41 263**
			Итого по разделу: Обустройство парковки				**169 254**
			Итого по локальной смете: Устройство парковки №3				**6 350 759**
			Локальная смета: Устройство парковки №2				
			Раздел: Земляные работы				
169	1	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	332	20	6 640
170	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	33.2	156	5 179
171	3	6101-0104-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м3	33.2	131	4 349
172	4	6101-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	33.2	454	15 073
173	5	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1394.4	52	72 509
174	6	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	153.419	567	86 989
175	7	6101-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	143.365	454	65 088

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	8	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	7526.6625	52	391 386
177	9	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	10.054	177	1 780
178	10	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	10.054	272	2 735
179	11	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу добавлять. Количество дополнительных проходов по одному следу: 5.	м3	10.054	95	955
180	12	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10.054	218	2 192
181	13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	1.0054	33	33
			Итого по разделу: Земляные работы				**654 908**
			Раздел: Лоток для защиты коммуникаций				
182	14	6104-0903-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	4.14	35 561	147 223
183	15	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3.06	57 413	175 684
184	16	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1.08	111 908	120 861
185	17	7101-0301-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0.044	41 832	1 841
186	18	226-105-0101 РСНБ РК 2022	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	2	9 185	18 370
			Итого по разделу: Лоток для защиты коммуникаций				**463 979**
			Раздел: Дорожная одежда				
187	19	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	57	5 532	315 324
188	20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	2.451	60 573	148 464

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
189	21	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	33	3 488	115 104
190	22	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	40.26	4 699	189 182
191	23	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	326	864	281 664
192	24	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя. Количество слоев по 1 см: 3.	м2	326	84	27 384
193	25	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	м3	78.6312	4 392	345 348
194	26	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0.33578	6 685	2 245
195	27	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.3458534	167 783	58 028
196	28	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	332	503	166 996
197	29	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия. Количество слоев по 0,5 см: 4.	м2	332	37	12 284
198	30	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	48.472	24 248	1 175 349
			Итого по разделу: Дорожная одежда				**2 837 372**
			Раздел: Обустройство парковки				
			Подраздел: РДорожные знаки				
199	31	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0.48	61 714	29 623
200	32	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	20 095	60 285
201	33	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1	3 935	3 935
202	34	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	3	8 449	25 347

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
203	35	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм	шт.	3	13 929	41 787
204	36	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	7 204	7 204
			Итого по подразделу: РДорожные знаки				**168 181**
			Подраздел: РДорожная разметка				
205	37	7101-0803-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0.0656	97 303	6 383
206	38	7101-0803-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	7	2 228	15 596
			Итого по подразделу: РДорожная разметка				**21 979**
			Итого по разделу: Обустройство парковки				**190 160**
			Итого по локальной смете: Устройство парковки №2				**4 146 419**
			Локальная смета: Конструктивные решения. Скала туфелька				
			Раздел: Фундаменты				
207	1	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-1 из бетона кл. С 25/30/	м3	1.56	74 560	116 314
208	2	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.37284	1 601 064	596 941
209	3	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2054	285 993	58 743
210	4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.16744	301 181	50 430
211	5	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.3302	1 486 435	490 821
212	6	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 /Фм-2 из бетона кл. С 25/30/	м3	1.9	74 560	141 664
213	7	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.29811	1 601 064	477 293
214	8	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1729	285 993	49 448

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
215	9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12521	301 181	37 711
216	10	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.2318	1 486 435	344 556
217	11	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	156	3 377	526 812
218	12	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять. Количество слоев по 10 мм: 29	отверстие	156	1 064	165 984
219	13	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	114	3 377	384 978
220	14	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять. Количество слоев по 10 мм: 40	отверстие	114	1 468	167 352
221	15	217-103-0202 РСНБ РК 2022	Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл	шт.	81	30 269	2 451 789
			Итого по разделу: Фундаменты				**6 060 836**
			Раздел: Металлоконструкции				
222	16	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	1.412	772 122	1 090 236
223	17	222-507-0602 РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т	1.46848	1 126 609	1 654 403
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**2 744 639**
			Итого по локальной смете: Конструктивные решения. Скала туфелька				**8 805 475**
			Локальная смета: Снос (демонтаж) элементов благоустройства (ГП, ПОС, проект по сносу)				
			Раздел: Парковка №1				
224	1	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения металлического без поручня.	м	46	1 834	84 364
225	2	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0.06072	1 315	80
226	3	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2.1252	52	111
			Итого по разделу: Парковка №1				**84 555**
			Раздел: Парковка №2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
227	4	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения металлического без поручня.	м	40	1 834	73 360
228	5	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0.0528	1 315	69
229	6	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1.848	52	96
			Итого по разделу: Парковка №2				**73 525**
			Раздел: Парковка №3				
230	7	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения металлического без поручня.	м	45	1 834	82 530
231	8	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0.0594	1 315	78
232	9	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2.079	52	108
			Итого по разделу: Парковка №3				**82 716**
			Итого по локальной смете: Снос (демонтаж) элементов благоустройства (ГП, ПОС, проект по сносу)				**240 796**
			ИТОГО по акту:				**64 609 168**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.200%)	64609168.136 x 9.20%	5 944 043
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	64609168.136 + 5944043.345	70 553 211
	Сметная прибыль, (5.00%)	70553211.481 x 5.00%	3 527 661
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	70553211.481 x 5.000%	3 527 661
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		77 608 533
	В прогнозных ценах 2025 г, к = 1.1550	77608532.629 x 1.1550	89 637 916
	НДС (12%)	89637915.721 x 12%	10 756 550
	Итого с НДС	89637915.721 + 10756549.887	100 394 466
	Итого со скидкой	100394465.608 - 2.00%	98 386 576

Лист согласования
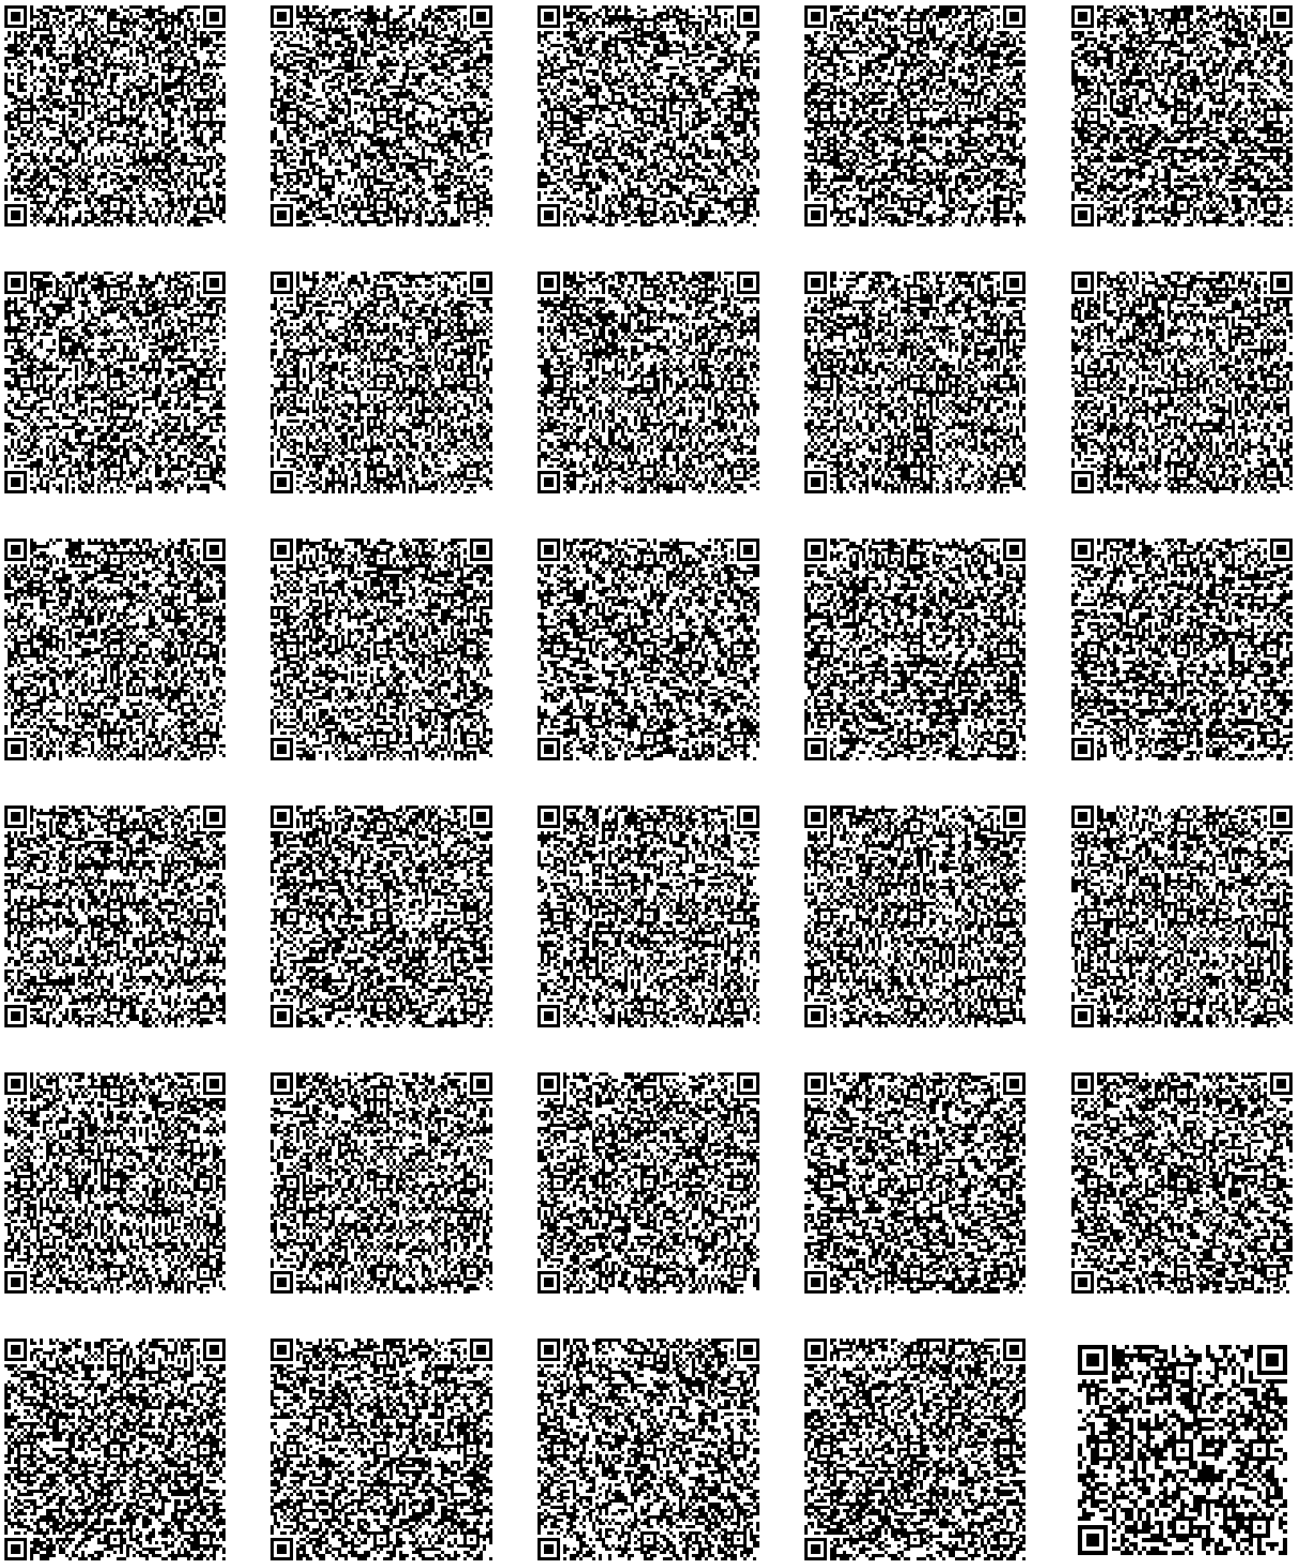
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
931209300341 - МАҚМҰТОВ МҰХАМЕДЖАН АСҚАРҰЛЫ	Инженер ПТО	29.05.2025 17:02
Представители технического надзора		
580125302154 - РАЙКУЛОВ ЖАНГАЛИ МОЛДАТАЕВИЧ	Специалист по техническому надзору (эксперт)	29.05.2025 17:04
Представители авторского надзора		
801101399068 - ТАШКИН МАКСАТ АБАЕВИЧ	Начальник отдела авторского надзора	29.05.2025 17:18
Представители заказчика		
771101300182 - НУРМАГАНБЕТОВ ДАУРЕН ДЕМЕСИНОВИЧ	Заведующий сектором капитального строительства ОКС УДП РК	29.05.2025 19:31
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий отделом капитального строительства УДП РК	29.05.2025 19:48
