Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - ГУ Управление делами Президента Республики Казахстан**

Подрядчик: **030540005073 - ТОО «Строитель 2003»**

Стройка: **Строительство инженерных сетей от поселка Бурабай до озер "Большое Чебачье" и "Текеколь" ГНПП "Бурабай". 2 очередь". Корректировка. Остаточные работы (с учетом корректировки). 2 пусковой комплекс.**

Договор подряда (контракт) №: **- от - года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети водопровода и канализации (остаточные работы 2023).				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИИ К1.				
			Подраздел: Разработка				
1	1	6101-0102-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4 /взаимозаменяемые работы, п.625 ведомости объемов выполненных работ/	м3	1623.734	527	855 708
			Итого по подразделу: Разработка				**855 708**
			Подраздел: Засыпка				
2	2	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	264.93	56	14 836
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	270.16	4 949	1 337 022
4	4	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	270.16	657	177 495
			Итого по подразделу: Засыпка				**1 529 353**
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИИ К1.				**2 385 061**
			Раздел: Колодцы К1				
			Подраздел: Колодец диам.1,5 м - 62 шт				
5	22	6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	13.3	115 133	1 531 269

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	23	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	37 381	224 286
7	24	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	30 564	122 256
8	25	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	30 750	615 000
9	26	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	36 177	217 062
			Итого по подразделу: Колодец диам.1,5 м - 62 шт				**2 709 873**
			Итого по разделу: Колодцы К1				**2 709 873**
			Раздел: Трубопровод К1				
10	63	6121-0105-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0.03947	3 238 276	127 815
11	64	241-201-0818 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	39.8647	8 318	331 595
12	67	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.04333	1 495 577	64 803
13	68	241-201-0512 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм	м	43.764	3 123	136 675
14	69	6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0.012	4 413 223	52 959
15	70	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	12.048	15 259	183 840
			Итого по разделу: Трубопровод К1				**897 687**
			Раздел: Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1.				
			Подраздел: Разработка				
16	100	6101-0102-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	1404.703	527	740 279
17	101	6101-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	146.972	19 067	2 802 315
18	102	6101-0105-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	630.81	10 942	6 902 323

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Разработка				**10 444 916**
			Подраздел: Засыпка				
19	103	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	142.67	10 872	1 551 108
20	104	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	142.67	56	7 989
21	105	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	46.31	4 949	229 188
22	106	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	120.78	657	79 353
			Итого по подразделу: Засыпка				**1 867 638**
			Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1.				**12 312 555**
			Раздел: Трубопровод В1				
23	110	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.19009	1 495 577	284 294
24	111	241-201-0512 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм	м	191.991	3 123	599 588
25	112	6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0.05699	1 751 392	99 812
26	113	241-201-0515 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х11,8 мм	м	57.56	6 589	379 263
27	114	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.11312	1 431 356	161 915
28	115	241-201-0509 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	114.2512	1 048	119 735
29	136	6121-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0.014	7 635 733	106 900
30	137	241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	14	36 528	511 392
31	152	6121-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0.017	7 635 733	129 808

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	153	241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	17	36 528	620 976
			Итого по разделу: Трубопровод В1				**3 013 683**
			Раздел: Колодцы В1				
			Подраздел: Колодец диам.1,5м - 97 шт. (+2 колодца см.часть АС)=99 шт				
33	184	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	21.058	133 495	2 811 138
34	185	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	37 381	485 953
35	186	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	24	30 564	733 536
36	189	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	15	30 750	461 250
37	190	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	13	36 177	470 301
			Итого по подразделу: Колодец диам.1,5м - 97 шт. (+2 колодца см.часть АС)=99 шт				**4 962 178**
			Итого по разделу: Колодцы В1				**4 962 178**
			Раздел: Устройство септика				
			Подраздел: Засыпка				
38	268	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	306.66	3 784	1 160 401
39	269	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	337.326	4 949	1 669 426
40	270	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	306.66	657	201 476
			Итого по подразделу: Засыпка				**3 031 303**
			Итого по разделу: Устройство септика				**3 031 303**
			Итого по локальной смете: Наружные сети водопровода и канализации (остаточные работы 2023).				**29 312 339**
			Локальная смета: Общестроительные работы АС (остаточные работы)				
			Раздел: Подпольные каналы				
			Подраздел: Трубы				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	47	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0.79354	118 015	93 650
42	48	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	103	1 852	190 756
43	49	241-102-0171 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	м	13.6	4 696	63 866
44	50	6121-0201-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0.0136	3 984 258	54 186
			Итого по подразделу: Трубы				**402 458**
			Итого по разделу: Подпольные каналы				**402 458**
			Раздел: Стены				
			Подраздел: Наружные стены				
45	51	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м.	м3 кладки	44.475	66 874	2 974 221
46	52	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	177.9	3 764	669 616
47	53	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м2	163.4	4 091	668 469
48	54	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/Облицовка/Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича.	м2	163.4	13 553	2 214 560
49	55	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.06336	109 230	6 921
50	56	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.25159	698 503	175 736
51	57	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.0164	1 486 435	24 378
52	58	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.8528	418	356
			Итого по подразделу: Наружные стены				**6 734 257**
			Подраздел: Внутренние стены				
53	59	1108-0201-0108 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м.	м3 кладки	24.8355	65 815	1 634 548

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Внутренние стены				**1 634 548**
			Подраздел: Перемычки				
54	62	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	16	1 760	28 160
55	63	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7 865	15 730
56	64	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.956	170 598	163 092
57	65	6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматурных стыковых накладок	т	0.28525	1 470 551	419 475
58	66	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0.28525	1 059 588	302 247
59	67	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12.551	272	3 414
60	68	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12.551	418	5 246
			Итого по подразделу: Перемычки				**937 364**
			Подраздел: Перемычка /5ПБ 30-37а лист 22/				
61	69	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7 856	7 856
62	70	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.164	170 598	27 978
63	71	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01509	1 486 435	22 430
			Итого по подразделу: Перемычка /5ПБ 30-37а лист 22/				**58 264**
			Итого по разделу: Стены				**9 364 433**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип I				
64	90	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м2	36.8	1 226	45 117
65	91	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3.68	49 587	182 480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	92	6109-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм	м2	36.8	2 243	82 542
67	93	6109-0302-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Железнение покрытий цементных	м2	36.8	597	21 970
			Итого по подразделу: Тип I				**332 109**
			Итого по разделу: Полы				**332 109**
			Раздел: Горизонтальная диафрагма АС-10				
68	94	6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматурных стыковых накладок	т	0.9963	1 470 551	1 465 110
69	95	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	22.50655	418	9 408
70	96	1107-0701-0201 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство	м2 покрытия	15	4 137	62 055
71	97	217-505-0206 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 12 мм	м2	15	4 245	63 675
			Итого по разделу: Горизонтальная диафрагма АС-10				**1 600 248**
			Раздел: Перекрытие				
72	98	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	12	10 089	121 068
73	99	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	99.9	13 020	1 300 698
74	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01664	306 812	5 105
75	101	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001064	301 181	320
			Итого по разделу: Перекрытие				**1 427 191**
			Раздел: Кровля				
76	106	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	м3	3.1996	276 848	885 803
77	107	6107-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прогона по фермам из досок	м3	0.35	214 475	75 066

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	108	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	3.5496	15 536	55 147
79	109	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	124	550	68 200
			Подраздел: Слуховые окна 2 шт				
80	117	6107-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство слуховых окон	шт.	2	49 618	99 236
81	118	215-202-0301 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.402	117 362	47 180
82	119	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	6	5 621	33 726
83	121	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0.402	15 536	6 245
84	122	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	6	550	3 300
			Итого по подразделу: Слуховые окна 2 шт				**189 687**
			Итого по разделу: Кровля				**1 273 903**
			Раздел: Внутренняя отделка/лист 2 п.6/				
			Подраздел: Стены и перегородки				
85	128	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	331.47	4 173	1 383 224
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**1 383 224**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка/лист 2 п.6/				**1 383 224**
			Итого по локальной смете: Общестроительные работы АС (остаточные работы)				**15 783 566**
			Локальная смета: Наружное электроснабжение 0,4кВ (остаточные работы)				
			Раздел: Прокладка кабелей				
86	34	6101-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	27	19 067	514 809
87	35	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	135	828	111 780
88	36	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	135	763	103 005

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	37	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	87.12	3 784	329 662
90	38	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	95.83	4 949	474 263
91	39	6125-0701-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 6 кг	км	0.648	804 065	521 034
92	40	243-125-1811 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120 (ок)-1	км	0.324	2 649 344	858 387
93	41	243-125-2947 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х95 (мс)-1	км	0.324	3 086 201	999 929
94	42	6124-0201-1702 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	8	25 009	200 072
95	43	243-903-2005 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EPKT-0047-CEE01-L12, с ленточной броней	шт.	8	44 221	353 768
			Итого по разделу: Прокладка кабелей				**4 466 709**
			Итого по локальной смете: Наружное электроснабжение 0,4кВ (остаточные работы)				**4 466 709**
			Локальная смета: Электросиловое оборудование (остаточные работы)				
			Раздел: Оборудование				
96	5	6124-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 1600 кВ•А	шт.	2	1 259 741	2 519 482
97	6	515-101-0111 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА	шт.	2	10 339 319	20 678 638
			Итого по разделу: Оборудование				**23 198 120**
			Итого по локальной смете: Электросиловое оборудование (остаточные работы)				**23 198 120**
			Локальная смета: Общестроительные работы АС (остаточные работы)				
			Раздел: Земляные работы				
98	1	6101-0105-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	343.641	10 942	3 760 120
99	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	3	9 558	28 674
100	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	4.7	4 156	19 533

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	42.3	67	2 834
102	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	42.3	657	27 791
103	6	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34	145	4 930
104	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	19	4 156	78 964
			Итого по разделу: Земляные работы				**3 922 846**
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: ФБС				
105	8	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	1.86675	12 295	22 952
106	9	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	52	8 151	423 852
107	10	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	25	6 103	152 575
108	11	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	56	5 508	308 448
109	12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	28.236	51 181	1 445 147
110	13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4.24	51 181	217 007
111	14	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5.07	51 181	259 488
112	15	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3.654	51 181	187 015
113	16	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2.044	51 181	104 614
114	17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2.032	51 181	104 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	18	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	4.03	49 435	199 223
116	19	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	36	1 760	63 360
117	20	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.952	170 598	162 409
118	21	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0.8	216 899	173 519
			Итого по подразделу: ФБС				**3 823 609**
			Итого по разделу: Фундаменты				**3 823 609**
			Раздел: Подпольные каналы				
			Подраздел: ПК-1				
119	23	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	0.459	12 295	5 643
120	24	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6.81	53 230	362 496
121	25	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	6.91215	29 094	201 102
122	26	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.08316	1 486 435	123 612
			Итого по подразделу: ПК-1				**692 853**
			Подраздел: ПК-2				
123	28	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	0.459	12 295	5 643
124	29	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6.81	53 230	362 496
125	30	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	6.91215	29 094	201 102
126	31	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.08316	1 486 435	123 612
			Итого по подразделу: ПК-2				**692 853**
			Подраздел: ПК-3				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	35	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	1.148	12 295	14 115
128	36	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13.48	53 230	717 540
129	37	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	13.6822	29 094	398 070
130	38	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.180432	1 486 435	268 200
			Итого по подразделу: ПК-3				**1 397 925**
			Подраздел: Фундамент под трансформатор Ф-1 (2шт.)				
131	42	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	0.4077	12 295	5 013
132	43	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3.02	27 631	83 446
133	44	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3.0653	29 094	89 182
134	45	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.67888	1 486 435	1 009 111
			Итого по подразделу: Фундамент под трансформатор Ф-1 (2шт.)				**1 186 752**
			Подраздел: Трубы				
135	47	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0.79354	118 015	93 650
136	48	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	103	1 852	190 756
137	49	241-102-0171 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	м	13.6	4 696	63 866
138	50	6121-0201-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0.0136	3 984 258	54 186
			Итого по подразделу: Трубы				**402 458**
			Итого по разделу: Подпольные каналы				**4 372 841**
			Раздел: Стены				
			Подраздел: Наружные стены				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	51	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м.	м3 кладки	44.475	66 874	2 974 221
140	52	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	177.9	11 290	2 008 491
141	53	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м2	163.4	4 091	668 469
142	54	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/Облицовка/Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича.	м2	163.4	13 553	2 214 560
143	55	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.06336	109 230	6 921
144	56	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.25159	698 503	175 736
145	57	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.0164	1 486 435	24 378
146	58	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.8528	418	356
			Итого по подразделу: Наружные стены				**8 073 132**
			Подраздел: Внутренние стены				
147	59	1108-0201-0108 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м.	м3 кладки	24.8355	65 815	1 634 548
			Итого по подразделу: Внутренние стены				**1 634 548**
			Подраздел: Перемычки				
148	62	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	16	1 760	28 160
149	63	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7 865	15 730
150	64	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.956	170 598	163 092
151	65	6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматурных стыковых накладок	т	0.28525	1 470 551	419 475

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	66	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0.28525	1 059 588	302 247
153	67	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12.551	272	3 414
154	68	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12.551	418	5 246
			Итого по подразделу: Перемычки				**937 364**
			Подраздел: Перемычка /5ПБ 30-37а лист 22/				
155	69	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7 856	7 856
156	70	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.164	170 598	27 978
157	71	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01509	1 486 435	22 430
			Итого по подразделу: Перемычка /5ПБ 30-37а лист 22/				**58 264**
			Итого по разделу: Стены				**10 703 308**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип I				
158	90	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м2	36.8	1 226	45 117
159	91	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3.68	49 587	182 480
160	92	6109-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм	м2	36.8	2 243	82 542
161	93	6109-0302-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Железнение покрытий цементных	м2	36.8	597	21 970
			Итого по подразделу: Тип I				**332 109**
			Итого по разделу: Полы				**332 109**
			Раздел: Горизонтальная диафрагма АС-10				
162	94	6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматурных стыковых накладок	т	0.9963	1 470 551	1 465 110

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
163	95	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	22.50655	418	9 408
164	96	1107-0701-0201 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство	м2 покрытия	15	4 137	62 055
165	97	217-505-0206 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 12 мм	м2	15	4 245	63 675
			Итого по разделу: Горизонтальная диафрагма АС-10				**1 600 248**
			Раздел: Перекрытие				
166	98	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	12	10 089	121 068
167	99	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	99.9	13 020	1 300 698
168	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01664	306 812	5 105
169	101	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001064	301 181	320
			Итого по разделу: Перекрытие				**1 427 191**
			Раздел: Кровля				
170	106	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	м3	3.1996	276 848	885 803
171	107	6107-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прогона по фермам из досок	м3	0.35	214 475	75 066
172	108	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	3.5496	15 536	55 147
173	109	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	124	550	68 200
			Подраздел: Слуховые окна 2 шт				
174	117	6107-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство слуховых окон	шт.	2	49 618	99 236
175	118	215-202-0301 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.402	117 362	47 180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	119	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	6	5 621	33 726
177	121	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0.402	15 536	6 245
178	122	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	6	550	3 300
			Итого по подразделу: Слуховые окна 2 шт				**189 687**
			Итого по разделу: Кровля				**1 273 903**
			Раздел: Внутренняя отделка/лист 2 п.6/				
			Подраздел: Стены и перегородки				
179	128	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	331.47	4 173	1 383 224
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**1 383 224**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка/лист 2 п.6/				**1 383 224**
			Итого по локальной смете: Общестроительные работы АС (остаточные работы)				**28 839 279**
			Локальная смета: Электросиловое оборудование (остаточные работы)				
			Раздел: Оборудование				
180	5	6124-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 1000 кВ•А	шт.	2	296 957	593 914
181	6	515-101-0109 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	6 815 091	13 630 182
			Итого по разделу: Оборудование				**14 224 096**
			Итого по локальной смете: Электросиловое оборудование (остаточные работы)				**14 224 096**
			ИТОГО по акту:				**115 824 109**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.500%)	81515289.432 x 7.50%	6 113 647
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	115824109.432 + 6113646.707	121 937 756
	Сметная прибыль, (5.00%)	87628936.140 x 5.00%	4 381 447
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	121937756.140 x 5.000%	6 096 888
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		132 416 091
	коэф 2025 - 1,075, к = 1.0750	132416090.754 x 1.0750	142 347 298
	НДС (12%)	142347297.560 x 12%	17 081 676
	Итого с НДС	142347297.560 + 17081675.707	159 428 973

Лист согласования
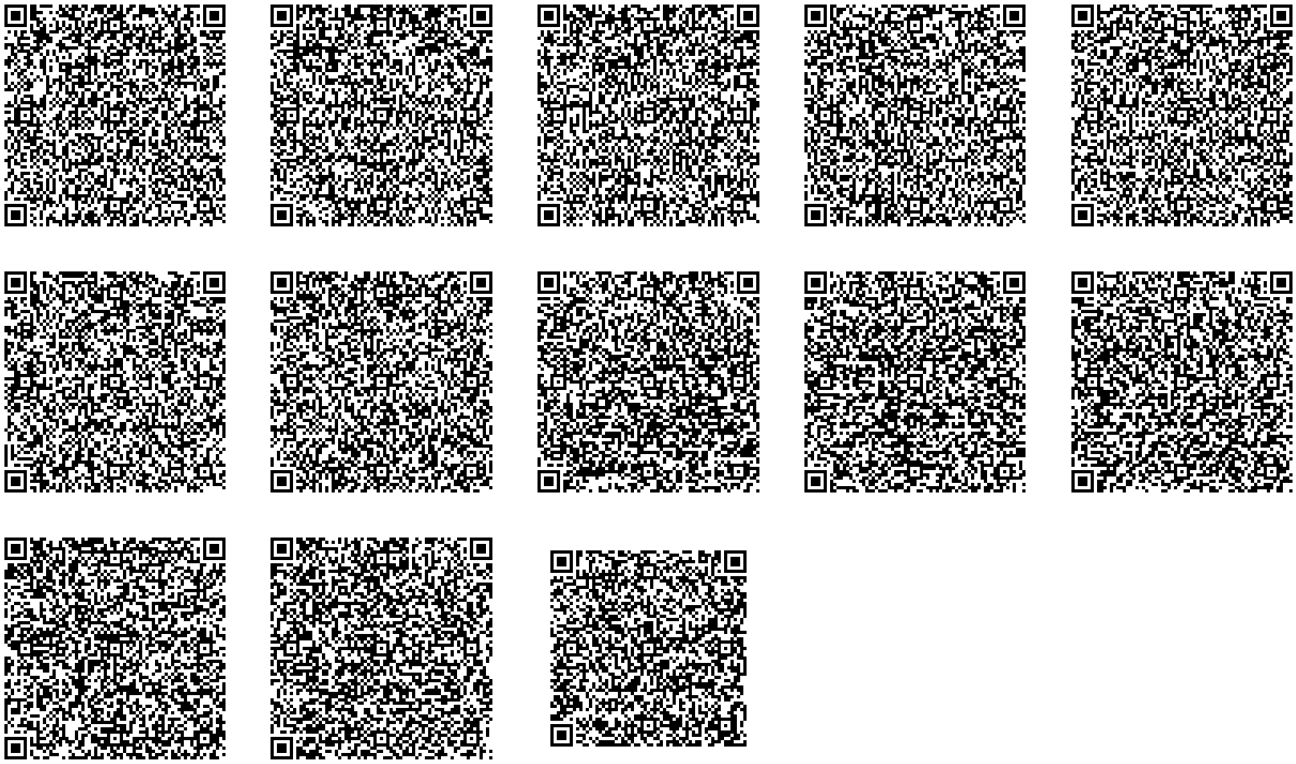
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
810308350298 - КАБАСОВ КУАТ АЙТМАГАМБЕТОВИЧ	Ген подрядчик	27.06.2025 12:14
Представители технического надзора		
861221450769 - МУРЗАБЕКОВА КУЛЯИМ КУДАЙБЕРГЕНОВНА	Технадзор	28.06.2025 14:05
Представители авторского надзора		
850912350576 - КОННОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ	Авторский надзор	28.06.2025 13:18
Представители заказчика		
771101300182 - НУРМАГАНБЕТОВ ДАУРЕН ДЕМЕСИНОВИЧ	Заказчик	27.06.2025 14:34
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий ОКС УДП РК	27.06.2025 14:38
