Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - ГУ Управление делами Президента Республики Казахстан**

Подрядчик: **030540005073 - ТОО «Строитель 2003»**

Стройка: **Строительство инженерных сетей от поселка Бурабай до озер "Большое Чебачье" и "Текеколь" ГНПП "Бурабай". 2 очередь". Корректировка. Остаточные работы (с учетом корректировки). 2 пусковой комплекс.**

Договор подряда (контракт) №: **- от - года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети водопровода и канализации (остаточные работы 2023).				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИИ К1.				
			Подраздел: Разработка				
1	1	6101-0102-0116ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4 /взаимозаменяемые работы, п.625 ведомости объемов выполненных работ/	м3	666.25	527	351 114
			Итого по подразделу: Разработка				**351 114**
			Подраздел: Засыпка				
2	3	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25.71	4 949	127 239
			Итого по подразделу: Засыпка				**127 239**
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИИ К1.				**478 353**
			Раздел: Колодцы К1				
			Подраздел: Колодец диам.1 м - 101 шт				
3	15	222-506-0401РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.036558	1 133 576	41 441
4	16	244-202-0105РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	9	47 143	424 287
			Итого по подразделу: Колодец диам.1 м - 101 шт				**465 728**
			Подраздел: Колодец диам.1,5 м - 62 шт				
5	31	222-506-0401РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.971598	1 133 576	1 101 380
6	33	244-202-0105РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	46	47 143	2 168 578
			Итого по подразделу: Колодец диам.1,5 м - 62 шт				**3 269 958**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Колодец-гаситель диам.1,5 м - 2 шт				
7	47	222-506-0401РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.03788	1 133 576	42 940
			Итого по подразделу: Колодец-гаситель диам.1,5 м - 2 шт				**42 940**
			Итого по разделу: Колодцы К1				**3 778 626**
			Раздел: Трубопровод К1				
8	63	6121-0105-0409ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0.04445	3 238 276	143 941
9	67	6121-0105-0403ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.02311	1 495 577	34 563
10	68	241-201-0512РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм	м	23.11	3 123	72 173
			Подраздел: КНС				
11	90	241-102-0246РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	22	36 528	803 616
			Итого по подразделу: КНС				**803 616**
			Итого по разделу: Трубопровод К1				**1 054 293**
			Раздел: Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1.				
			Подраздел: Засыпка				
12	104	6101-0106-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	279.69	56	15 662
			Итого по подразделу: Засыпка				**15 662**
			Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1.				**15 662**
			Раздел: Трубопровод В1				
13	174	6121-0502-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка гидрантов пожарных	шт.	3	13 377	40 131
14	175	244-404-0106РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	3	73 421	220 263
			Итого по разделу: Трубопровод В1				**260 394**
			Раздел: Колодцы В1				
			Подраздел: Колодец диам.2,0 м - 7 шт.				
15	177	222-506-0401РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.14756	1 133 576	167 270
			Итого по подразделу: Колодец диам.2,0 м - 7 шт.				**167 270**
			Подраздел: Колодец диам.1,5м - 97 шт. (+2 колодца см.часть АС)=99 шт				
16	195	222-506-0401РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1.13068	1 133 576	1 281 712
			Итого по подразделу: Колодец диам.1,5м - 97 шт. (+2 колодца см.часть АС)=99 шт				**1 281 712**
			Итого по разделу: Колодцы В1				**1 448 982**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Колодцы К1.1				
			Подраздел: Колодец диам.1 м - 1 шт				
17	213	222-506-0401РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.0195	1 133 576	22 105
			Итого по подразделу: Колодец диам.1 м - 1 шт				**22 105**
			Подраздел: Колодец диам.1,5 м - 1 шт				
18	227	222-506-0401РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.0097	1 133 576	10 996
			Итого по подразделу: Колодец диам.1,5 м - 1 шт				**10 996**
			Итого по разделу: Колодцы К1.1				**33 101**
			Раздел: Колодцы В1.1				
			Подраздел: Колодец диам.1,5м - 2 шт.				
19	257	222-506-0401РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.0406	1 133 576	46 023
			Итого по подразделу: Колодец диам.1,5м - 2 шт.				**46 023**
			Итого по разделу: Колодцы В1.1				**46 023**
			Раздел: Устройство водопонижения				
20	279	325-101-0102РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	246.795	1 470	362 789
21	280	325-101-0101РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	107	1 367	146 269
			Итого по разделу: Устройство водопонижения				**509 058**
			Итого по локальной смете: Наружные сети водопровода и канализации (остаточные работы 2023).				**7 624 492**
			Локальная смета: Охранная сигнализация (остаточные работы)				
			Раздел: Оборудование				
22	1	6125-0601-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	1	9 719	9 719
23	2	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор приемно-контрольный охранный с функцией интелектуального оповещения Мираж GSM М8-03	шт	1	66 412	66 412
24	3	6124-0105-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	12 724	12 724
25	4	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	8 014	8 014
26	5	6125-0202-0206ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	66 955	66 955
27	6	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Источник бесперебойного питания Импульс-2	шт	1	5 555	5 555
28	7	6125-0601-0302ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	6	29 482	176 892

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	8	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Извещатель пассивный инфракрасного движения COLT XS Pyronix	шт	6	4 918	29 507
30	9	6125-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	9	5 508	49 572
31	10	248-301-0102РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	9	1 208	10 872
32	11	6125-0601-0302ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	2	29 482	58 964
33	12	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Извещатель потолочный инфракрасного движения Астра 7	шт	2	10 473	20 946
34	15	6125-0601-0306ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического блока питания и контроля	шт.	1	48 209	48 209
35	16	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Сетевая контрольная панель СКП-08-03	шт	1	25 955	25 955
36	17	6124-0103-2101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	7 189	14 378
37	18	248-302-0501РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277	4 554
38	19	6125-0602-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	3	2 796	8 388
39	20	247-202-1101РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	3	20 091	60 273
40	21	6119-0402-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1 074	1 074
41	22	247-214-0103РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	410	410
42	23	1310-0601-0102РСНБ РК 2022	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	149 178	149 178
43	24	СТПереченьРСНБ РК 2022	Антена выносная направленная стандарта GSM	шт	1	47 357	47 357
44	25	6125-0702-1207ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 800х1800 мм	шт.	1	23 586	23 586
45	26	247-201-0102РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6 763
46	27	1308-0206-2202РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	396	55 440
47	28	243-303-0412РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0.1	93 210	9 321
48	29	243-105-0501РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.025	343 606	8 590
49	30	243-802-0102РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0.015	98 588	1 479
50	31	6125-0202-0206ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	66 955	66 955

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	33	6124-0303-0305ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1	61 764	61 764
52	34	ТПеречень п.56ЕСЦ РСНБ РК 2023	АВР на 220В ,ШУ-8853-42	шт	1	141 127	141 127
			Итого по разделу: Оборудование				**1 250 933**
			Итого по локальной смете: Охранная сигнализация (остаточные работы)				**1 250 933**
			Локальная смета: Общестроительные работы АС (остаточные работы)				
			Раздел: Крыльца, пандусы /АС-7/				
			Подраздел: Пандус				
53	140	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	3.8	14 187	53 911
54	141	6103-0101-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	5.7	37 158	211 801
			Итого по подразделу: Пандус				**265 712**
			Итого по разделу: Крыльца, пандусы /АС-7/				**265 712**
			Итого по локальной смете: Общестроительные работы АС (остаточные работы)				**265 712**
			Локальная смета: Фундаменты под КНС, Камеры водопроводные (остаточные работы на 2023 г.)				
			Раздел: Фундаменты под КНС (АС-3,4)				
			Подраздел: Фм-1				
55	1	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.31	14 187	4 398
56	6	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	5.4	4 846	26 168
			Итого по подразделу: Фм-1				**30 566**
			Итого по разделу: Фундаменты под КНС (АС-3,4)				**30 566**
			Раздел: Камера водопроводная ПГ-6				
57	41	235-201-0602РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65	кг	89.52	277	24 797
58	42	6122-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка	шт.	2	9 915	19 830
59	43	244-202-0105РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	2	47 143	94 286
			Итого по разделу: Камера водопроводная ПГ-6				**138 913**
			Итого по локальной смете: Фундаменты под КНС, Камеры водопроводные (остаточные работы на 2023 г.)				**169 479**
			Локальная смета: Телемеханика (остаточные работы)				
			Раздел: ТЕЛЕМЕХАНИКА				
60	2	1310-0410-0201РСНБ РК 2022	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт стационарная. Монтаж оборудования	комплект	1	57 411	57 411

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	5	ТПеречень п.54ЕСЦ РСНБ РК 2023	Радиостанция Motorola CM 140 (в комплекте с антеной)	шт	1	176 196	176 196
			Итого по разделу: ТЕЛЕМЕХАНИКА				**233 607**
			Итого по локальной смете: Телемеханика (остаточные работы)				**233 607**
			Локальная смета: Наружное электроснабжение 0,4кВ (остаточные работы)				
			Раздел: Дизель-генераторные установки				
62	62	1313-1201-0101РСНБ РК 2022	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	1	735 823	735 823
			Итого по разделу: Дизель-генераторные установки				**735 823**
			Итого по локальной смете: Наружное электроснабжение 0,4кВ (остаточные работы)				**735 823**
			Локальная смета: Электросиловое оборудование (остаточные работы)				
			Раздел: Оборудование				
			Подраздел: Аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения, отопления и вентиляции				
63	21	6116-0301-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конвекторов	кВт	6	5 143	30 858
64	22	245-201-0202РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	6	27 034	162 204
			Итого по подразделу: Аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения, отопления и вентиляции				**193 062**
			Итого по разделу: Оборудование				**193 062**
			Раздел: Заземление				
65	47	6124-0203-0306ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	18	1 238	22 284
66	48	6124-0203-0306ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	80	1 238	99 040
67	49	6124-0203-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	20	1 302	26 040
			Итого по разделу: Заземление				**147 364**
			Раздел: Средства защиты				
68	51	ТПеречень п.34.20-34.22 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Средства защиты. Ящик для песка. Барьер (в трансформаторных отсеках)	к-кт.	1	458 464	458 464
69	52	248-305-0203РСНБ РК 2022	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	2	20 960	41 920
70	53	248-305-0104РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	1	7 804	7 804
			Итого по разделу: Средства защиты				**508 188**
			Итого по локальной смете: Электросиловое оборудование (остаточные работы)				**848 614**
			Локальная смета: Охранная сигнализация (остаточные работы)				
			Раздел: Оборудование				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	1	6125-0601-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	1	9 719	9 719
72	2	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор приемно-контрольный охранный с функцией интелектуального оповещения Мираж GSM М8-03	шт	1	66 412	66 412
73	3	6124-0105-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	12 724	12 724
74	4	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	8 014	8 014
75	5	6125-0202-0206ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	66 955	66 955
76	6	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Источник бесперебойного питания Импульс-2	шт	1	5 555	5 555
77	7	6125-0601-0302ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	6	29 482	176 892
78	8	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Извещатель пассивный инфракрасного движения COLT XS Pyronix	шт	6	4 918	29 507
79	9	6125-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	9	5 508	49 572
80	10	248-301-0102РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	9	1 208	10 872
81	11	6125-0601-0302ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	2	29 482	58 964
82	12	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Извещатель потолочный инфракрасного движения Астра 7	шт	2	10 473	20 946
83	15	6125-0601-0306ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического блока питания и контроля	шт.	1	48 209	48 209
84	16	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Сетевая контрольная панель СКП-08-03	шт	1	25 955	25 955
85	17	6124-0103-2101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	7 189	14 378
86	18	248-302-0501РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277	4 554
87	19	6125-0602-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	3	2 796	8 388
88	20	247-202-1101РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	3	20 091	60 273
89	21	6119-0402-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1 074	1 074
90	22	247-214-0103РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	410	410
91	23	1310-0601-0102РСНБ РК 2022	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	149 178	149 178
92	24	СТПереченьРСНБ РК 2022	Антена выносная направленная стандарта GSM	шт	1	47 357	47 357

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	25	6125-0702-1207ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 800х1800 мм	шт.	1	23 586	23 586
94	26	247-201-0102РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6 763
95	27	1308-0206-2202РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	396	55 440
96	28	243-303-0412РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0.1	93 210	9 321
97	29	243-105-0501РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.025	343 606	8 590
98	30	243-802-0102РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0.015	98 588	1 479
99	31	6125-0202-0206ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	66 955	66 955
100	33	6124-0303-0305ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1	61 764	61 764
101	34	ТПеречень п.56ЕСЦ РСНБ РК 2023	АВР на 220В ,ШУ-8853-42	шт	1	141 127	141 127
			Итого по разделу: Оборудование				**1 250 933**
			Итого по локальной смете: Охранная сигнализация (остаточные работы)				**1 250 933**
			Локальная смета: Общестроительные работы АС (остаточные работы)				
			Раздел: Подпольные каналы				
			Подраздел: ПК-1				
102	27	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.32432	418	1 808
			Итого по подразделу: ПК-1				**1 808**
			Подраздел: ПК-2				
103	32	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.32432	418	1 808
104	33	1108-0201-0703РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.20253	719 243	145 668
105	34	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8.648031	418	3 615
			Итого по подразделу: ПК-2				**151 091**
			Подраздел: ПК-3				
106	39	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	9.3842944	418	3 923
107	40	1108-0201-0703РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.3297	719 243	237 134
108	41	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	14.07819	418	5 885

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ПК-3				**246 942**
			Подраздел: Фундамент под трансформатор Ф-1 (2шт.)				
109	46	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	35.30176	418	14 756
			Итого по подразделу: Фундамент под трансформатор Ф-1 (2шт.)				**14 756**
			Итого по разделу: Подпольные каналы				**414 597**
			Раздел: Устройство проемов				
			Подраздел: Двери ДМ-1				
110	79	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.9856	418	412
			Итого по подразделу: Двери ДМ-1				**412**
			Подраздел: Ворота				
111	86	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	75.041812	418	31 367
112	89	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6.79488	418	2 840
			Итого по подразделу: Ворота				**34 207**
			Итого по разделу: Устройство проемов				**34 619**
			Раздел: Кровля				
113	115	224-105-0102РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13.28	1 516	20 132
114	116	224-105-0302РСНБ РК 2022	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	1 355	5 420
			Подраздел: Слуховые окна 2 шт				
115	120	6110-0101-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	7	12 473	87 311
			Итого по подразделу: Слуховые окна 2 шт				**87 311**
			Итого по разделу: Кровля				**112 863**
			Раздел: Крыльца, пандусы /АС-7/				
			Подраздел: Пандус				
116	140	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	3.8	14 187	53 911
117	141	6103-0101-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	5.7	37 158	211 801
			Итого по подразделу: Пандус				**265 712**
			Итого по разделу: Крыльца, пандусы /АС-7/				**265 712**
			Итого по локальной смете: Общестроительные работы АС (остаточные работы)				**827 791**
			Локальная смета: Электросиловое оборудование (остаточные работы)				
			Раздел: Оборудование				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения, отопления и вентиляции				
118	21	6116-0301-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конвекторов	кВт	6	5 143	30 858
119	22	245-201-0202РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	6	27 034	162 204
			Итого по подразделу: Аппаратура низкого напряжения до 1 кВ для освещения, отопления и вентиляции				**193 062**
			Итого по разделу: Оборудование				**193 062**
			Раздел: Заземление				
120	47	6124-0203-0306ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	18	1 238	22 284
121	48	6124-0203-0306ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	80	1 238	99 040
122	49	6124-0203-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	20	1 302	26 040
			Итого по разделу: Заземление				**147 364**
			Раздел: Средства защиты				
123	51	ТПеречень п.34.20-34.22 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Средства защиты. Ящик для песка. Барьер (в трансформаторных отсеках)	к-кт.	1	458 464	458 464
124	52	248-305-0203РСНБ РК 2022	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	2	20 960	41 920
125	53	248-305-0104РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	1	7 804	7 804
			Итого по разделу: Средства защиты				**508 188**
			Итого по локальной смете: Электросиловое оборудование (остаточные работы)				**848 614**
			ИТОГО по акту:				**14 055 998**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.500%)	12680620.241 x 7.50%	951 047
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	14055998.241 + 951046.518	15 007 045
	Сметная прибыль, (5.00%)	13631666.759 x 5.00%	681 583
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	15007044.759 x 5.000%	750 352
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		16 438 980
	коэф на 25 год-1,075, к = 1.0750	16438980.335 x 1.0750	17 671 904
	НДС (12%)	17671903.860 x 12%	2 120 628
	Итого с НДС	17671903.860 + 2120628.463	19 792 532

Лист согласования
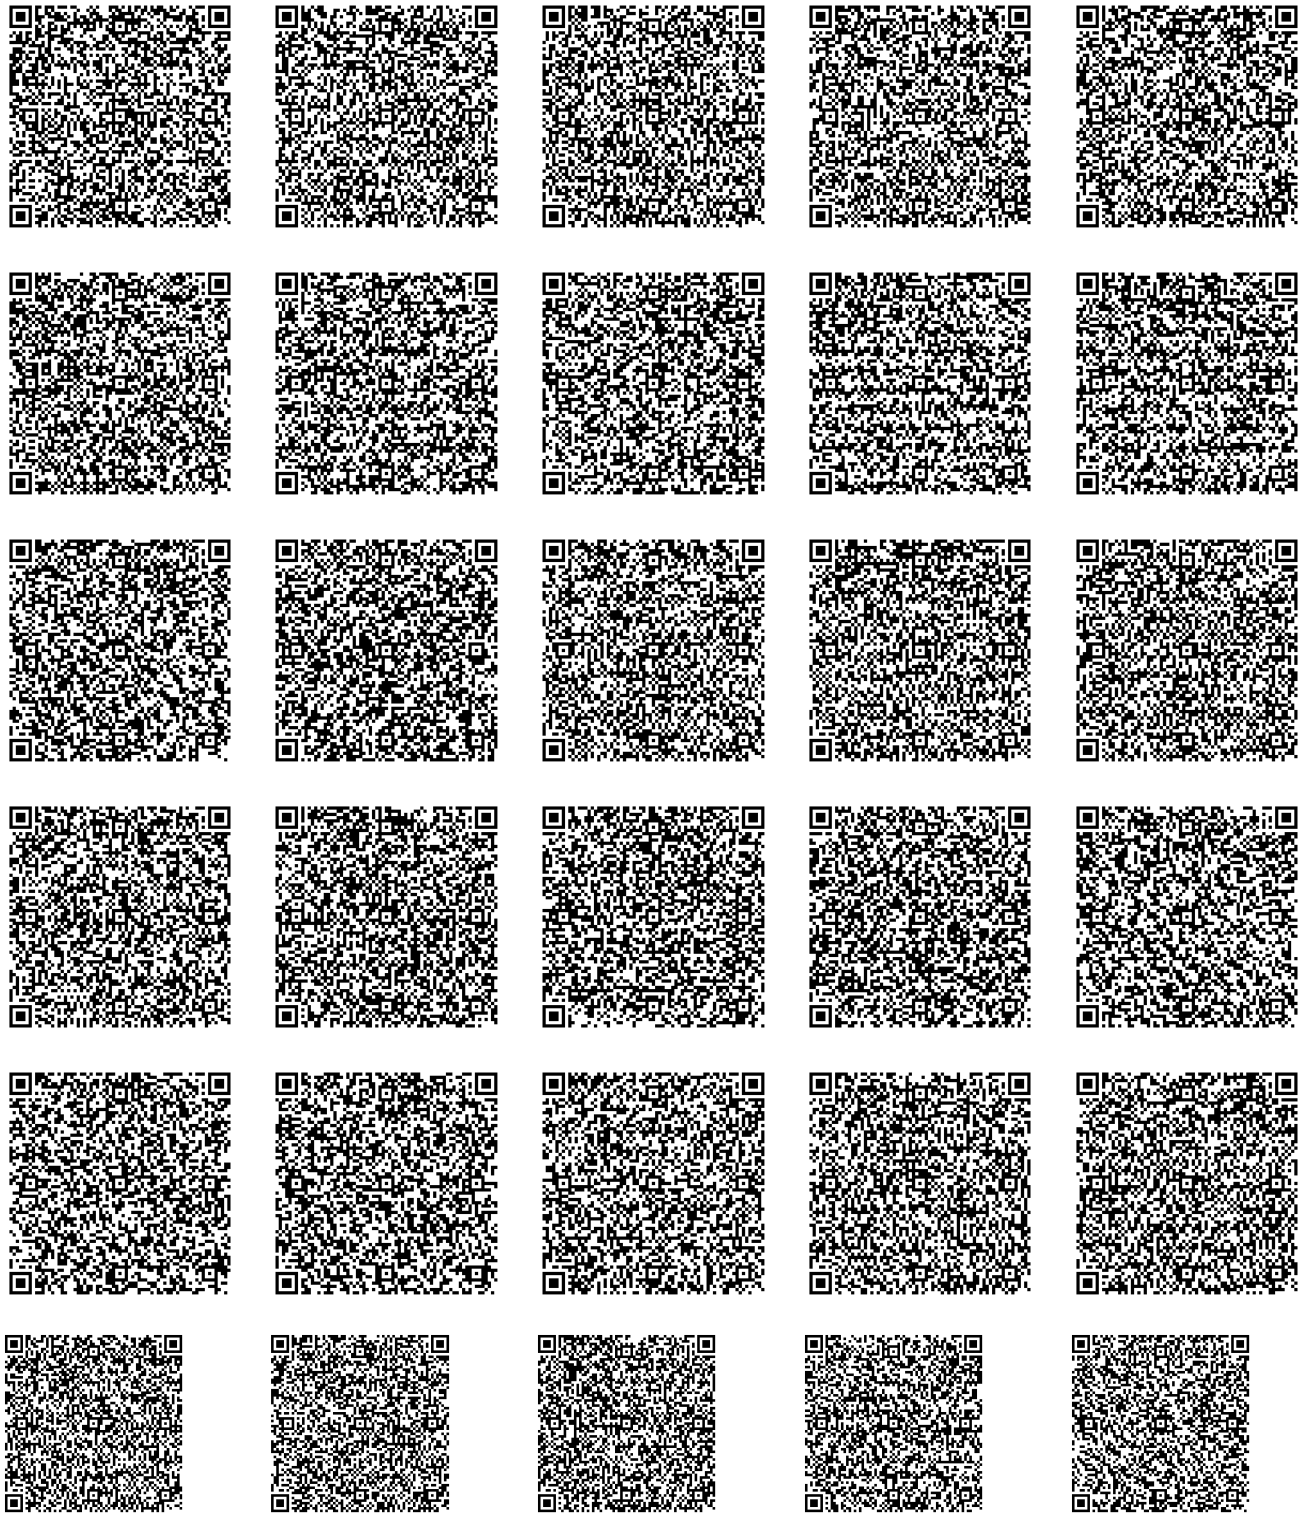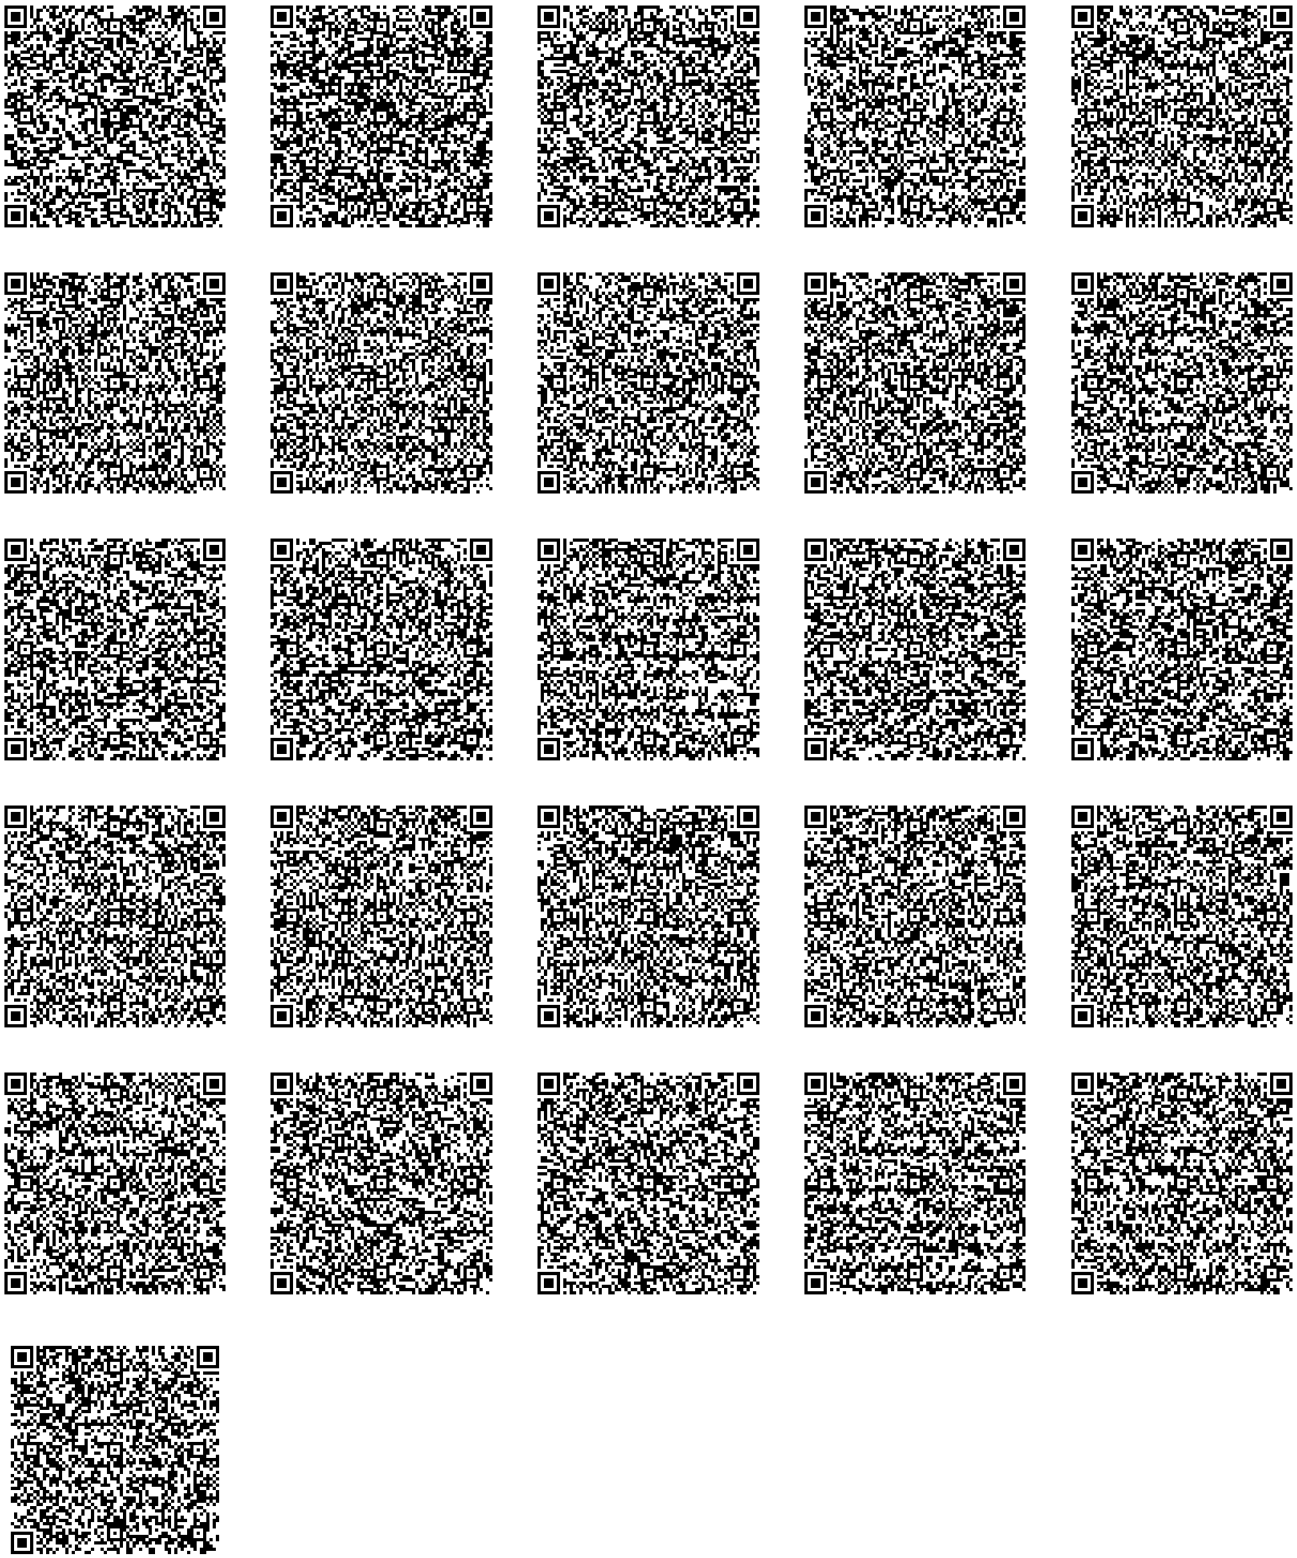
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
810308350298 - КАБАСОВ КУАТ АЙТМАГАМБЕТОВИЧ	Ген подрядчик	25.09.2025 18:10
Представители технического надзора		
861221450769 - МУРЗАБЕКОВА КУЛЯИМ КУДАЙБЕРГЕНОВНА	Технадзор	26.09.2025 13:48
Представители авторского надзора		
850912350576 - КОННОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ	Авторский надзор	26.09.2025 16:02
Представители заказчика		
890128350782 - АЛПЫСБАЕВ МУРАТ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ	Главный эксперт	29.09.2025 08:45
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий ОКС УДП РК	29.09.2025 16:18
