Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - ГУ Управление делами Президента Республики Казахстан**

Подрядчик: **030540005073 - ТОО «Строитель 2003»**

Стройка: **Строительство инженерных сетей от поселка Бурабай до озер "Большое Чебачье" и "Текеколь" ГНПП "Бурабай". 2 очередь". Корректировка. Остаточные работы (с учетом корректировки). 2 пусковой комплекс.**

Договор подряда (контракт) №: **- от - года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Работы в замен не подлежащих выполнению. Внутриплощадочные сети связи (остаточные работы)2 пусковой комплекс.				
			Раздел: Колодец ККС-2 (код 2)				
1	1	1134-0201-0604РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	26 979	26 979
2	2	225-201-0103РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	59 151	59 151
			Итого по разделу: Колодец ККС-2 (код 2)				**86 130**
			Раздел: Прокладка и подключение кабеля ОКЛ по зданию гор. центра				
3	3	6124-0201-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	200	1 803	360 600
4	4	243-502-0113РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2207	км	0.204	272 235	55 536
5	5	1308-0304-0304РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	17 011	17 011
6	6	247-201-0102РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6 763
7	7	СТПрайсРСНБ РК 2022	Бокс оптический распределительный FTTH-24SC	шт	1	10 086	10 086
8	8	СТПрайсРСНБ РК 2022	Сплиттер оптический 1х16 in900/out900-SC/APC-1м	шт	1	2 967	2 967
9	9	6125-0704-1102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС, УССЛК число волокон 8	шт.	1	154 546	154 546
10	10	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Муфта оптическая FOSC-A8-24F	шт	1	13 015	13 015

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	6125-0105-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж в шкафу, кроссировка	шт.	1	657	657
12	12	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Кросс оптический FDF-1U-24 port-SC (серый)	шт	1	12 102	12 102
			Итого по разделу: Прокладка и подключение кабеля ОКЛ по зданию гор. центра				**633 283**
			Итого по локальной смете: Работы в замен не подлежащих выполнению. Внутриплощадочные сети связи (остаточные работы)2 пусковой комплекс.				**719 413**
			Локальная смета: ..Работы в замен не подлежащих выполнению. Благоустройство				
			Раздел: Устройство беговой дорожки 640 м				
13	1	7101-0403-1204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	м2	745.12	196	146 044
14	2	217-203-0303РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м	м2	760.0224	341	259 168
15	3	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	111.768	3 388	378 670
16	4	211-501-0103РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 карьерный песок фракция 1,5 - 3 мм	м3	125.18016	4 406	551 544
			Итого по разделу: Устройство беговой дорожки 640 м				**1 335 426**
			Итого по локальной смете: ..Работы в замен не подлежащих выполнению. Благоустройство				**1 335 426**
			Локальная смета: Работы в замен не подлежащих выполнению. Наружное электроснабжение 0,4кВ (остаточные работы)				
			Раздел: Подключение КНС 2 к электроснабжению от ТП3 (КЛ-0,4 кВ)				
			Подраздел: РЗемляные работы				
17	1	6101-0102-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	322.76475	527	170 097
18	2	6101-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	32.276475	19 067	615 416
19	3	6101-0106-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	227.13075	115	26 120
20	4	6101-0106-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0103	м3	227.13075	50	11 357
21	5	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	531.1	828	439 751
22	6	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	31.878	4 949	157 764

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	7	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	63.756	3 784	241 253
24	8	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	63.756	4 949	315 528
			Итого по подразделу: РЗемляные работы				**1 977 286**
			Подраздел: Кабельная продукция				
25	9	6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	560	1 240	694 400
26	10	243-125-1809РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х70 (ок)-1	км	0.5712	2 977 949	1 701 004
27	11	243-903-7503РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	2	17 509	35 018
28	12	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	531.3	775	411 757
29	13	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2.24	86 970	194 813
30	14	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	531.3	24	12 751
31	15	249-101-0505РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	531.3	156	82 883
			Итого по подразделу: Кабельная продукция				**3 132 626**
			Итого по разделу: Подключение КНС 2 к электроснабжению от ТП3 (КЛ-0,4 кВ)				**5 109 912**
			Раздел: Подключение кабеля к распределительному шкафу в котельной				
32	16	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 2 кг	км	0.01	506 875	5 069
33	17	243-106-1005РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1	км	0.0102	3 430 048	34 986
			Итого по разделу: Подключение кабеля к распределительному шкафу в котельной				**40 055**
			Итого по локальной смете: Работы в замен не подлежащих выполнению. Наружное электроснабжение 0,4кВ (остаточные работы)				**5 149 967**
			Локальная смета: Работы в замен не подлежащих выполнению. Наружные сети водопровода и канализации (остаточные работы 2023).				
			Раздел: Водопровод ПГ5-ПГ14				
34	1	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб, диаметр 160 мм	м	116.5	514	59 881
35	2	241-201-0515РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х11,8 мм	м	117.665	6 589	775 295
			Итого по разделу: Водопровод ПГ5-ПГ14				**835 176**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализация К19.1-К42				
36	3	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2.	м3	5277.45	708	3 736 435
37	4	6101-0106-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	4796.415	115	551 588
38	5	6101-0106-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0103/перемещение грунта на 15 м, добавляем к основной позиции 10м/	м3	4796.415	99	474 845
39	6	412-102-0206РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	4839.21	61	295 192
40	7	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	337.69	56	18 911
41	8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	337.69	657	221 862
42	9	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0.0891	4 848 895	432 037
43	10	241-201-0821РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	89.991	16 150	1 453 355
44	11	6121-0105-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0.10044	3 238 276	325 252
45	12	241-201-0818РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	101.4444	8 318	843 815
46	13	6101-0106-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	300	115	34 500
47	14	6101-0106-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0103	м3	300	50	15 000
			Итого по разделу: Канализация К19.1-К42				**8 402 792**
			Раздел: Колодцы полиэтиленовые				
			Подраздел: Плита размерами 2200х2200х300мм 5 шт				
48	15	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.64	14 187	37 454
49	16	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	6.6	42 707	281 866
50	17	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.264	287 369	75 865

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	18	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	37.4	4 846	181 240
			Итого по подразделу: Плита размерами 2200х2200х300мм 5 шт				**576 425**
			Подраздел: Плита размерами 2200х2000х300мм 6 шт				
52	19	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3.456	14 187	49 030
53	20	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	8.712	42 926	373 971
54	21	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.33264	287 369	95 590
55	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	44.88	4 846	217 488
			Итого по подразделу: Плита размерами 2200х2000х300мм 6 шт				**736 079**
			Подраздел: Анкерное соединение				
56	23	6103-0701-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного с шайбой: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0.04224	207 107	8 748
57	24	217-101-0102РСНБ РК 2022	Анкерный болт с гайкой и шайбой M20 L200 ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.04224	1 448 727	61 194
			Итого по подразделу: Анкерное соединение				**69 942**
			Подраздел: Устройство полиэтиленовых колодцев				
58	25	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	8.24	13 103	107 969
59	26	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-19.1 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.8240 SN8, масса 1533 кг	шт.	1	3 996 098	3 996 098
60	27	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	8.13	13 103	106 527
61	28	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-42 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.8130 SN8, масса 1512 кг	шт.	1	3 515 137	3 515 137
62	29	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	8.3	13 103	108 755
63	30	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-41 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.8300 SN8, масса 1544 кг	шт.	1	3 580 816	3 580 816
64	31	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	6.8	13 103	89 100

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	32	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-22 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.7000 SN8, масса 1302 кг	шт.	1	3 078 566	3 078 566
66	33	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	6.75	13 103	88 445
67	34	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-21 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.6750 SN8, масса 1256 кг	шт.	1	2 981 980	2 981 980
68	35	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	6.58	13 103	86 218
69	36	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-20 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.6580 SN8, масса 1224 кг	шт.	1	2 874 772	2 874 772
70	37	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	5.64	13 103	73 901
71	38	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-19 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.5640 SN8, масса 1049 кг	шт.	1	2 511 608	2 511 608
72	39	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	3.82	13 103	50 053
73	40	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-18 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.3820 SN8, масса 710 кг	шт.	1	1 808 458	1 808 458
74	41	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	3.4	13 103	44 550
75	42	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-17 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.3400 SN8, масса 632 кг	шт.	1	1 646 194	1 646 194
76	43	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	3.98	13 103	52 150
77	44	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-16 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.3980 SN8, масса 740 кг	шт.	1	1 870 274	1 870 274
78	45	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	3.4	13 103	44 550
79	46	СТПрайсЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодец К-15 полиэтиленовый сварной PE DN/ID1500.3400 SN8, масса 632 кг	шт.	1	1 646 194	1 646 194
			Итого по подразделу: Устройство полиэтиленовых колодцев				**30 362 315**
			Подраздел: Якорение колодцев				
80	47	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	12.76	58 985	752 649
81	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных лотков в полиэтиленовых колодцах	м3	7.744	37 250	288 464

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	101.2	4 846	490 415
			Итого по подразделу: Якорение колодцев				**1 531 528**
			Подраздел: Запорная арматура для колодцев из полиэтилена				
83	50	241-214-0111РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3 398	6 796
84	51	241-214-0117РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	16	18 737	299 792
85	52	241-214-0114РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	34	8 406	285 804
86	53	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0.328	2 347 975	770 136
87	54	241-116-0415РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	16	33 931	542 896
88	55	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0.3696	3 852 798	1 423 994
89	56	241-116-0413РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	34	18 489	628 626
90	57	241-116-0412РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	13 626	27 252
91	58	217-101-0102РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.09138	1 448 727	132 385
92	59	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 737	9 474
93	60	241-208-0118РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	71 015	142 030
			Итого по подразделу: Запорная арматура для колодцев из полиэтилена				**4 269 185**
			Итого по разделу: Колодцы полиэтиленовые				**37 545 474**
			Раздел: Подключение котельной к водоснабжению и канализации с утеплением трубопроводов				
94	61	1116-0501-0101РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3 651	25 557
95	62	241-201-0102РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	7.14	406	2 899
96	63	1116-0501-0101РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3 651	21 906
97	64	241-201-0408РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	6.12	797	4 878
98	65	242-202-0206РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	73 911	73 911

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	66	6124-0202-1103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе полимерной, диаметр до 50 мм	м	20	792	15 840
100	67	243-403-0102РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL16-2CR	м	10	1 243	12 430
101	68	243-403-0103РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL24-2CR	м	10	1 299	12 990
102	69	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	20	2 009	40 180
103	70	234-303-0307РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	11	434	4 774
104	71	234-303-0314РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	11	817	8 987
105	72	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 998	5 998
106	73	242-106-2402РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	1	20 946	20 946
			Итого по разделу: Подключение котельной к водоснабжению и канализации с утеплением трубопроводов				**251 296**
			Раздел: Монтаж насосного оборудования на КНС-3 и КНС-4				
			Подраздел: КНС-3				
107	74	6121-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0.015	2 103 606	31 554
108	75	241-102-0163РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	15	3 827	57 405
109	76	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	7.56	272	2 056
110	77	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.2	208	874
111	78	1122-0801-0206РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 80-110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	5 140	41 120
112	79	241-116-0210РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 366	8 732
113	80	241-116-0209РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 434	6 868
114	81	241-214-0108РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 578	3 156
115	82	241-214-0107РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 101	2 202

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	83	241-114-0140РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 89 до 110 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	1	4 355	4 355
117	84	6121-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	2	9 739	19 478
118	85	242-101-0302РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	31 887	63 774
119	86	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 963	19 926
120	87	241-223-0203РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	4 257	8 514
121	88	6122-0401-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр 1 метр	м	8.8	13 103	115 306
122	89	ТПрайс ТОО «Sayana» ЕСЦ РСНБ РК 2023	Корпусная насосная станция из стеклопластика DN 1600мм, Н±8800мм.	шт.	1	2 325 581	2 325 581
123	90	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	83 408	166 816
124	91	511-302-0102РСНБ РК 2022	Насос фекальный сетевой подача 25,0 м3/ч, напор 22,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	шт.	2	534 103	1 068 206
			Итого по подразделу: КНС-3				**3 945 923**
			Подраздел: КНС-4				
125	92	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм /приминительно к д65мм	шт.	1	5 998	5 998
126	93	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	83 408	166 816
127	94	6124-0103-2001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора измерения, управления и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	7 158	7 158
			Итого по подразделу: КНС-4				**179 972**
			Итого по разделу: Монтаж насосного оборудования на КНС-3 и КНС-4				**4 125 895**
			Итого по локальной смете: Работы в замен не подлежащих выполнению. Наружные сети водопровода и канализации (остаточные работы 2023).				**51 160 633**
			Локальная смета: .Работы в замен не подлежащих выполнению. Благоустройство				
			Раздел: Устройство пешеходных дорожек				
128	5	7101-0403-1204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	м2	173.66	196	34 037
129	6	217-203-0303РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м	м2	177.1332	341	60 402

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	7	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17.366	8 832	153 377
131	8	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	17.366	5 218	90 616
132	9	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	173.66	4 304	747 433
133	10	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых гранитных, другие виды покрытия	м	684.9	5 532	3 788 867
134	11	255-201-0101РСНБ РК 2022	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	280	16 157	4 523 960
			Итого по разделу: Устройство пешеходных дорожек				**9 398 692**
			Итого по локальной смете: .Работы в замен не подлежащих выполнению. Благоустройство				**9 398 692**
			Локальная смета: Работы в замен не подлежащих выполнению. Наружные сети водопровода и канализации (остаточные работы 2023).				
			Раздел: Устройство водопонижения и водоотлива				
135	104	325-101-0105РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 22 кВт	маш.-ч	335	2 032	680 720
			Итого по разделу: Устройство водопонижения и водоотлива				**680 720**
			Итого по локальной смете: Работы в замен не подлежащих выполнению. Наружные сети водопровода и канализации (остаточные работы 2023).				**680 720**
			ИТОГО по акту:				**68 444 851**
			В том числе оборудование:				**3 393 787**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.500%)	65051064.000 x 7.50%	4 878 830
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	68444851.000 + 4878829.800	73 323 681
	Сметная прибыль, (5.00%)	69929893.800 x 5.00%	3 496 495
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	73323680.800 x 5.000%	3 666 184
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		80 486 360
	коэф на 25 год-1,075, к = 1.0750	80486359.530 x 1.0750	86 522 837
	НДС (12%)	86522837.300 x 12%	10 382 740
	Итого с НДС	86522837.300 + 10382740.476	96 905 578

Лист согласования
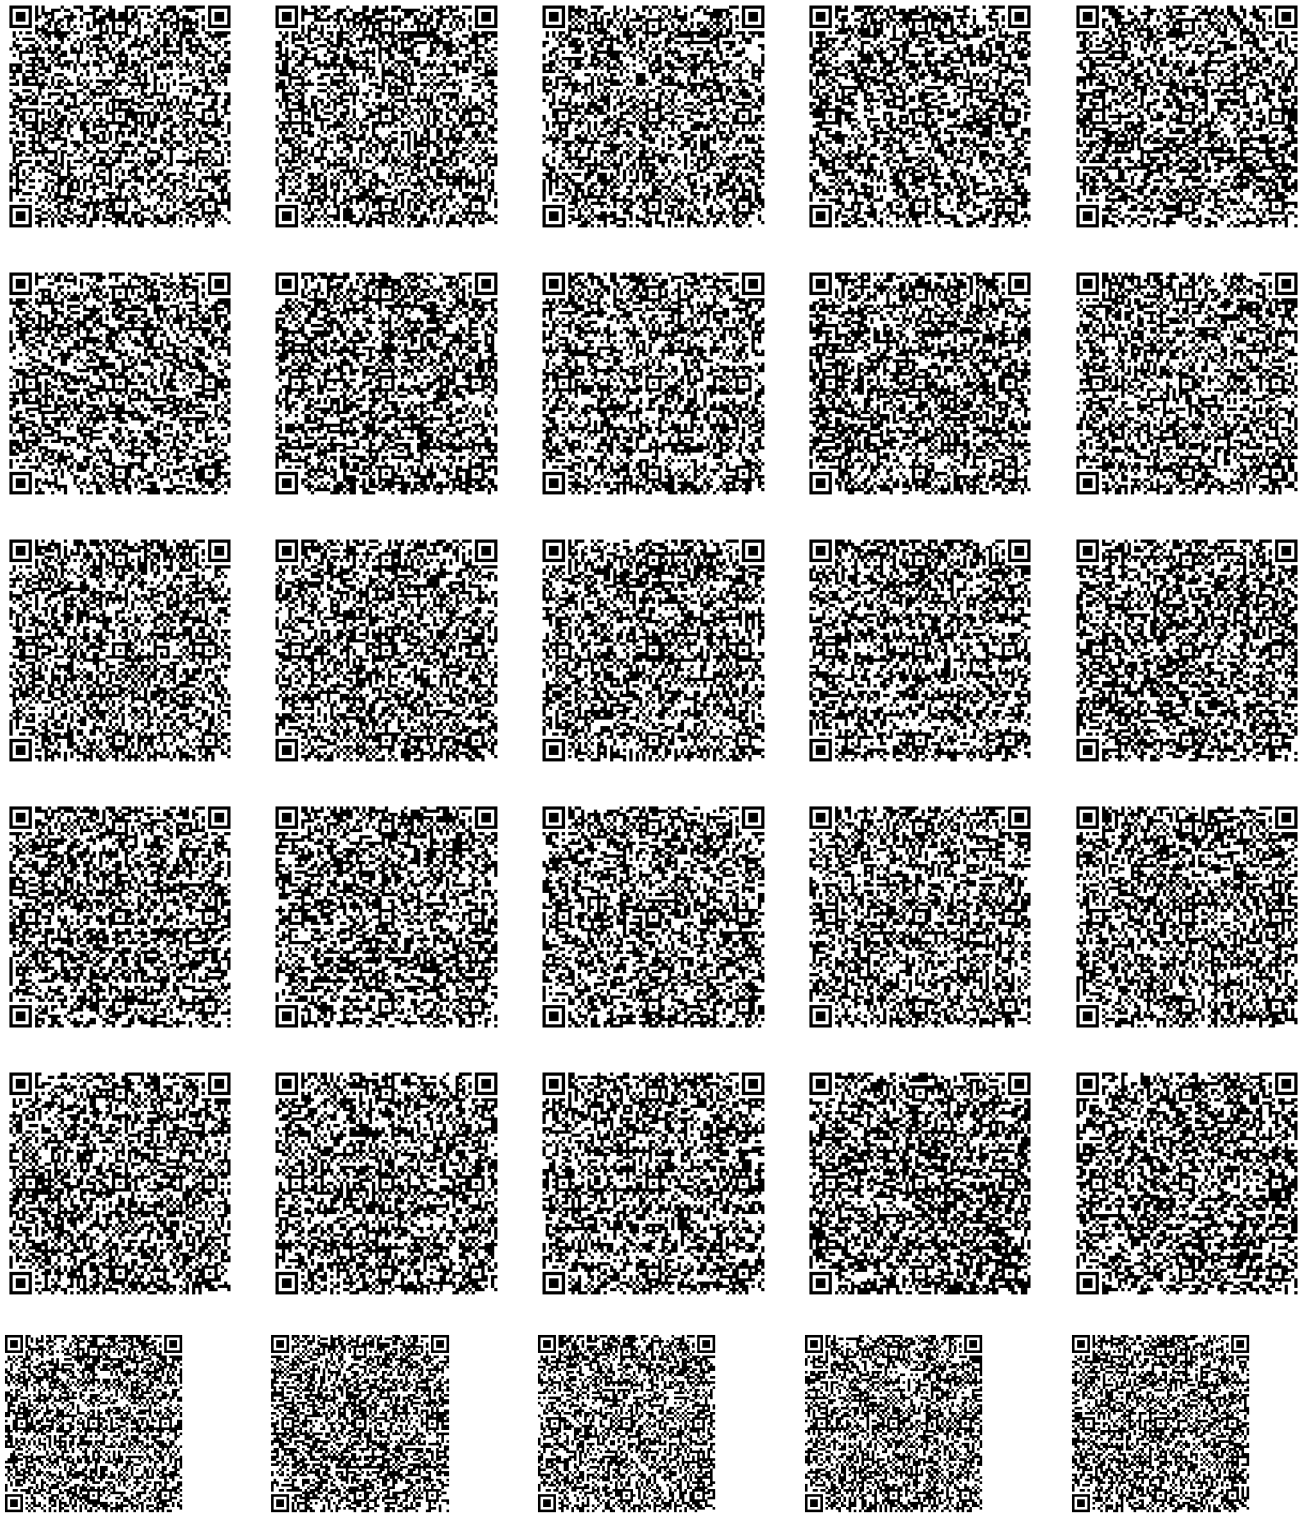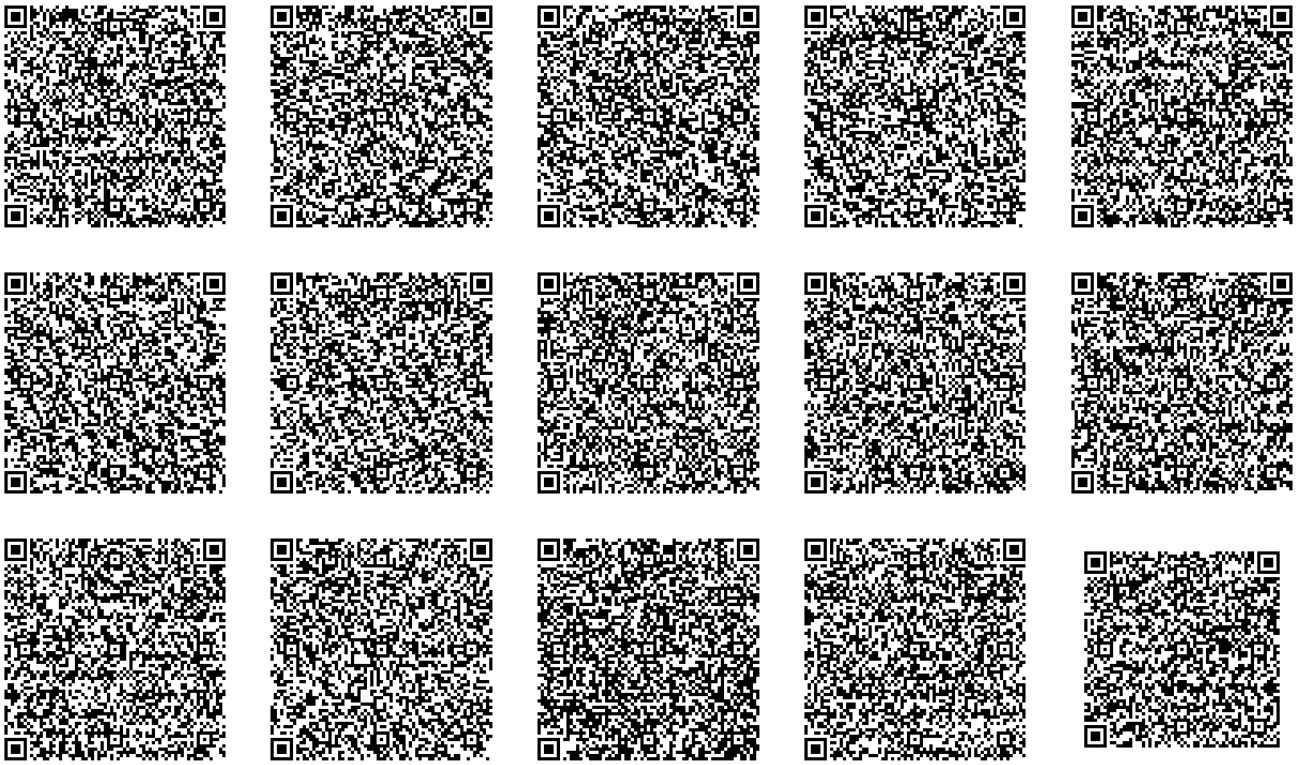
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
810308350298 - КАБАСОВ КУАТ АЙТМАГАМБЕТОВИЧ	Ген подрядчик	11.11.2025 14:27
Представители технического надзора		
861221450769 - МУРЗАБЕКОВА КУЛЯИМ КУДАЙБЕРГЕНОВНА	Технадзор	11.11.2025 14:55
Представители авторского надзора		
850912350576 - КОННОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ	Авторский надзор	11.11.2025 14:37
Представители заказчика		
890128350782 - АЛПЫСБАЕВ МУРАТ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ	Главный эксперт	11.11.2025 17:06
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий ОКС УДП РК	11.11.2025 18:24
