Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Земляные работы				
			Подраздел: Разработка котлована				
1	1	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	934.111875	375	350 292
2	2	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	10536.575625	501	5 278 824
3	3	6101-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м, группа грунта 2	м3	204.3125	16 539	3 379 124
4	4	411-103-0115РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	282116.8123594	91	25 672 630
			Итого по подразделу: Разработка котлована				**34 680 870**
			Подраздел: Засыпка				
5	5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	950.75	64	60 848
6	6	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	950.75	46	43 734
7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	950.75	611	580 908
			Итого по подразделу: Засыпка				**685 490**
			Подраздел: Подготовка из щебня				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	467.3	15 271	7 136 138
			Итого по подразделу: Подготовка из щебня				**7 136 138**
			Итого по разделу: Земляные работы				**42 502 498**
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока А/Б /Лист-7/				
9	9	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	388.6	327	127 071
10	10	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	45.8	33 951	1 554 956
11	11	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	194.3	53 464	10 388 055
12	12	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14.5756	418 459	6 099 291
13	13	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3.5164	294 911	1 037 025
14	14	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.7184	311 690	535 608
15	15	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	121.4375	4 160	505 180
			Итого по подразделу: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока А/Б /Лист-7/				**20 247 187**
			Подраздел: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока В /Лист-14/				
16	16	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	210	327	68 670
17	17	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	26	33 951	882 726
18	18	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	105	53 464	5 613 720
19	19	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7.444	418 459	3 115 009
20	20	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.8476	294 911	544 878
21	21	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.8645	311 690	269 456

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	65.625	4 160	273 000
			Итого по подразделу: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока В /Лист-14/				**10 767 459**
			Подраздел: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока Г/Д /Лист-17/				
23	23	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	309	327	101 043
24	24	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	35.9	33 951	1 218 841
25	25	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	154.5	53 464	8 260 188
26	26	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10.9552	418 459	4 584 302
27	27	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2.7922	294 911	823 450
28	28	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.6826	311 690	524 450
29	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	96.5625	4 160	401 700
			Итого по подразделу: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока Г/Д /Лист-17/				**15 913 974**
			Подраздел: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока Ж /Лист-23/				
30	30	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	84.9	327	27 762
31	31	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	10.5	33 951	356 486
			Итого по подразделу: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока Ж /Лист-23/				**384 248**
			Подраздел: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока И /Лист-25/				
32	37	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	55	327	17 985
33	38	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	7.6	33 951	258 027
34	39	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	27.5	53 464	1 470 260
35	40	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2.5618	418 459	1 072 008

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	41	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.6854	294 911	202 131
37	42	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4457	311 690	138 920
			Итого по подразделу: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока И /Лист-25/				**3 159 333**
			Подраздел: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока Е /Лист-33/				
38	50	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	54.3	327	17 756
39	51	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	7.6	33 951	258 027
			Итого по подразделу: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока Е /Лист-33/				**275 784**
			Подраздел: Р Сборные фундаментные блоки /Лист-32/				
40	57	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	484	7 591	3 674 044
41	58	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	307	5 680	1 743 760
42	59	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	185	5 144	951 640
43	60	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	451	12 345	5 567 595
44	61	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	766	34 022	26 060 851
45	62	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного ленточного /монолитные заделки между блоками/	м3	29.15	45 646	1 330 580
			Итого по подразделу: Р Сборные фундаментные блоки /Лист-32/				**39 328 471**
			Подраздел: Р Монолитный пояс				
46	67	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	130.2	88 705	11 549 391
47	68	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5.118717	311 690	1 595 453
48	69	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.677849	323 349	542 531
			Итого по подразделу: Р Монолитный пояс				**13 687 375**
			Итого по разделу: Фундаменты				**103 763 831**
			Раздел: Плиты перекрытия /Лист-82/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	81	6104-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 м2	шт.	380	20 975	7 970 500
50	82	6104-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	47	13 783	647 801
51	83	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	3242.04	8 463	27 437 384
52	84	222-203-0303РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	206.44	8 193	1 691 362
			Итого по разделу: Плиты перекрытия /Лист-82/				**37 747 048**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**184 013 378**
			ИТОГО по акту:				**184 013 378**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)				184013378.146 x 6.90%	12 696 923
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				184013378.146 + 12696923.268	196 710 301
		Сметная прибыль, 5.00%				196710301.414 x 5.00%	9 835 515
		Непредвиденные расходы, 2.000%				196710301.414 x 2.000%	3 934 206
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					210 480 022
		в ценах 3, 4 квартала 2023г., к = 0.9699				210480022.513 x 0.9699	204 151 331
		НДС (12%)				204151331.244 x 12%	24 498 159
		Итого с НДС				204151331.244 + 24498159.749	228 649 490

Лист согласования
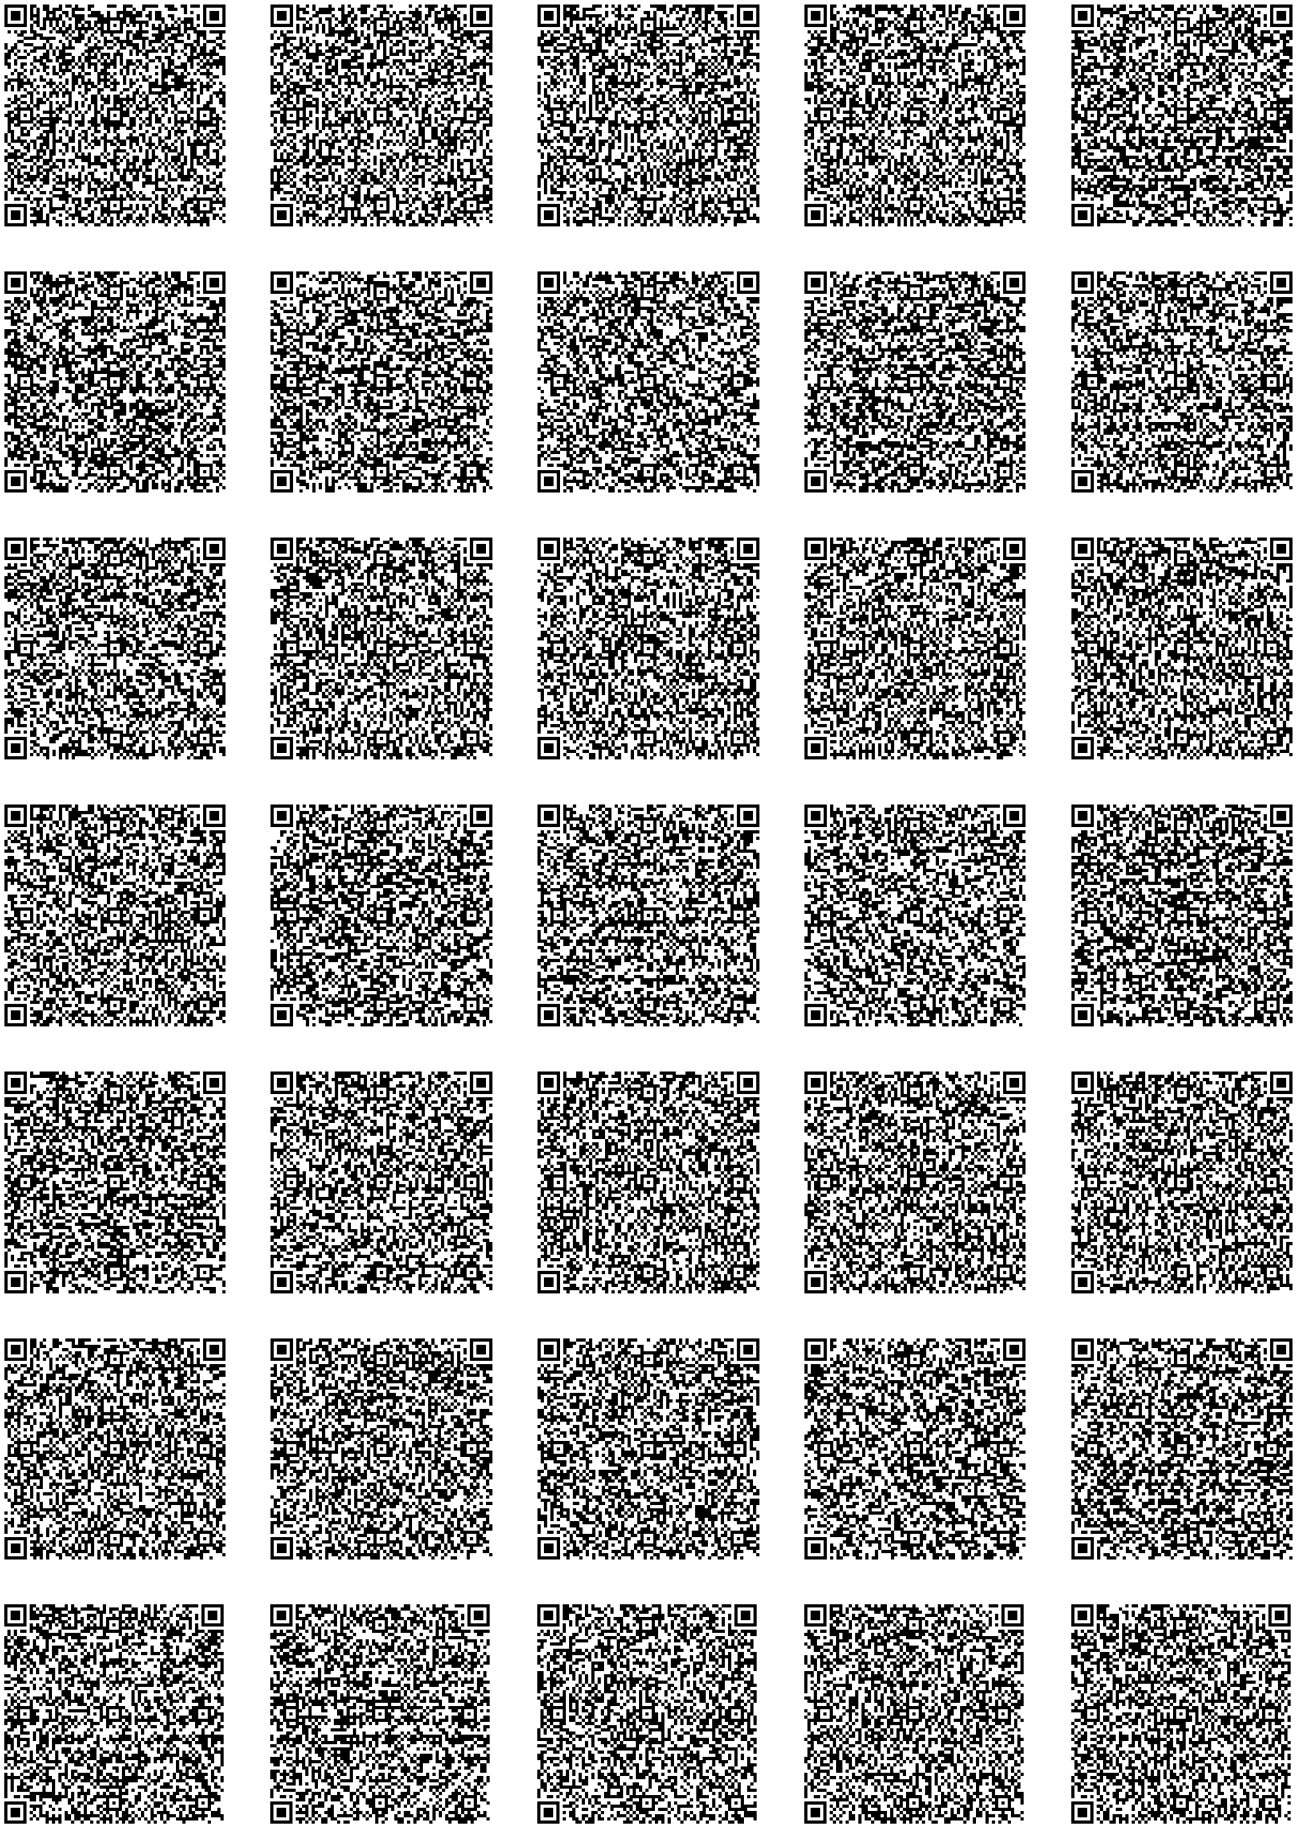
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
790122399035 - АБДРАХПАНОВ МАХАМБЕТ АБДУАЛИЕВИЧ	Директор	20.12.2024 07:36
Представители технического надзора		
890412300509 - БӨЛЕКОВ ТЕМІРЛАН ЖАНГЕЛДІҰЛЫ	Эксперт	20.12.2024 09:39
Представители авторского надзора		
870222300077 - БЕКБАГАМБЕТОВ БАТЫРБЕК БОЛАТОВИЧ	Авторский надзор	20.12.2024 07:41
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	25.12.2024 09:43 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
901011351283 - БЕКСУЛТАНОВ АРМАН ЕРКИНОВИЧ	Ведущий специалист (ПТО)	25.12.2024 09:41
600110300905 - ИБРАЕВ АСАН САГИНГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель	25.12.2024 09:51
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	и.о. Заместителя Директора департамента строительства по реализации национального проекта	26.12.2024 04:28
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист Отдела смет и и ценообразования	25.12.2024 16:03 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
