Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-строительные чертежи				
			Раздел: Стены и перегородки /Листы - 6-7/				
			Подраздел: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				
1	6	6105-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	673.7	9 702	6 536 237
2	7	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	33.95	77 102	2 617 612
3	8	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.72366	300 662	217 576
4	9	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.72366	85 269	61 705
5	10	6105-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	363.48	9 702	3 526 483
6	11	213-102-0201РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	18.32	53 522	980 522
7	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.515	300 662	154 841
8	13	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.515	85 269	43 913
			Итого по подразделу: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				**14 138 893**
			Подраздел: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				
9	14	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней	м3	322.924	38 800	12 529 451
10	15	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	122.7	55 564	6 817 702
11	16	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	3.92	292 085	1 144 972

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	17	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.92	300 662	1 178 594
13	18	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	3.92	85 269	334 254
			Итого по подразделу: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				**22 004 976**
			Подраздел: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				
14	19	6105-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	401.87	40 214	16 160 800
15	20	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	121.15	55 564	6 731 578
16	21	213-102-0306РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	10.69	78 700	841 303
17	22	213-101-0403РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	20.86	106 147	2 214 226
18	23	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	4.36	292 085	1 273 490
19	24	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.36	300 662	1 310 886
20	25	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	4.36	85 269	371 772
21	26	1126-0201-0108РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	968.95	3 505	3 396 170
22	27	234-101-0110РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	98.83	44 521	4 400 010
			Итого по подразделу: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				**36 700 238**
			Подраздел: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				
23	29	6105-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	177.6	9 702	1 723 075
24	30	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8.96	77 102	690 833
25	31	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2	300 662	60 132
26	32	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.2	85 269	17 053
27	33	6105-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	84.27	9 702	817 587
28	34	213-102-0201РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	4.24	53 522	226 933
29	35	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1	300 662	30 066
30	36	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.1	85 269	8 526
			Итого по подразделу: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				**3 574 209**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				
31	37	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней	м3	133.97	38 800	5 198 036
32	38	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	53.19	55 564	2 955 449
33	39	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	3.46	292 085	1 010 614
34	40	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.46	300 662	1 040 290
35	41	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	3.46	85 269	295 030
			Итого по подразделу: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				**10 499 420**
			Подраздел: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				
36	42	6105-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	142.665	40 214	5 737 130
37	43	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	43.36	55 564	2 409 255
38	44	213-102-0306РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	4.72	78 700	371 464
39	45	213-101-0403РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6.114	106 147	648 982
40	46	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	3	292 085	876 255
41	47	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3	300 662	901 985
42	48	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	3	85 269	255 806
43	49	1126-0201-0108РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	807	3 505	2 828 535
44	50	234-101-0110РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	35.2	44 521	1 567 139
			Итого по подразделу: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				**15 596 554**
			Итого по разделу: Стены и перегородки /Листы - 6-7/				**102 514 292**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-строительные чертежи				**102 514 292**
			ИТОГО по акту:				**102 514 292**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)	102514292.322 x 6.90%	7 073 486
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	102514292.322 + 7073486.268	109 587 778
	Сметная прибыль, 5.00%	109587778.591 x 5.00%	5 479 388
	Непредвиденные расходы, 2.000%	109587778.591 x 2.000%	2 191 755
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		117 258 923
	в ценах 3,4 кварталов 2023г., к = 0.9699	117258923.092 x 0.9699	113 733 194

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС (12%)				113733194.076 x 12%	13 647 983
		Итого с НДС				113733194.076 + 13647983.289	127 381 177

Лист согласования
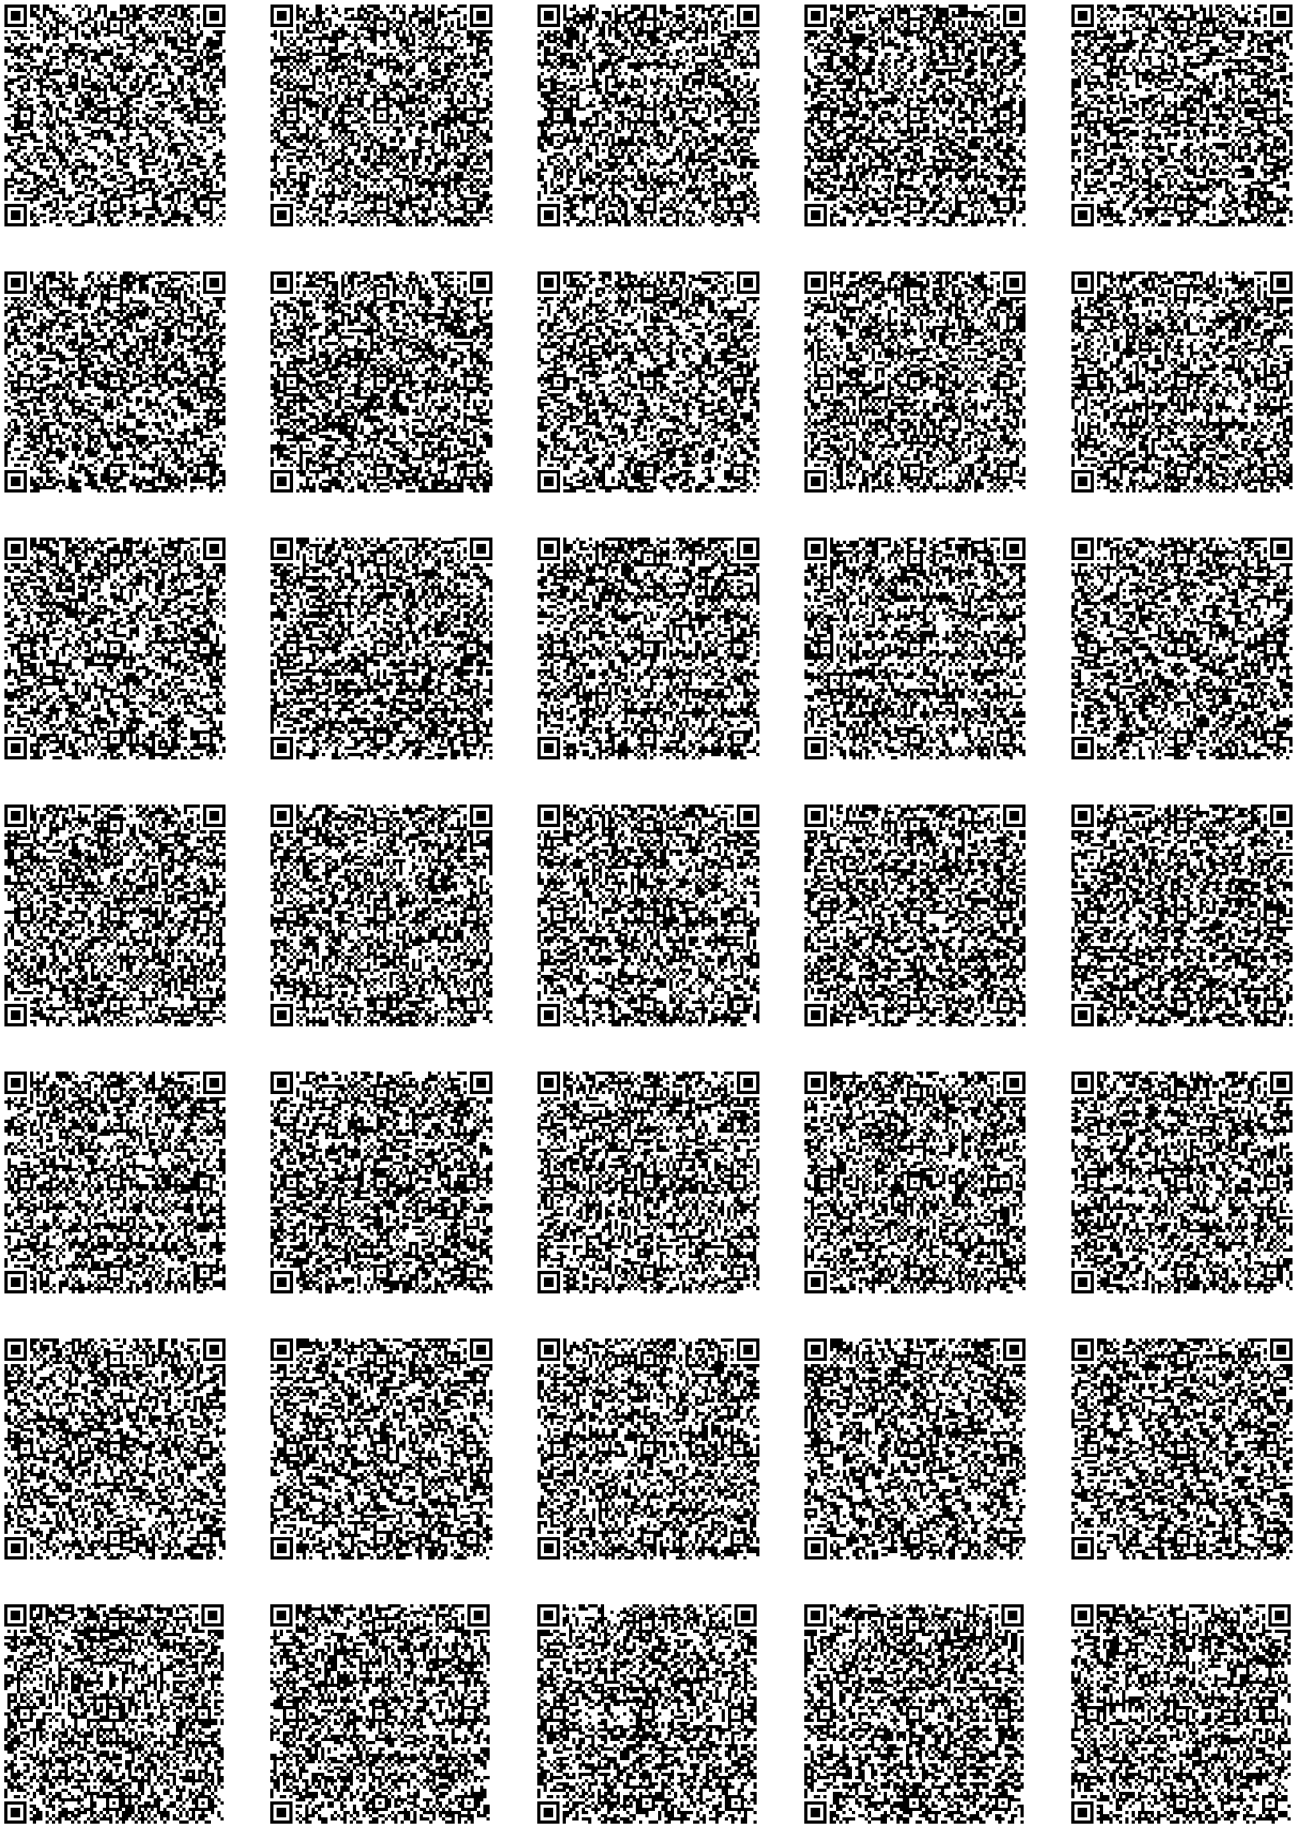
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
790122399035 - АБДРАХПАНОВ МАХАМБЕТ АБДУАЛИЕВИЧ	Директор	17.01.2025 05:02
Представители технического надзора		
890412300509 - БӨЛЕКОВ ТЕМІРЛАН ЖАНГЕЛДІҰЛЫ	Эксперт	17.01.2025 08:19
Представители авторского надзора		
870222300077 - БЕКБАГАМБЕТОВ БАТЫРБЕК БОЛАТОВИЧ	Авторский надзор	17.01.2025 05:18
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	19.01.2025 12:48 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600110300905 - ИБРАЕВ АСАН САГИНГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель	19.01.2025 13:16
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	20.01.2025 09:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	21.01.2025 03:24
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	19.01.2025 11:13 Комментарий: согласовано
