Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-планировочные решения				
			Раздел: Окна /Лист-13/				
			Подраздел: ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОК-10, ОК-11				
1	40	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	211.68	7 467	1 580 615
2	41	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	211.68	50 401	10 668 884
			Итого по подразделу: ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОК-10, ОК-11				**12 249 498**
			Подраздел: ОК-3, ОК-5				
3	42	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	26.46	6 376	168 709
4	43	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	26.46	52 349	1 385 155
			Итого по подразделу: ОК-3, ОК-5				**1 553 863**
			Итого по разделу: Окна /Лист-13/				**13 803 362**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-планировочные решения				**13 803 362**
			ИТОГО по акту:				**13 803 362**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)				13803361.756 x 6.90%	952 432
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				13803361.756 + 952431.974	14 755 794
		Сметная прибыль, (5.00%)				14755793.730 x 5.00%	737 790
		Непредвиденные расходы, (2.000%)				14755793.730 x 2.000%	295 116

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					15 788 699
		в ценах 3,4 квартала 2023 года, к = 0.9699				15788699.291 x 0.9699	15 313 966
		НДС (12%)				15313966.335 x 12%	1 837 676
		Итого с НДС				15313966.335 + 1837675.960	17 151 642

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	26.03.2025 14:59
Представители технического надзора		
890412300509 - БӨЛЕКОВ ТЕМІРЛАН ЖАНГЕЛДІҰЛЫ	Эксперт	26.03.2025 16:16
Представители авторского надзора		
870222300077 - БЕКБАГАМБЕТОВ БАТЫРБЕК БОЛАТОВИЧ	Авторский надзор	26.03.2025 17:33
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	28.03.2025 16:00 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	26.03.2025 17:42
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	28.03.2025 16:06
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 17:49 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600110300905 - ИБРАЕВ АСАН САГИНГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель	26.03.2025 18:42

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-строительные чертежи				
			Раздел: Стены и перегородки /Листы - 6-7/				
			Подраздел: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				
1	52	6105-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	150.54	9 702	1 460 539
2	53	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7.587216	77 102	584 990
3	54	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.205646	300 662	61 830
4	55	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.205646	85 269	17 536
5	56	6105-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	277.58	9 702	2 693 081
6	57	213-102-0201РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	13.990032	53 522	748 774
7	58	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3280753	300 662	98 639
8	59	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.3280753	85 269	27 975
			Итого по подразделу: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				**5 693 365**
			Подраздел: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				
9	60	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней	м3	264.19	38 800	10 250 572
10	61	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	100.3922	55 564	5 578 192
11	62	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	3.03076696	292 085	885 242

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	63	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.03076696	300 662	911 237
13	64	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	3.03076696	85 269	258 430
			Итого по подразделу: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				**17 883 673**
			Подраздел: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				
14	65	6105-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	205.94	40 214	8 281 671
15	66	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	61.515	55 564	3 418 020
16	67	213-102-0306РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	5.68206	78 700	447 178
17	68	213-101-0403РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	11.06009	106 147	1 173 995
18	69	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1.71741	292 085	501 630
19	70	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.71741	300 662	516 360
20	71	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1.71741	85 269	146 442
21	72	1126-0201-0108РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	31.4705	3 505	110 304
22	73	234-101-0110РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	3.209991	44 521	142 912
			Итого по подразделу: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				**14 738 512**
			Итого по разделу: Стены и перегородки /Листы - 6-7/				**38 315 550**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-строительные чертежи				**38 315 550**
			ИТОГО по акту:				**38 315 550**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)	38315549.668 x 6.90%	2 643 773
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	38315549.668 + 2643772.964	40 959 323
	Сметная прибыль, (5.00%)	40959322.631 x 5.00%	2 047 966
	Непредвиденные расходы, (2.000%)	40959322.631 x 2.000%	819 186
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		43 826 475
	в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699	43826475.216 x 0.9699	42 508 705
	НДС (12%)	42508705.350 x 12%	5 101 045
	Итого с НДС	42508705.350 + 5101044.642	47 609 750

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	26.03.2025 15:10
Представители технического надзора		
890412300509 - БӨЛЕКОВ ТЕМІРЛАН ЖАНГЕЛДІҰЛЫ	Эксперт	26.03.2025 16:18
Представители авторского надзора		
870222300077 - БЕКБАГАМБЕТОВ БАТЫРБЕК БОЛАТОВИЧ	Авторский надзор	26.03.2025 17:32
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 17:50 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600110300905 - ИБРАЕВ АСАН САГИНГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель	26.03.2025 18:41
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	26.03.2025 17:45
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	28.03.2025 16:18 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	28.03.2025 16:35

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Плиты перекрытия /Лист-82/				
1	81	6104-0401-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 м2	шт.	308	20 975	6 460 300
2	82	6104-0401-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	32	13 783	441 056
3	83	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	3447.38032	8 463	29 175 180
			Итого по разделу: Плиты перекрытия /Лист-82/				**36 076 536**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**36 076 536**
			ИТОГО по акту:				**36 076 536**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)				36076535.724 x 6.90%	2 489 281
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				36076535.724 + 2489280.999	38 565 817
		Сметная прибыль, (5.00%)				38565816.723 x 5.00%	1 928 291
		Непредвиденные расходы, (2.000%)				38565816.723 x 2.000%	771 316
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					41 265 424
		в ценах 3,4 квартала 2023г, к = 0.9699				41265423.893 x 0.9699	40 024 659
		НДС (12%)				40024659.451 x 12%	4 802 959
		Итого с НДС				40024659.451 + 4802959.134	44 827 619

Лист согласования
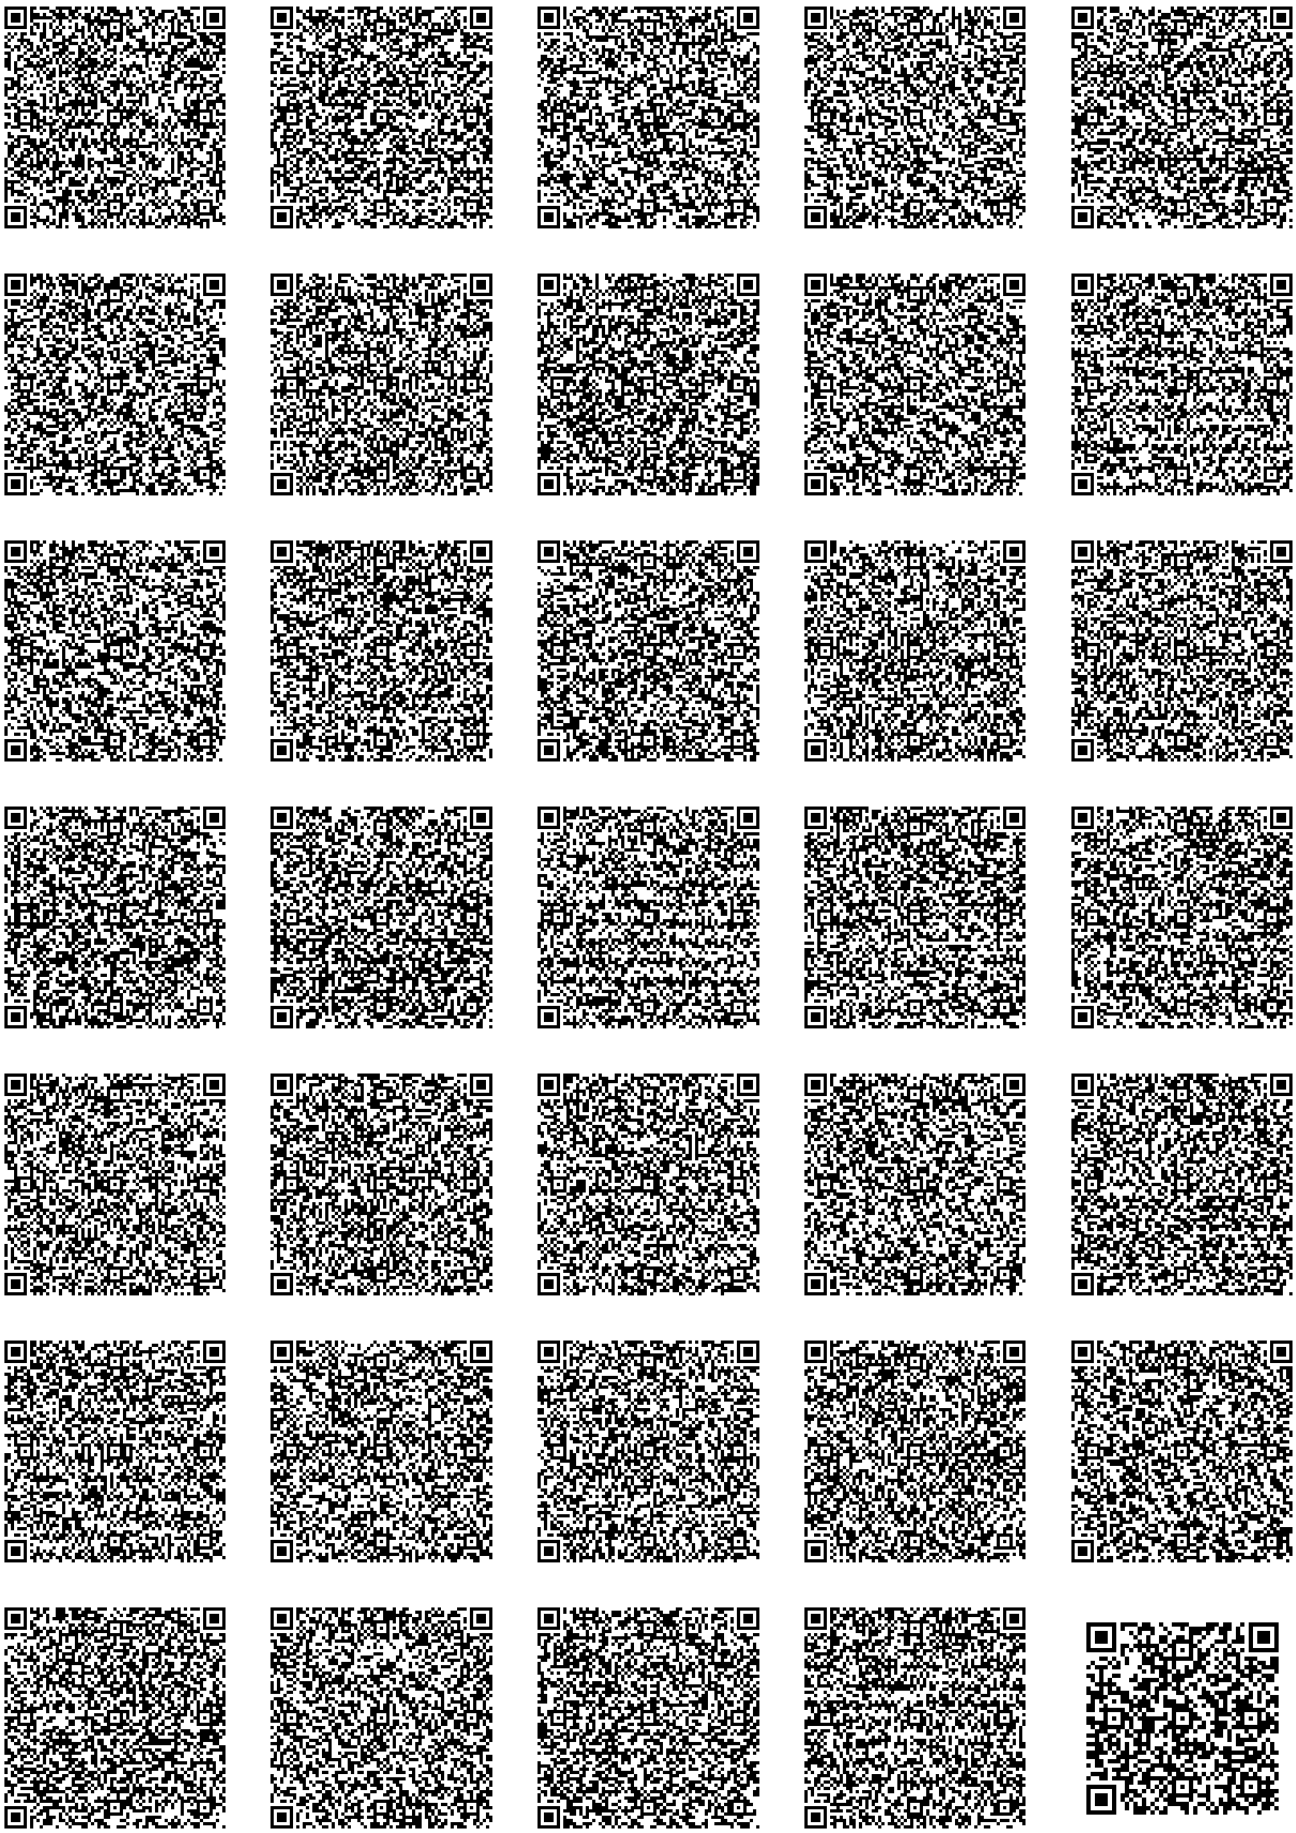
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	26.03.2025 15:00
Представители технического надзора		
890412300509 - БӨЛЕКОВ ТЕМІРЛАН ЖАНГЕЛДІҰЛЫ	Эксперт	26.03.2025 16:17
Представители авторского надзора		
870222300077 - БЕКБАГАМБЕТОВ БАТЫРБЕК БОЛАТОВИЧ	Авторский надзор	26.03.2025 17:33
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	26.03.2025 17:44
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	28.03.2025 16:06 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	28.03.2025 16:07
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 17:50 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600110300905 - ИБРАЕВ АСАН САГИНГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель	26.03.2025 18:41
