Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции металлические				
			Раздел: Блок-Ж /Лист-2/				
			Подраздел: Р Ферма Ф-1ж				
1	1	6106-0302-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса более 5 т, высота до 25 м	т	6.185	104 098	643 846
2	2	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6.43228	1 121 754	7 215 436
			Итого по подразделу: Р Ферма Ф-1ж				**7 859 282**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
3	3	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	179.362	250	44 841
4	4	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	179.362	193	34 617
5	5	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	179.362	2 934	526 248
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**605 706**
			Подраздел: Р Вертикальные связи ВС-1ж				
6	6	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.218	286 888	62 542
7	7	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.226366	1 121 754	253 927
			Итого по подразделу: Р Вертикальные связи ВС-1ж				**316 469**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
8	8	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6.312	250	1 578
9	9	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6.312	193	1 218

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6.312	2 934	18 520
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**21 316**
			Подраздел: Р Вертикальные связи ВС-2ж				
11	11	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.4203	286 888	120 579
12	12	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.437091	1 121 754	490 309
			Итого по подразделу: Р Вертикальные связи ВС-2ж				**610 888**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
13	13	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12.2	250	3 050
14	14	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12.2	193	2 355
15	15	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12.2	2 934	35 795
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**41 200**
			Подраздел: Р Распорки Р-1ж				
16	16	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.855	336 509	287 715
17	17	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.889075	1 121 754	997 323
			Итого по подразделу: Р Распорки Р-1ж				**1 285 039**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
18	18	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	24.792	250	6 198
19	19	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	24.792	193	4 785
20	20	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	24.792	2 934	72 740
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**83 723**
			Подраздел: Р Горизонтальные связи гс-1ж				
21	21	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1.5974	336 509	537 539
22	22	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1.661275	1 121 754	1 863 542
			Итого по подразделу: Р Горизонтальные связи гс-1ж				**2 401 081**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
23	23	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	46.324	250	11 581
24	24	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	46.324	193	8 940

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	46.324	2 934	135 914
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**156 436**
			Подраздел: Р Прогоны п-1ж				
26	26	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	3.41145	107 271	365 949
27	27	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3.547908	1 121 754	3 979 880
			Итого по подразделу: Р Прогоны п-1ж				**4 345 829**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
28	28	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	98.93205	250	24 733
29	29	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	98.93205	193	19 094
30	30	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	98.93205	2 934	290 266
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**334 093**
			Подраздел: Р Прогоны п-2ж				
31	31	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.85344	107 271	91 549
32	32	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.887578	1 121 754	995 644
			Итого по подразделу: Р Прогоны п-2ж				**1 087 193**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
33	33	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	24.75	250	6 188
34	34	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	24.75	193	4 777
35	35	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	24.75	2 934	72 617
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**83 581**
			Итого по разделу: Блок-Ж /Лист-2/				**19 231 835**
			Раздел: Блок-Е /Лист-2/				
			Подраздел: Р Ферма Ф-1е				
36	36	6106-0302-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса более 5 т, высота до 25 м	т	1.672	104 098	174 052
37	37	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1.738402	1 121 754	1 950 059
			Итого по подразделу: Р Ферма Ф-1е				**2 124 111**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	48.475	250	12 119
39	39	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	48.475	193	9 356
40	40	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	48.475	2 934	142 225
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**163 700**
			Подраздел: Р Вертикальные связи ВС-1е				
41	41	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.187	286 888	53 648
42	42	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.194584	1 121 754	218 275
			Итого по подразделу: Р Вертикальные связи ВС-1е				**271 923**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
43	43	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5.43	250	1 358
44	44	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	5.43	193	1 048
45	45	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5.43	2 934	15 932
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**18 337**
			Подраздел: Р Вертикальные связи ВС-2е				
46	46	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.362	286 888	103 853
47	47	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.376189	1 121 754	421 992
			Итого по подразделу: Р Вертикальные связи ВС-2е				**525 845**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
48	48	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	10.49	250	2 623
49	49	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	10.49	193	2 025
50	50	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	10.49	2 934	30 778
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**35 425**
			Подраздел: Р Распорки Р-1е				
51	51	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.10686	336 509	35 959
52	52	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.111134	1 121 754	124 665
			Итого по подразделу: Р Распорки Р-1е				**160 625**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3.099	250	775
54	54	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3.099	193	598
55	55	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	3.099	2 934	9 093
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**10 465**
			Подраздел: Р Горизонтальные связи гс-1е				
56	56	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.919	336 509	309 252
57	57	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.955734	1 121 754	1 072 098
			Итого по подразделу: Р Горизонтальные связи гс-1е				**1 381 350**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
58	58	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	26.65	250	6 662
59	59	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	26.65	193	5 143
60	60	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	26.65	2 934	78 191
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**89 997**
			Подраздел: Р Прогоны п-1е				
61	61	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1.46205	107 271	156 835
62	62	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1.520532	1 121 754	1 705 663
			Итого по подразделу: Р Прогоны п-1е				**1 862 498**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
63	63	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	42.4	250	10 600
64	64	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	42.4	193	8 183
65	65	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	42.4	2 934	124 402
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**143 185**
			Итого по разделу: Блок-Е /Лист-2/				**6 787 462**
			Раздел: Блок-И /Лист-2/				
			Подраздел: Р Ферма Ф-1и				
66	66	6106-0302-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса более 5 т, высота до 25 м	т	1.409	104 098	146 674
67	67	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1.465069	1 121 754	1 643 447

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Р Ферма Ф-1и				**1 790 121**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
68	68	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	40.853	250	10 213
69	69	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	40.853	193	7 885
70	70	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	40.853	2 934	119 863
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**137 960**
			Подраздел: Р Вертикальные связи ВС-1и				
71	71	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.196	286 888	56 230
72	72	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.203611	1 121 754	228 401
			Итого по подразделу: Р Вертикальные связи ВС-1и				**284 631**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
73	73	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5.678	250	1 420
74	74	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	5.678	193	1 096
75	75	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5.678	2 934	16 659
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**19 175**
			Подраздел: Р Вертикальные связи ВС-2и				
76	76	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.189	286 888	54 222
77	77	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.196622	1 121 754	220 562
			Итого по подразделу: Р Вертикальные связи ВС-2и				**274 783**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
78	78	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5.483	250	1 371
79	79	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	5.483	193	1 058
80	80	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5.483	2 934	16 087
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**18 516**
			Подраздел: Р Распорки Р-1и				
81	81	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.14248	336 509	47 946
82	82	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.148179	1 121 754	166 220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Р Распорки Р-1и				**214 166**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
83	83	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.132	250	1 033
84	84	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.132	193	798
85	85	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4.132	2 934	12 123
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**13 954**
			Подраздел: Р Горизонтальные связи гс-1и				
86	86	6106-0302-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.626	336 509	210 655
87	87	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.650562	1 121 754	729 770
			Итого по подразделу: Р Горизонтальные связи гс-1и				**940 425**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
88	88	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	18.141	250	4 535
89	89	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	18.141	193	3 501
90	90	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	18.141	2 934	53 225
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**61 262**
			Подраздел: Р Прогоны п-1и				
91	91	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.6823	107 271	73 191
92	92	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.709582	1 121 754	795 976
			Итого по подразделу: Р Прогоны п-1и				**869 168**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
93	93	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19.786	250	4 946
94	94	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	19.786	193	3 819
95	95	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	19.786	2 934	58 052
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**66 818**
			Подраздел: Р Прогоны п-2и				
96	96	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.427	107 271	45 805
97	97	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.443789	1 121 754	497 822

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Р Прогоны п-2и				**543 627**
			Подраздел: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				
98	98	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12.375	250	3 094
99	99	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12.375	193	2 389
100	100	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12.375	2 934	36 308
			Итого по подразделу: Антикоррозийная защита /Лист-3, прим.4 и 5/				**41 790**
			Итого по разделу: Блок-И /Лист-2/				**5 276 396**
			Итого по локальной смете: Конструкции металлические				**31 295 693**
			ИТОГО по акту:				**31 295 693**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	31295693.481 x 6.90%	2 159 403
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	31295693.481 + 2159402.880	33 455 096
	Сметная прибыль, (5.00%)	33455096.361 x 5.00%	1 672 755
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	33455096.361 x 2.000%	669 102
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		35 796 953
	в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699	35796953.106 x 0.9699	34 720 614
	НДС (12%)	34720614.070 x 12%	4 166 474
	Итого с НДС	34720614.070 + 4166473.688	38 887 088

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	24.06.2025 09:42
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	24.06.2025 09:47
Представители авторского надзора		
870222300077 - БЕКБАГАМБЕТОВ БАТЫРБЕК БОЛАТОВИЧ	Авторский надзор	24.06.2025 09:47
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	25.06.2025 16:00 Комментарий: согласовано
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	25.06.2025 16:02 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	25.06.2025 16:03
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	25.06.2025 17:12 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
970606300144 - АЛДАБЕРГЕНОВ АСЛАН ЕСЕНГАЛИУЛЫ	И.о. директора регионального подразделения	25.06.2025 18:15

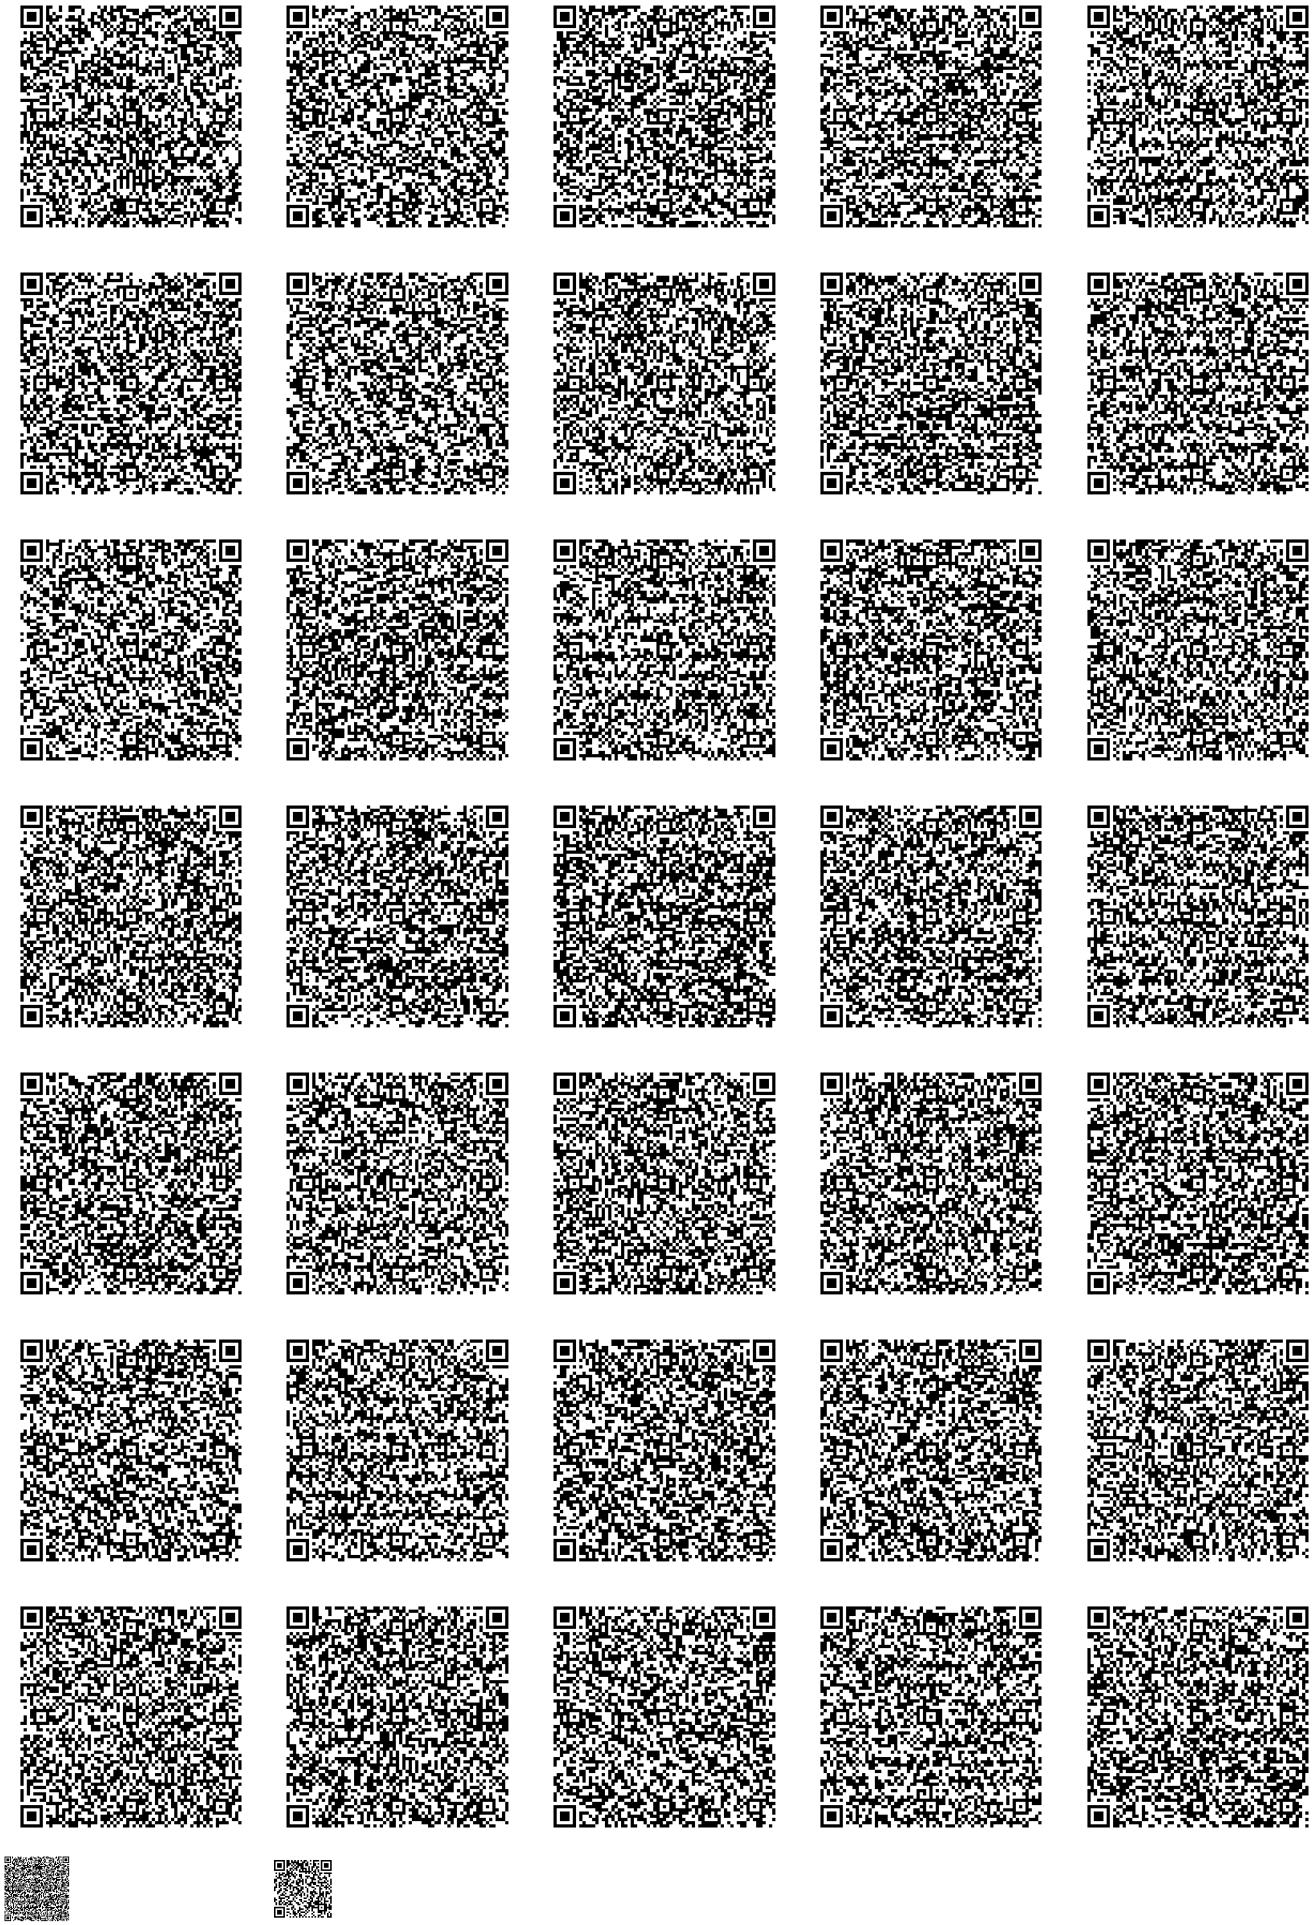

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление и вентиляция				
			Раздел: Отопление				
1	53	6114-0103-0312ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	306.46	754	231 071
2	54	241-205-0301РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	м	303.3954	561	170 205
3	55	245-509-0301РСНБ РК 2022	Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом, DN 1", L 290 мм	шт.	1	212 215	212 215
4	56	6116-0701-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	1	20 671	20 671
5	57	245-509-0135РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на три ответвления, L 250 мм	шт.	1	60 237	60 237
6	58	6114-0103-0312ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	2064.29	754	1 556 475
7	59	6114-0103-0313ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	483.5	1 199	579 717
8	60	6114-0103-0314ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	121.41	1 316	159 776
9	61	241-205-2301РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	2043.6471	189	386 249
10	62	241-205-2302РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	478.665	282	134 984
11	63	241-205-2303РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	120.1959	468	56 252
			Итого по разделу: Отопление				**3 567 850**
			Раздел: Системы вентиляции и кондиционирования				
			Подраздел: Система П2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	193	6118-0101-0303ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	18.26	7 522	137 352
13	194	246-103-0106РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	18.26	6 118	111 715
14	195	6118-0101-0310ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	6	6 519	39 114
15	196	246-103-0107РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	6	7 372	44 232
16	199	6118-0202-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	3	1 412	4 236
17	200	246-304-0576РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	7 065	7 065
18	201	246-304-0653РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	9 398	18 796
19	202	6118-0203-0806ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	2	6 392	12 784
20	205	246-302-0642РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	13 576	13 576
21	207	246-302-0643РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	14 191	14 191
			Итого по подразделу: Система П2				**403 061**
			Подраздел: Система П3				
22	223	6118-0101-0303ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	45	7 522	338 490
23	224	246-103-0106РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	45	6 118	275 310
24	225	6118-0101-0310ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	9.6	6 519	62 582
25	226	246-103-0107РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	9.6	7 372	70 771
26	229	6118-0202-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	6	1 412	8 472
27	231	246-304-0553РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066
28	233	246-304-0653РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	5	9 398	46 990
29	234	6118-0203-0806ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	5	6 392	31 960
30	235	246-302-0641РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12 672	25 344
31	237	246-302-0643РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	14 191	42 573
			Итого по подразделу: Система П3				**908 558**
			Подраздел: Система П5				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	274	6118-0101-0302ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	8.4	8 212	68 981
33	275	246-103-0106РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8.4	6 118	51 391
34	276	6118-0101-0310ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	18	6 519	117 342
35	277	246-103-0107РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	18	7 372	132 696
36	280	6118-0202-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	7	1 412	9 884
37	281	246-304-0653РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	4	9 398	37 592
38	282	246-304-0553РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	6 066	18 198
			Итого по подразделу: Система П5				**436 084**
			Подраздел: Система В3				
39	420	6118-0101-0302ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	19.2	8 212	157 670
40	421	246-103-0106РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	19.2	6 118	117 465
41	426	6118-0202-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1 412	14 120
42	427	246-304-0528РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	4 509	45 090
			Итого по подразделу: Система В3				**334 346**
			Подраздел: Система В4				
43	444	6118-0101-0302ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7.2	8 212	59 126
44	445	246-103-0106РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7.2	6 118	44 050
45	452	6118-0202-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	4	1 412	5 648
46	453	246-304-0528РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	4 509	18 036
			Итого по подразделу: Система В4				**126 860**
			Подраздел: Система В5				
47	466	6118-0101-0302ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7.2	8 212	59 126
48	467	246-103-0106РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7.2	6 118	44 050
49	468	6118-0101-0212ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм/0,9мм периметр до 3200 мм	м2	5.52	4 430	24 454

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	469	246-104-0109РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	5.52	10 920	60 278
51	470	6118-0202-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	6	1 412	8 472
52	471	246-304-0528РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	4 509	27 054
53	472	246-301-0501РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18	775	13 950
			Итого по подразделу: Система В5				**237 384**
			Подраздел: Система естественной вентиляции ВЕ1-35				
54	734	6118-0101-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2.4	8 212	19 709
55	735	6118-0101-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	м2	4	7 522	30 088
56	736	246-103-0106РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6.4	6 118	39 155
57	740	6118-0202-0302ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	13	1 777	23 101
58	741	246-304-0528РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 509	13 527
59	743	246-304-0551РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	5 560	11 120
60	744	246-304-0553РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066
61	745	246-304-0607РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	7 893	7 893
62	747	246-304-0653РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	6	9 398	56 388
			Итого по подразделу: Система естественной вентиляции ВЕ1-35				**207 047**
			Итого по разделу: Системы вентиляции и кондиционирования				**2 653 339**
			Итого по локальной смете: Отопление и вентиляция				**6 221 190**
			ИТОГО по акту:				**6 221 190**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	6221189.643 x 6.90%	429 262
Итого с затратами на организацию и управление СМР	6221189.643 + 429262.091	6 650 452
Сметная прибыль, (5.00%)	6650451.735 x 5.00%	332 523
Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	6650451.735 x 2.000%	133 009
Итого с непредвидемыми работами и затратами		7 115 983
в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699	7115983.356 x 0.9699	6 902 021
НДС (12%)	6902020.714 x 12%	828 242
Итого с НДС	6902020.714 + 828242.486	7 730 263

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	26.06.2025 10:52
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	26.06.2025 11:37
Представители авторского надзора		
870222300077 - БЕКБАГАМБЕТОВ БАТЫРБЕК БОЛАТОВИЧ	Авторский надзор	26.06.2025 12:17
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	26.06.2025 15:41
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.06.2025 16:12 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	26.06.2025 18:15
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	27.06.2025 15:35 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
970606300144 - АЛДАБЕРГЕНОВ АСЛАН ЕСЕНГАЛИУЛЫ	И.о. директора регионального подразделения	27.06.2025 15:38

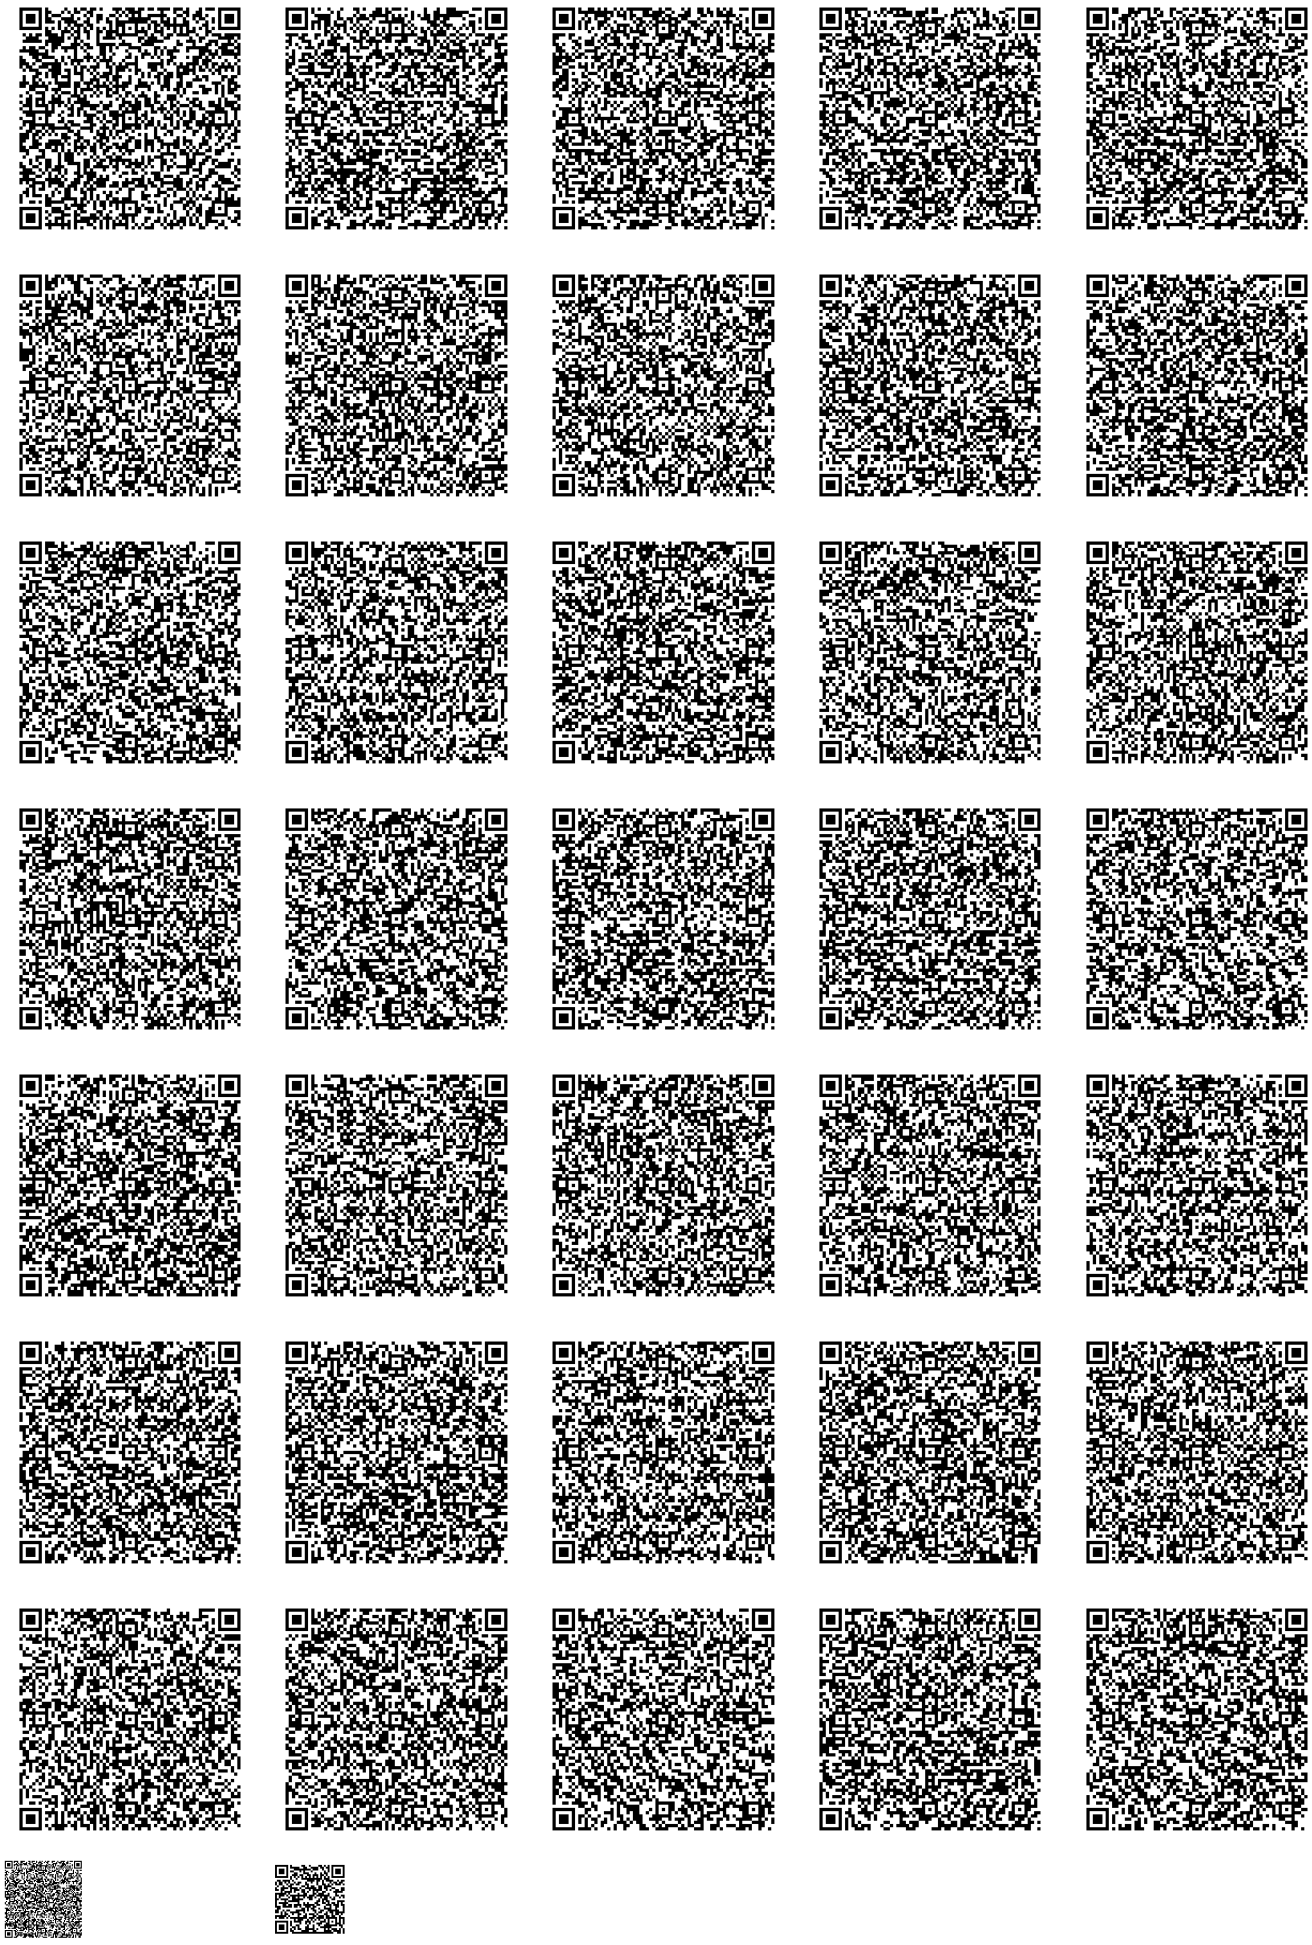

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-планировочные решения				
			Раздел: Окна /Лист-13/				
			Подраздел: ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОК-10, ОК-11				
1	40	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	621.2192	7 467	4 638 644
2	41	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	621.2192	50 401	31 310 069
			Итого по подразделу: ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОК-10, ОК-11				**35 948 713**
			Подраздел: ОК-3, ОК-5				
3	42	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	49.8056	6 376	317 560
4	43	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	49.8056	52 349	2 607 273
			Итого по подразделу: ОК-3, ОК-5				**2 924 834**
			Подраздел: ОК-4				
5	44	6108-0102-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	16.7272	7 080	118 429
6	45	223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	16.7272	62 645	1 047 875
			Итого по подразделу: ОК-4				**1 166 304**
			Подраздел: ОК-6 и ОК-7				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	46	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	15.2504	9 961	151 909
8	47	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	15.2504	55 044	839 443
			Итого по подразделу: ОК-6 и ОК-7				**991 352**
			Подраздел: ОК-8				
9	48	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	1.2556	9 794	12 297
10	49	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1.2556	36 391	45 693
			Итого по подразделу: ОК-8				**57 990**
			Подраздел: Подоконники				
11	55	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	498.7	3 166	1 578 884
12	56	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	494.9	2 347	1 161 530
13	57	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	3.8	2 835	10 773
			Итого по подразделу: Подоконники				**2 751 188**
			Итого по разделу: Окна /Лист-13/				**43 840 380**
			Раздел: Внутренняя отделка потолков				
			Подраздел: Выравнивание+ВЭ покраска				
14	90	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	632.92	2 396	1 516 476
			Итого по подразделу: Выравнивание+ВЭ покраска				**1 516 476**
			Подраздел: Выравнивание+акриловая моющаяся покраска				
15	98	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	47.55	2 255	107 225
			Итого по подразделу: Выравнивание+акриловая моющаяся покраска				**107 225**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка потолков				**1 623 702**
			Раздел: Внутренняя отделка стен				
			Подраздел: Р Облицовка керамической плиткой в местах установки умывальников и фонтанчиков /Лист-17, прим.3/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	169	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	59.64	10 487	625 445
			Итого по подразделу: Р Облицовка керамической плиткой в местах установки умывальников и фонтанчиков /Лист-17, прим.3/				**625 445**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка стен				**625 445**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип V				
17	236	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	79.012	26 173	2 067 981
18	237	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	63.2096	33 951	2 146 029
			Итого по подразделу: Тип V				**4 214 010**
			Подраздел: Тип I				
19	280	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	27.57	1 986	54 754
20	281	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 30 мм	м2	27.57	320	8 822
			Итого по подразделу: Тип I				**63 576**
			Подраздел: Тип II				
21	292	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	115.38	1 986	229 145
22	293	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 30 мм	м2	115.38	320	36 921
			Итого по подразделу: Тип II				**266 066**
			Подраздел: Тип IV				
23	299	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	1757.75	1 986	3 490 892
24	300	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 44 мм	м2	1757.75	768	1 349 952
			Итого по подразделу: Тип IV				**4 840 844**
			Итого по разделу: Полы				**9 384 497**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-планировочные решения				**55 474 023**
			ИТОГО по акту:				**55 474 023**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)				55474023.247 x 6.90%	3 827 708
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				55474023.247 + 3827707.657	59 301 731
		Сметная прибыль, (5.00%)				59301730.904 x 5.00%	2 965 087
		Непредвиденные расходы, (2.000%)				59301730.904 x 2.000%	1 186 035
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					63 452 852
		в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699				63452852.068 x 0.9699	61 544 958
		НДС (12%)				61544958.359 x 12%	7 385 395
		Итого с НДС				61544958.359 + 7385395.003	68 930 353

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	25.06.2025 19:02
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	25.06.2025 23:08
Представители авторского надзора		
870222300077 - БЕКБАГАМБЕТОВ БАТЫРБЕК БОЛАТОВИЧ	Авторский надзор	26.06.2025 09:46
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	27.06.2025 15:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.06.2025 16:06 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
970606300144 - АЛДАБЕРГЕНОВ АСЛАН ЕСЕНГАЛИУЛЫ	И.о. директора регионального подразделения	27.06.2025 15:37
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	26.06.2025 15:40
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	26.06.2025 18:15

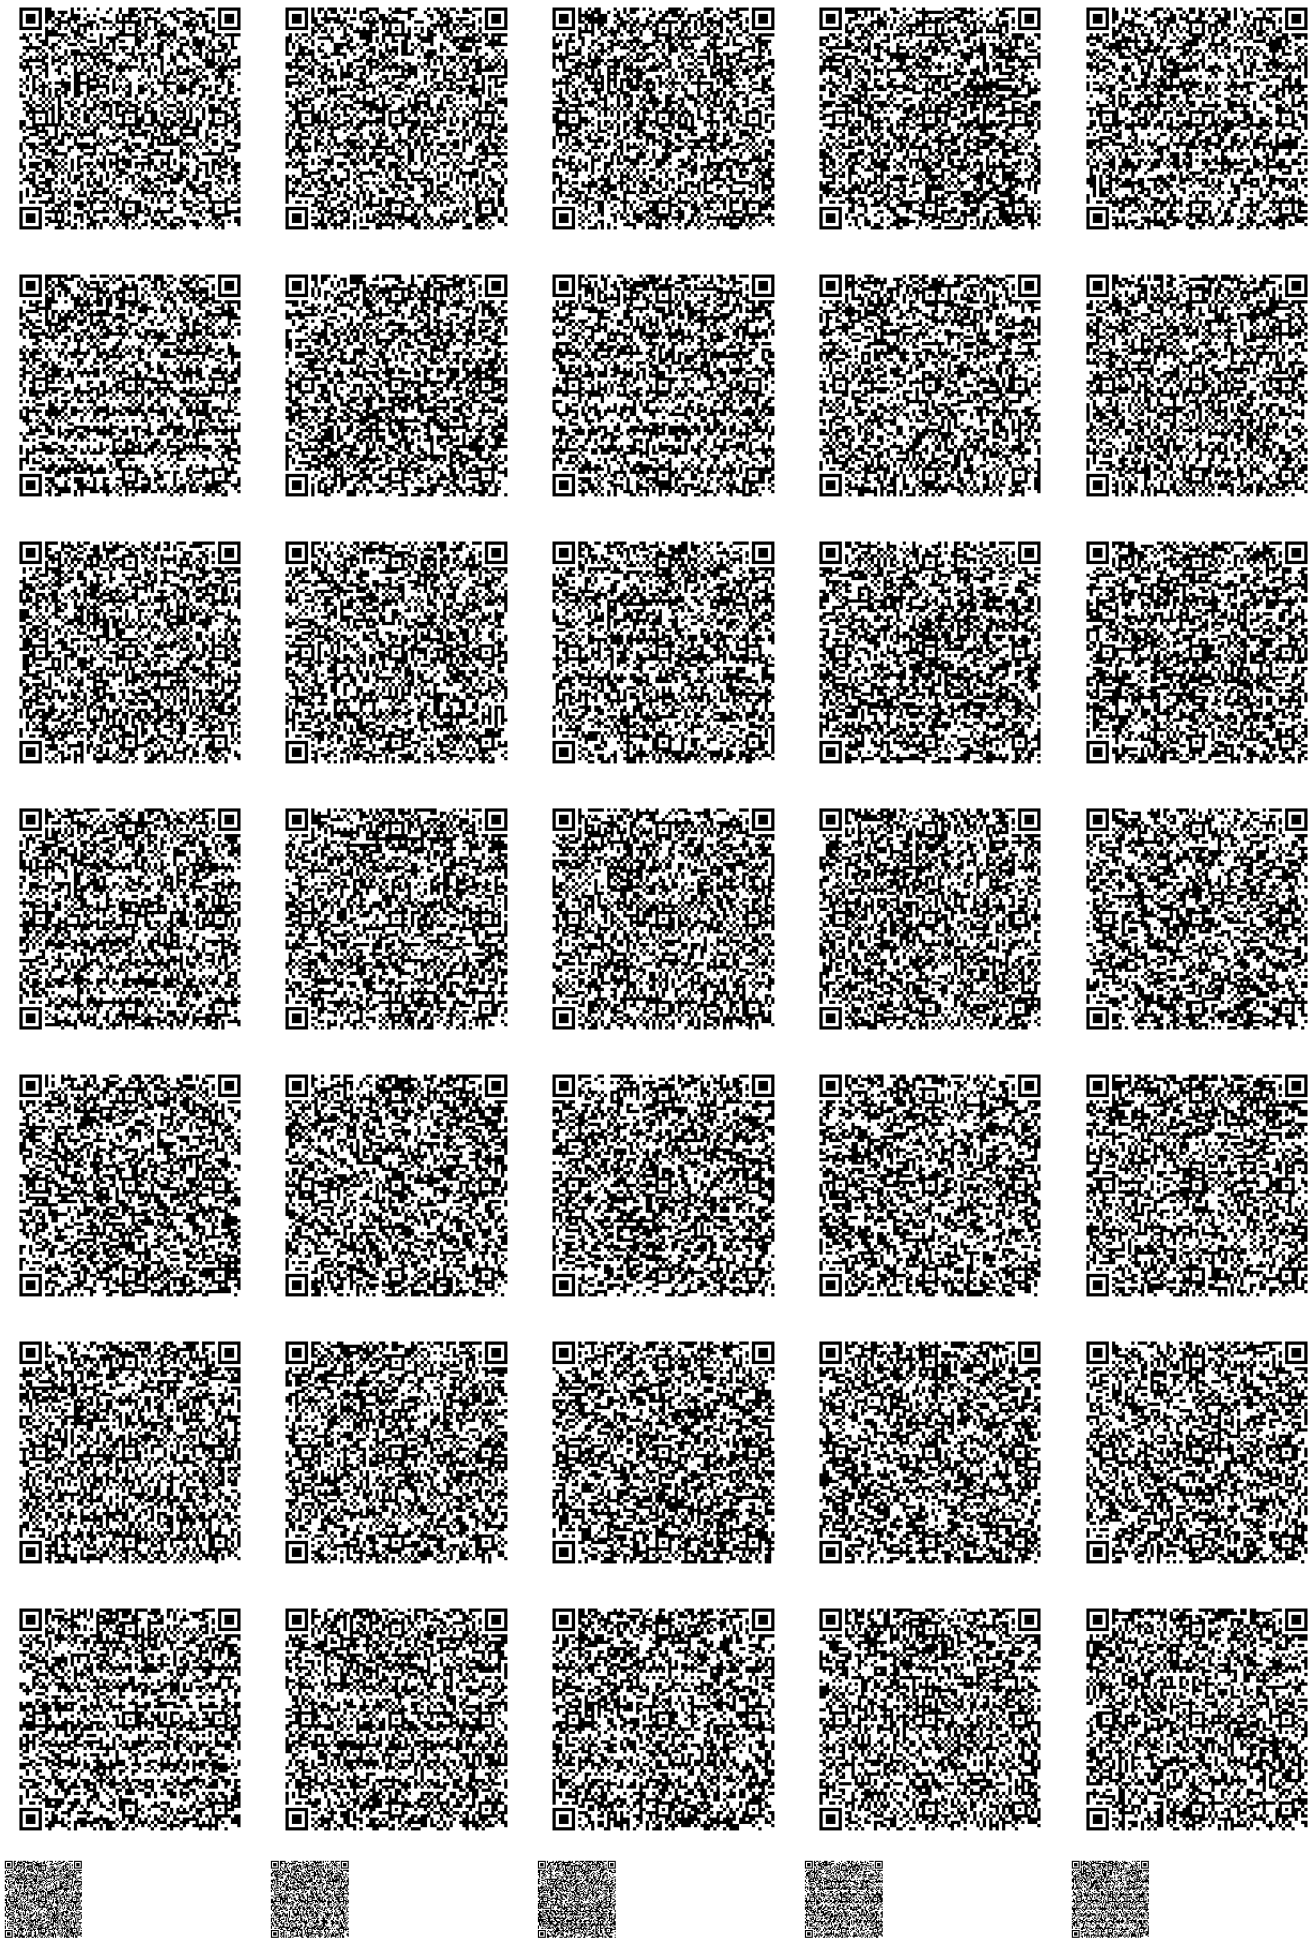

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-строительные чертежи				
			Раздел: Лестницы				
			Подраздел: Р Лестница в осях 1-3, 18-16 /Лист-146/				
1	1259	6106-0304-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	28.511838	255 600	7 287 626
2	1260	222-503-0201РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	28.511838	1 145 933	32 672 656
			Итого по подразделу: Р Лестница в осях 1-3, 18-16 /Лист-146/				**39 960 282**
			Подраздел: Р Лестница в осях 6-7 /Лист-147/				
3	1263	6106-0304-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	8.2336	255 600	2 104 508
4	1264	222-503-0201РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	8.2336	1 145 933	9 435 154
			Итого по подразделу: Р Лестница в осях 6-7 /Лист-147/				**11 539 662**
			Подраздел: Р Лестница в осях 12-13 /Лист-148/				
5	1267	6106-0304-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	9.768456	255 600	2 496 817
6	1268	222-503-0201РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	9.768456	1 145 933	11 193 996
			Итого по подразделу: Р Лестница в осях 12-13 /Лист-148/				**13 690 813**
			Подраздел: Р Лестница в осях 7-9 /Лист-149/				
7	1271	6106-0304-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	6.296496	255 600	1 609 384
8	1272	222-503-0201РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	6.296496	1 145 933	7 215 363
			Итого по подразделу: Р Лестница в осях 7-9 /Лист-149/				**8 824 747**
			Итого по разделу: Лестницы				**74 015 504**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Архитектурн-строительные чертежи				**74 015 504**
			ИТОГО по акту:				**74 015 504**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				74015504.000 x 6.90%	5 107 070
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				74015504.000 + 5107069.847	79 122 574
		Сметная прибыль, (5.00%)				79122573.847 x 5.00%	3 956 129
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				79122573.847 x 2.000%	1 582 451
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					84 661 154
		в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699				84661154.016 x 0.9699	82 115 571
		НДС (12%)				82115571.305 x 12%	9 853 869
		Итого с НДС				82115571.305 + 9853868.557	91 969 440

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	23.06.2025 12:44
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	24.06.2025 09:49
Представители авторского надзора		
870222300077 - БЕКБАГАМБЕТОВ БАТЫРБЕК БОЛАТОВИЧ	Авторский надзор	23.06.2025 16:34
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	25.06.2025 16:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	25.06.2025 15:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	25.06.2025 15:58
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	25.06.2025 15:34 Комментарий: согласовано
970606300144 - АЛДАБЕРГЕНОВ АСЛАН ЕСЕНГАЛИУЛЫ	И.о. директора регионального подразделения	25.06.2025 18:15

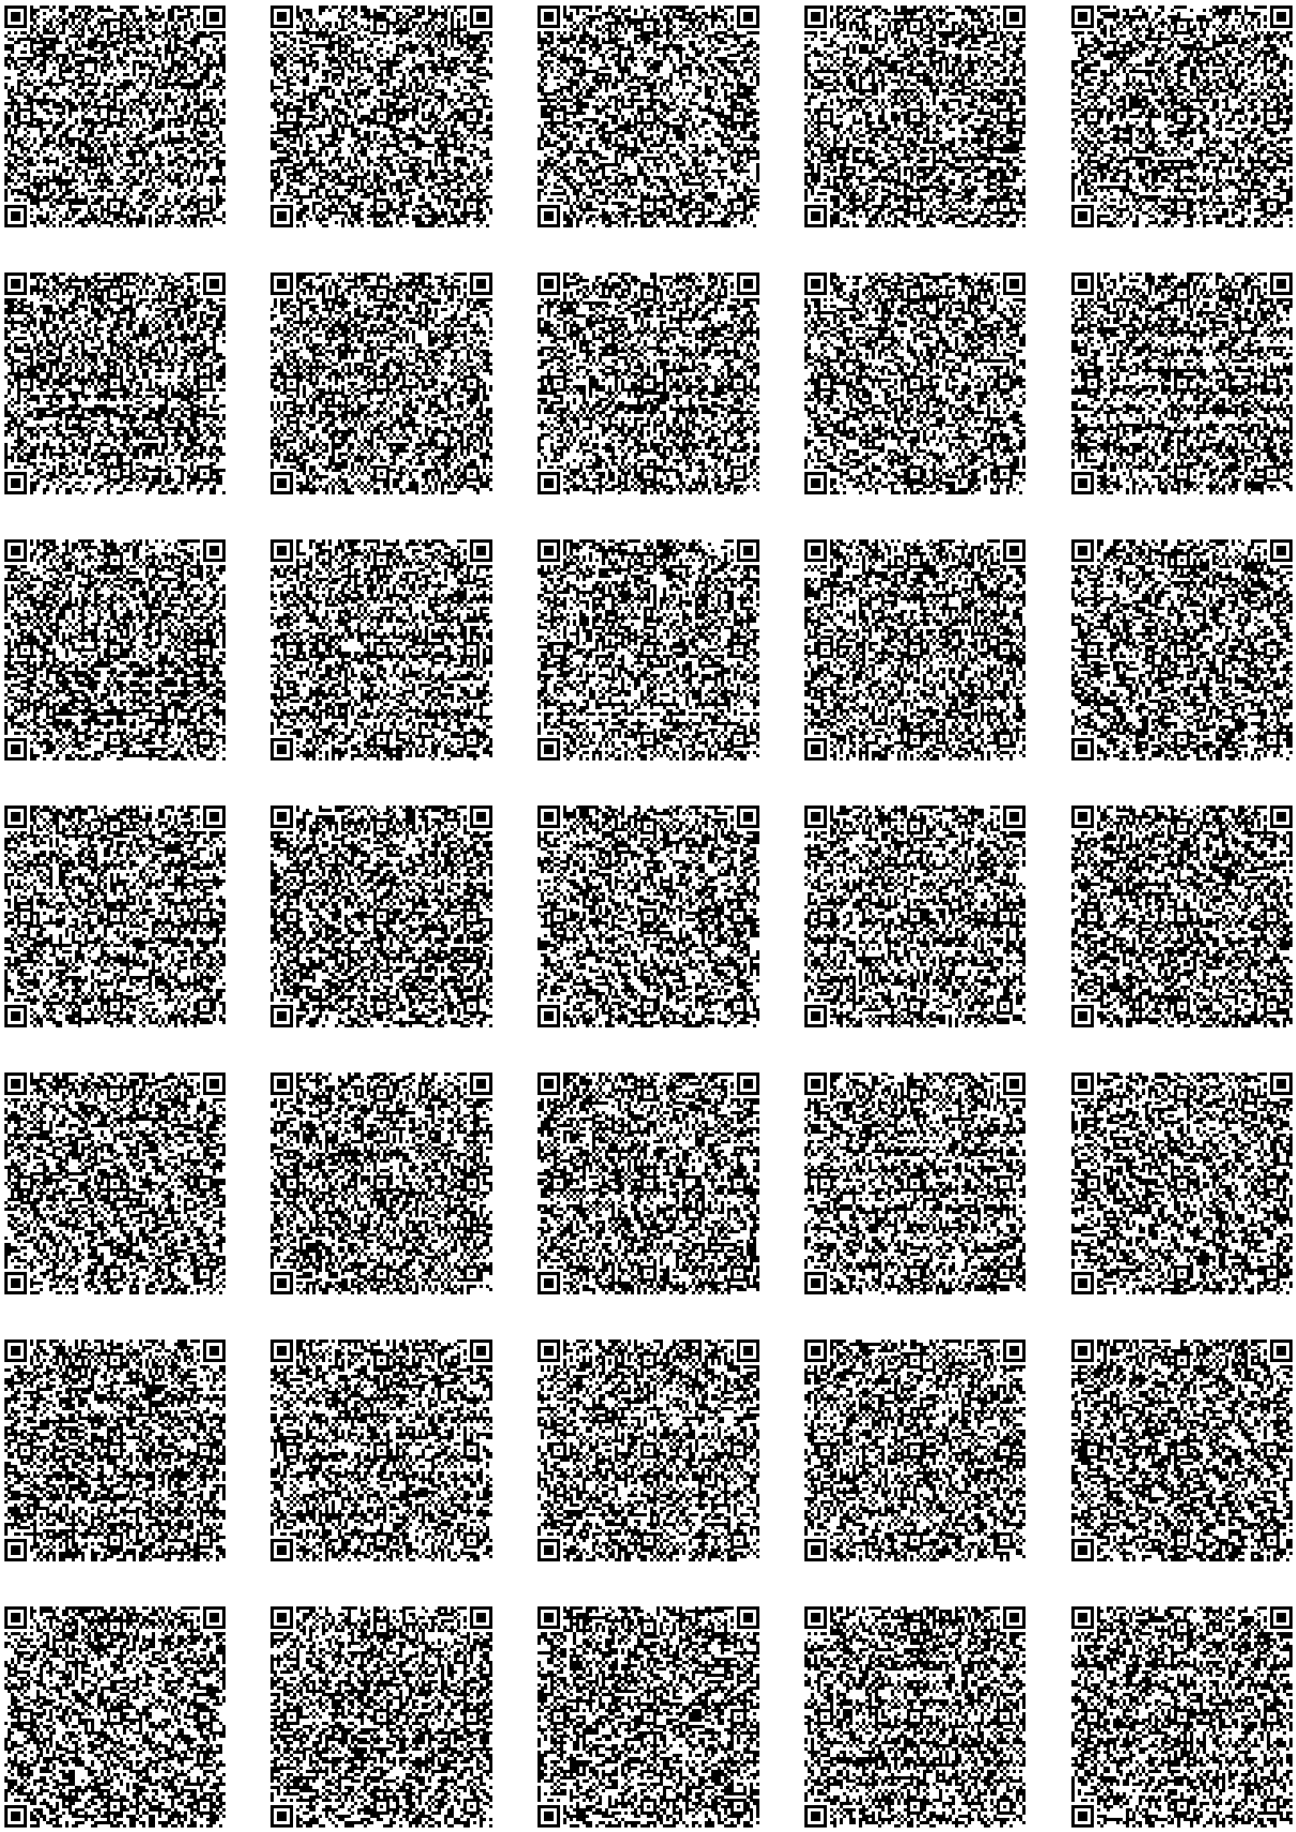

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока Е /Лист-33/				
1	52	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	27.15	53 464	1 451 548
2	53	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.4549	418 459	608 816
3	54	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.8374	294 911	246 958
4	55	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3365	311 690	104 884
5	56	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16.96875	4 160	70 590
			Итого по подразделу: Р Фундамент ленточный ФЛ-1 Блока Е /Лист-33/				**2 482 796**
			Подраздел: Р Сборные фундаментные блоки /Лист-32/				
6	57	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	21	7 591	159 411
7	58	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	125	5 680	710 000
8	59	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	10	5 144	51 440

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	60	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	72	12 345	888 840
10	61	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	117.992	34 022	4 014 324
			Итого по подразделу: Р Сборные фундаментные блоки /Лист-32/				**5 824 015**
			Подраздел: Р Фундаменты ж/б сборные под колонны Ф1, Ф2, Ф3 /Лист-33.2/				
11	63	6104-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка фундаментов под колонны массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	20	17 624	352 480
12	64	6104-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	5	11 683	58 415
13	65	261-101-0383РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	43.7	49 998	2 184 913
14	66	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.1346	689 449	92 800
			Итого по подразделу: Р Фундаменты ж/б сборные под колонны Ф1, Ф2, Ф3 /Лист-33.2/				**2 688 608**
			Итого по разделу: Фундаменты				**10 995 419**
			Раздел: Колонны /Лист-57/				
15	70	6104-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка колонн в стаканы фундаментов, масса до 3 т	шт.	12	43 020	516 240
16	71	6104-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка колонн в стаканы фундаментов, масса до 4 т	шт.	11	49 185	541 035
17	72	6104-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка колонн в стаканы фундаментов, масса до 2 т	шт.	2	34 988	69 976
18	73	222-103-0301РСНБ РК 2022	Колонна поперечного сечения 400х400 мм связевого каркаса 3,3 м; 3,6 и 4,2 м ГОСТ 13015-2012	м3	27.17	153 349	4 166 492
			Подраздел: Закладные детали				
19	74	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	2.45756	1 487 579	3 655 815
			Итого по подразделу: Закладные детали				**3 655 815**
			Итого по разделу: Колонны /Лист-57/				**8 949 558**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**19 944 977**
			ИТОГО по акту:				**19 944 977**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				19944976.818 x 6.90%	1 376 203
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				19944976.818 +	21 321 180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						1376203.419	
			Сметная прибыль, (5.00%)			21321180.237 x 5.00%	1 066 059
			Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)			21321180.237 x 2.000%	426 424
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				22 813 663
			в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699			22813662.854 x 0.9699	22 127 704
			НДС (12%)			22127704.029 x 12%	2 655 324
			Итого с НДС			22127704.029 + 2655324.483	24 783 029

Лист согласования
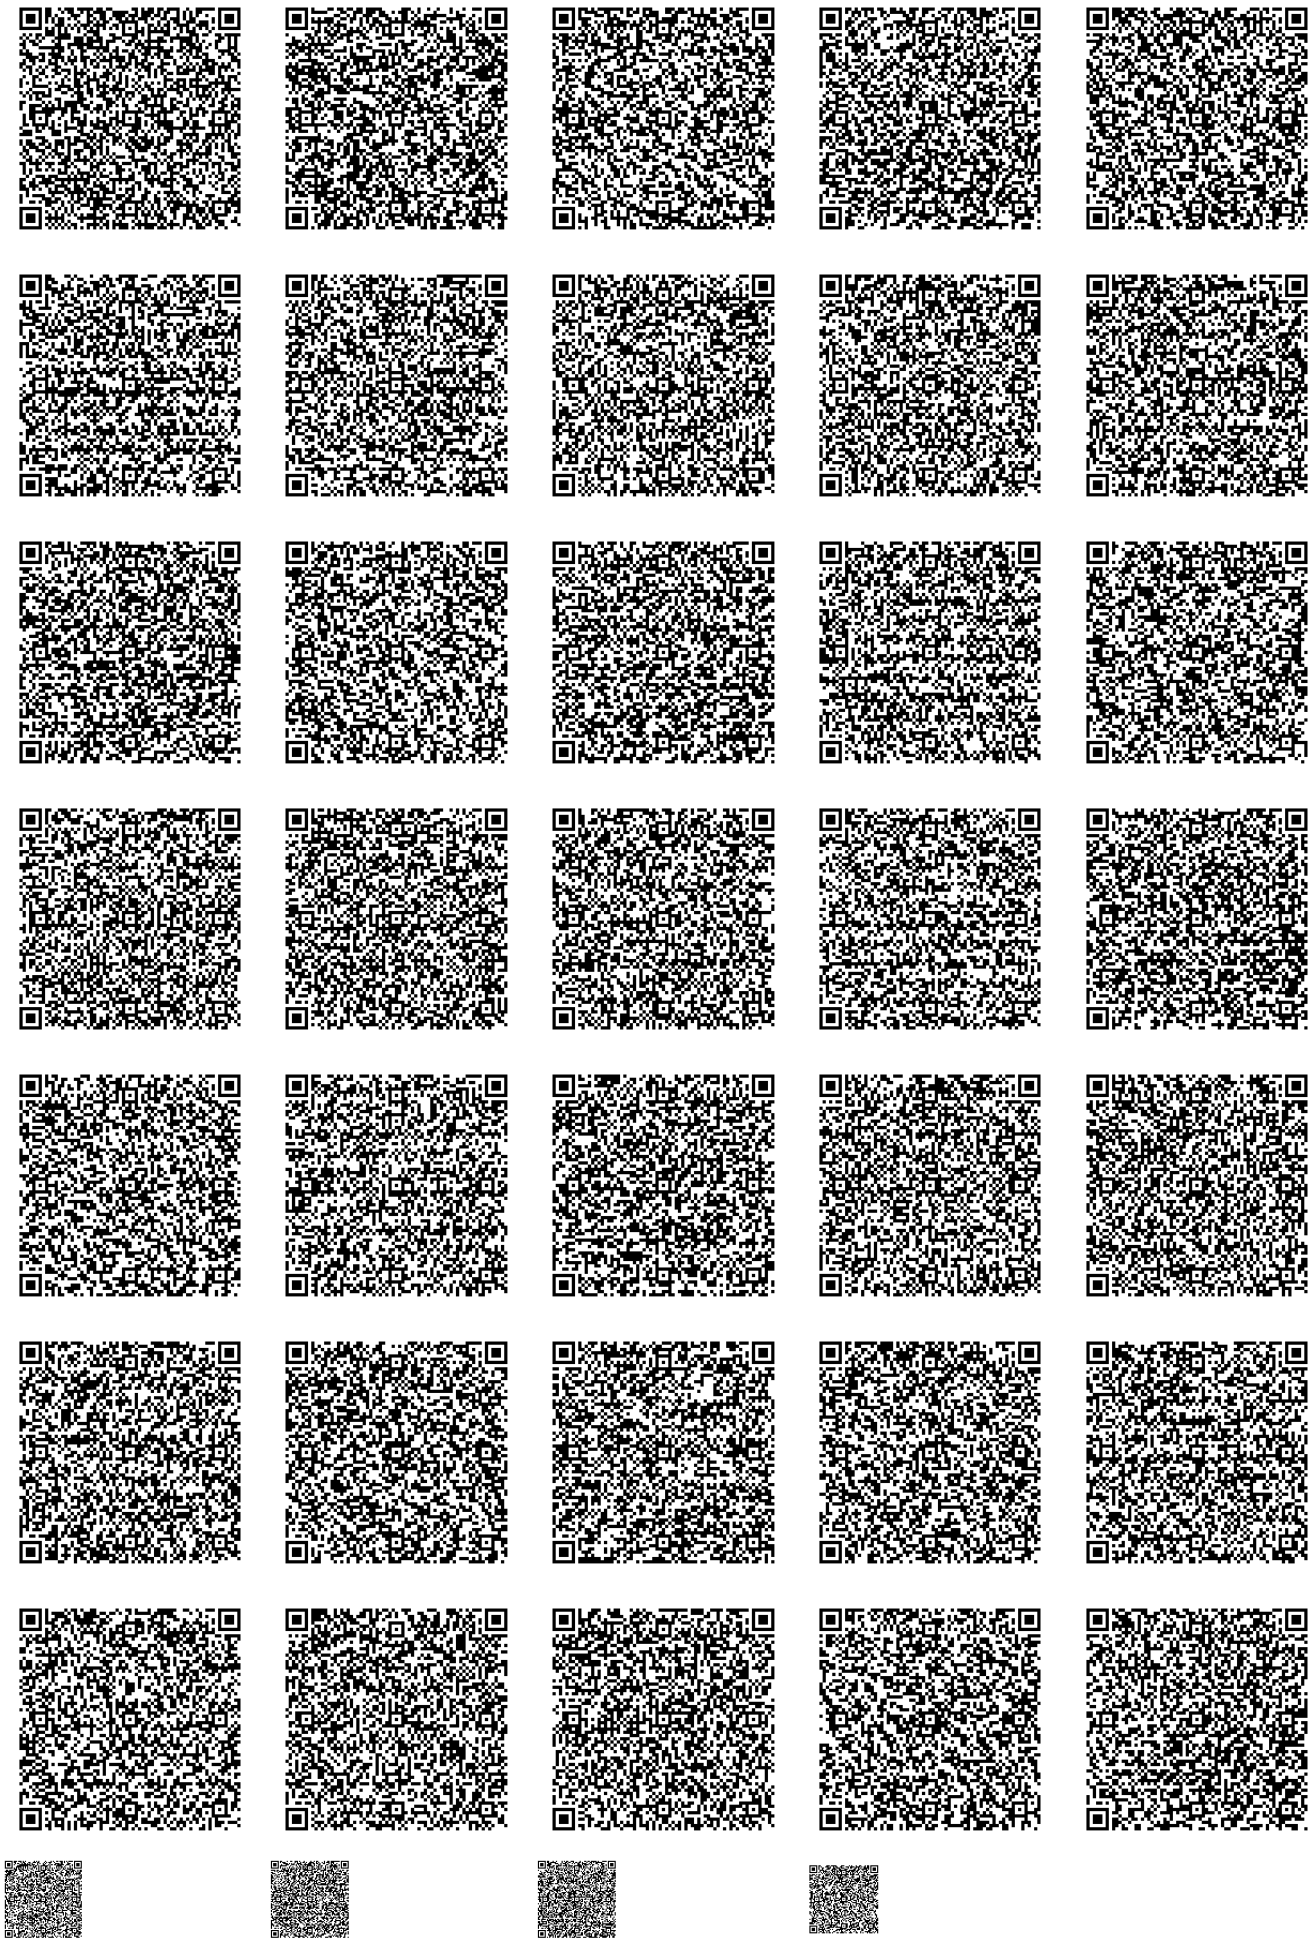
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	23.06.2025 12:44
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	24.06.2025 09:51
Представители авторского надзора		
870222300077 - БЕКБАГАМБЕТОВ БАТЫРБЕК БОЛАТОВИЧ	Авторский надзор	23.06.2025 16:34
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	25.06.2025 15:46 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	25.06.2025 16:40 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	25.06.2025 15:58
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	25.06.2025 15:26
970606300144 - АЛДАБЕРГЕНОВ АСЛАН ЕСЕНГАЛИУЛЫ	И.о. директора регионального подразделения	25.06.2025 18:15
