*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Август 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Котельная. Конструкции железобетонные** | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0101-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 | м3 | 41.16 | 532 | 21 897 |
| 2 | 2 | 6101-0106-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м3 | 4.228 | 93 | 393 |
| 3 | 3 | 6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 4.228 | 611 | 2 583 |
| 4 | 4 | 6101-0205-0106ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2 | м3 | 9.8785 | 6 374 | 62 966 |
| 5 | 5 | 6113-0301-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство основания из щебня | м3 | 16.575 | 22 025 | 365 064 |
| 6 | 7 | 6101-0108-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство основания под фундаменты, песчаное | м3 | 0.227 | 8 904 | 2 021 |
| 7 | 8 | 6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м3 | 25 | 40 363 | 1 009 075 |
| 8 | 9 | 6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 36 | 4 160 | 149 760 |
| 9 | 14 | 6113-0301-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство основания из щебня | м3 | 0.075 | 22 025 | 1 652 |
| 10 | 15 | 6103-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 | м3 | 1.15 | 64 654 | 74 352 |
| 11 | 16 | 214-403-0101РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.022395 | 397 364 | 8 899 |
| 12 | 17 | 6103-0701-0807ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.0381661 | 2 159 508 | 82 420 |
| 13 | 18 | 6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 4.6 | 4 160 | 19 136 |
| 14 | 19 | 6113-0301-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство основания из щебня | м3 | 0.1 | 22 025 | 2 203 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 20 | 6103-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 | м3 | 1.182 | 64 654 | 76 421 |
| 16 | 21 | 214-403-0101РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.02998 | 397 364 | 11 913 |
| 17 | 22 | 6103-0701-0807ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.0379107 | 2 159 508 | 81 868 |
| 18 | 23 | 6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 4.08 | 4 160 | 16 973 |
| | | | **Итого по локальной смете: Котельная. Конструкции железобетонные** | | | | **1 989 596** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **1 989 596** |
| | | | | | | | |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%) | | | | 1989596.000 x 6.90% | 137 282 |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | 1989596.000 + 137282.126 | 2 126 878 |
| | | Сметная прибыль, (5.00%) | | | | 2126878.126 x 5.00% | 106 344 |
| | | Непредвиденные расходы, (2.000%) | | | | 2126878.126 x 2.000% | 42 538 |
| | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | | 2 275 760 |
| | | **в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699** | | | | 2275759.595 x 0.9699 | 2 207 332 |
| | | НДС (12%) | | | | 2207332.294 x 12% | 264 880 |
| | | **Итого с НДС** | | | | 2207332.294 + 264879.875 | 2 472 212 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ | Директор | 04.08.2025 10:07 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ | Эксперт | 04.08.2025 14:34 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ | Авторский надзор | 04.08.2025 12:20 |
| **Представители заказчика** | | |
| 881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ | Ведущий специалист | 05.08.2025 12:30 |
| 800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ | Региональный руководитель | 05.08.2025 15:11 |
| 841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА | Ведущий специалист (сметчик) | 05.08.2025 14:46<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |

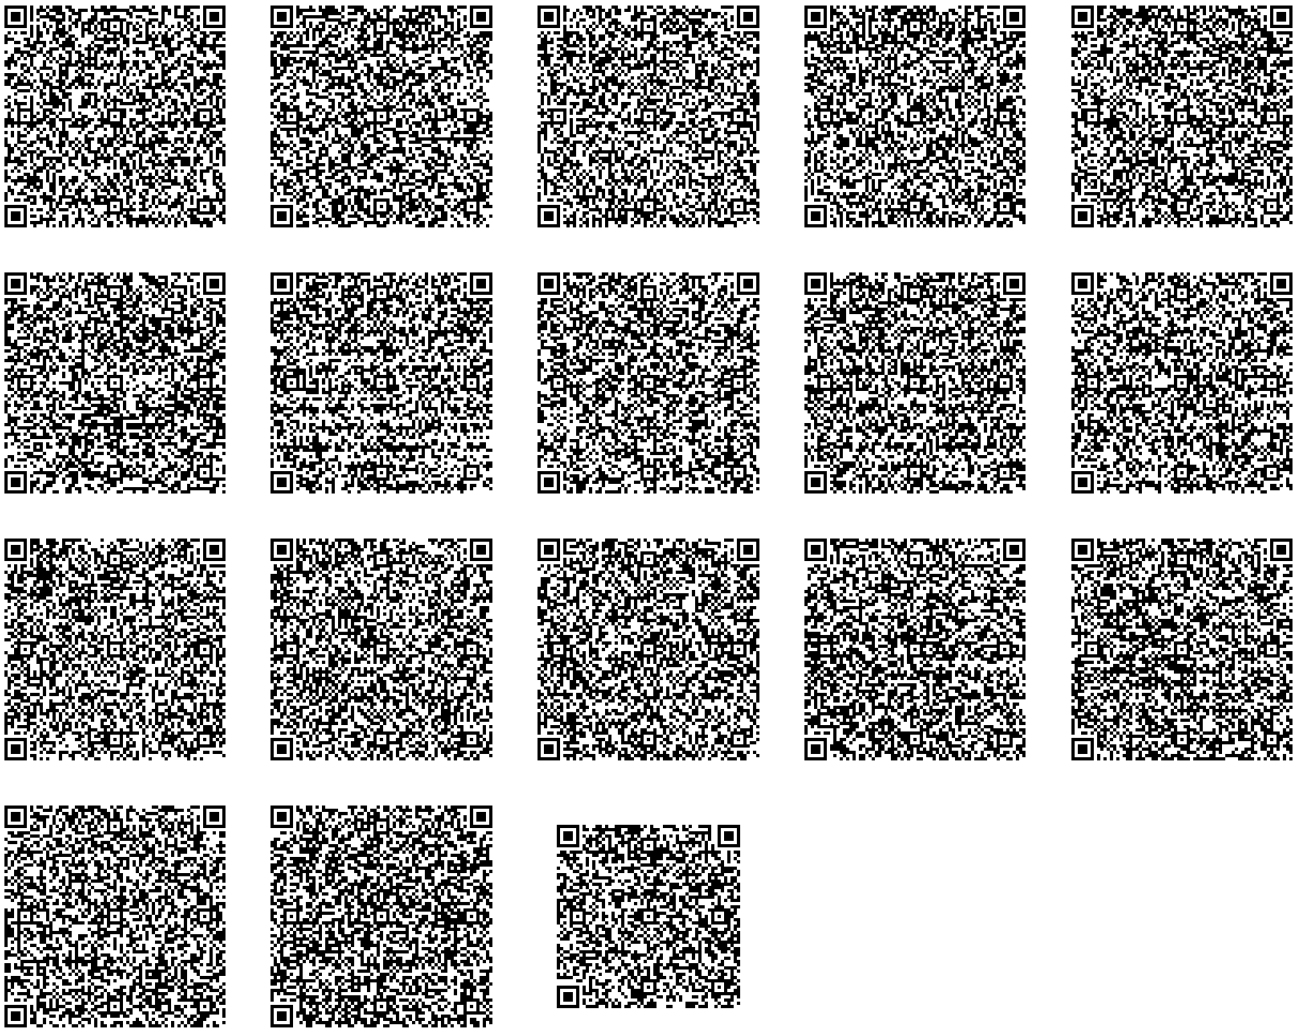

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Август 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Пожарная сигнализация** | | | | |
| 1 | 35 | 6119-0102-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 711 | 795 | 565 245 |
| 2 | 38 | 243-305-0303РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 215.22 | 118 | 25 396 |
| 3 | 41 | 243-108-0501РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 459 | 555 | 254 745 |
| 4 | 42 | 243-142-0311РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 | м | 51 | 362 | 18 462 |
| 5 | 46 | 6119-0301-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 684 | 1 367 | 935 028 |
| 6 | 47 | 241-207-0303РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 690.84 | 78 | 53 886 |
| 7 | 48 | 6119-0301-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм | м | 1.5 | 1 467 | 2 200 |
| 8 | 49 | 241-102-0106РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 1.53 | 505 | 773 |
| | | | **Итого по локальной смете: Пожарная сигнализация** | | | | **1 855 735** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **1 855 735** |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%) | | | | 1855734.675 x 6.90% | 128 046 |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | 1855734.675 + 128045.694 | 1 983 780 |
| | | Сметная прибыль, (5.00%) | | | | 1983780.370 x 5.00% | 99 189 |
| | | Непредвиденные расходы, (2.000%) | | | | 1983780.370 x 2.000% | 39 676 |
| | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | | 2 122 645 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699 | | | | 2122644.995 x 0.9699 | 2 058 822 |
| | | НДС (12%) | | | | 2058821.528 x 12% | 247 059 |
| | | Итого с НДС | | | | 2058821.528 + 247058.583 | 2 305 880 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ | Директор | 04.08.2025 10:06 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ | Эксперт | 04.08.2025 14:35 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ | Авторский надзор | 04.08.2025 12:20 |
| **Представители заказчика** | | |
| 800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ | Региональный руководитель | 05.08.2025 12:16 |
| 841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА | Ведущий специалист (сметчик) | 05.08.2025 12:03<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ | Ведущий специалист | 05.08.2025 11:57 |

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Август 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Электрочасофикация. Звонковая сигнализация** | | | | |
| | | | **Раздел: Электрочасофикация** | | | | |
| 1 | 11 | 248-306-0101РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 31 | 282 | 8 742 |
| 2 | 12 | 6119-0102-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка установочного провода под штукатуркупо стене или в готовой борозде | м | 635 | 795 | 504 825 |
| 3 | 13 | 243-301-0703РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9 | м | 647.7 | 101 | 65 418 |
| 4 | 14 | 6119-0301-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 625 | 1 367 | 854 375 |
| 5 | 15 | 241-207-0101РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 621.15 | 120 | 74 538 |
| 6 | 16 | 241-207-0203РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХгладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 10.1 | 111 | 1 121 |
| | | | **Итого по разделу: Электрочасофикация** | | | | **1 509 019** |
| | | | **Раздел: Звонковая сигнализация** | | | | |
| 7 | 20 | 248-306-0101РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 25 | 282 | 7 050 |
| 8 | 21 | 6119-0102-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 720 | 795 | 572 400 |
| 9 | 22 | 243-108-2501РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 734.4 | 643 | 472 219 |
| 10 | 23 | 6119-0301-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 700 | 1 367 | 956 900 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 24 | 241-207-0101РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 707 | 120 | 84 840 |
| | | | **Итого по разделу: Звонковая сигнализация** | | | | **2 093 409** |
| | | | **Итого по локальной смете: Электрочасофикация. Звонковая сигнализация** | | | | **3 602 428** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **3 602 428** |
| | | | | | | | |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%) | | | | 3602428.000 x 6.90% | 248 568 |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | 3602428.000 + 248567.535 | 3 850 996 |
| | | Сметная прибыль, (5.00%) | | | | 3850995.535 x 5.00% | 192 550 |
| | | Непредвиденные расходы, (2.000%) | | | | 3850995.535 x 2.000% | 77 020 |
| | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | | 4 120 565 |
| | | **в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699** | | | | 4120565.223 x 0.9699 | 3 996 668 |
| | | НДС (12%) | | | | 3996668.499 x 12% | 479 600 |
| | | **Итого с НДС** | | | | 3996668.499 + 479600.220 | 4 476 269 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ | Директор | 04.08.2025 10:07 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ | Эксперт | 04.08.2025 14:35 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ | Авторский надзор | 04.08.2025 12:20 |
| **Представители заказчика** | | |
| 881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ | Ведущий специалист | 05.08.2025 11:58 |
| 841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА | Ведущий специалист (сметчик) | 05.08.2025 12:04<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ | Региональный руководитель | 05.08.2025 12:16 |

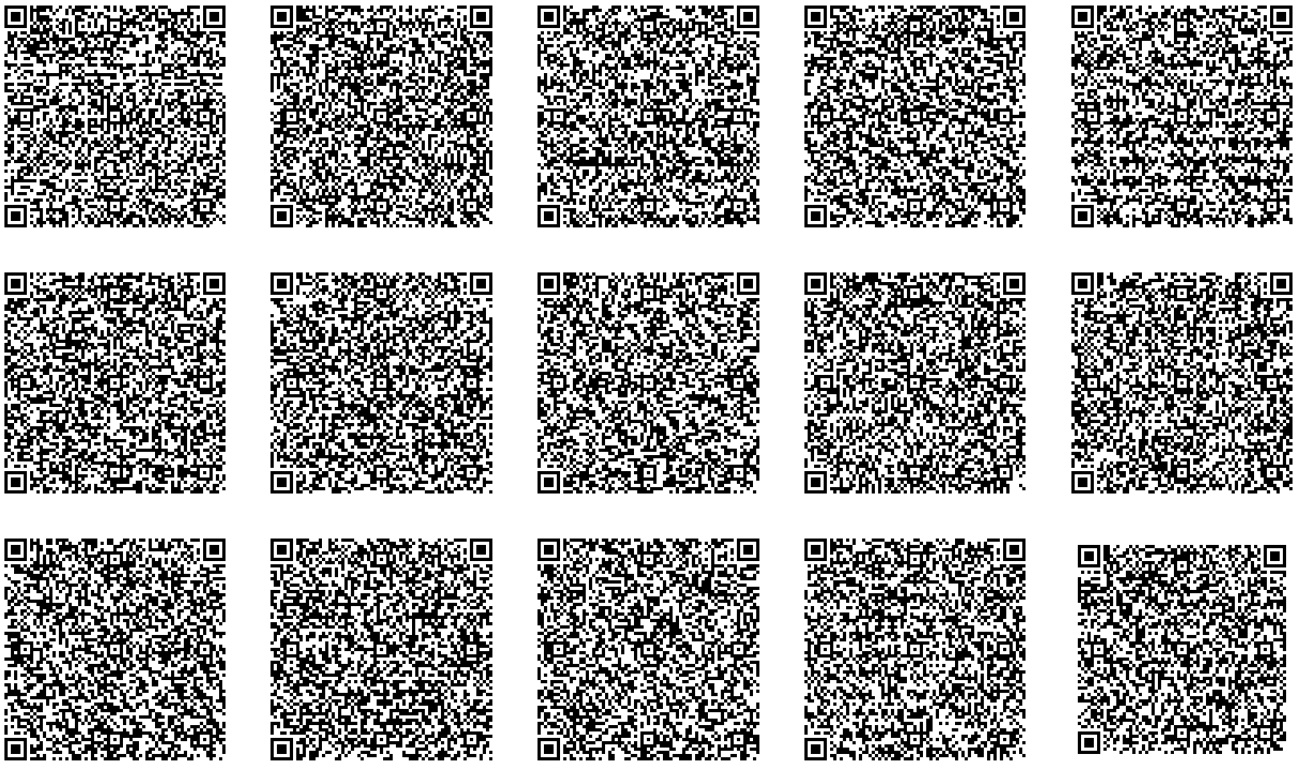

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Август 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Архитектурн-планировочные решения** | | | | |
| | | | **Раздел: Двери /Лист-12/** | | | | |
| | | | **Подраздел: Д-1, Д-1л, Д-2, Д-2л, Д-3, Д-3л, Д-4, Д-4л, Д-5, Д-5л, Д-6, Д-6л, Д-7.1л, Д-7л, Д-8, Д-8л** | | | | |
| 1 | 1 | 6108-0201-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2 | м2 | 59.01 | 8 162 | 481 640 |
| 2 | 2 | 223-201-0105<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | м2 | 30.03 | 12 734 | 382 402 |
| 3 | 3 | 223-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 28.98 | 12 298 | 356 396 |
| | | | **Итого по подразделу: Д-1, Д-1л, Д-2, Д-2л, Д-3, Д-3л, Д-4, Д-4л, Д-5, Д-5л, Д-6, Д-6л, Д-7.1л, Д-7л, Д-8, Д-8л** | | | | **1 220 438** |
| | | | **Подраздел: Д-18, Д-18л** | | | | |
| 4 | 12 | 6108-0201-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2 | м2 | 5.67 | 8 162 | 46 278 |
| 5 | 13 | 223-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 5.67 | 12 298 | 69 730 |
| 6 | 14 | 6108-0204-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка дверных доводчиков | шт. | 3 | 10 658 | 31 974 |
| | | | **Итого по подразделу: Д-18, Д-18л** | | | | **147 982** |
| | | | **Итого по разделу: Двери /Лист-12/** | | | | **1 368 420** |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка стен** | | | | |
| | | | **Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 145 | 6112-0202-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м2 | 212.822 | 4 655 | 990 686 |
| 8 | 146 | 6112-0301-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами | м2 | 2895.13 | 1 910 | 5 529 698 |
| | | | **Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска** | | | | **6 520 384** |
| | | | **Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска** | | | | |
| 9 | 148 | 6112-0202-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м2 | 58.722 | 4 655 | 273 351 |
| 10 | 149 | 6112-0301-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами | м2 | 335.67 | 1 910 | 641 130 |
| | | | **Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска** | | | | **914 481** |
| | | | **Подраздел: Простая штукатурка+керамич.плитка** | | | | |
| 11 | 151 | 6112-0202-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | м2 | 465.5 | 3 887 | 1 809 398 |
| 12 | 152 | 6112-0102-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 | 720 | 10 487 | 7 550 640 |
| | | | **Итого по подразделу: Простая штукатурка+керамич.плитка** | | | | **9 360 038** |
| | | | **Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска** | | | | |
| 13 | 153 | 6112-0202-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м2 | 1079.0845 | 4 655 | 5 023 138 |
| 14 | 154 | 6112-0301-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами | м2 | 3466.31 | 1 910 | 6 620 652 |
| | | | **Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска** | | | | **11 643 790** |
| | | | **Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска** | | | | |
| 15 | 156 | 6112-0202-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м2 | 6.75 | 4 655 | 31 421 |
| 16 | 157 | 6112-0301-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами | м2 | 90.57 | 1 910 | 172 989 |
| | | | **Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска** | | | | **204 410** |
| | | | **Подраздел: Простая штукатурка+керамич.плитка** | | | | |
| 17 | 160 | 6112-0102-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 | 260 | 10 487 | 2 726 620 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по подразделу: Простая штукатурка+керамич.плитка** | | | | **2 726 620** |
| | | | **Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска** | | | | |
| 18 | 161 | 6112-0202-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м2 | 2672.48 | 4 655 | 12 440 394 |
| 19 | 162 | 6112-0301-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами | м2 | 2672.48 | 1 910 | 5 104 437 |
| | | | **Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска** | | | | **17 544 831** |
| | | | **Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска** | | | | |
| 20 | 164 | 6112-0202-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м2 | 69.65 | 4 655 | 324 221 |
| 21 | 165 | 6112-0301-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами | м2 | 69.65 | 1 910 | 133 032 |
| | | | **Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска** | | | | **457 253** |
| | | | **Подраздел: Простая штукатурка+керамич.плитка** | | | | |
| 22 | 167 | 6112-0202-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | м2 | 410.14 | 3 887 | 1 594 214 |
| | | | **Итого по подразделу: Простая штукатурка+керамич.плитка** | | | | **1 594 214** |
| | | | **Итого по разделу: Внутренняя отделка стен** | | | | **50 966 022** |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | |
| | | | **Подраздел: Тип IX** | | | | |
| 23 | 173 | 6109-0102-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | м3 | 28.801 | 26 173 | 753 809 |
| 24 | 174 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 28.801 | 33 951 | 977 823 |
| 25 | 175 | 6111-0401-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя | м2 | 288.01 | 5 014 | 1 444 082 |
| 26 | 176 | 235-103-0305<br>РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | м2 | 662.423 | 1 007 | 667 060 |
| 27 | 177 | 6103-0101-0211<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м3 | 7.3344 | 38 406 | 281 685 |
| 28 | 178 | 6103-0703-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм | т | 2.275279 | 85 269 | 194 011 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 179 | 214-210-0501<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /сетка А500 100х100х8 - вес 7,9 кг/м2/ | т | 2.275279 | 314 637 | 715 887 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип IX** | | | | **5 034 357** |
| | | | **Подраздел: Тип VIII** | | | | |
| 30 | 182 | 6109-0102-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | м3 | 209.34 | 26 173 | 5 479 056 |
| 31 | 183 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 209.34 | 33 951 | 7 107 302 |
| 32 | 184 | 6111-0401-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя | м2 | 2093.4 | 5 014 | 10 496 308 |
| 33 | 185 | 235-103-0305<br>РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | м2 | 4814.82 | 1 007 | 4 848 524 |
| 34 | 188 | 6103-0703-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм | т | 16.53786 | 85 269 | 1 410 167 |
| 35 | 189 | 214-210-0501<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /сетка А500 100х100х8 - вес 7,9 кг/м2/ | т | 16.53786 | 314 637 | 5 203 423 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип VIII** | | | | **34 544 780** |
| | | | **Подраздел: Тип X** | | | | |
| 36 | 191 | 6109-0102-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | м3 | 9.696 | 26 173 | 253 773 |
| 37 | 192 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 9.696 | 33 951 | 329 189 |
| 38 | 193 | 6111-0401-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя | м2 | 96.96 | 5 014 | 486 157 |
| 39 | 194 | 235-103-0305<br>РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | м2 | 223.008 | 1 007 | 224 569 |
| 40 | 196 | 6103-0703-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм | т | 0.765984 | 85 269 | 65 315 |
| 41 | 197 | 214-210-0501<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /сетка А500 100х100х8 - вес 7,9 кг/м2/ | т | 0.765984 | 314 637 | 241 007 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип X** | | | | **1 600 010** |
| | | | **Итого по разделу: Полы** | | | | **41 179 147** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Кровля /Лист-32/** | | | | |
| | | | **Подраздел: Р Основная кровля** | | | | |
| 42 | 347 | 6111-0402-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | м2 | 1150 | 2 034 | 2 339 100 |
| 43 | 348 | 235-103-0118<br>РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка | м2 | 1265 | 820 | 1 037 300 |
| 44 | 349 | 6111-0402-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | м2 | 1150 | 1 787 | 2 055 050 |
| 45 | 350 | 234-101-0207<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м3 | 189.52 | 57 830 | 10 959 942 |
| 46 | 353 | 6111-0402-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом | м3 | 304.75 | 34 930 | 10 644 918 |
| 47 | 354 | 6110-0302-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | м2 | 1150 | 1 662 | 1 911 300 |
| 48 | 355 | 6110-0302-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | м2 | 1150 | 2 642 | 3 038 300 |
| 49 | 356 | 6103-0701-0810<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 1.15 | 63 196 | 72 675 |
| 50 | 357 | 214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /сетка 3ВР1 100х100 вес 1 кг/м2/ | т | 1.15 | 397 364 | 456 969 |
| 51 | 358 | 6110-0101-0212<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных | м2 | 1150 | 942 | 1 083 300 |
| 52 | 359 | 6110-0101-0213<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212 | м2 | 1150 | 375 | 431 250 |
| 53 | 360 | 235-103-0408<br>РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для зеленой кровли,марки ЭПП-5,0 | м2 | 2645 | 1 419 | 3 753 255 |
| 54 | 361 | 235-103-0404<br>РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2 | м2 | 1322.5 | 3 143 | 4 156 618 |
| | | | **Итого по подразделу: Р Основная кровля** | | | | **41 939 976** |
| | | | **Итого по разделу: Кровля /Лист-32/** | | | | **41 939 976** |
| | | | **Итого по локальной смете: Архитектурн-планировочные решения** | | | | **135 453 565** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **135 453 565** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%) | | | | 135453564.863 x 6.90% | 9 346 296 |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | 135453564.863 + 9346296.105 | 144 799 861 |
| | | Сметная прибыль, (5.00%) | | | | 144799860.968 x 5.00% | 7 239 993 |
| | | Непредвиденные расходы, (2.000%) | | | | 144799860.968 x 2.000% | 2 895 997 |
| | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | | 154 935 851 |
| | | **в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699** | | | | 154935851.235 x 0.9699 | 150 277 256 |
| | | НДС (12%) | | | | 150277256.290 x 12% | 18 033 271 |
| | | **Итого с НДС** | | | | 150277256.290 + 18033270.755 | 168 310 527 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ | Директор | 05.08.2025 10:13 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ | Эксперт | 05.08.2025 10:23 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ | Авторский надзор | 05.08.2025 10:14 |
| **Представители заказчика** | | |
| 800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ | Региональный руководитель | 05.08.2025 15:17 |
| 881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ | Ведущий специалист | 05.08.2025 12:31 |
| 841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА | Ведущий специалист (сметчик) | 05.08.2025 14:48<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |

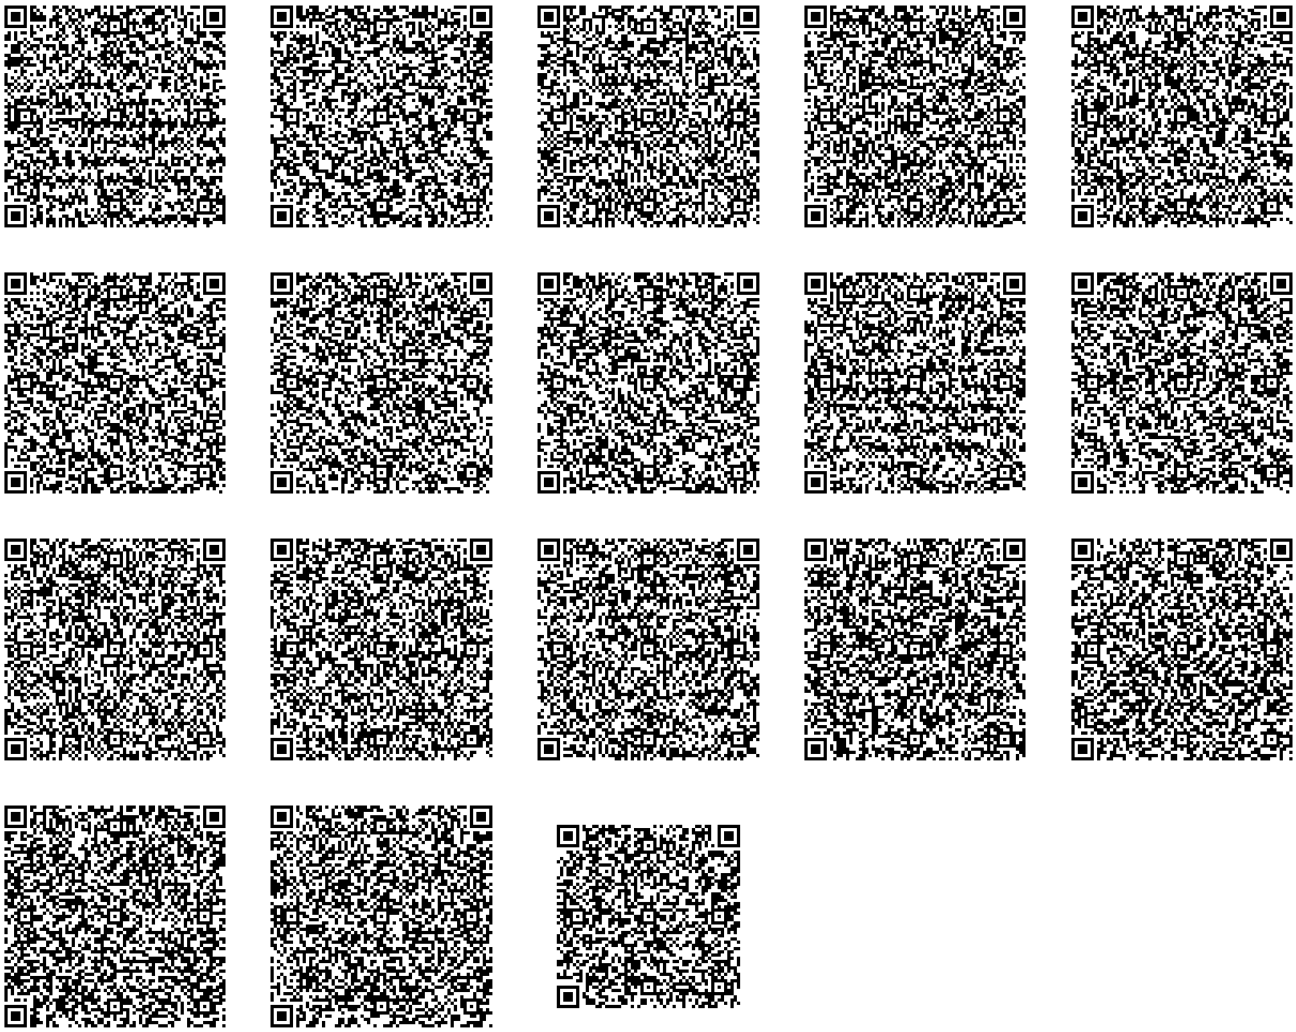

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Август 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Архитектурн-строительные чертежи** | | | | |
| | | | **Раздел: Стены и перегородки /Листы - 6-7/** | | | | |
| | | | **Подраздел: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50** | | | | |
| 1 | 1 | 6105-0201-0502<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича | м2 | 111.94 | 9 702 | 1 086 042 |
| 2 | 2 | 213-101-0101РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 5.641776 | 77 102 | 434 992 |
| 3 | 3 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.209965 | 300 662 | 63 129 |
| 4 | 4 | 6103-0703-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм | т | 0.209965 | 85 269 | 17 904 |
| | | | **Итого по подразделу: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50** | | | | **1 602 066** |
| | | | **Подраздел: Р Зашивка стояков и трубопроводов из ГКЛВ /Лист-7, прим./** | | | | |
| 5 | 82 | 6107-0204-0107<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой | м2 | 110 | 5 401 | 594 110 |
| | | | **Итого по подразделу: Р Зашивка стояков и трубопроводов из ГКЛВ /Лист-7, прим./** | | | | **594 110** |
| | | | **Итого по разделу: Стены и перегородки /Листы - 6-7/** | | | | **2 196 176** |
| | | | **Итого по локальной смете: Архитектурн-строительные чертежи** | | | | **2 196 176** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **2 196 176** |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%) | | | | 2196176.197 x 6.90% | 151 536 |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | 2196176.197 + 151536.160 | 2 347 712 |
| | | Сметная прибыль, (5.00%) | | | | 2347712.357 x 5.00% | 117 386 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Непредвиденные расходы, (2.000%) | | | | 2347712.357 x 2.000% | 46 954 |
| | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | | 2 512 052 |
| | | **в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699** | | | | 2512052.222 x 0.9699 | 2 436 520 |
| | | НДС (12%) | | | | 2436520.099 x 12% | 292 382 |
| | | **Итого с НДС** | | | | 2436520.099 + 292382.412 | 2 728 903 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ | Директор | 04.08.2025 10:06 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ | Эксперт | 04.08.2025 14:36 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ | Авторский надзор | 04.08.2025 12:18 |
| **Представители заказчика** | | |
| 800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ | Региональный руководитель | 05.08.2025 12:15 |
| 881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ | Ведущий специалист | 05.08.2025 11:49 |
| 841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА | Ведущий специалист (сметчик) | 05.08.2025 12:03<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |

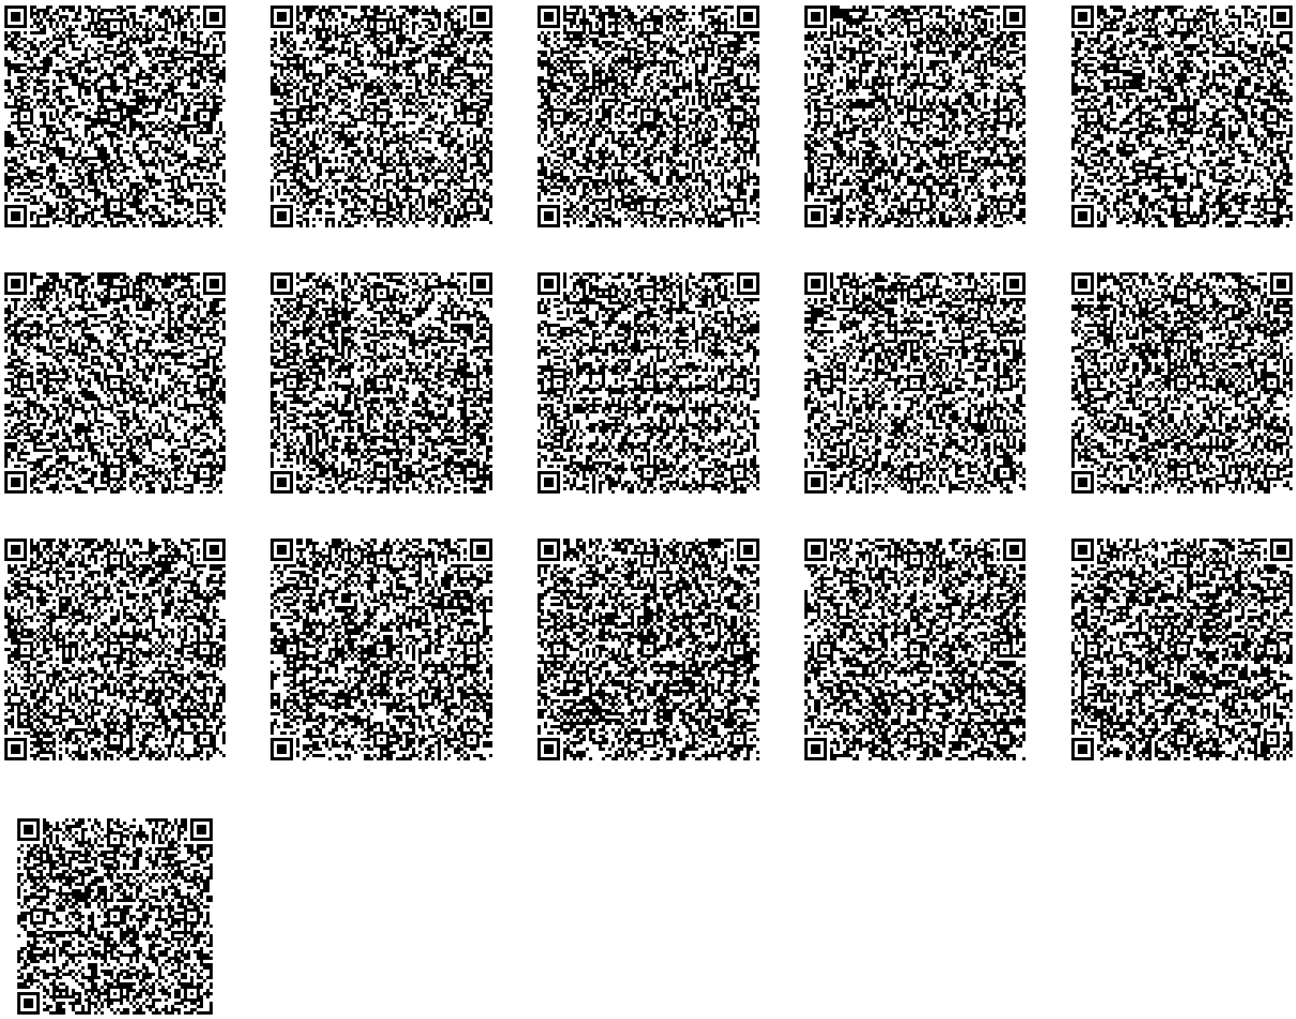

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Август 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Диспетчерезация лифта** | | | | |
| 1 | 7 | 6119-0102-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 60 | 795 | 47 700 |
| 2 | 8 | 243-301-0423РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 10х2х0,5-315 | м | 40.8 | 447 | 18 238 |
| 3 | 9 | СТРСНБ РК 2022 | Кабель телефонный для внутренней прокладки, негорючий КПСВЭВ 2х2х0,5 | м. | 20 | 173 | 3 470 |
| 4 | 10 | 6119-0301-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 38 | 1 367 | 51 946 |
| 5 | 11 | 241-207-0103РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкаясо структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 30.3 | 224 | 6 787 |
| 6 | 12 | 241-207-0203РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 8 | 111 | 888 |
| | | | **Итого по локальной смете: Диспетчерезация лифта** | | | | **129 029** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **129 029** |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%) | 129029.000 x 6.90% | 8 903 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 129029.000 + 8903.001 | 137 932 |
| Сметная прибыль, (5.00%) | 137932.001 x 5.00% | 6 897 |
| Непредвиденные расходы, (2.000%) | 137932.001 x 2.000% | 2 759 |
| **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 147 587 |
| **в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699** | 147587.241 x 0.9699 | 143 150 |
| НДС (12%) | 143149.603 x 12% | 17 178 |
| **Итого с НДС** | 143149.603 + 17177.952 | 160 328 |

Лист согласования
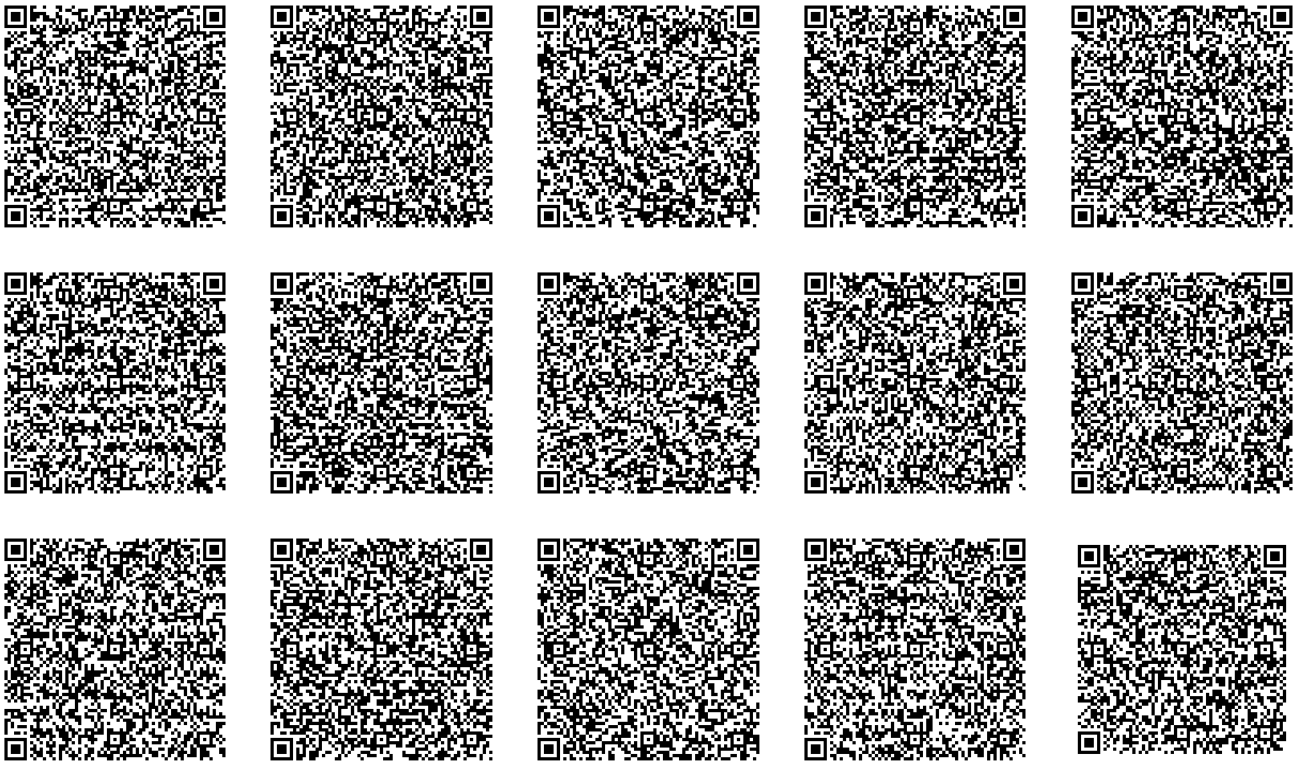
| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ | Директор | 04.08.2025 10:08 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ | Эксперт | 04.08.2025 14:31 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ | Авторский надзор | 04.08.2025 12:19 |
| **Представители заказчика** | | |
| 800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ | Региональный руководитель | 05.08.2025 15:12 |
| 881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ | Ведущий специалист | 05.08.2025 12:31 |
| 841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА | Ведущий специалист (сметчик) | 05.08.2025 14:47<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
