Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление и вентиляция				
			Раздел: Отопление				
1	1	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	211.64	2 868	606 983
2	2	245-102-0105РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	2226	2 231	4 966 206
3	3	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	231	763	176 253
4	4	261-301-0405РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	231	120	27 720
5	5	245-106-0101РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	231	1 056	243 936
6	6	6114-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	231	762	176 022
7	7	245-510-0301РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	231	3 350	773 850
8	12	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	16.6	2 046	33 964
9	13	241-101-0204РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0.8	1 102	882
10	14	241-101-0207РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0.6	1 369	821
11	15	241-101-0209РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	3.6	1 406	5 062

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	16	241-101-0209РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	6	1 406	8 436
13	17	241-101-0209РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1.8	1 406	2 531
14	18	241-101-0210РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	1.8	2 099	3 778
15	19	241-101-0210РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	1.2	2 099	2 519
16	20	6116-0602-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка воздухоотводчиков	шт.	16	9 411	150 576
17	21	245-405-1502РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	16	4 549	72 784
18	22	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	12	2 319	27 828
19	23	242-312-0101РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	84 708	847 080
20	24	242-312-0102РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	91 228	91 228
21	25	242-312-0103РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	110 474	110 474
22	26	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	10	2 652	26 520
23	27	242-312-0104РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	127 320	1 145 880
24	28	242-312-0105РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	135 073	135 073
25	29	242-207-0901РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	29	3 901	113 129
26	30	242-207-0902РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	19	5 466	103 854
27	31	242-207-0903РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	8 398	67 184
28	32	242-207-0904РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	20	12 677	253 540
29	33	242-207-0905РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	18 982	113 892
30	34	242-207-0906РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	30 222	120 888
31	35	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 608	9 216

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	36	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	9	4 690	42 210
33	37	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	5 594	5 594
34	38	242-404-0803РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 799	15 799
35	39	242-404-0804РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	22 279	22 279
36	40	242-404-0805РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	9	28 637	257 733
37	41	242-404-0806РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	40 180	40 180
38	42	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	39	2 319	90 441
39	43	242-312-1401СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	25	19 315	482 875
40	44	242-312-1402СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	22 507	202 563
41	45	242-312-1403СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	30 842	154 210
42	46	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	8	2 319	18 552
43	47	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	5	2 652	13 260
44	48	242-312-1701СпрСЦ 08.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	26 802	160 812
45	49	242-312-1702СпрСЦ 08.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	30 547	30 547
46	50	242-312-1703СпрСЦ 08.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	36 808	36 808
47	51	242-312-1704СпрСЦ 08.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	54 922	219 688
48	52	242-312-1705СпрСЦ 08.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	61 173	61 173
49	58	6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	489.38	754	368 992
50	59	6114-0103-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	140.6	1 199	168 579

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	60	6114-0103-0314 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	58.24	1 316	76 644
52	61	241-205-2301РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	484.4862	189	91 568
53	62	241-205-2302РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	139.194	282	39 253
54	63	241-205-2303РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	57.6576	468	26 984
55	78	241-208-2501РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1500	17	25 500
56	79	241-208-2502РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	95	31	2 945
57	80	241-208-2503РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	30	48	1 440
58	81	241-209-1901РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	335	34	11 390
59	82	241-209-1902РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	32	52	1 664
60	83	241-209-1903РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	11	102	1 122
61	86	6401-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	94 945	94 945
62	87	245-405-1901РСНБ РК 2022	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 3 отвода	шт.	1	337 553	337 553
63	88	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	3357.42	1 890	6 345 523
64	89	234-303-0108РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	2809.037	189	530 908
65	90	234-303-0110РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	686.51	236	162 016
66	91	234-303-0112РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	197.615	303	59 877
			Итого по разделу: Отопление				**20 619 738**
			Итого по локальной смете: Отопление и вентиляция				**20 619 738**
			ИТОГО по акту:				**20 619 738**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)				20619737.605 x 6.90%	1 422 762
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				20619737.605 + 1422761.914	22 042 500
		Сметная прибыль, (5.00%)				22042499.520 x 5.00%	1 102 125

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные расходы, (2.000%)				22042499.520 x 2.000%	440 850
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					23 585 474
		в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699				23585474.486 x 0.9699	22 876 309
		НДС (12%)				22876308.910 x 12%	2 745 157
		Итого с НДС				22876308.910 + 2745157.069	25 621 466

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	02.09.2025 09:52
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	02.09.2025 11:00
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	02.09.2025 10:03
Представители заказчика		
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	03.09.2025 17:04
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	03.09.2025 10:31
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	03.09.2025 16:53 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

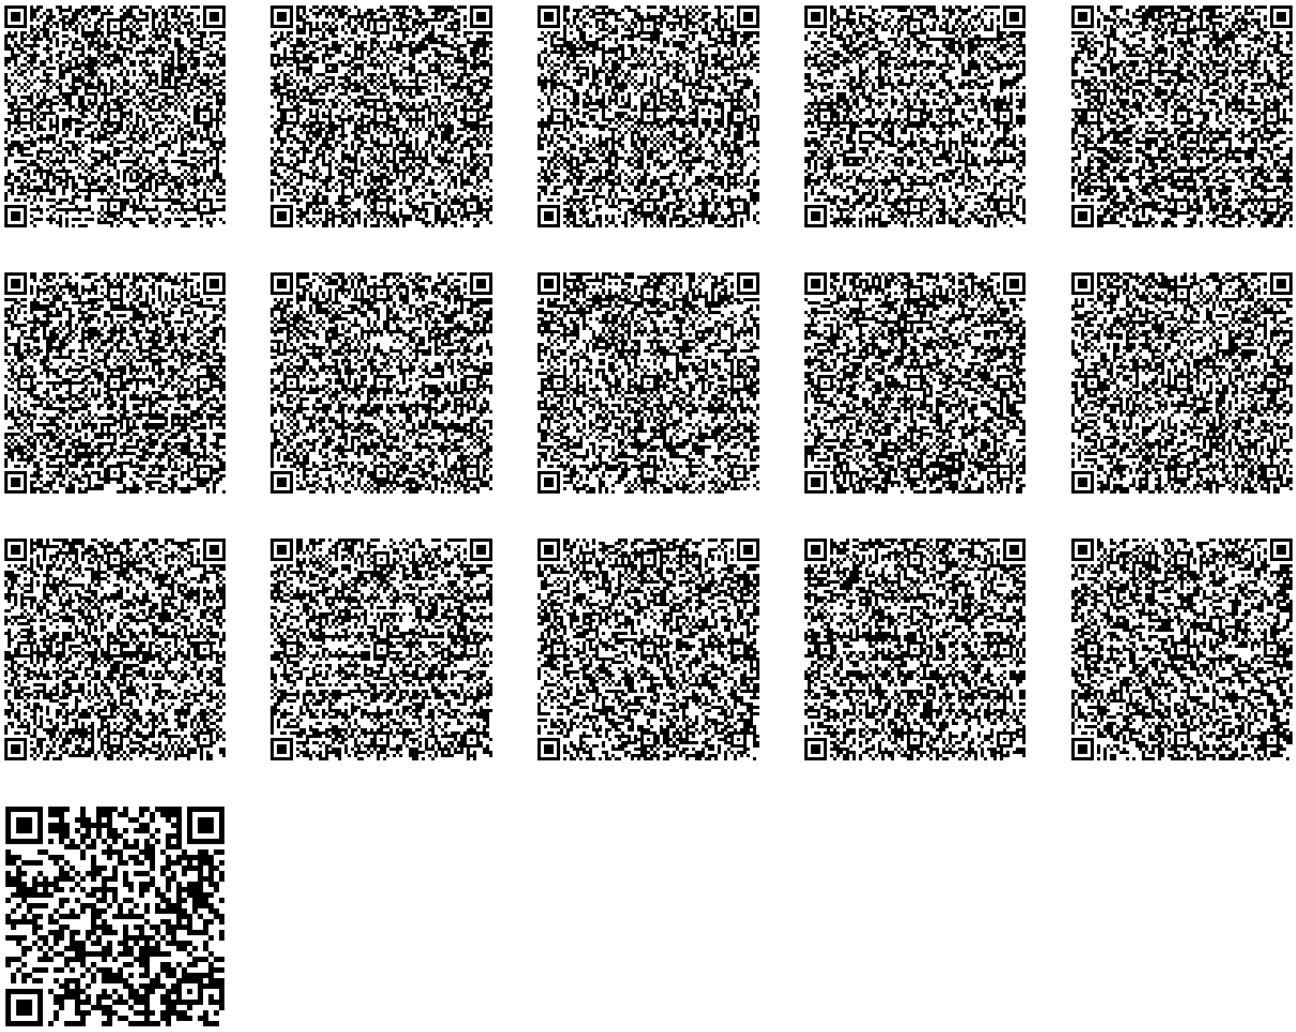

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Охранная сигнализация				
1	17	248-306-0101РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	60	282	16 920
2	19	6119-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	630	300	189 000
3	20	243-305-0111РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	м	642.6	210	134 946
4	21	6119-0302-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	630	1 202	757 260
5	22	243-907-0105РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	648.9	129	83 708
			Итого по локальной смете: Охранная сигнализация				**1 181 834**
			ИТОГО по акту:				**1 181 834**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	1181834.000 x 6.90%	81 547
Итого с затратами на организацию и управление СМР	1181834.000 + 81546.547	1 263 381
Сметная прибыль, (5.00%)	1263380.547 x 5.00%	63 169
Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	1263380.547 x 2.000%	25 268
Итого с непредвидемыми работами и затратами		1 351 817
в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699	1351817.185 x 0.9699	1 311 171
НДС (12%)	1311170.888 x 12%	157 341
Итого с НДС	1311170.888 + 157340.507	1 468 511

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:10
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:44
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:27
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 17:09 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 15:44
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:23

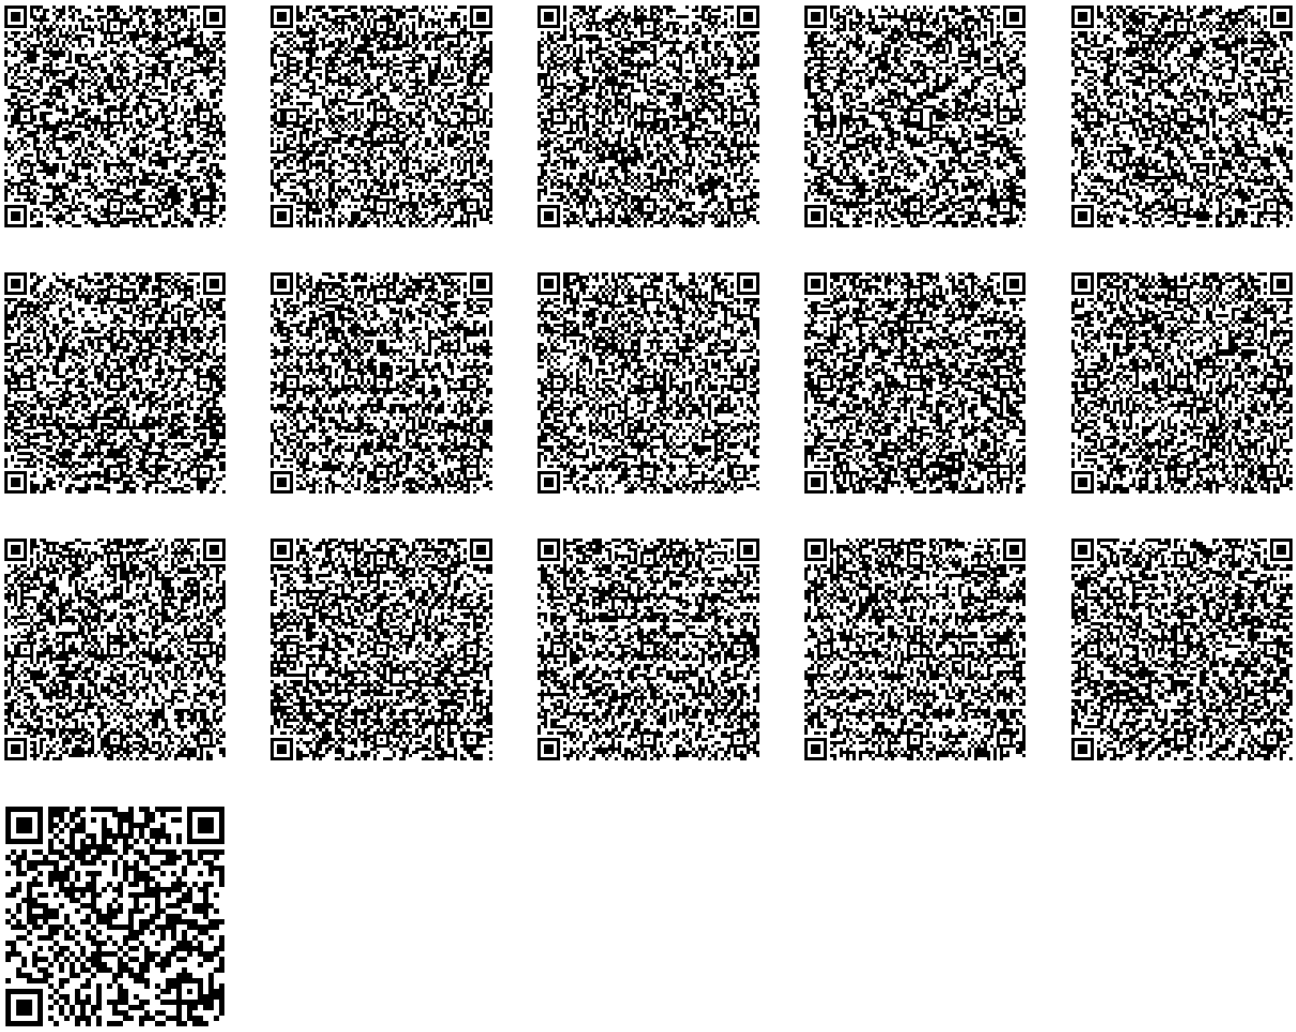

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Пожарная сигнализация				
1	15	6125-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	480	10 174	4 883 520
2	16	248-302-0233СпрСЦ 08.2024	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	480	7 936	3 809 280
3	29	6401-0104-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	7	94 945	664 615
4	30	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Шкаф управления вентилятором 1,5 кВт, 380В ШУН/В-1,5-00-R3	шт.	1	194 853	194 853
5	31	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Шкаф управления вентилятором 5,5 кВт, 380В ШУН/В-5,5-00-R3	шт.	3	200 170	600 510
6	32	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Шкаф управления вентилятором 15 кВт, 380В ШУН/В-15-00-R3	шт.	1	207 252	207 252
7	33	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Шкаф управления вентилятором 1,5кВт и электрокалорифером 15кВт 380В ШУН/В-1,5-00-УК-15-R3	шт.	1	231 748	231 748
8	34	247-201-1434СпрСЦ 08.2024	Шкаф контрольно-пусковой ШУЗ-RS	шт.	1	219 167	219 167
9	36	6119-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1820	300	546 000
10	38	243-305-0303РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	1856.4	118	219 055
11	44	6119-0302-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	1820	1 202	2 187 640
12	45	243-907-0105РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1874.6	129	241 823
			Итого по локальной смете: Пожарная сигнализация				**14 005 463**
			ИТОГО по акту:				**14 005 463**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)					14005463.331 х 6.90%	966 377

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				14005463.331 + 966376.983	14 971 840
		Сметная прибыль, (5.00%)				14971840.314 x 5.00%	748 592
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				14971840.314 x 2.000%	299 437
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					16 019 869
		Наименование Коэффициент (%) в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699				16019869.136 x 0.9699	15 538 185
		НДС (12%)				15538185.389 x 12%	1 864 582
		Итого с НДС				15538185.389 + 1864582.247	17 402 768

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:10
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:43
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:27
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 15:24
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 15:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:24

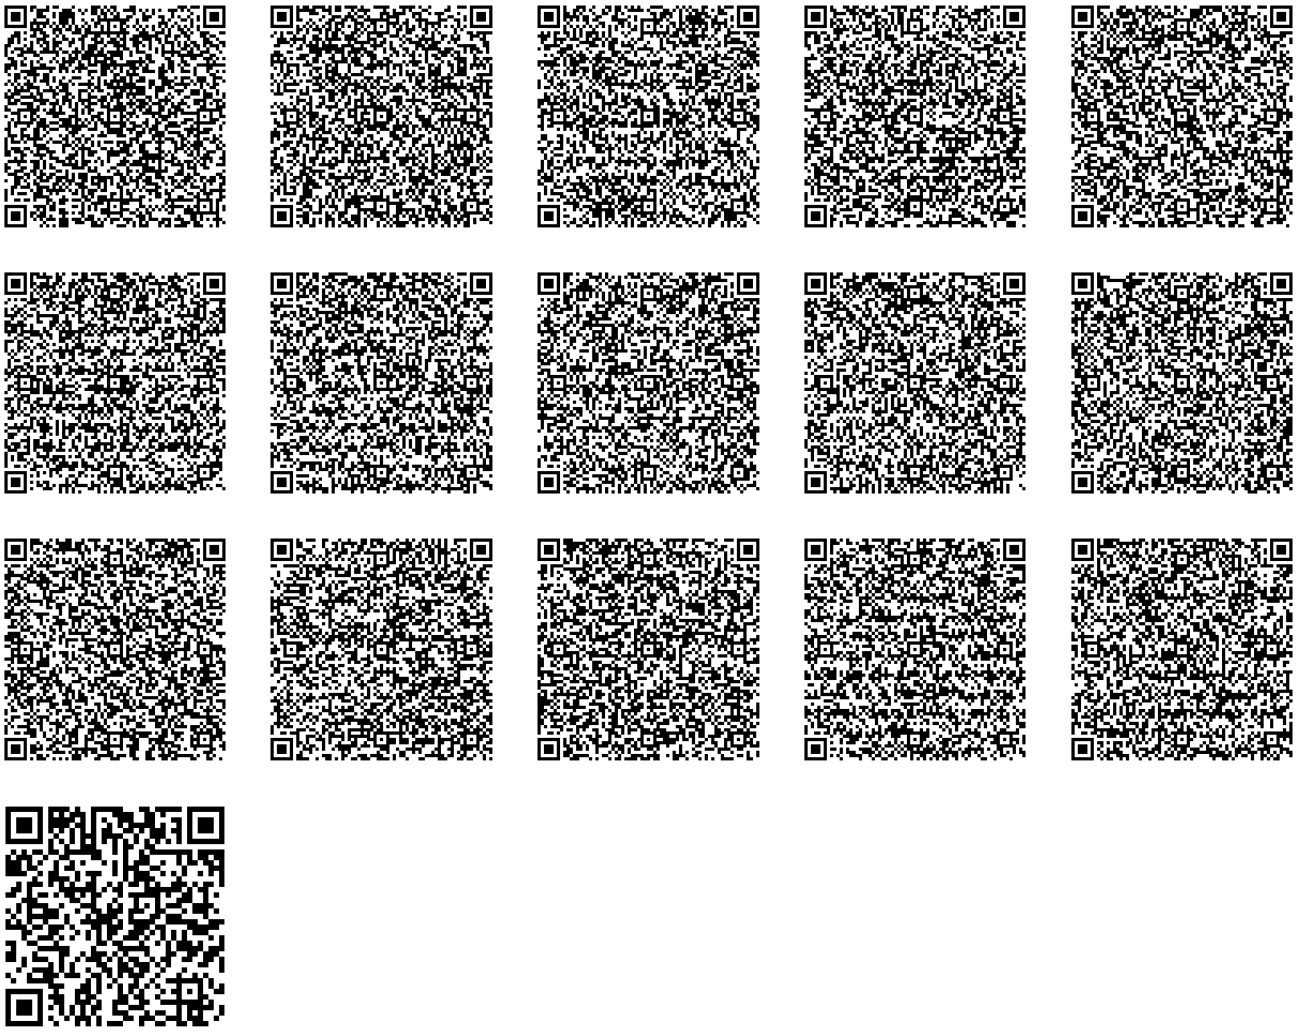

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Структурированная кабельная сеть				
			Раздел: Оборудование шкафа 19				
1	1	6125-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг	шт.	1	41 618	41 618
2	2	248-102-1530 СпрСЦ 08.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x1000 мм 42U, с передней стеклянной и задней перфорированной металлической дверьми	шт.	1	419 741	419 741
3	3	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4 384	4 384
4	4	248-102-2902 СпрСЦ 08.2024	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290	102 290
5	5	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	4 384	8 768
6	6	248-102-3503 СпрСЦ 08.2024	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	2	27 246	54 492
7	7	248-102-2503 СпрСЦ 08.2024	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	9	3 997	35 973
8	8	248-102-2702 СпрСЦ 08.2024	Полка выдвижная типа ITK, глубиной 1000 мм, статистическая нагрузка до 40 кг	шт.	1	63 157	63 157
9	9	248-102-3704 СпрСЦ 08.2024	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual)	шт.	1	26 895	26 895

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	248-102-3708 СпрСЦ 08.2024	Патч-панель типа ITK высокой плотности, 1U, категория 6 UTP, 48 портов (Dual)	шт.	8	48 934	391 472
11	11	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4 384	4 384
12	12	248-102-0704 СпрСЦ 08.2024	Маршрутизатор (роутер) ESR-30, 4x10/100/1000BASE-T, 2x10GBASE-R SFP+, 1xConsole (RJ-45), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1 слот для micro-SD карт, 4 Гб RAM, 8 Гб Flash, 100-264 В AC	шт.	1	889 566	889 566
13	13	СТСпрСЦ 08.2024	Оптическая панель 19" 1U фиксированная, корпус на 24 адаптера, 6 дуплекс LC Eurolan 48C-24-S2-2L-06-11BL	шт.	1	100 747	100 747
14	14	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	6	35 045	210 270
15	15	518-102-0307 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	6	680 014	4 080 084
16	16	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	14	4 384	61 376
17	17	СТРСНБ РК 2022	Модуль питания для коммутатора ELTEX PM950-220/56	шт.	6	106 145	636 872
18	18	248-404-1605 СпрСЦ 08.2024	Модуль SFP, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM оптический, дальность до 1км, 1310нм	шт.	8	12 596	100 768
19	19	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4 384	4 384
20	20	Т Пункт перечня РСНБ РК 2022	SERVER GIGABYTE R282-3C1: 6NR2823C1SR-RMA-A100:SERVER GIGABYTE R282-3C1 (2x Intel Xeon Silver 4314(2,4GHZ/16-Core/24MB/135W, 4x 32GB ECC DDR4 3200MHz RAM; 2x 1600W (240V) 80 PLUS Platinum, шSSD, 480GB, SATA 6GB/s, Read intensive, 2GB Cache, Hardware RAID 0/1/5/6/10/50/60, PCIe x8 slot (3.0 x8 bus), Сборка на заводе GIGABYTE, ГАРАНТИЯ и ПОДДЕРЖКА GIGABYTEт	шт.	1	3 906 497	3 906 497
			Итого по разделу: Оборудование шкафа 19				**11 143 738**
			Раздел: Материалы, кабель				
21	37	243-906-2402 СпрСЦ 08.2024	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH	шт.	8	5 920	47 360
22	38	243-906-2711 СпрСЦ 08.2024	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH	шт.	252	4 920	1 239 840
23	39	6118-0206-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка герметического	шт.	122	11 397	1 390 434
24	40	247-216-1403 СпрСЦ 08.2024	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 4 поста (45x45),металл/ пластик, с пластиковой коробкой 126x110,5x76 мм; IP40	шт.	122	29 191	3 561 302

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	50	СТРСНБ РК 2022	Коробка накладная для монтажа Legrand 672510	шт.	57	1 387	79 058
26	52	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	730	300	219 000
27	53	1308-0206-0801 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	500	74	37 000
28	55	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	994.5	137	136 246
29	56	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	20.6	362	7 457
30	57	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	900	1 367	1 230 300
31	58	6119-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	150	1 637	245 550
32	59	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	404	224	90 496
33	60	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	505	111	56 055
34	61	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	151.5	172	26 058
35	62	6119-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	690	1 202	829 380
36	63	6119-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	40	1 861	74 440
37	64	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	587.1	129	75 736
38	65	243-907-0112 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	123.6	504	62 294
39	66	243-907-0114 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	м	41.2	637	26 244
			Итого по разделу: Материалы, кабель				**9 434 250**
			Раздел: Оптические сети				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	71	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	50	789	39 450
41	72	243-503-0203 СпрСЦ 08.2024	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF	м	51	1 264	64 464
42	73	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	6	1 095	6 570
43	74	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	50.5	239	12 070
			Итого по разделу: Оптические сети				**122 554**
			Итого по локальной смете: Структурированная кабельная сеть				**20 700 542**
			ИТОГО по акту:				**20 700 542**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	12713961.000 x 6.90%	877 263
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	20700542.000 + 877263.321	21 577 805
	Сметная прибыль, (5.00%)	13591224.321 x 5.00%	679 561
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	21577805.321 x 2.000%	431 556
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		22 688 923
	в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699	22688922.644 x 0.9699	22 006 714
	НДС (12%)	22006714.494 x 12%	2 640 806
	Итого с НДС	22006714.494 + 2640805.739	24 647 520

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:11
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:46
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:25
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 17:03
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 17:11 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:29

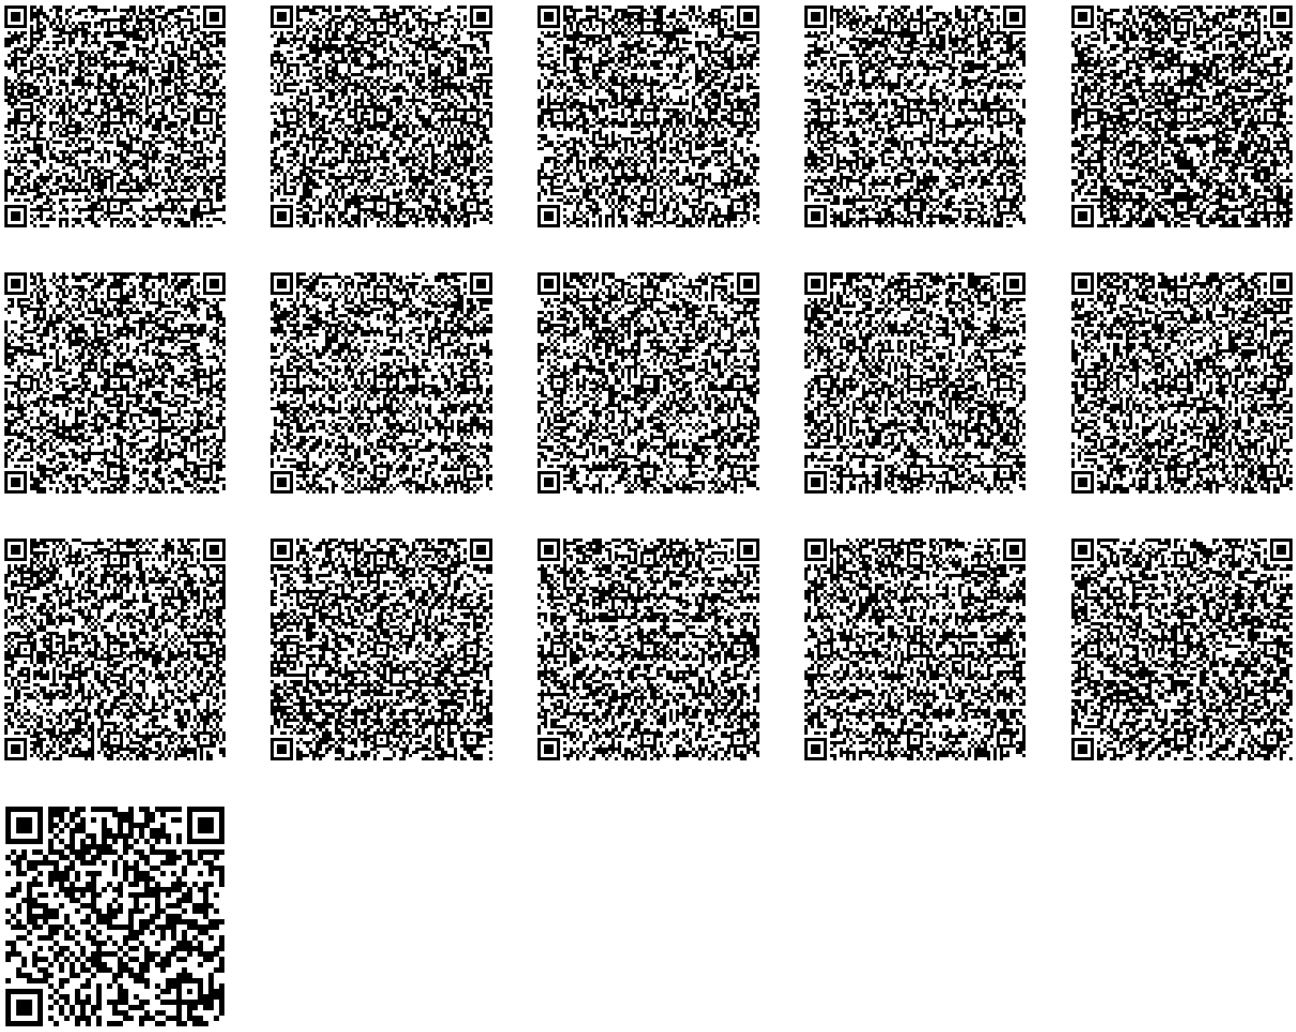

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система контроля и управления доступом				
			Раздел: Оборудование и материалы				
1	2	1310-0302-0105РСНБ РК 2022	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	35 045	70 090
2	3	518-102-0306РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2324B: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12DC	шт.	1	306 209	306 209
3	4	518-102-0307РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	1	680 014	680 014
4	25	248-306-0101РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	84	282	23 688
5	30	6119-0102-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	558	795	443 610
6	31	6119-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1060	300	318 000
7	32	243-304-0133РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	553.86	121	67 017
8	33	243-802-0102РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	504.7	103	51 984
9	34	243-802-0107РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм2	м	185.4	156	28 922
10	35	243-305-0101РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	499.8	68	33 986
11	36	6119-0302-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	540	1 202	649 080
12	37	243-907-0105РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	556.2	129	71 750
13	38	6119-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	75	1 367	102 525

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	39	241-207-0303РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	75.75	78	5 908
15	40	6119-0301-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	3	1 467	4 401
16	41	241-102-0106РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3.06	505	1 545
			Итого по разделу: Оборудование и материалы				**2 858 730**
			Итого по локальной смете: Система контроля и управления доступом				**2 858 730**
			ИТОГО по акту:				**2 858 730**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	1872506.800 x 6.90%	129 203
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2858729.800 + 129202.971	2 987 933
	Сметная прибыль, (5.00%)	2001709.771 x 5.00%	100 085
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	2987932.771 x 2.000%	59 759
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		3 147 777
	в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699	3147776.915 x 0.9699	3 053 130
	НДС (12%)	3053129.888 x 12%	366 376
	Итого с НДС	3053129.888 + 366375.587	3 419 505

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:10
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:45
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:26
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 15:44
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 17:10 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:26

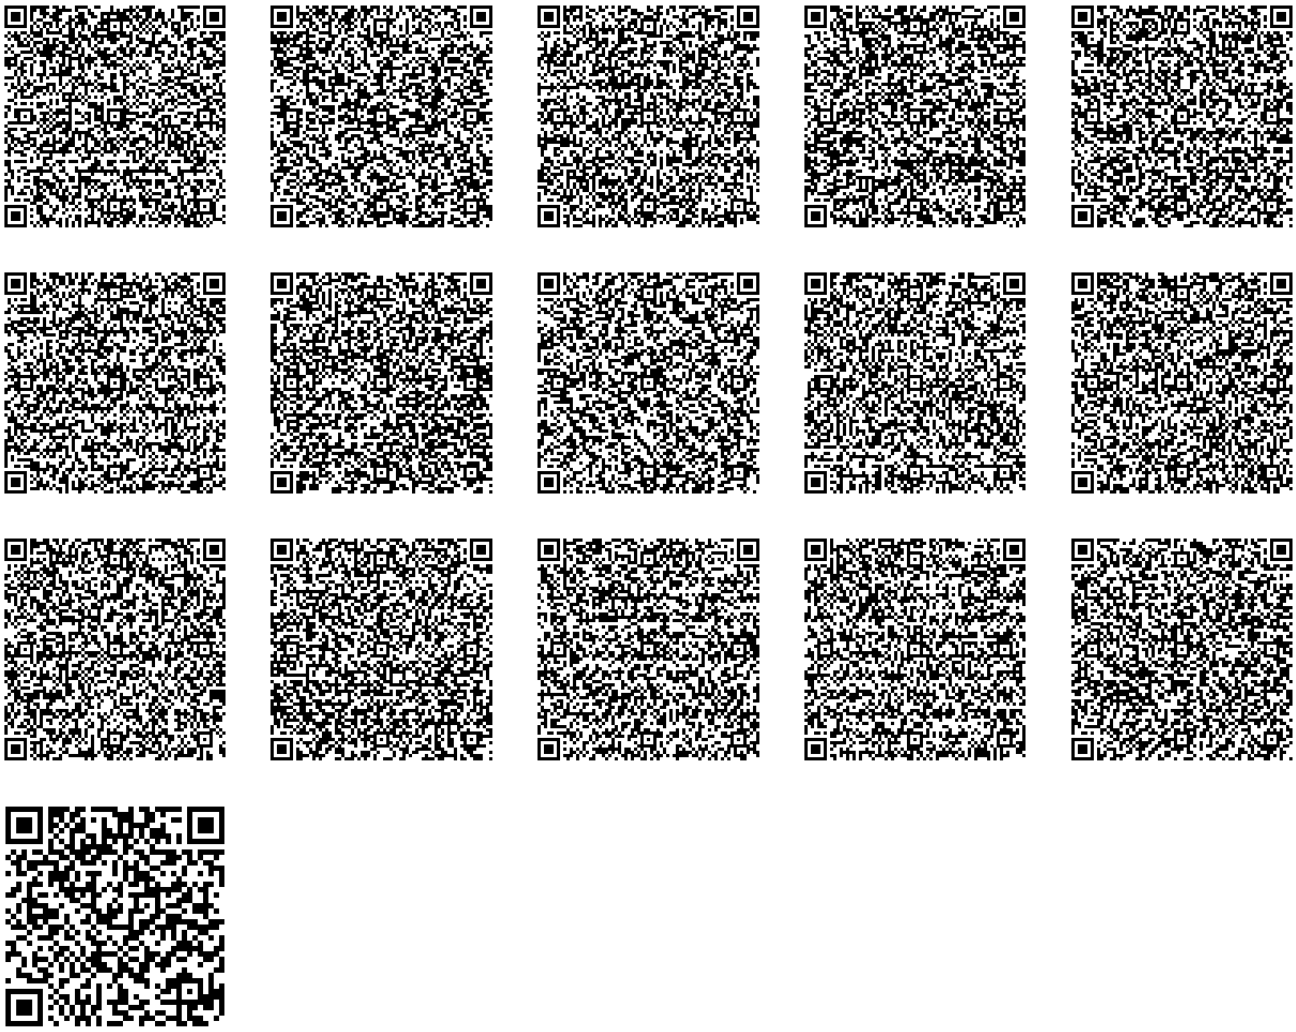

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система оповещения и управления эвакуацией				
1	6	6401-0303-0404ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 816	15 816
2	7	248-102-1828СпрСЦ 08.2024	Шкаф телекоммуникационный настенныйтипа ITK, LINEA WE 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	56 252	56 252
3	18	6119-0102-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	459.75	795	365 501
4	19	6119-0101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	166.5	300	49 950
5	20	243-305-0301РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	238.5	86	20 511
6	21	243-305-0303РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	81	118	9 558
7	22	243-305-0307СпрСЦ 08.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	295.5	344	101 652
8	23	243-304-0135РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52	м	11.25	356	4 005
9	24	261-404-0478РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.9	62	56
10	25	6119-0302-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	166.5	1 202	200 133
11	26	243-907-0105РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	171.495	129	22 123
12	27	6119-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	448.5	1 367	613 099
13	28	241-207-0303РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	452.985	78	35 333
14	29	6119-0301-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	1.5	1 467	2 200

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	30	241-102-0106РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1.5	505	757
			Итого по локальной смете: Система оповещения и управления эвакуацией				**1 496 947**
			ИТОГО по акту:				**1 496 947**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				1496947.250 x 6.90%	103 289
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1496947.250 + 103289.362	1 600 237
		Сметная прибыль, (5.00%)				1600236.612 x 5.00%	80 012
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				1600236.612 x 2.000%	32 005
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					1 712 253
		в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699				1712253.174 x 0.9699	1 660 769
		НДС (12%)				1660769.325 x 12%	199 292
		Итого с НДС				1660769.325 + 199292.319	1 860 062

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:10
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:45
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:26
Представители заказчика		
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:25
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 15:26
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 15:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

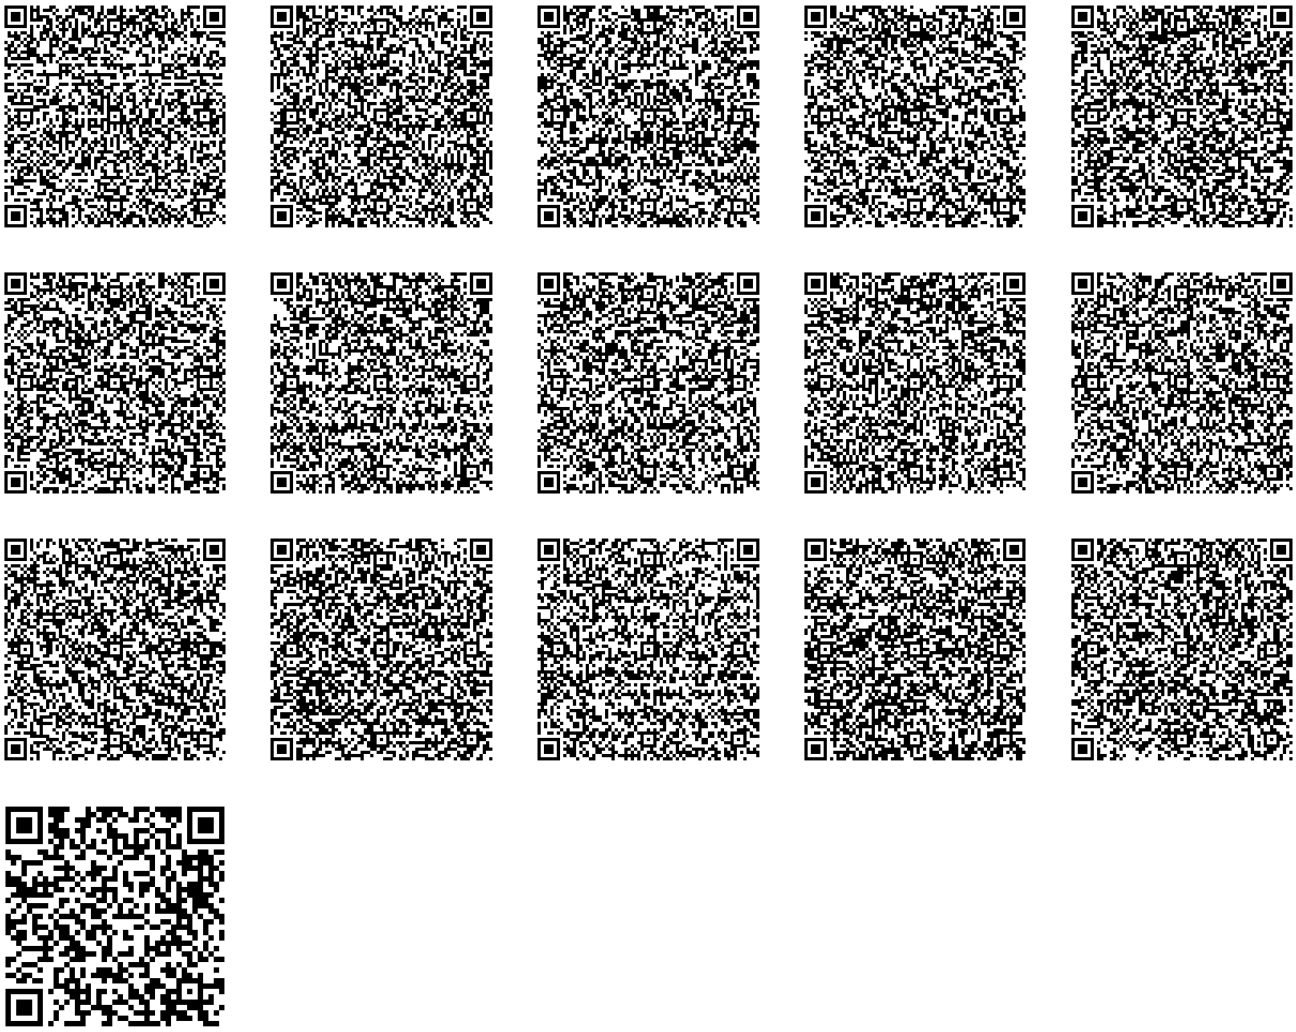

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Котельная. Тепломеханические решения (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №2 от 04.09.2025 г.)				
1	1	513-105-0215РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х850±1700 кВт, размер 9000х4800х2700 мм	комплект	1	26 008 354	26 008 354
			Итого по локальной смете: Котельная. Тепломеханические решения (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №2 от 04.09.2025 г.)				**26 008 354**
			ИТОГО по акту:				**26 008 354**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				0.000 x 6.90%	0
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				26008354.000 + 0.000	26 008 354
		Сметная прибыль, (5.00%)				0.000 x 5.00%	0
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				26008354.000 x 2.000%	520 167
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					26 528 521
		в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699				26528521.080 x 0.9699	25 730 864
		НДС (12%)				25730864.287 x 12%	3 087 704
		Итого с НДС				25730864.287 + 3087703.714	28 818 568

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:31
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:51
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:32
Представители заказчика		
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.09.2025 17:00
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.09.2025 16:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	16.09.2025 16:20

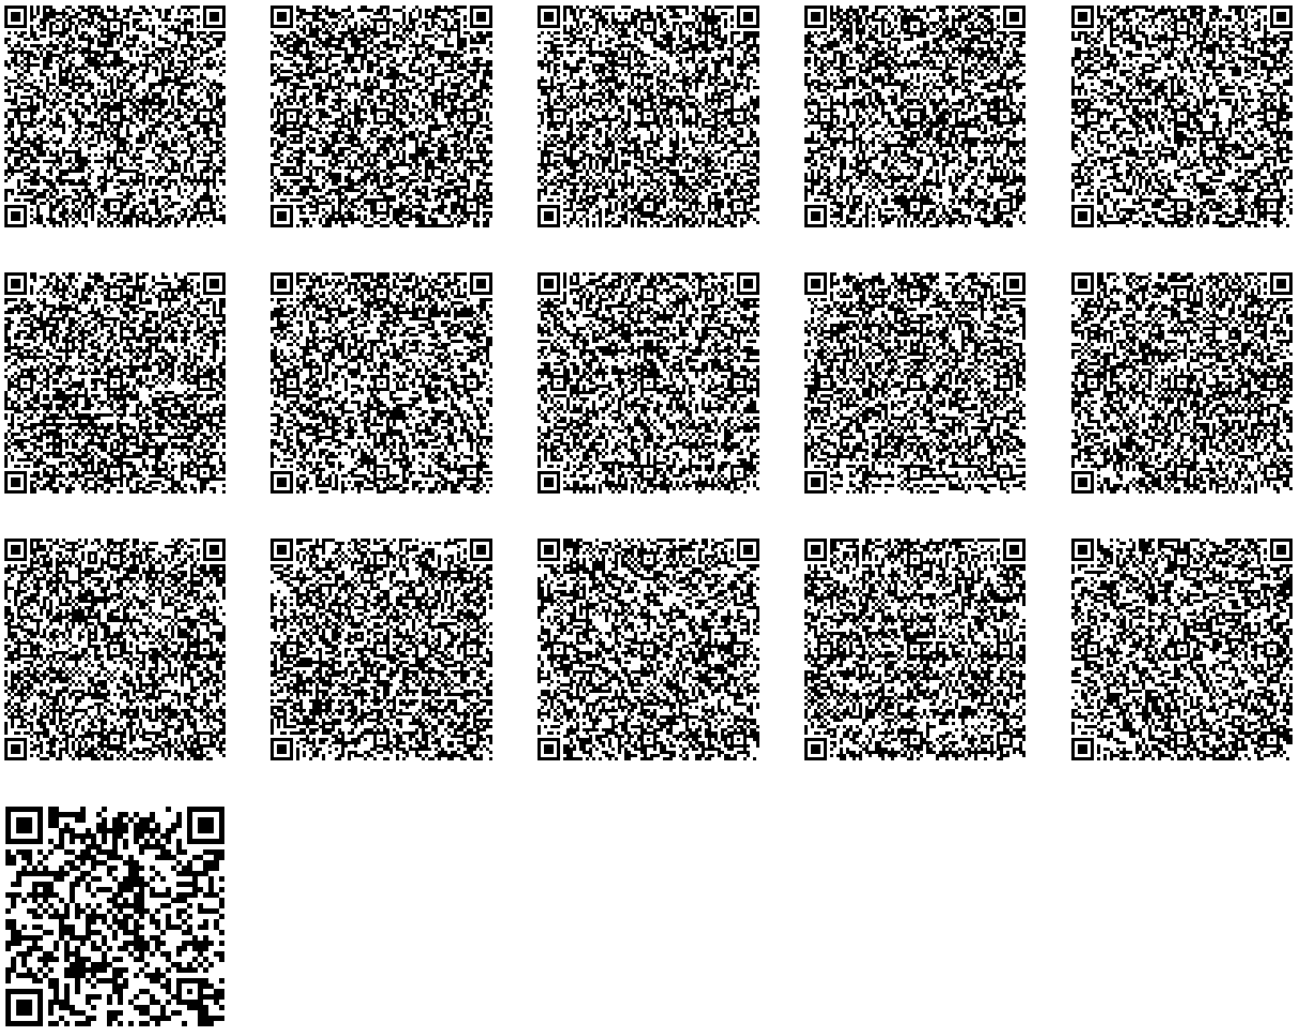

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Котельная. Тепломеханические решения				
1	1	1125-0130-0101РСНБ РК 2022	Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов	7.2	168 729	1 214 849
			Итого по локальной смете: Котельная. Тепломеханические решения				**1 214 849**
			ИТОГО по акту:				**1 214 849**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				1214849.000 x 6.90%	83 825
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1214849.000 + 83824.582	1 298 674
		Сметная прибыль, (5.00%)				1298673.582 x 5.00%	64 934
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				1298673.582 x 2.000%	25 973
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					1 389 581
		в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699				1389580.733 x 0.9699	1 347 799
		НДС (12%)				1347798.965 x 12%	161 736
		Итого с НДС				1347798.965 + 161735.876	1 509 535

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	16.09.2025 09:11
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	16.09.2025 09:25
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	16.09.2025 09:16
Представители заказчика		
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.09.2025 17:01
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.09.2025 16:30 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	16.09.2025 16:20

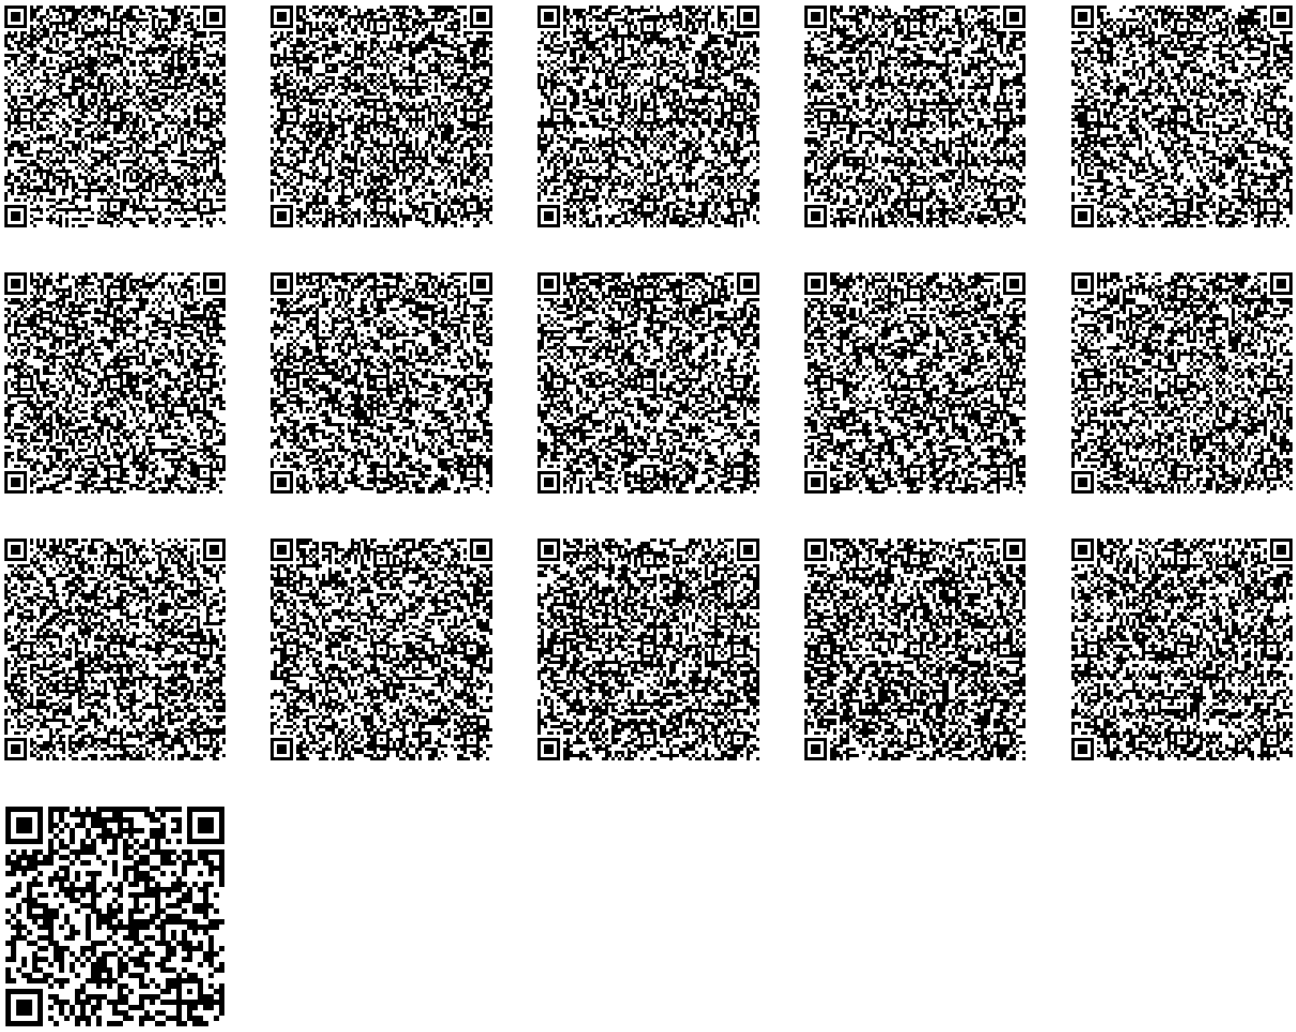

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроснабжение и электроосвещение				
			Раздел: Освещение				
			Подраздел: ЩО1, ЩО7				
1	1	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	11 445	22 890
2	2	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6 287	12 574
3	3	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 103	73 236
4	4	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 829	3 658
5	5	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	10	770	7 700
			Итого по подразделу: ЩО1, ЩО7				**120 058**
			Подраздел: ЩО2, ЩО5				
6	6	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	11 445	22 890
7	7	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6 287	12 574
8	8	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6 103	97 648

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 829	3 658
10	10	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	14	770	10 780
			Итого по подразделу: ЩО2, ЩО5				**147 550**
			Подраздел: ЩО3				
11	11	6401-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	94 945	94 945
12	12	515-301-1409 СпрСЦ 08.2024	Щит управления наружным освещением арт. AS-100-20-5036-3111-I; AWADA PLC (до 6 линий, с однонаправленной связью)	комплект	1	5 933 003	5 933 003
			Итого по подразделу: ЩО3				**6 027 948**
			Подраздел: ЩО4				
13	13	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
14	14	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
15	15	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 103	24 412
16	16	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829	1 829
17	17	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	3	770	2 310
			Итого по подразделу: ЩО4				**48 448**
			Подраздел: ЩО6				
18	18	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
19	19	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
20	20	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 103	54 927
21	21	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829	1 829

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	8	770	6 160
			Итого по подразделу: ЩО6				**80 648**
			Подраздел: ЩО8				
23	23	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
24	24	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
25	25	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 103	42 721
26	26	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829	1 829
27	27	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	6	770	4 620
			Итого по подразделу: ЩО8				**66 902**
			Подраздел: ЩО10				
28	28	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
29	29	247-201-0101 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
30	30	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 103	30 515
31	31	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829	1 829
32	32	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	4	770	3 080
			Итого по подразделу: ЩО10				**55 321**
			Подраздел: ЩОА1				
33	33	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
34	34	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 103	54 927
36	36	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829	1 829
37	37	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	8	770	6 160
			Итого по подразделу: ЩОА1				**82 813**
			Подраздел: ЩОА2				
38	38	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
39	39	247-201-0101 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
40	40	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 103	12 206
41	41	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829	1 829
42	42	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	1	770	770
			Итого по подразделу: ЩОА2				**34 702**
			Подраздел: ЩО9				
43	43	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
44	44	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
45	45	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 103	36 618
46	46	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829	1 829
47	47	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	5	770	3 850
			Итого по подразделу: ЩО9				**62 194**
			Подраздел: Провода и кабели				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	70	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	852	795	677 340
49	71	243-107-2302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	м	38.76	336	13 023
50	72	243-107-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	278.46	469	130 598
51	73	243-107-2702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	120.36	609	73 299
52	80	243-108-2301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	м	99.96	537	53 678
53	81	243-108-2501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	267.24	643	171 835
54	82	243-108-2701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	58.14	810	47 093
55	83	243-108-2901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	6.12	980	5 998
			Итого по подразделу: Провода и кабели				**1 172 866**
			Подраздел: Трубы				
56	84	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	3209	1 367	4 386 703
57	85	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3241.5	78	252 837
			Итого по подразделу: Трубы				**4 639 540**
			Итого по разделу: Освещение				**12 538 990**
			Раздел: Силовое оборудование				
			Подраздел: ЩС1				
58	86	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
59	87	247-201-0204 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 577	13 577
60	88	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6 103	79 339

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	89	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
62	90	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	9	4 911	44 199
63	91	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	3	4 911	14 733
			Итого по подразделу: ЩС1				**165 177**
			Подраздел: ЩС2				
64	92	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
65	93	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
66	94	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 103	48 824
67	95	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
68	96	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	3	4 911	14 733
69	97	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	4	4 911	19 644
			Итого по подразделу: ЩС2				**106 339**
			Подраздел: ЩС3				
70	98	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
71	99	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
72	100	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 103	73 236
73	101	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	102	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	9	4 911	44 199
75	103	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	2	4 911	9 822
			Итого по подразделу: ЩС3				**151 680**
			Подраздел: ЩС(М1)				
76	104	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
77	105	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
78	106	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 103	36 618
79	107	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 941	1 941
80	108	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	4	4 911	19 644
81	109	247-204-0358 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С32 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
			Итого по подразделу: ЩС(М1)				**84 484**
			Подраздел: ЩС(К1)				
82	110	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
83	111	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
84	112	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 103	36 618
85	113	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
86	114	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	5	4 911	24 555
			Итого по подразделу: ЩС(К1)				**84 348**
			Подраздел: ЩС(М2)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	115	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
88	116	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
89	117	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 103	36 618
90	118	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
91	119	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	3	4 911	14 733
92	120	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	2	4 911	9 822
			Итого по подразделу: ЩС(М2)				**84 311**
			Подраздел: ЩС4				
93	121	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
94	122	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
95	123	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 103	42 721
96	124	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
97	125	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	6	4 911	29 466
			Итого по подразделу: ЩС4				**96 494**
			Подраздел: ЩС5				
98	126	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
99	127	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	128	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 103	30 515
101	129	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
102	130	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
103	131	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	3	4 911	14 733
			Итого по подразделу: ЩС5				**74 466**
			Подраздел: ЩС(К2)				
104	132	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
105	133	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
106	134	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 103	48 824
107	135	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
108	136	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	7	4 911	34 377
			Итого по подразделу: ЩС(К2)				**106 376**
			Подраздел: ЩС6				
109	137	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
110	138	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
111	139	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 103	48 824
112	140	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	141	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
114	142	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	5	4 911	24 555
115	143	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
			Итого по подразделу: ЩС6				**107 508**
			Подраздел: ЩС(К3)				
116	144	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
117	145	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
118	146	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 103	30 515
119	147	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
120	148	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
121	149	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	3	4 911	14 733
			Итого по подразделу: ЩС(К3)				**71 824**
			Подраздел: ЩС7				
122	150	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
123	151	247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11 094
124	152	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 103	42 721
125	153	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	154	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	5	4 911	24 555
127	155	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
			Итого по подразделу: ЩС7				**96 494**
			Подраздел: ЩС(Л)				
128	156	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
129	157	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
130	158	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 103	30 515
131	159	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
132	160	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	2	4 911	9 822
133	161	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	2	4 911	9 822
			Итого по подразделу: ЩС(Л)				**71 824**
			Подраздел: ЩС8				
134	162	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
135	163	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
136	164	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6 103	79 339
137	165	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 288	2 288
138	166	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	8	4 911	39 288

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	167	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	3	4 911	14 733
140	168	247-204-0358 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С32 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
			Итого по подразделу: ЩС8				**162 472**
			Подраздел: ЩС9				
141	169	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
142	170	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
143	171	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 103	61 030
144	172	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 941	1 941
145	173	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
146	174	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	6	4 911	29 466
147	175	247-204-0354 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
148	176	247-204-0358 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С32 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
			Итого по подразделу: ЩС9				**129 083**
			Подраздел: ЩС10				
149	177	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
150	178	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
151	179	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 103	61 030

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	180	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
153	181	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	3	4 911	14 733
154	182	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	9	4 911	44 199
			Итого по подразделу: ЩС10				**143 759**
			Подраздел: ЩС1В				
155	183	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
156	184	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	22 776	22 776
157	185	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 103	54 927
158	186	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
159	187	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567	567
160	188	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	1 829	12 803
			Итого по подразделу: ЩС1В				**104 402**
			Подраздел: ЩС2В				
161	189	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
162	190	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	22 776	22 776
163	191	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 103	54 927
164	192	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
165	193	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	1 829	12 803
166	194	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567	567
			Итого по подразделу: ЩС2В				**104 323**
			Подраздел: ЩС3В				
167	195	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
168	196	247-201-0121 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	25 305	25 305
169	197	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 103	91 545
170	198	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
171	199	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	11	1 829	20 119
172	200	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567	567
173	201	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522	1 044
			Итого по подразделу: ЩС3В				**151 793**
			Подраздел: ЩС(К4)				
174	202	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	11 445	22 890
175	203	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9 925	19 850
176	204	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 103	73 236
177	205	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 768	3 536

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
178	206	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	2	4 911	9 822
179	207	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	8	4 911	39 288
			Итого по подразделу: ЩС(К4)				**168 622**
			Подраздел: ЩС11				
180	208	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
181	209	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
182	210	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 103	61 030
183	211	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
184	212	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	6	4 911	29 466
185	213	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	3	4 911	14 733
			Итого по подразделу: ЩС11				**129 026**
			Подраздел: ЩСН				
186	214	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
187	215	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356	13 356
188	216	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 103	30 515
189	217	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
190	218	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567	567

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
191	219	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 829	3 658
192	220	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	1	4 911	4 911
			Итого по подразделу: ЩСН				**66 257**
			Подраздел: ЩС4В				
193	221	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
194	222	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762	16 762
195	223	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 103	42 721
196	224	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 309	2 309
197	225	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 829	3 658
198	226	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 805	3 610
199	227	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
200	228	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
			Итого по подразделу: ЩС4В				**84 157**
			Подраздел: ВРУ1				
201	229	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	55 947	111 894
202	230	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2 577 355	2 577 355
203	231	515-301-0313 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1 635 358	1 635 358
			Итого по подразделу: ВРУ1				**4 324 607**
			Подраздел: ВРУ2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
204	232	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	3	55 947	167 841
205	233	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2 577 355	2 577 355
206	234	515-301-0313 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1 635 358	1 635 358
207	235	515-301-0308 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1 581 141	1 581 141
			Итого по подразделу: ВРУ2				**5 961 695**
			Подраздел: Провода и кабели				
208	236	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	6234	795	4 956 030
209	237	243-107-2602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-1	м	638.52	778	496 769
210	238	243-107-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м	1893.12	1 200	2 271 744
211	239	243-107-2603 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-1	м	333.54	1 213	404 584
212	240	243-107-2604 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-1	м	194.82	1 742	339 376
213	241	243-107-2903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	м	122.4	1 877	229 745
214	242	243-107-2904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	357	2 738	977 466
215	243	243-107-2905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66	м	319.26	4 531	1 446 567
216	244	243-107-2906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66	м	330.48	7 173	2 370 533
217	245	243-107-2907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-0,66	м	214.2	11 357	2 432 669

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
218	246	243-107-2910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x35 (мк)-0,66	м	323.34	16 495	5 333 493
219	247	243-107-3012 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x70 (мк)-1	м	11.22	31 470	353 093
220	248	243-107-3013 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x95 (мк)-1	м	3.06	43 299	132 495
221	249	243-107-3015 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x150 (мк)-1	м	11.22	67 580	758 248
222	250	243-108-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	605.88	922	558 622
223	251	243-108-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	486.54	1 436	698 671
224	252	243-108-2904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6 (ок)-0,66	м	385.56	3 083	1 188 681
225	253	243-108-2905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	106.08	4 935	523 505
226	254	243-108-2907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x25 (ок)-0,66	м	22.44	11 786	264 478
			Итого по подразделу: Провода и кабели				**25 736 768**
			Подраздел: Установочное оборудование				
227	255	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	895	1 164	1 041 780
228	256	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	138	1 436	198 168
229	257	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	1580	1 095	1 730 100
230	258	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	757	613	464 041
231	259	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	6	5 401	32 406

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
232	260	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	6	117 466	704 796
233	261	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 103	30 515
234	262	247-211-1905 СпрСЦ 08.2024	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 400A	шт.	1	1 174 968	1 174 968
235	263	521-101-0401063 СпрСЦ 08.2024	Сетевой фильтр Defender M518, 1,8 м, 5 розеток	шт.	4	3 148	12 592
236	264	6401-0103-1401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж конденсатора статического на установленных конструкциях, масса до15 кг	шт.	3	12 389	37 167
237	265	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Помехоподавляющий конденсатор К73-28-1М2 1мкФ	шт	3	3 488	10 463
238	266	6118-0206-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка герметического	шт.	43	11 397	490 071
239	267	247-216-1403 СпрСЦ 08.2024	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 4 поста (45х45),металл/ пластик, с пластиковой коробкой 126х110,5х76 мм; IP40	шт.	43	29 191	1 255 213
240	268	521-301-0569 СпрСЦ 08.2024	Комплект электроснабжения	шт.	3	187 063	561 189
241	269	6401-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	15	17 535	263 025
242	270	515-301-0207 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5110-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	15	496 846	7 452 690
243	271	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 103	6 103
244	272	247-211-1902 СпрСЦ 08.2024	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 160A	шт.	1	441 456	441 456
			Итого по подразделу: Установочное оборудование				**15 906 743**
			Подраздел: Трубы				
245	273	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	4168	1 367	5 697 656
246	274	6119-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	824	1 614	1 329 936

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
247	275	6119-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	944	1 637	1 545 328
248	276	6119-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	63	1 680	105 840
249	277	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	4209.68	78	328 355
250	278	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	832.24	65	54 096
251	279	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	858.5	99	84 992
252	280	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	94.94	143	13 576
253	281	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	63.63	431	27 425
254	283	6119-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	30	1 891	56 730
255	284	6119-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 50 мм	м	7	2 050	14 350
256	286	241-102-0111 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,5 мм	м	30.6	488	14 933
257	287	241-102-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	7.14	610	4 355
258	288	6125-0104-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж между рядами швеллера перфорированного	м	623	1 576	981 848
259	289	243-907-1129 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм	м	623	7 584	4 724 832
			Итого по подразделу: Трубы				**14 984 252**
			Подраздел: Материалы для системы уравнивания потенциалов				
260	302	247-202-1301 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для силового оборудования А6, полиэтиленовая, наружний размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	17	488	8 296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
261	303	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	410	795	325 950
262	304	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	329.6	242	79 763
263	305	243-142-0115 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	м	92.7	1 553	143 963
264	306	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	370	1 367	505 790
265	307	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	373.7	54	20 180
			Итого по подразделу: Материалы для системы уравнивания потенциалов				**1 083 942**
			Подраздел: Заземление. Молниезащита				
266	308	6401-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8/6 мм	м	1800	1 127	2 028 600
267	309	6401-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	63	10 119	637 497
268	310	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	310	1 417	439 270
269	311	6401-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	370	1 266	468 420
270	312	6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	280	1 470	411 600
271	313	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	133.9	242	32 404
272	314	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0.1545	959 078	148 178
			Итого по подразделу: Заземление. Молниезащита				**4 165 969**
			Итого по разделу: Силовое оборудование				**74 709 195**
			Итого по локальной смете: Электроснабжение и электроосвещение				**87 248 185**
			ИТОГО по акту:				**87 248 185**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				63282143.975 x 6.90%	4 366 468
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				87248184.975 +	91 614 653

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						4366467.995	
		Сметная прибыль, (5.00%)				67648611.970 x 5.00%	3 382 431
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				91614652.970 x 2.000%	1 832 293
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					96 829 377
		в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699				96829376.628 x 0.9699	93 917 921
		НДС (12%)				93917921.075 x 12%	11 270 151
		Итого с НДС				93917921.075 + 11270150.529	105 188 072

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:11
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:47
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:24
Представители заказчика		
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:27
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 17:03
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 17:12 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

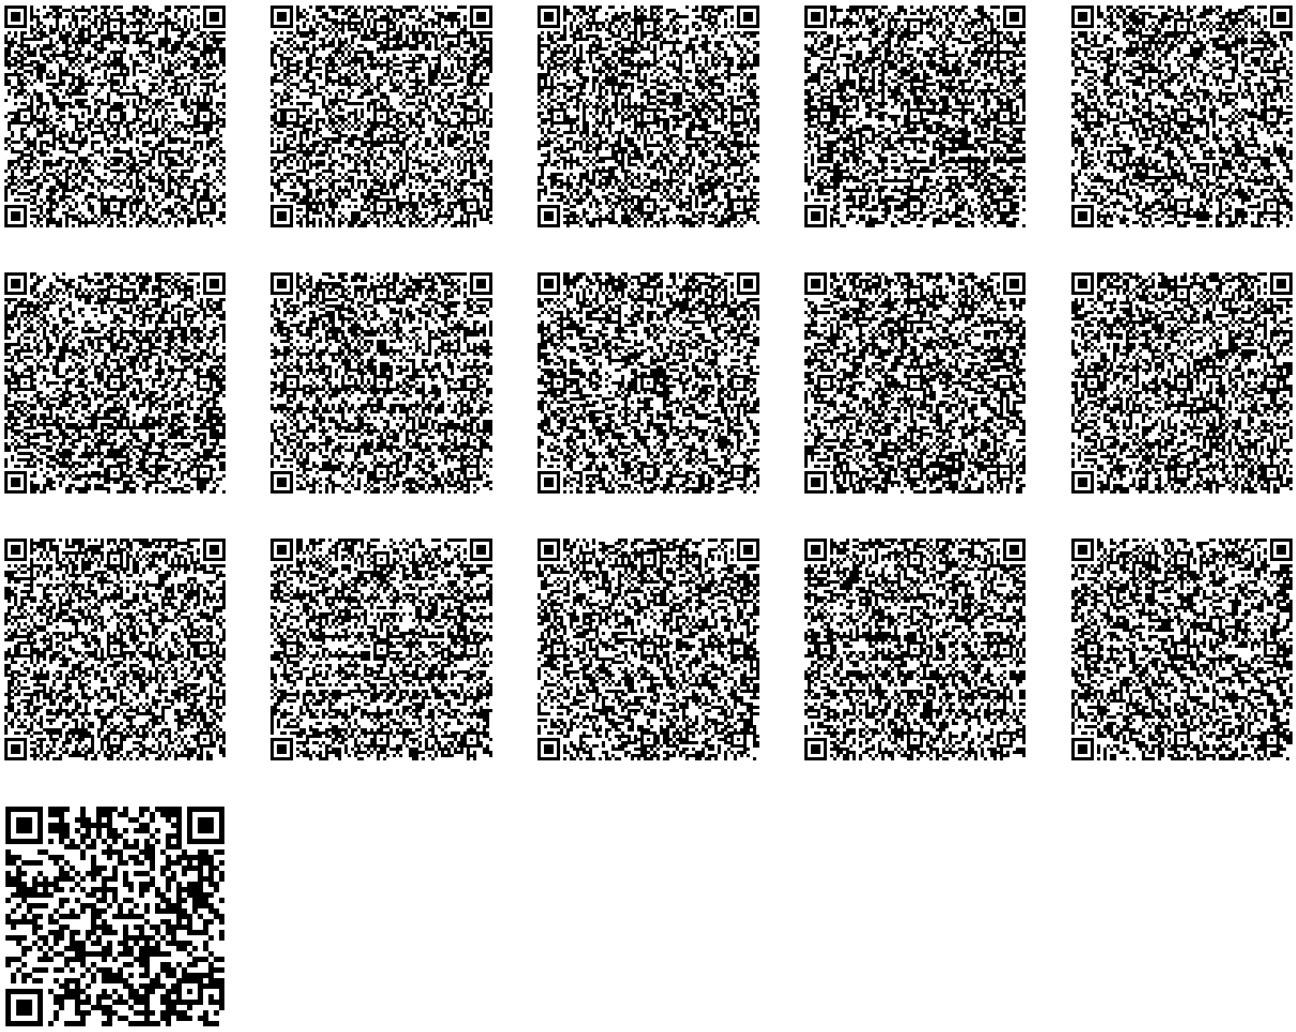

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-планировочные решения (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №2 от 04.09.2025 г.)				
			Раздел: Внутренняя отделка потолков				
			Подраздел: ГКЛО+выравнивание+ВЭ покраска Замена на Армстронг 8мм				
1	1	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	704.51	5 746	4 048 114
2	2	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	704.51	4 122	2 903 990
			Итого по подразделу: ГКЛО+выравнивание+ВЭ покраска Замена на Армстронг 8мм				**6 952 104**
			Подраздел: Выравнивание+акриловая моющаяся покраска				
3	5	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	8.15	5 746	46 830
4	6	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	8.15	4 122	33 594
			Итого по подразделу: Выравнивание+акриловая моющаяся покраска				**80 424**
			Подраздел: ГУЛО+выравнивание+ВЭ покраска Замена на Армстронг 8мм				
5	9	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	687.544	5 746	3 950 628
6	10	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	687.544	4 122	2 834 057
			Итого по подразделу: ГУЛО+выравнивание+ВЭ покраска Замена на Армстронг 8мм				**6 784 685**
			Подраздел: ГКЛО+выравнивание+ВЭ покраска Замена на Армстронг 8мм				
7	11	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	628.99	5 746	3 614 177

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	12	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	628.99	4 122	2 592 697
			Итого по подразделу: ГКЛО+выравнивание+ВЭ покраска Замена на Армстронг 8мм				**6 206 874**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка потолков				**20 024 087**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип IV				
9	13	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	470.44	2 540	1 194 918
10	14	6109-0308-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2	33.6029	3 056	102 690
11	15	233-101-0115СпрСЦ 08.2024	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC	м2	37.6352	4 613	173 611
12	16	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	600.41	5 882	3 531 612
13	17	233-202-0203РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	612.4182	7 520	4 605 385
			Итого по подразделу: Тип IV				**9 608 216**
			Подраздел: Тип V				
14	18	6109-0308-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2	56.4372	3 056	172 472
15	19	233-101-0112СпрСЦ 08.2024	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 4,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot	м2	63.2096	6 314	399 105
			Итого по подразделу: Тип V				**571 577**
			Подраздел: Тип XVII				
16	20	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	84.97	2 540	215 824
			Итого по подразделу: Тип XVII				**215 824**
			Подраздел: Тип IV				
17	21	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1330.41	2 540	3 379 242
18	22	6109-0308-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2	102.255	3 056	312 491
19	23	233-101-0115СпрСЦ 08.2024	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC	м2	114.5256	4 613	528 307
20	24	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	626.88	5 882	3 687 308

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	25	233-202-0203РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	639.4176	7 520	4 808 420
			Итого по подразделу: Тип IV				**12 715 768**
			Подраздел: Тип XIII				
22	28	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	32.56	2 540	82 702
23	29	6109-0308-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2	2.3257	3 056	7 107
24	30	233-101-0115СпрСЦ 08.2024	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC	м2	2.6048	4 613	12 016
25	31	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	20.9	5 882	122 934
26	32	233-202-0203РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	21.318	7 520	160 311
			Итого по подразделу: Тип XIII				**385 070**
			Подраздел: Тип IV				
27	33	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1239.21	2 540	3 147 593
28	34	6109-0308-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2	88.515	3 056	270 502
29	35	233-101-0115СпрСЦ 08.2024	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC	м2	99.1368	4 613	457 318
30	36	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	479.67	5 882	2 821 419
31	37	233-202-0203РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	489.2634	7 520	3 679 261
			Итого по подразделу: Тип IV				**10 376 093**
			Подраздел: Р Плинтуса /Лист-22, прим.4/				
32	38	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	1094	3 478	3 804 932
			Итого по подразделу: Р Плинтуса /Лист-22, прим.4/				**3 804 932**
			Итого по разделу: Полы				**37 677 481**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-планировочные решения (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №2 от 04.09.2025 г.)				**57 701 567**
			ИТОГО по акту:				**57 701 567**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)				57701567.494 x 6.90%	3 981 408
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				57701567.494 +	61 682 976

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						3981408.212	
		Сметная прибыль, (5.00%)				61682975.707 x 5.00%	3 084 149
		Непредвиденные расходы, (2.000%)				61682975.707 x 2.000%	1 233 660
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					66 000 784
		в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699				66000784.006 x 0.9699	64 016 279
		НДС (12%)				64016279.346 x 12%	7 681 954
		Итого с НДС				64016279.346 + 7681953.522	71 698 233

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	16.09.2025 11:12
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	16.09.2025 11:21
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	16.09.2025 11:13
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.09.2025 16:54 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.09.2025 17:05
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	16.09.2025 16:15

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-планировочные решения				
			Раздел: Внутренняя отделка стен				
			Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска				
1	145	6112-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	793.55	4 655	3 693 975
			Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска				**3 693 975**
			Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска				
2	156	6112-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	9	4 655	41 895
			Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска				**41 895**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка стен				**3 735 870**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-планировочные решения				**3 735 870**
			ИТОГО по акту:				**3 735 870**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				3735870.270 x 6.90%	257 775
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				3735870.270 + 257775.052	3 993 645
		Сметная прибыль, (5.00%)				3993645.322 x 5.00%	199 682
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				3993645.322 x 2.000%	79 873
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 273 200
		в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699				4273200.495 x 0.9699	4 144 714
		НДС (12%)				4144714.350 x 12%	497 366
		Итого с НДС				4144714.350 + 497365.722	4 642 080

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:11
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:47
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:23
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 15:51
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 16:32 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:28

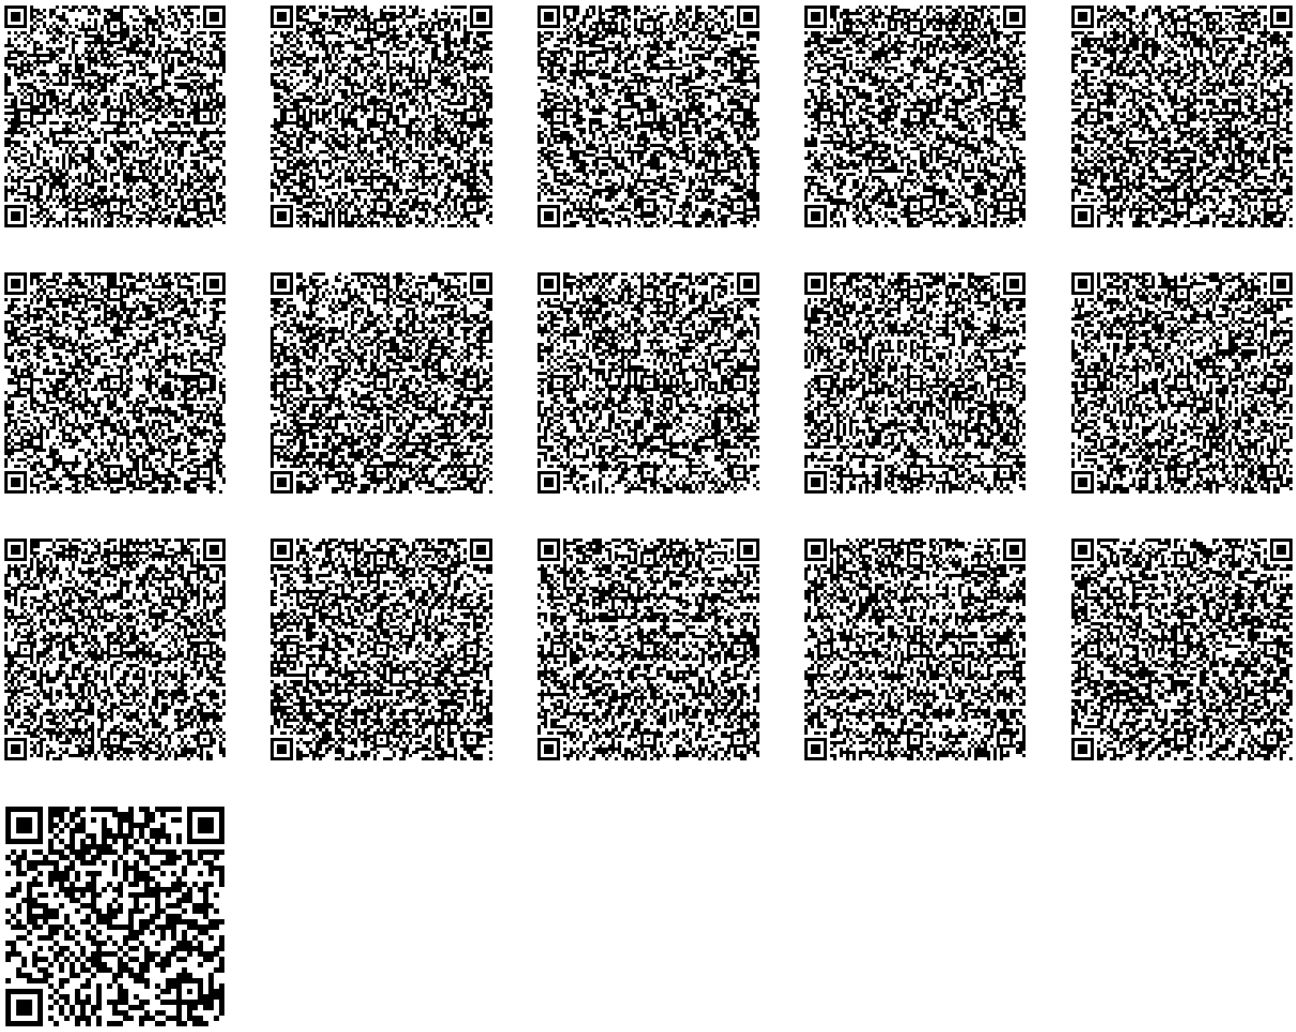

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-планировочные решения				
			Раздел: Двери /Лист-12/				
			Подраздел: Д-1, Д-1л, Д-2, Д-2л, Д-3, Д-3л, Д-4, Д-4л, Д-5, Д-5л, Д-6, Д-6л, Д-7.1л, Д-7л, Д-8, Д-8л				
1	1	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	61.32	8 162	500 494
2	2	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	35.49	12 734	451 930
3	3	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	24.15	12 298	296 997
			Итого по подразделу: Д-1, Д-1л, Д-2, Д-2л, Д-3, Д-3л, Д-4, Д-4л, Д-5, Д-5л, Д-6, Д-6л, Д-7.1л, Д-7л, Д-8, Д-8л				**1 249 420**
			Подраздел: Д-9				
4	4	6108-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	6.3	6 866	43 256
5	5	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	6.3	12 734	80 224
			Итого по подразделу: Д-9				**123 480**
			Подраздел: Д-14				
6	6	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	4.86	8 162	39 667
7	7	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	4.86	12 298	59 768

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Д-14				**99 435**
			Подраздел: Д-16				
8	8	6108-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	8.8	6 866	60 421
9	9	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	1	9 829	9 829
			Итого по подразделу: Д-16				**70 250**
			Подраздел: Д-17л				
10	10	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	13.65	8 162	111 411
11	11	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	13.65	12 734	173 819
			Итого по подразделу: Д-17л				**285 230**
			Подраздел: Д-18, Д-18л				
12	12	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	7.56	8 162	61 705
13	13	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7.56	12 298	92 973
14	14	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	4	10 658	42 632
			Итого по подразделу: Д-18, Д-18л				**197 310**
			Итого по разделу: Двери /Лист-12/				**2 025 125**
			Раздел: Окна /Лист-13/				
			Подраздел: Откосы и отливы				
15	62	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	539	3 216	1 733 424
			Итого по подразделу: Откосы и отливы				**1 733 424**
			Итого по разделу: Окна /Лист-13/				**1 733 424**
			Раздел: Витражи				
			Подраздел: Р Витражи наружние /Лист-15/				
16	72	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	156.8756	3 556	557 850

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	73	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	10.509	3 234	33 986
18	74	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	146.3666	130 306	19 072 446
19	75	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	10.509	146 170	1 536 101
20	77	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	3	5 438	16 314
21	78	223-502-0102 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	3	4 701	14 103
22	80	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	6	2 259	13 554
			Итого по подразделу: Р Витражи наружние /Лист-15/				**21 244 354**
			Итого по разделу: Витражи				**21 244 354**
			Раздел: Внутренняя отделка потолков				
			Подраздел: Выравнивание+ВЭ покраска				
23	90	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	1019.15	2 396	2 441 884
			Итого по подразделу: Выравнивание+ВЭ покраска				**2 441 884**
			Подраздел: ГКЛО+выравнивание+ВЭ покраска				
24	92	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	1027.62	7 668	7 879 790
25	93	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	1027.62	2 255	2 317 283
			Итого по подразделу: ГКЛО+выравнивание+ВЭ покраска				**10 197 073**
			Подраздел: ГКЛО+выравнивание+акриловая моющаяся покраска				
26	95	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	74.97	7 668	574 870
27	96	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	74.97	2 255	169 057
			Итого по подразделу: ГКЛО+выравнивание+акриловая моющаяся покраска				**743 927**
			Подраздел: Выравнивание+акриловая моющаяся покраска				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	98	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	334.76	2 255	754 884
			Итого по подразделу: Выравнивание+акриловая моющаяся покраска				**754 884**
			Подраздел: Армстронг 12мм				
29	100	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	101.74	5 220	531 083
30	101	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	106.827	5 491	586 587
			Итого по подразделу: Армстронг 12мм				**1 117 670**
			Подраздел: Выравнивание+ВЭ покраска				
31	102	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	1134.3	2 396	2 717 783
			Итого по подразделу: Выравнивание+ВЭ покраска				**2 717 783**
			Подраздел: ГУЛО+выравнивание+ВЭ покраска				
32	104	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	992.89	7 668	7 613 481
33	105	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	992.89	2 255	2 238 967
			Итого по подразделу: ГУЛО+выравнивание+ВЭ покраска				**9 852 448**
			Подраздел: Выравнивание+акриловая моющаяся покраска				
34	107	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	119.71	2 255	269 946
			Итого по подразделу: Выравнивание+акриловая моющаяся покраска				**269 946**
			Подраздел: Армстронг 12 мм				
35	109	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	33.9	5 220	176 958
36	110	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	35.595	5 491	195 452
			Итого по подразделу: Армстронг 12 мм				**372 410**
			Подраздел: Армстронг 15 мм				
37	111	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	159.01	5 220	830 032

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	112	232-401-0103 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	166.9605	8 531	1 424 340
			Итого по подразделу: Армстронг 15 мм				**2 254 372**
			Подраздел: Выравнивание+ВЭ покраска				
39	113	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	1097.4	2 396	2 629 370
			Итого по подразделу: Выравнивание+ВЭ покраска				**2 629 370**
			Подраздел: ГКЛО+выравнивание+ВЭ покраска				
40	115	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	629.07	7 668	4 823 709
41	116	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	629.07	2 255	1 418 553
			Итого по подразделу: ГКЛО+выравнивание+ВЭ покраска				**6 242 262**
			Подраздел: Выравнивание+акриловая моющаяся покраска				
42	118	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	88.29	2 255	199 094
			Итого по подразделу: Выравнивание+акриловая моющаяся покраска				**199 094**
			Подраздел: Армстронг 12 мм				
43	120	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	94.17	5 220	491 567
44	121	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	98.8785	5 491	542 942
			Итого по подразделу: Армстронг 12 мм				**1 034 509**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка потолков				**40 827 631**
			Раздел: Внутренняя отделка стен				
			Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска				
45	145	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	380.15	4 655	1 769 598
			Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска				**1 769 598**
			Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска				
46	148	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	356.7	4 655	1 660 438

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	149	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	356.7	1 910	681 297
			Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска				**2 341 735**
			Подраздел: Простая штукатурка+керамич.плитка				
48	151	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	119.512	3 887	464 543
49	152	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	742.53	10 487	7 786 912
			Итого по подразделу: Простая штукатурка+керамич.плитка				**8 251 455**
			Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска				
50	153	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	874.1	4 655	4 068 936
51	154	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	874.1	1 910	1 669 531
			Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска				**5 738 467**
			Подраздел: Простая штукатурка+керамич.плитка				
52	160	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	301.66	10 487	3 163 508
			Итого по подразделу: Простая штукатурка+керамич.плитка				**3 163 508**
			Подраздел: Простая штукатурка+керамич.плитка				
53	168	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	410.14	10 487	4 301 138
			Итого по подразделу: Простая штукатурка+керамич.плитка				**4 301 138**
			Подраздел: Р Облицовка керамической плиткой в местах установки умывальников и фонтанчиков /Лист-17, прим.3/				
54	169	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	114.36	10 487	1 199 293
			Итого по подразделу: Р Облицовка керамической плиткой в местах установки умывальников и фонтанчиков /Лист-17, прим.3/				**1 199 293**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка стен				**26 765 195**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип I				
55	203	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	36.43	327	11 912

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	204	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	36.43	1 341	48 852
57	205	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.125687	64 613	72 734
58	208	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	60.23	5 882	354 273
59	209	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	61.4346	7 520	461 988
60	210	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	51.73	1 986	102 736
61	211	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	51.73	5 882	304 276
62	212	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	52.7646	7 520	396 790
			Итого по подразделу: Тип I				**1 753 562**
			Подраздел: Тип II				
63	216	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	346.28	5 616	1 944 708
64	217	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	346.28	3 367	1 165 925
65	218	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	346.28	1 986	687 712
66	219	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 30 мм	м2	346.28	320	110 810
67	220	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	312.38	6 899	2 155 109
68	221	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	318.6276	3 066	976 912
			Итого по подразделу: Тип II				**7 041 176**
			Подраздел: Тип III				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	225	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	77.03	1 986	152 982
70	226	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 30 мм	м2	77.03	320	24 650
71	227	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	205.26	5 882	1 207 339
72	228	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	209.3652	7 520	1 574 426
			Итого по подразделу: Тип III				**2 959 397**
			Подраздел: Тип VII				
73	256	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	77.02	5 882	453 032
74	257	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	78.5604	7 520	590 774
			Итого по подразделу: Тип VII				**1 043 806**
			Подраздел: Тип XVI				
75	268	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	181.1	6 899	1 249 409
76	269	232-202-0101 РСНБ РК 2022	Мозаика из натурального камня на сеточной основе	м2	184.722	14 707	2 716 706
			Итого по подразделу: Тип XVI				**3 966 115**
			Подраздел: Тип I				
77	277	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	27.57	327	9 015
78	278	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	27.57	1 341	36 971
79	279	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0.851913	64 613	55 045
80	282	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	27.57	5 882	162 167
81	283	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	28.1214	7 520	211 473

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	284	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	77.65	1 986	154 213
83	285	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	39.48	5 882	232 221
84	286	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	40.2696	7 520	302 827
			Итого по подразделу: Тип I				**1 163 933**
			Подраздел: Тип II				
85	290	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	127.31	5 616	714 973
86	291	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	127.31	3 367	428 653
87	292	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	11.93	1 986	23 693
88	293	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 30 мм	м2	11.93	320	3 818
89	294	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	127.31	6 899	878 312
90	295	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	129.8562	3 066	398 139
			Итого по подразделу: Тип II				**2 447 588**
			Подраздел: Тип IV				
91	299	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	300.7	1 986	597 190
92	300	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 44 мм	м2	300.7	768	230 938
			Итого по подразделу: Тип IV				**828 128**
			Подраздел: Тип XV				
93	310	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	98.48	1 986	195 582
94	311	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40 мм	м2	98.48	639	62 929

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип XV				**258 510**
			Подраздел: Тип II				
95	319	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	92.25	1 986	183 208
96	320	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 30 мм	м2	92.25	320	29 520
97	321	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	92.25	6 899	636 433
98	322	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	94.095	3 066	288 495
			Итого по подразделу: Тип II				**1 137 656**
			Подраздел: Тип III				
99	323	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	37.72	327	12 334
100	324	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	37.72	1 341	50 583
101	325	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.165548	64 613	75 309
102	326	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	44.16	1 986	87 702
103	327	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 30 мм	м2	44.16	320	14 131
104	328	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	44.16	5 882	259 749
105	329	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	45.0432	7 520	338 725
			Итого по подразделу: Тип III				**838 533**
			Подраздел: Тип IV				
106	333	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	1718.88	1 986	3 413 696
107	334	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 44 мм	м2	1718.88	768	1 320 100

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип IV				**4 733 796**
			Итого по разделу: Полы				**28 172 200**
			Раздел: Фасад /Лист-33/				
			Подраздел: Р Декоративные элементы /Лист-36.1/				
108	392	6112-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, угловой элемент	м	17.9	1 305	23 359
109	393	231-307-0116 СпрСЦ 08.2024	Полоса декоративная межэтажная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм	м2	8.95	4 897	43 828
110	394	6112-0302-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом, клеевая набивка фриза по трафарету	м2	8.95	13 071	116 985
			Итого по подразделу: Р Декоративные элементы /Лист-36.1/				**184 173**
			Итого по разделу: Фасад /Лист-33/				**184 173**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-планировочные решения				**120 952 103**
			ИТОГО по акту:				**120 952 103**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)	120952103.108 x 6.90%	8 345 695
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	120952103.108 + 8345695.230	129 297 798
	Сметная прибыль, (5.00%)	129297798.338 x 5.00%	6 464 890
	Непредвиденные расходы, (2.000%)	129297798.338 x 2.000%	2 585 956
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		138 348 644
	в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699	138348644.222 x 0.9699	134 188 792
	НДС (12%)	134188791.680 x 12%	16 102 655
	Итого с НДС	134188791.680 + 16102655.002	150 291 447

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	05.09.2025 17:16
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	05.09.2025 18:23
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	05.09.2025 17:17
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	08.09.2025 09:32 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	08.09.2025 09:33
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	08.09.2025 09:03

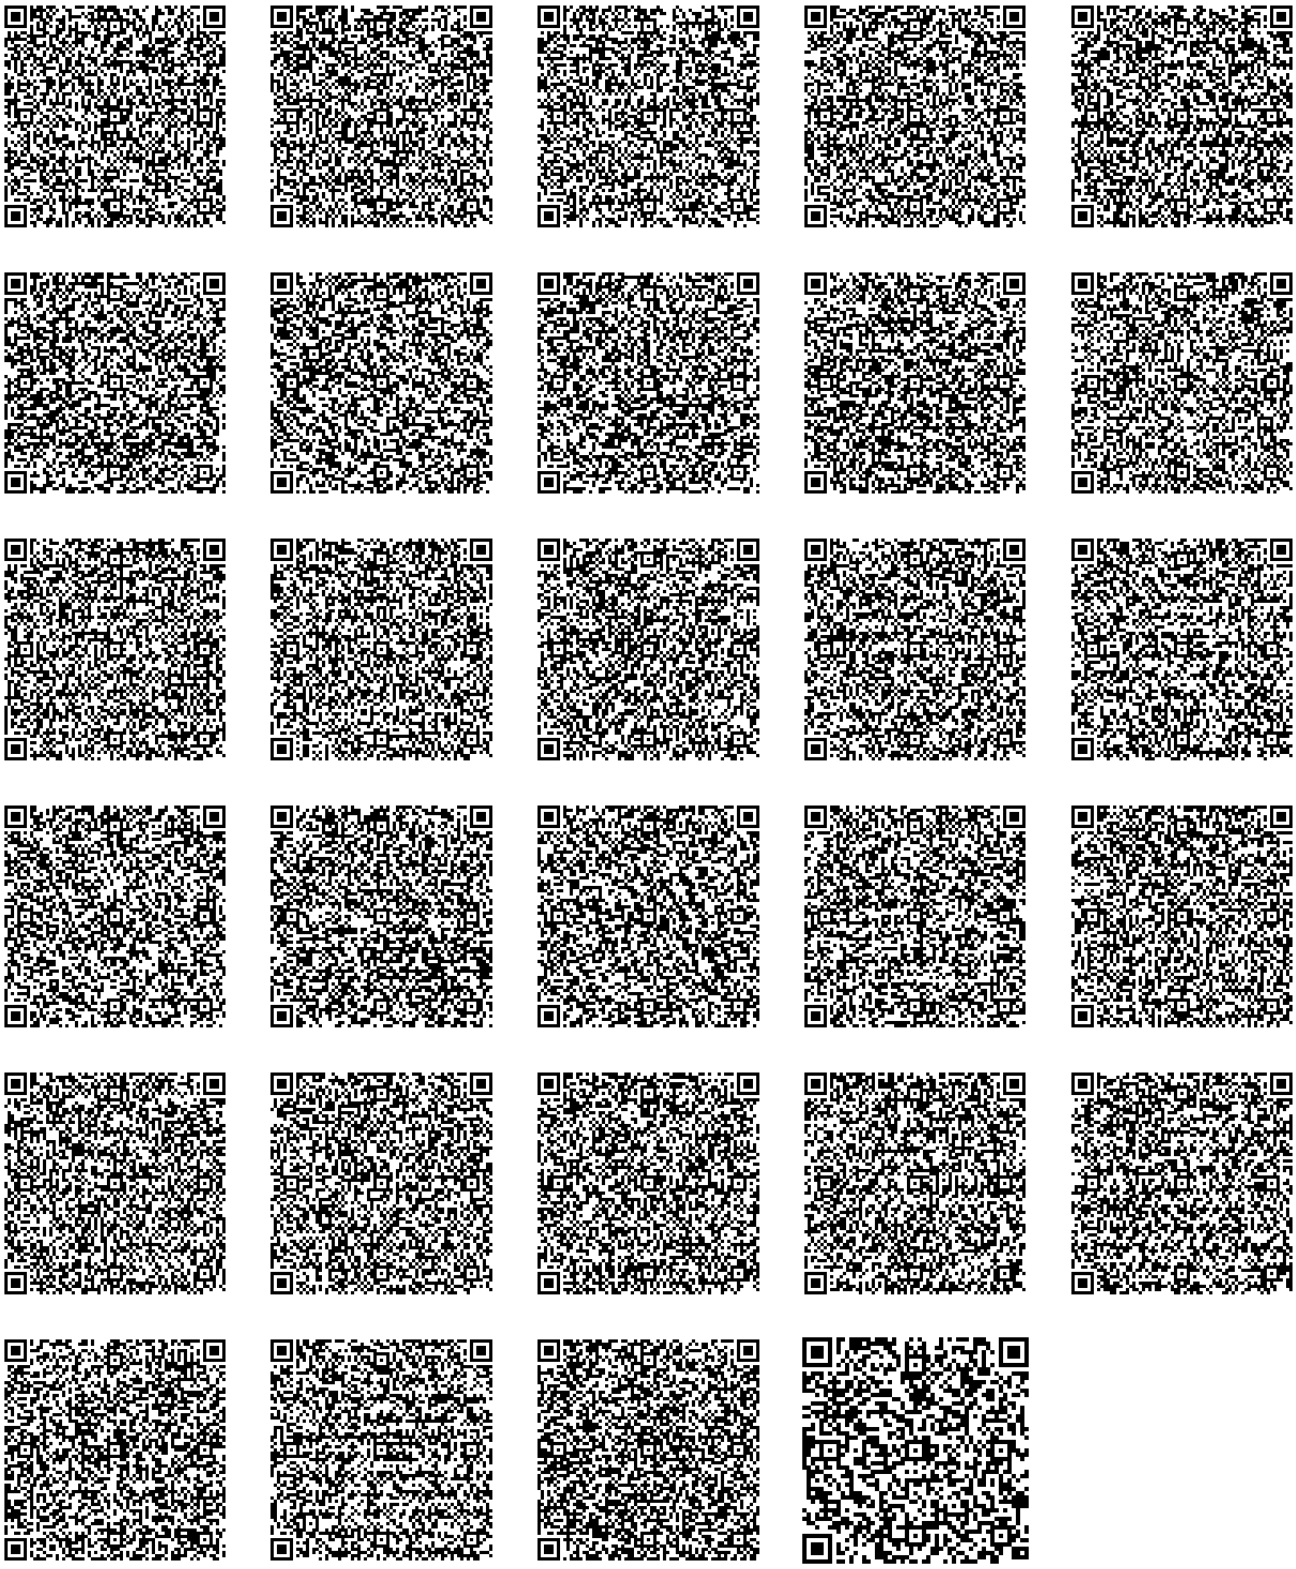

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-строительные чертежи				
			Раздел: Перемычки /Лист-25/				
1	99	6104-0301-0110ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	151	1 600	241 600
2	100	6104-0301-0111ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	3	7 379	22 137
3	101	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.996	123 926	123 430
4	102	222-102-0103РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.882	98 750	87 097
5	103	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.257	122 899	31 585
6	105	222-102-0105РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2.8	99 188	277 726
7	107	222-102-0107РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5.362	102 486	549 530
8	108	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	4.29564	107 271	460 798
9	109	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4.29564	373 849	1 605 921
10	110	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 за 2 раза	м2	124.57356	501	62 411
11	111	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	124.57356	389	48 459
			Итого по разделу: Перемычки /Лист-25/				**3 510 695**
			Раздел: Лестницы				
			Подраздел: Р Лестница в осях 1-3, 18-16 /Лист-146/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	1261	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	826.843302	389	321 642
13	1262	6107-0204-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 2 слоя	м2	270	9 043	2 441 610
			Итого по подразделу: Р Лестница в осях 1-3, 18-16 /Лист-146/				**2 763 252**
			Подраздел: Р Лестница в осях 6-7 /Лист-147/				
14	1265	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	238.7744	389	92 883
15	1266	6107-0204-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 2 слоя	м2	26	9 043	235 118
			Итого по подразделу: Р Лестница в осях 6-7 /Лист-147/				**328 001**
			Подраздел: Р Лестница в осях 12-13 /Лист-148/				
16	1269	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	283.285224	389	110 198
17	1270	6107-0204-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 2 слоя	м2	33	9 043	298 419
			Итого по подразделу: Р Лестница в осях 12-13 /Лист-148/				**408 617**
			Итого по разделу: Лестницы				**3 499 870**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-строительные чертежи				**7 010 565**
			ИТОГО по акту:				**7 010 565**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	7010564.968 x 6.90%	483 729
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	7010564.968 + 483728.990	7 494 294
	Сметная прибыль, (5.00%)	7494293.958 x 5.00%	374 715
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	7494293.958 x 2.000%	149 886
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		8 018 895
	в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699	8018894.535 x 0.9699	7 777 783
	НДС (12%)	7777783.254 x 12%	933 334
	Итого с НДС	7777783.254 + 933333.991	8 711 117

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	16.09.2025 09:08
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	16.09.2025 09:26
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	16.09.2025 09:17
Представители заказчика		
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.09.2025 17:02
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	16.09.2025 16:10
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.09.2025 16:34 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

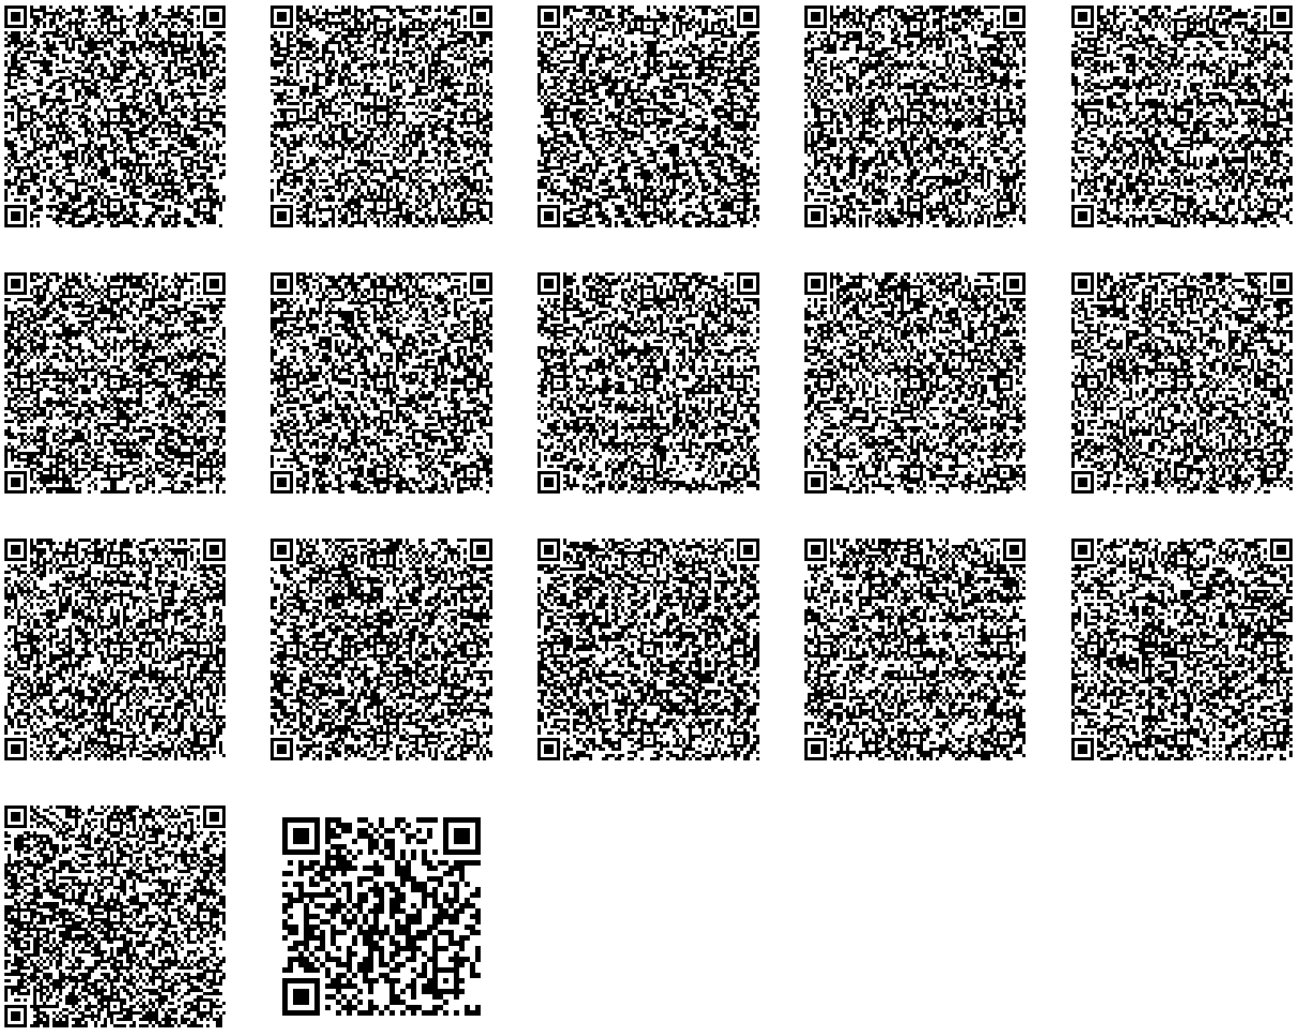

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-строительные чертежи				
			Раздел: Стены и перегородки /Листы - 6-7/				
			Подраздел: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				
1	6	6105-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	174.9999997	9 702	1 697 850
2	7	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8.82447999	77 102	680 385
3	8	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.18798886	300 662	56 521
4	9	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.18798886	85 269	16 030
5	10	6105-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	122.5	9 702	1 188 495
6	11	213-102-0201РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	6.173392	53 522	330 412
7	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.17318699	300 662	52 071
8	13	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.17318699	85 269	14 767
			Итого по подразделу: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				**4 036 531**
			Подраздел: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				
9	14	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней	м3	38.396	38 800	1 489 765
10	15	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	14.6016	55 564	811 323
11	16	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.46170599	292 085	134 857

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	17	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.46170599	300 662	138 817
13	18	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.46170599	85 269	39 369
			Итого по подразделу: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				**2 614 132**
			Подраздел: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				
14	19	6105-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	123.85	40 214	4 980 504
15	20	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	37.33115472	55 564	2 074 268
16	21	213-102-0306РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	3.30116104	78 700	259 801
17	22	213-101-0403РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6.44128144	106 147	683 723
18	23	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1.34407563	292 085	392 584
19	24	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.34407563	300 662	404 112
20	25	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1.34407563	85 269	114 608
21	26	1126-0201-0108РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	298.61545254	3 505	1 046 647
22	27	234-101-0110РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	30.46164026	44 521	1 356 183
			Итого по подразделу: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				**11 312 431**
			Подраздел: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				
23	29	6105-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	129.65	9 702	1 257 864
24	30	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6.5254	77 102	503 121
25	31	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.163133	300 662	49 048
26	32	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.163133	85 269	13 910
27	33	6105-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	71.6466667	9 702	695 116
28	34	213-102-0201РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	3.6182	53 522	193 653
29	35	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.084292	300 662	25 343
30	36	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.084292	85 269	7 188
			Итого по подразделу: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				**2 745 244**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				
31	37	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней	м3	30.62	38 800	1 188 056
32	38	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	9.3542	55 564	519 757
33	39	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.6191257	292 085	180 837
34	40	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6191257	300 662	186 148
35	41	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.6191257	85 269	52 792
			Итого по подразделу: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				**2 127 590**
			Подраздел: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				
36	42	6105-0201-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	230	40 214	9 249 220
37	43	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	69.92718213	55 564	3 885 434
38	44	213-102-0306РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	7.6322128	78 700	600 655
39	45	213-101-0403РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	9.85930507	106 147	1 046 536
40	46	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.36232304	292 085	105 829
41	47	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.36232304	300 662	108 937
42	48	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.36232304	85 269	30 895
43	49	1126-0201-0108РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	96.54903796	3 505	338 404
44	50	234-101-0110РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	56.96200187	44 521	2 536 005
			Итого по подразделу: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				**17 901 916**
			Подраздел: Парапет t=380 мм на растворе марки М100				
45	74	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней	м3	111.8	38 800	4 337 840
46	75	213-101-0403РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	40.323602	106 147	4 280 230
47	76	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	0.207581	55 564	11 534
48	77	213-102-0306РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	1.952848	78 700	153 689
49	78	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1.464132	292 085	427 651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	79	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.464132	300 662	440 209
51	80	6103-0703-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1.464132	85 269	124 845
			Итого по подразделу: Парапет t=380 мм на растворе марки М100				**9 775 998**
			Итого по разделу: Стены и перегородки /Листы - 6-7/				**50 513 842**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-строительные чертежи				**50 513 842**
			ИТОГО по акту:				**50 513 842**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)				50513842.011 x 6.90%	3 485 455
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				50513842.011 + 3485455.147	53 999 297
		Сметная прибыль, (5.00%)				53999297.158 x 5.00%	2 699 965
		Непредвиденные расходы, (2.000%)				53999297.158 x 2.000%	1 079 986
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					57 779 248
		в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699				57779247.959 x 0.9699	56 041 948
		НДС (12%)				56041947.584 x 12%	6 725 034
		Итого с НДС				56041947.584 + 6725033.710	62 766 981

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	02.09.2025 09:52
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	02.09.2025 11:02
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	02.09.2025 10:02
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	03.09.2025 10:39
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	03.09.2025 16:54 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	03.09.2025 17:04

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутреннее газоснабжение				
1	1	6114-0102-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	3	6 467	19 401
2	2	6114-0102-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	5	6 466	32 330
3	3	6114-0102-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	0.7	4 795	3 357
4	4	6114-0102-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	5	4 321	21 605
5	5	6114-0102-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	5	3 681	18 405
6	6	241-102-0220РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	3	6 748	20 244
7	7	241-102-0177РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	3 617	18 085
8	8	241-102-0161РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0.7	2 679	1 875
9	9	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1 453	7 265
10	10	241-102-0104РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	5	367	1 835
11	11	241-112-0124РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	521	521
12	12	241-117-0424РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	2	2 791	5 582

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	242-209-0102РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	104 720	1 675 520
14	14	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.5	193	97
15	15	6114-0102-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	5.7	3 681	20 982
16	16	241-102-0104РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	5	367	1 835
17	17	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0.7	1 453	1 017
18	18	241-112-0108РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	5	155	775
19	19	242-209-0102РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	104 720	1 675 520
20	20	261-301-0219РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708	3 540
21	21	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.5	193	97
			Итого по локальной смете: Внутреннее газоснабжение				**3 529 888**
			ИТОГО по акту:				**3 529 888**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	3529888.000 x 6.90%	243 562
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	3529888.000 + 243562.275	3 773 450
	Сметная прибыль, (5.00%)	3773450.275 x 5.00%	188 673
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	3773450.275 x 2.000%	75 469
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		4 037 592
	в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 1.0301	4037591.795 x 1.0301	4 158 994
	НДС (12%)	4158993.682 x 12%	499 079
	Итого с НДС	4158993.682 + 499079.242	4 658 073

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:09
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:41
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:28
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 15:27 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:19
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 14:34

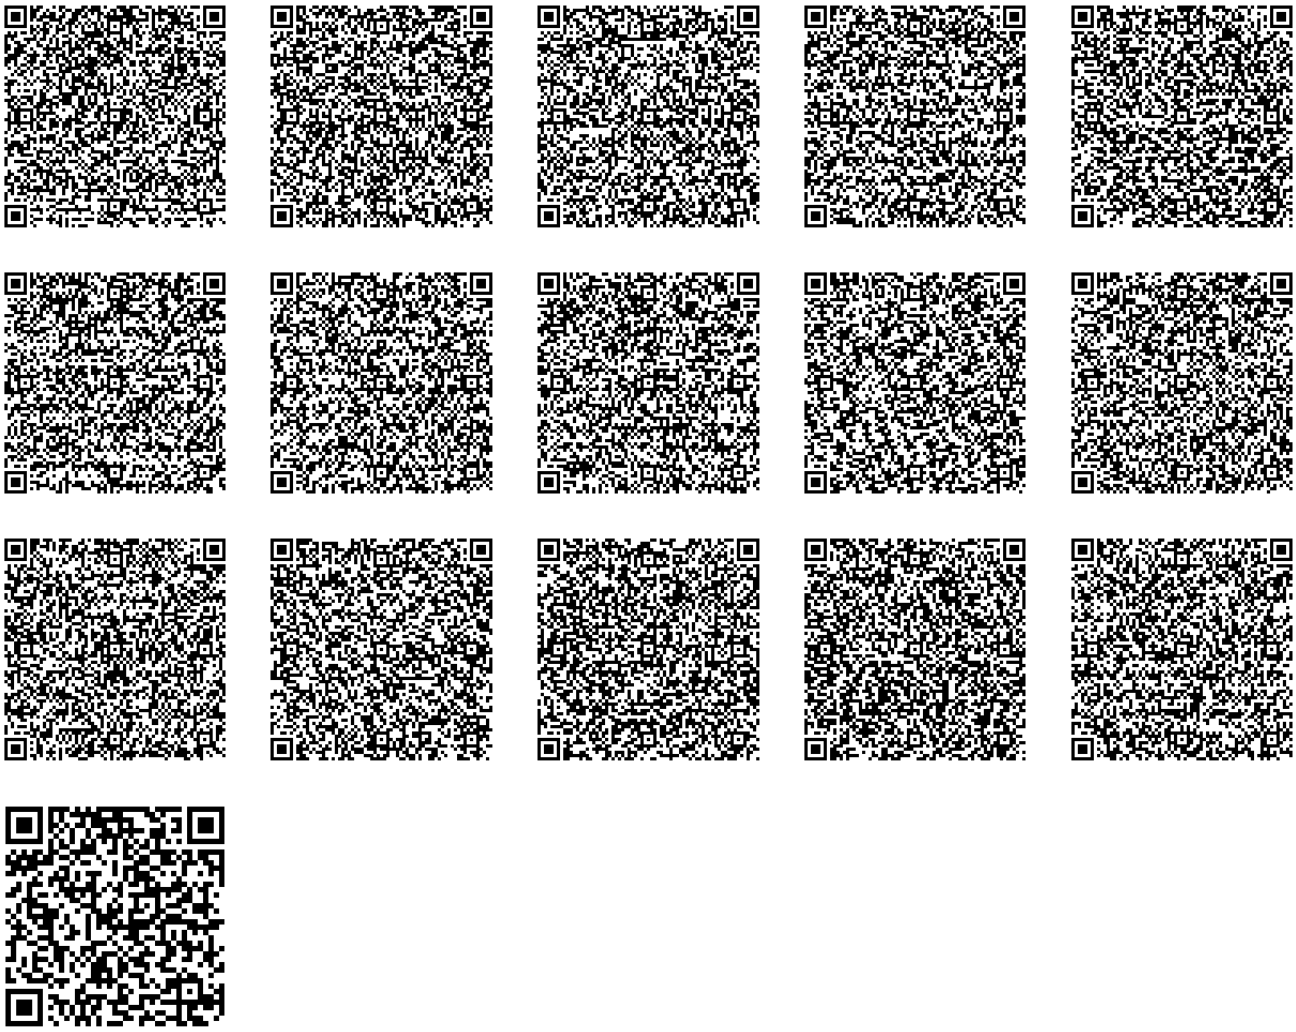

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Видеонаблюдение				
1	1	6401-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 816	15 816
2	2	248-102-1203СпрСЦ 08.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 24U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	182 866	182 866
3	3	6125-0408-0623 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства видиоконтрольного	шт.	2	12 160	24 320
4	4	248-403-0132СпрСЦ 08.2024	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR516-64-C, 64-х канальный, поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb	шт.	2	1 387 900	2 775 800
5	5	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	3	4 384	13 152
6	6	248-404-0446СпрСЦ 08.2024	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PMS552F, сетевой управляемый гигабитный Poe коммутатор с 48 портами Poe x 1000 Мбит + 4 Uplink SFPx1280 Мбит/с	шт.	3	391 009	1 173 027
7	18	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг/маршрутизатор/	шт.	1	4 384	4 384
8	19	Т пункт перечня ЕСЦ РСНБ РК 2024	Маршрутизатор Mikrotik RB4011iGS+RM	шт.	1	98 447	98 447
9	20	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 384	4 384
10	21	248-102-2902СпрСЦ 08.2024	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290	102 290
11	22	248-102-3501СпрСЦ 08.2024	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3 х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	32 248	32 248

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	24	243-902-1803СпрСЦ 08.2024	Разъем кабельный типа Hyperline, RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, экранированный, для одножильного и многожильного кабеля (в комплекте 100 шт.)	шт.	2	46 417	92 834
			Итого по локальной смете: Видеонаблюдение				**4 519 568**
			ИТОГО по акту:				**4 519 568**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				4421121.000 x 6.90%	305 057
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4519568.000 + 305057.353	4 824 625
		Сметная прибыль, (5.00%)				4726178.353 x 5.00%	236 309
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				4824625.353 x 2.000%	96 493
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					5 157 427
		в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699				5157426.778 x 0.9699	5 002 354
		НДС (12%)				5002353.810 x 12%	600 282
		Итого с НДС				5002353.810 + 600282.457	5 602 636

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:10
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:43
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:27
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 15:35 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:22
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 15:25

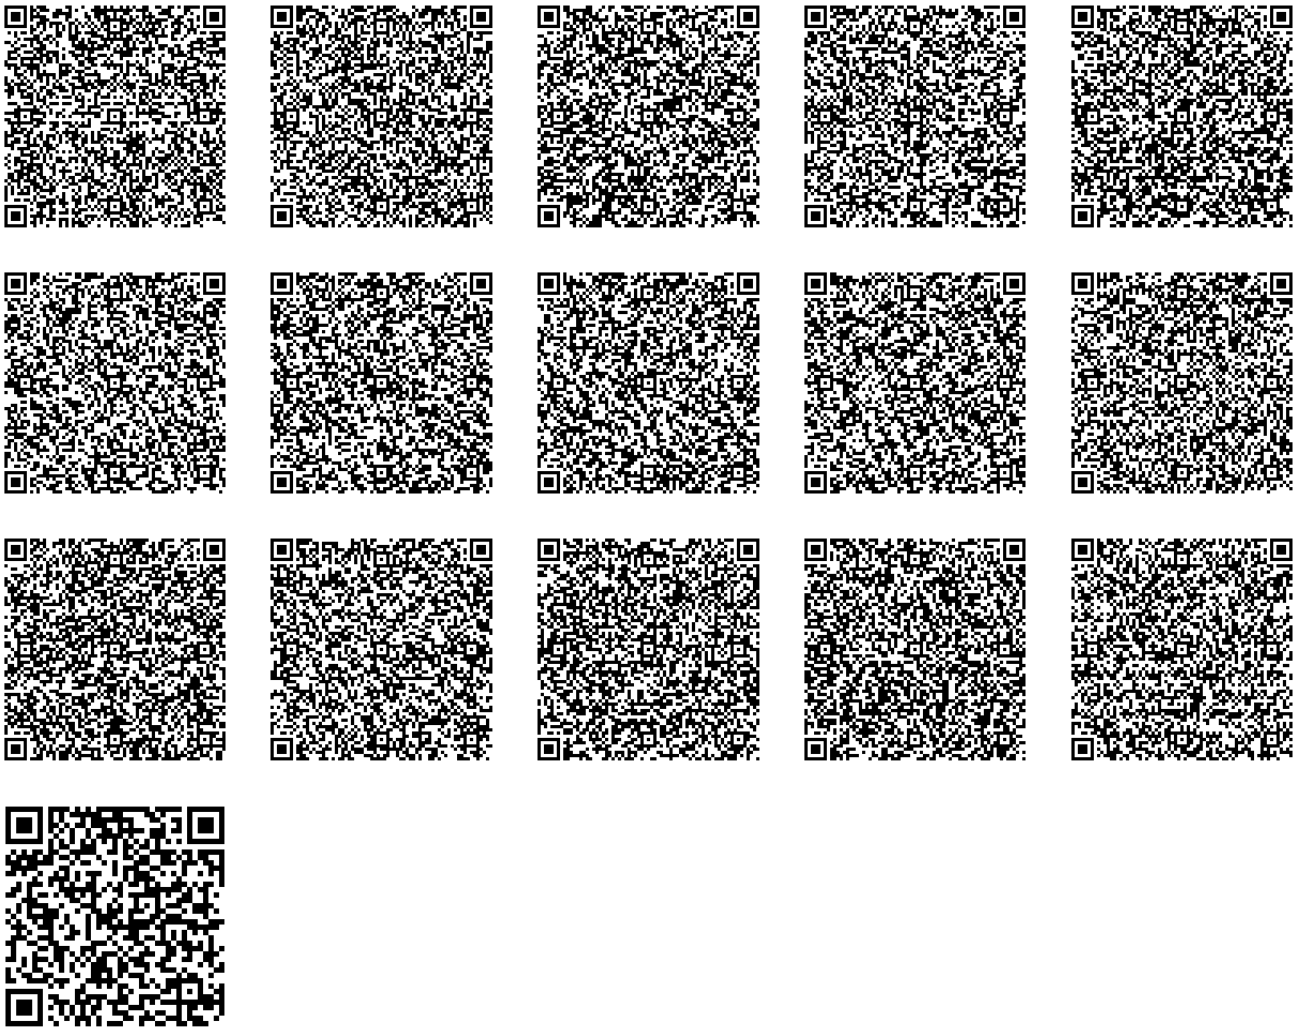

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети газоснабжения				
1	1	6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0.01	1 334 100	13 341
2	2	241-202-0210РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	10.1	1 022	10 322
3	3	241-208-1806РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	3 250	32 500
4	4	241-210-0111РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	1 325	1 325
5	5	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10	22	220
6	6	249-101-0201РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	10	18	180
7	7	6301-0701-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона, в грунтах сухих	м3	0.07	71 991	5 039
8	8	222-203-0101РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	1	4 421	4 421
9	9	225-101-0101РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 095	7 095
10	10	242-202-4401РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN15, PN16/25/40	шт.	1	22 615	22 615
11	11	244-202-0101РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
12	12	241-211-0102РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	2	247	494

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	249-101-0201РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	5	18	90
14	14	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	1	3 938	3 938
15	15	6114-0102-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	1	9 513	9 513
16	16	6301-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0.0022	3 307 989	7 278
17	17	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2.2	1 453	3 197
18	18	241-102-0218РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1	5 411	5 411
19	19	241-210-0113РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	1 542	1 542
20	20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1.74	4 160	7 238
21	21	6114-0102-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	1	3 681	3 681
22	22	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1 453	1 453
23	23	6117-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка регуляторов давления газа, диаметр до 100 мм	шт.	1	52 444	52 444
24	24	Т пункт перечня ЕСЦ РСНБ РК 2024	Шкафной регуляторный пункт с двумя линиями редуцирования, с катушкой под узе учета газа, с обогревом ГРПШ-03М-2У1 (2 линии, КИП, на базе регулятора-РДСК-50) Рвх-0,21 МПа Рвых-10-100КПа, расход газа 170,6м3/ч	комплект.	1	214 962	214 962
25	25	6117-0301-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчиков индивидуальных	шт.	1	14 481	14 481
26	26	Т пункт перечня ЕСЦ РСНБ РК 2024	Счетчик ротационный CGR-G-65 Соотношение диапазонов: 1:100 При Рвх-0,21 МПа Qмах- 170,6м3/ч, Qmin- 2.61м3/ч,Common CGR-01-G-65	шт.	1	732 019	732 019
27	27	Т пункт перечня ЕСЦ РСНБ РК 2024	Электронный корректор, mini ELCOR	шт.	1	584 536	584 536
28	28	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0.227	198 046	44 956
29	29	222-525-0201РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.227	1 125 884	255 576

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0.42	11 590	4 868
31	31	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м3	0.056	22 025	1 233
32	32	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0.4	64 654	25 862
33	33	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	5.8	4 160	24 128
34	34	6114-0102-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	3	4 321	12 963
35	35	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 453	4 359
36	36	241-112-0124РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	521	521
37	37	6114-0102-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	0.6	4 795	2 877
38	38	241-102-0168РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	0.6	2 601	1 561
39	39	242-101-0101РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	11 788	11 788
40	40	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.5	193	97
41	41	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0.053	11 590	614
42	42	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м3	0.007	22 025	154
43	43	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0.06	64 654	3 879
44	44	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0.82	4 160	3 411
45	45	6114-0102-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	0.9	4 321	3 889
46	46	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0.9	1 453	1 308

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	222-525-0201РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0016482	1 125 884	1 856
48	48	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.24	193	46
49	49	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0.24	250	60
50	50	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	11.5	3 715	42 722
51	51	241-101-0104РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6	509	3 054
52	52	241-101-0107РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	5.5	462	2 541
53	53	241-112-0108РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	7	155	1 085
54	54	241-112-0106РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	3	189	567
55	55	242-101-0101РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	11 788	11 788
56	56	242-209-0102РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	104 720	209 440
57	57	6303-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0.006	3 568 060	21 408
58	58	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1 453	5 812
59	59	241-102-0104РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	2	367	734
60	60	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2.	м3	2.3	359	826
61	61	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	2.3	93	214
62	62	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0.78	3 840	2 995
63	63	1125-0127-0301 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0.01	1 280 473	12 805
64	64	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	51 372	51 372

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Наружные сети газоснабжения				**2 535 896**
			ИТОГО по акту:				**2 535 896**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				1004379.000 x 6.90%	69 302
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				2535896.000 + 69302.152	2 605 198
		Сметная прибыль, (5.00%)				1073681.152 x 5.00%	53 684
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				2605198.152 x 2.000%	52 104
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					2 710 986
		в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 1.0301				2710986.173 x 1.0301	2 792 500
		НДС (12%)				2792499.821 x 12%	335 100
		Итого с НДС				2792499.821 + 335099.979	3 127 600

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:09
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:42
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:28
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 15:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:21
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 14:57

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №2 от 04.09.2025 г.)				
			Раздел: Лифтовая шахта кирпичная /Лист 132-133/				
1	1	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней	м3	26	38 800	1 008 800
2	2	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	9.88	55 564	548 972
3	3	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.3154398	292 085	92 135
4	4	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.3154398	397 364	125 344
5	5	6103-0701-0809ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0.18	109 032	19 626
6	6	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.18	373 849	67 293
7	7	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.86	250	1 215
8	8	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.86	389	1 891
			Итого по разделу: Лифтовая шахта кирпичная /Лист 132-133/				**1 865 276**
			Раздел: Монолитная плиты /Лист-134/				
			Подраздел: Р Плита перекрытия лифтовой шахты на отм.-10,850				
9	9	6104-0401-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	2	13 783	27 566
10	10	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	6.48	8 463	54 840
			Итого по подразделу: Р Плита перекрытия лифтовой шахты на отм.-10,850				**82 406**
			Итого по разделу: Монолитная плиты /Лист-134/				**82 406**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №2 от 04.09.2025 г.)				**1 947 682**
			ИТОГО по акту:				**1 947 682**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				1947682.000 x 6.90%	134 390
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1947682.000 + 134390.060	2 082 072
		Сметная прибыль, (5.00%)				2082072.060 x 5.00%	104 104
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				2082072.060 x 2.000%	41 641
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					2 227 817
		в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699				2227817.104 x 0.9699	2 160 831
		НДС (12%)				2160831.333 x 12%	259 300
		Итого с НДС				2160831.333 + 259299.760	2 420 131

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.09.2025 09:12
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.09.2025 11:49
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.09.2025 09:20
Представители заказчика		
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	15.09.2025 17:20
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	15.09.2025 16:58
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.09.2025 17:01 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Плиты перекрытия /Лист-82/				
1	81	6104-0401-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 м2	шт.	194	20 975	4 069 150
2	83	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	856.60651092	8 463	7 249 461
			Итого по разделу: Плиты перекрытия /Лист-82/				**11 318 611**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**11 318 611**
			ИТОГО по акту:				**11 318 611**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)	11318610.921 x 6.90%	780 984
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	11318610.921 + 780984.164	12 099 595
	Сметная прибыль, (5.00%)	12099595.085 x 5.00%	604 980
	Непредвиденные расходы, (2.000%)	12099595.085 x 2.000%	241 992
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		12 946 567
	в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699	12946566.741 x 0.9699	12 557 291
	НДС (12%)	12557290.728 x 12%	1 506 875
	Итого с НДС	12557290.728 + 1506874.887	14 064 166

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	02.09.2025 09:51
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	02.09.2025 11:00
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	02.09.2025 10:04
Представители заказчика		
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	03.09.2025 17:02
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	03.09.2025 10:30
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	03.09.2025 16:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

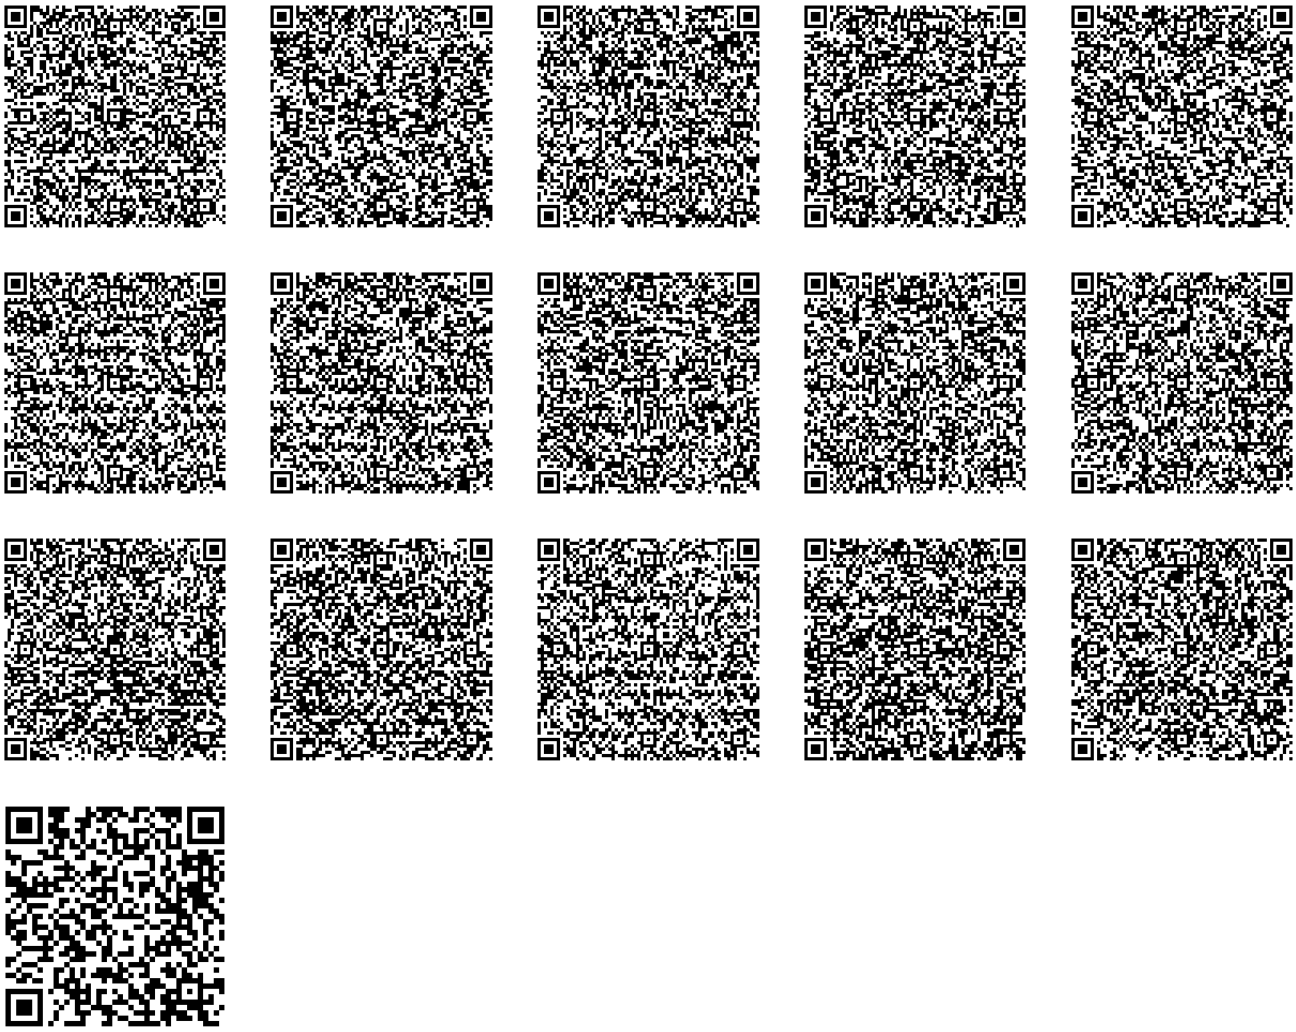

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Плиты перекрытия /Лист-82/				
			Подраздел: Участок моеолитный УМ-1...УМ40, ОПм1 /Лист 83-84, 127-128/				
1	85	6111-0403-0503ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	19.68	40 582	798 654
2	86	6103-0101-0209ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /участки монолитные УМ/	м3	93.27638	55 810	5 205 755
3	87	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9.0563402	311 690	2 822 771
4	88	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7.96060892	294 911	2 347 671
5	89	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3.01236776	323 349	974 046
			Итого по подразделу: Участок моеолитный УМ-1...УМ40, ОПм1 /Лист 83-84, 127-128/				**12 148 896**
			Итого по разделу: Плиты перекрытия /Лист-82/				**12 148 896**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**12 148 896**
			ИТОГО по акту:				**12 148 896**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	12148896.493 x 6.90%	838 274
Итого с затратами на организацию и управление СМР	12148896.493 + 838273.870	12 987 170
Сметная прибыль, (5.00%)	12987170.362 x 5.00%	649 359
Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	12987170.362 x 2.000%	259 743
Итого с непредвидемыми работами и затратами		13 896 272
в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699	13896272.288 x 0.9699	13 478 441
НДС (12%)	13478440.628 x 12%	1 617 413
Итого с НДС	13478440.628 + 1617412.875	15 095 854

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	04.09.2025 17:19
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	04.09.2025 18:16
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	04.09.2025 17:20
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	05.09.2025 16:21 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	05.09.2025 15:01
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	07.09.2025 09:56

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Колонны /Лист-57/				
			Подраздел: Связи вертикальные				
1	75	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	11.52192	286 888	3 305 501
2	76	222-525-0101РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	11.52192	1 131 729	13 039 691
3	77	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	334.13568	389	129 979
			Итого по подразделу: Связи вертикальные				**16 475 171**
			Итого по разделу: Колонны /Лист-57/				**16 475 171**
			Раздел: Ригели /Лист-57/				
4	78	6104-0301-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка ригелей, масса до 3 т	шт.	60	58 967	3 538 020
5	79	6104-0301-0106ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка ригелей, масса до 2 т	шт.	14	21 187	296 618
6	80	222-104-0305РСНБ РК 2022	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 4 тс/пм ГОСТ 13015-2012	м3	69	124 897	8 617 893
			Итого по разделу: Ригели /Лист-57/				**12 452 531**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**28 927 702**
			ИТОГО по акту:				**28 927 702**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				28927702.000 x 6.90%	1 996 011
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				28927702.000 + 1996011.466	30 923 713
		Сметная прибыль, (5.00%)				30923713.466 x 5.00%	1 546 186
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				30923713.466 x 2.000%	618 474

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					33 088 373
		в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699				33088373.408 x 0.9699	32 093 476
		НДС (12%)				32093475.663 x 12%	3 851 217
		Итого с НДС				32093475.663 + 3851217.080	35 944 693

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	02.09.2025 09:19
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	02.09.2025 10:56
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	02.09.2025 12:42
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	03.09.2025 16:51 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	03.09.2025 10:30
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	03.09.2025 17:01

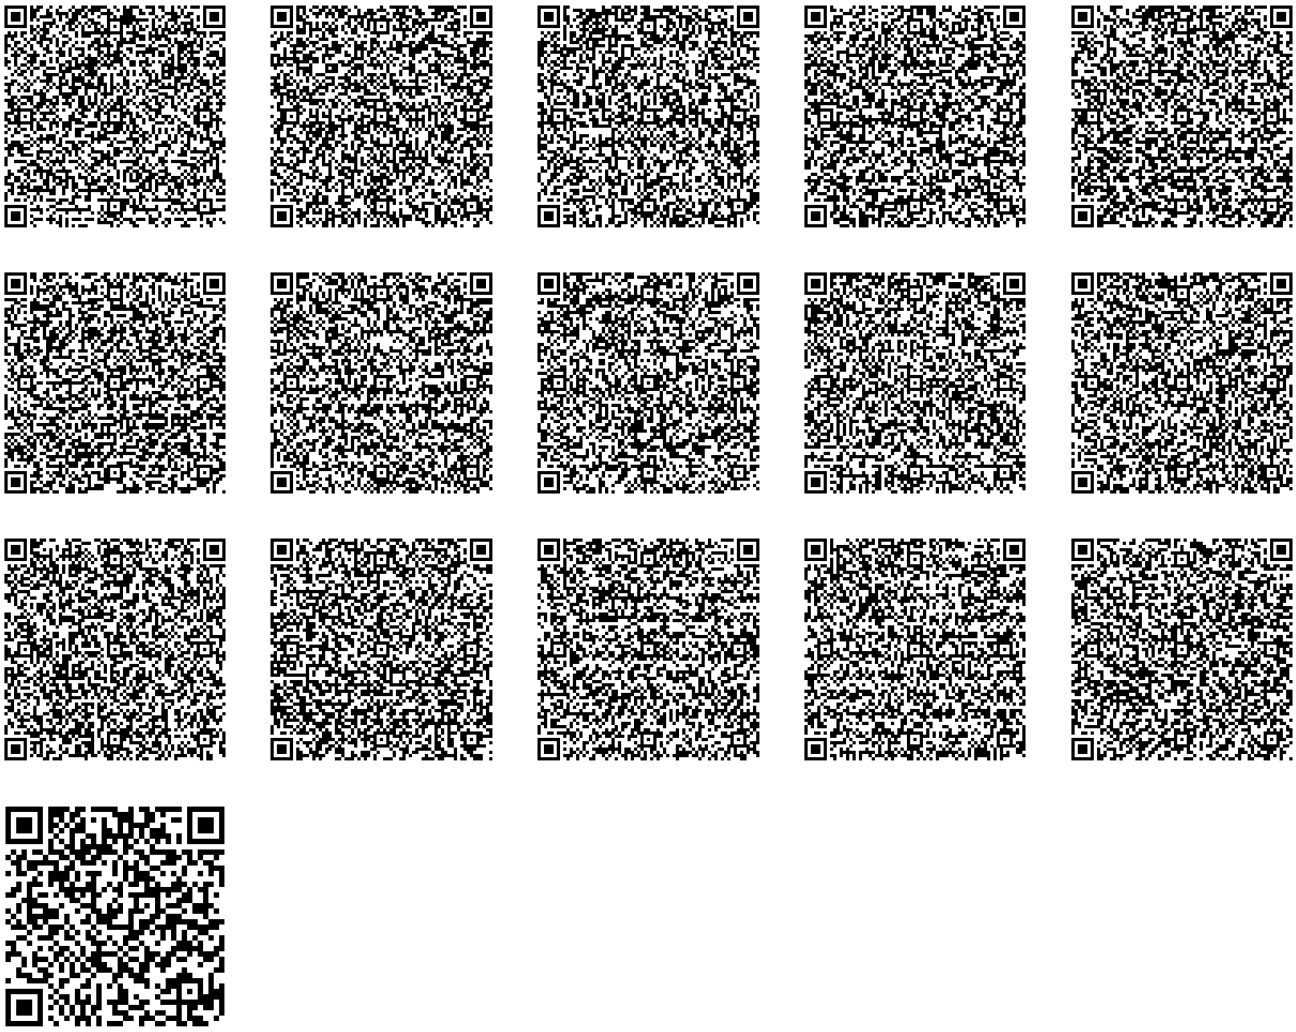

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Лифты				
1	1	6120-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.	1	3 713 924	3 713 924
2	2	6120-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103	шт.	1	-1 589 570	-1 589 570
3	3	6120-0101-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, кнорме 6120-0101-0103	м	30.7	-36 858	-1 131 541
4	4	516-101-0363РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 3, скорость подъема 1 м/с, огнестойкость дверей Е-30, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь, с диспетчерской связью	комплект	1	10 784 577	10 784 577
			Итого по локальной смете: Лифты				**11 777 390**
			ИТОГО по акту:				**11 777 390**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)				992813.000 x 6.90%	68 504
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				11777390.000 + 68504.098	11 845 894
		Сметная прибыль, (5.00%)				1061317.098 x 5.00%	53 066
		Непредвиденные расходы, (2.000%)				11845894.098 x 2.000%	236 918
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					12 135 878
		в ценах 3,4 квартала 2023 г. , к = 0.9699				12135877.835 x 0.9699	11 770 978
		НДС (12%)				11770977.531 x 12%	1 412 517
		Итого с НДС				11770977.531 + 1412517.304	13 183 495

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	02.09.2025 09:51
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	02.09.2025 10:59
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	02.09.2025 10:04
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	03.09.2025 16:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	03.09.2025 17:02
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	03.09.2025 10:30

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление и вентиляция				
			Раздел: Системы вентиляции и кондиционирования				
			Подраздел: Система П1				
1	158	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	235 767	235 767
2	159	514-401-0205 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м3/час	комплект	1	2 335 496	2 335 496
3	160	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7.2	8 212	59 126
4	161	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7.2	6 118	44 050
5	162	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	96.98	7 522	729 484
6	163	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	96.98	6 118	593 324
7	164	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	120.35	6 519	784 562
8	165	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	120.35	7 372	887 220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	166	6118-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м2	118.16	4 430	523 449
10	167	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	118.16	10 920	1 290 307
11	168	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	20	1 412	28 240
12	169	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	4 509	4 509
13	170	246-304-0576 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	9	7 065	63 585
14	171	246-304-0653 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	10	9 398	93 980
15	172	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	7	6 392	44 744
16	173	6118-0203-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	7 243	14 486
17	174	246-302-0641 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	12 672	76 032
18	175	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	14 191	14 191
19	176	246-302-0664 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	16 858	16 858
20	177	246-302-0666 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	19 552	19 552
21	178	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	150	775	116 250
22	179	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	120	1 341	160 920
23	180	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	123.6	3 745	462 882

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	181	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	25	490	12 250
25	182	6111-0501-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30.	м2	25	1 177	29 425
26	183	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В	кг	56.5	1 579	89 214
27	184	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	5	22 628	113 140
28	185	246-306-0619 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	98 681	98 681
29	186	246-306-0635 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	97 019	194 038
30	187	246-306-0638 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	106 430	106 430
31	188	246-306-0641 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 550 мм	шт.	1	112 262	112 262
			Итого по подразделу: Система П1				**9 354 454**
			Подраздел: Система П2				
32	189	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	235 767	235 767
33	190	514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час	комплект	1	1 857 558	1 857 558
34	191	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	3.6	8 212	29 563
35	192	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3.6	6 118	22 025
36	193	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	21.07	7 522	158 488
37	194	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	21.07	6 118	128 906

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	195	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	6.5	6 519	42 374
39	196	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	6.5	7 372	47 918
40	197	6118-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм/0,9мм периметр до 3200 мм	м2	102.54	4 430	454 252
41	198	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	102.54	10 920	1 119 737
42	199	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	5	1 412	7 060
43	200	246-304-0576 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	2	7 065	14 130
44	201	246-304-0653 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	3	9 398	28 194
45	202	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	4	6 392	25 568
46	203	246-302-0640 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	12 057	12 057
47	204	246-302-0641 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12 672	25 344
48	206	246-302-0661 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	15 022	15 022
49	208	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	80	775	62 000
50	209	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	107.1	1 341	143 621
51	210	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	110.313	3 745	413 122
52	211	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	18.9	490	9 261

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	212	6111-0501-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30.	м2	18.9	1 177	22 245
54	213	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В	кг	42.714	1 579	67 445
55	214	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	4	22 628	90 512
56	215	246-306-0618 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	96 900	96 900
57	216	246-306-0619 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	98 681	98 681
58	217	246-306-0620 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	100 299	100 299
59	218	246-306-0623 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 450 мм	шт.	1	105 897	105 897
			Итого по подразделу: Система П2				**5 433 946**
			Подраздел: Система П3				
60	219	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	235 767	235 767
61	220	514-401-0204 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час	комплект	1	2 343 897	2 343 897
62	221	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	1.8	8 212	14 782
63	222	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1.8	6 118	11 012
64	223	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	31.02	7 522	233 332
65	224	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	31.02	6 118	189 780
66	225	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	53.14	6 519	346 420

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	226	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	53.14	7 372	391 748
68	227	6118-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм/0,9мм периметр до 3200 мм	м2	191.62	4 430	848 877
69	228	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	191.62	10 920	2 092 490
70	229	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1 412	14 120
71	230	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	4 509	4 509
72	231	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066
73	232	246-304-0576 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	7 065	7 065
74	233	246-304-0653 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	7	9 398	65 786
75	234	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	5	6 392	31 960
76	235	246-302-0641 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	12 672	38 016
77	236	246-302-0642 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	13 576	13 576
78	237	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	14 191	14 191
79	238	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	143	775	110 825
80	239	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	180.5	1 341	242 050
81	240	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	185.915	3 745	696 252

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	241	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	28.6	490	14 014
83	242	6111-0501-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30.	м2	28.6	1 177	33 662
84	243	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В	кг	64.636	1 579	102 060
85	244	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	6	22 628	135 768
86	245	246-306-0618 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	96 900	96 900
87	246	246-306-0620 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	100 299	200 598
88	247	246-306-0636 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 300 мм	шт.	1	102 597	102 597
89	248	246-306-0622 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1	104 115	104 115
90	249	246-306-0623 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 450 мм	шт.	1	105 897	105 897
			Итого по подразделу: Система П3				**8 848 132**
			Подраздел: Система П4				
91	250	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	235 767	235 767
92	251	514-401-0203 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м3/час	комплект	1	2 137 538	2 137 538
93	252	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	1.8	8 212	14 782
94	253	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1.8	6 118	11 012
95	254	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	3.2	7 522	24 070

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	255	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3.2	6 118	19 578
97	256	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	62.06	6 519	404 569
98	257	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	62.06	7 372	457 506
99	258	6118-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм/0,9мм периметр до 3200 мм	м2	58.54	4 430	259 332
100	259	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	58.54	10 920	639 257
101	260	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1 412	14 120
102	261	246-304-0530 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	5 361	5 361
103	262	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	6 066	18 198
104	263	246-304-0707 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	6	10 465	62 790
105	264	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	82	775	63 550
106	265	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	57.6	1 341	77 242
107	266	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	59.328	3 745	222 183
108	267	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	7.2	490	3 528
109	268	6111-0501-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30.	м2	7.2	1 177	8 474
110	269	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В	кг	16.272	1 579	25 693

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	270	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	22 628	22 628
112	271	246-306-0659 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 900 мм	шт.	1	129 641	129 641
			Итого по подразделу: Система П4				**4 856 819**
			Подраздел: Система П5				
113	272	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	235 767	235 767
114	273	514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час	комплект	1	1 857 558	1 857 558
115	276	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	14.22	6 519	92 700
116	277	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	14.22	7 372	104 830
117	278	6118-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм/0,9мм периметр до 3200 мм	м2	26.61	4 430	117 882
118	279	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	26.61	10 920	290 581
119	283	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	55	775	42 625
120	284	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	36	1 341	48 276
121	285	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	37.08	3 745	138 865
122	286	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19	490	9 310
123	287	6111-0501-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30.	м2	19	1 177	22 363
124	288	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В	кг	42.94	1 579	67 802

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
125	289	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	22 628	22 628
126	290	246-306-0642 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 600 мм	шт.	1	114 179	114 179
			Итого по подразделу: Система П5				**3 165 366**
			Подраздел: Система П6				
127	291	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	235 767	235 767
128	292	514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час	комплект	1	1 504 297	1 504 297
129	293	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	20.16	8 212	165 554
130	294	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	20.16	6 118	123 339
131	295	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	19.82	6 519	129 207
132	296	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	19.82	7 372	146 113
133	297	6118-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм/0,9мм периметр до 3200 мм	м2	21.32	4 430	94 448
134	298	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	21.32	10 920	232 814
135	299	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	6	1 412	8 472
136	300	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 509	9 018
137	301	246-304-0576 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	4	7 065	28 260
138	302	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	64	775	49 600

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	303	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	20.4	1 341	27 356
140	304	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	21.012	3 745	78 690
141	305	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5.1	490	2 499
142	306	6111-0501-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30.	м2	5.1	1 177	6 003
143	307	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В	кг	11.526	1 579	18 200
144	308	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	22 628	22 628
145	309	246-306-0637 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 350 мм	шт.	1	104 513	104 513
			Итого по подразделу: Система П6				**2 986 778**
			Подраздел: Система П7				
146	310	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	235 767	235 767
147	311	514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час	комплект	1	1 857 558	1 857 558
148	312	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	4.48	8 212	36 790
149	313	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4.48	6 118	27 409
150	314	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	39.26	6 519	255 936
151	315	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	39.26	7 372	289 425
152	316	6118-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм/0,9мм периметр до 3200 мм	м2	128.04	4 430	567 217

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
153	317	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	128.04	10 920	1 398 197
154	318	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	8	1 412	11 296
155	319	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	8	7 893	63 144
156	320	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	79	775	61 225
157	321	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	127.3	1 341	170 709
158	322	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	131.119	3 745	491 041
159	323	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	20.1	490	9 849
160	324	6111-0501-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30.	м2	20.1	1 177	23 658
161	325	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В	кг	45.426	1 579	71 728
162	326	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	22 628	22 628
163	327	246-306-0655 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 650 мм	шт.	1	121 249	121 249
			Итого по подразделу: Система П7				**5 714 826**
			Подраздел: Система П8				
164	328	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	235 767	235 767
165	329	514-401-0703 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м3/час	комплект	1	3 085 578	3 085 578
166	330	Т пункт перечня РСНБ РК 2022	Секция бактерицидной обработки воздуха LB 60-35/222	шт	1	664 430	664 430

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	331	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2.1	8 212	17 245
168	332	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2.1	6 118	12 848
169	333	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4	7 522	30 088
170	334	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4	6 118	24 472
171	335	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	61.78	6 519	402 744
172	336	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	61.78	7 372	455 442
173	337	6118-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм/0,9мм периметр до 3200 мм	м2	34.1	4 430	151 063
174	338	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	34.1	10 920	372 372
175	339	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	9	1 412	12 708
176	340	246-304-0529 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 175 мм	шт.	1	3 658	3 658
177	341	246-304-0653 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	8	9 398	75 184
178	342	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	59	775	45 725
179	343	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	43.5	1 341	58 334
180	344	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	44.805	3 745	167 795
181	345	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5.5	490	2 695

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	346	6111-0501-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30.	м2	5.5	1 177	6 474
183	347	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В	кг	12.43	1 579	19 627
184	348	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	22 628	22 628
185	349	246-306-0656 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 700 мм	шт.	1	121 250	121 250
			Итого по подразделу: Система П8				**5 988 127**
			Подраздел: Система П9				
186	350	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	235 767	235 767
187	351	514-401-0203 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м3/час	комплект	1	2 137 538	2 137 538
188	352	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	5.68	8 212	46 644
189	353	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5.68	6 118	34 750
190	354	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	16.45	7 522	123 737
191	355	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	16.45	6 118	100 641
192	356	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	63.37	6 519	413 109
193	357	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	63.37	7 372	467 164
194	358	6118-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм/0,9мм периметр до 3200 мм	м2	36.65	4 430	162 360
195	359	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	36.65	10 920	400 218

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
196	360	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	24	1 412	33 888
197	361	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	8	3 735	29 880
198	362	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	5 560	16 680
199	363	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	3	4 327	12 981
200	364	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	7	7 893	55 251
201	365	246-304-0653 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	3	9 398	28 194
202	366	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	88	775	68 200
203	367	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	34.2	1 341	45 862
204	368	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	35.226	3 745	131 921
205	369	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6.4	490	3 136
206	370	6111-0501-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30.	м2	6.4	1 177	7 533
207	371	236-202-0604 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В	кг	14.464	1 579	22 839
208	372	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	22 628	22 628
209	373	246-306-0671 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 350 мм х 600 мм	шт.	1	120 002	120 002
			Итого по подразделу: Система П9				**4 720 923**
			Итого по разделу: Системы вентиляции и кондиционирования				**51 069 371**
			Итого по локальной смете: Отопление и вентиляция				**51 069 371**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту:				**51 069 371**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)			31287923.390 x 6.90%	2 158 867
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			51069371.390 + 2158866.744	53 228 238
			Сметная прибыль, (5.00%)			33446790.133 x 5.00%	1 672 340
			Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)			53228238.133 x 2.000%	1 064 565
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				55 965 142
			в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699			55965142.403 x 0.9699	54 282 388
			НДС (12%)			54282388.363 x 12%	6 513 887
			Итого с НДС			54282388.363 + 6513886.604	60 796 275

Лист согласования
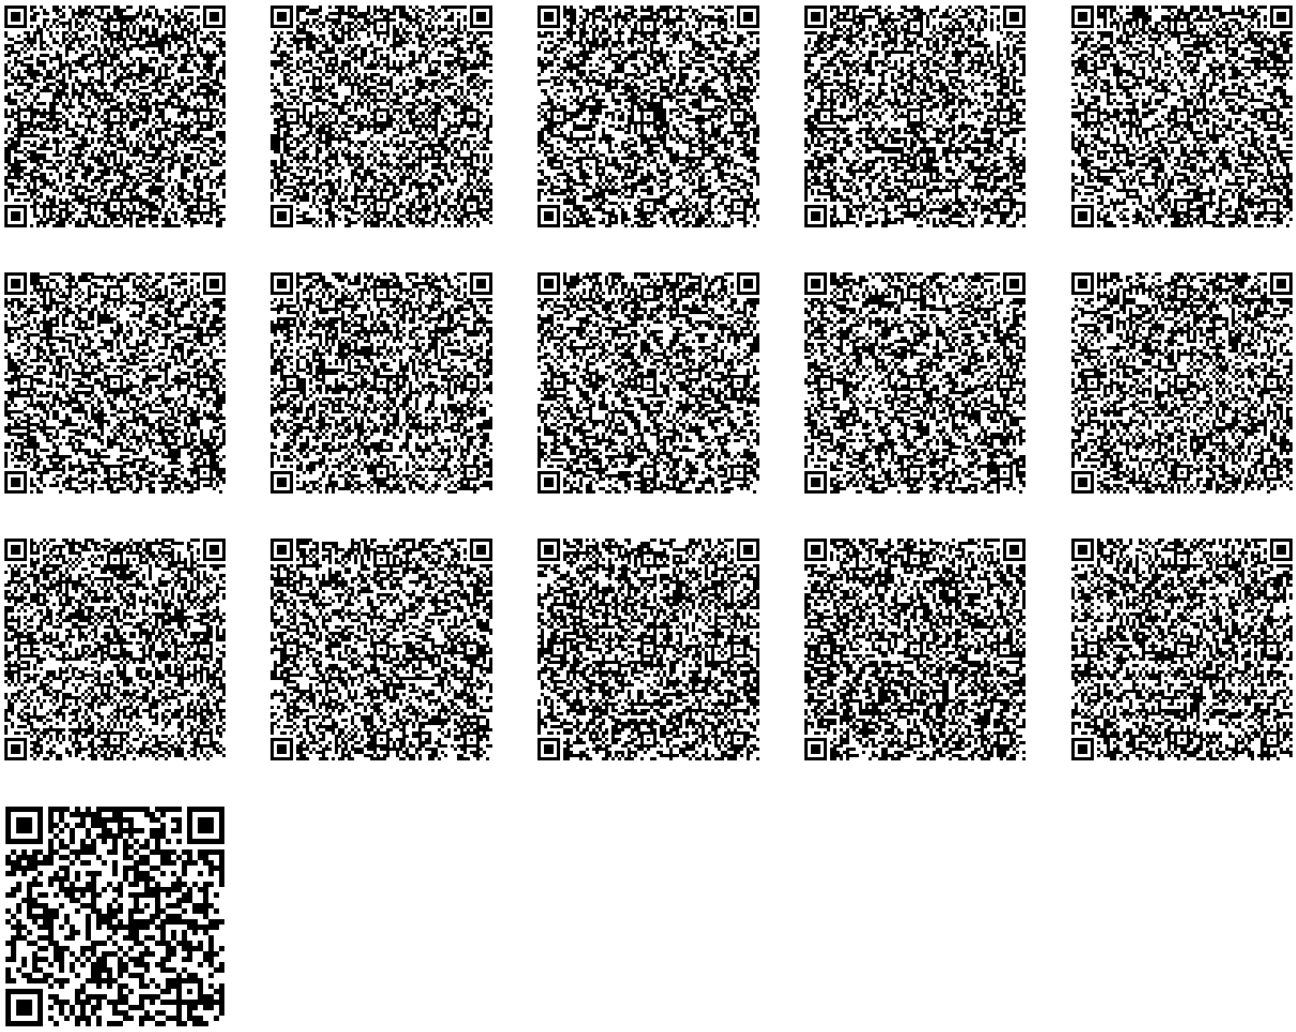
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	16.09.2025 10:32
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	16.09.2025 11:21
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	16.09.2025 11:11
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.09.2025 16:49 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800115300687 - АГЕЛЕУОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.09.2025 17:03
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	16.09.2025 16:11
