Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутриплощадочные сети связи				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	22.8	359	8 185
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1.1	7 357	8 093
3	3	6401-0202-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм2, количество в линии 2	шт.	1	49 542	49 542
			Итого по разделу: Земляные работы				**65 820**
			Раздел: Изделия, материалы				
4	4	1134-0201-0604РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	3	25 050	75 150
5	5	225-201-0101РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	1	39 609	39 609
6	6	225-201-0103РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	71 040	142 080
7	7	225-101-0203РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 10	шт.	3	5 424	16 272
8	8	244-202-0105РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	3	43 441	130 323
9	9	252-207-3964РСНБ РК 2022	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	6	3 242	19 452
10	10	261-404-0521РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1 346	10 768

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0.047	1 398 329	65 721
12	12	6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0.016	1 334 100	21 346
13	13	241-207-1105РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	47	1 968	92 496
14	14	241-207-1102РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	16	787	12 592
15	15	6119-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	50	1 637	81 850
16	16	241-207-0204РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	50	172	8 600
17	17	224-204-0112РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	100	588	58 800
			Итого по разделу: Изделия, материалы				**775 059**
			Раздел: Устройство ввода, герметизация отверстий (колодец, здание				
18	18	216-101-0101РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.01	28 642	286
19	19	236-104-0503РСНБ РК 2022	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	2	773	1 546
			Итого по разделу: Устройство ввода, герметизация отверстий (колодец, здание				**1 832**
			Итого по локальной смете: Внутриплощадочные сети связи				**842 711**
			ИТОГО по акту:				**842 711**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	842711.000 x 6.90%	58 147
Итого с затратами на организацию и управление СМР	842711.000 + 58147.060	900 858
Сметная прибыль, (5.00%)	900858.060 x 5.00%	45 043
Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	900858.060 x 2.000%	18 017
Итого с непредвидемыми работами и затратами		963 918
в ценах 1,2 квартала 2024 г. , к = 1.0000	963918.124 x 1.0000	963 918
НДС (12%)	963918.124 x 12%	115 670
Итого с НДС	963918.124 + 115670.175	1 079 588

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	24.10.2025 15:20
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	24.10.2025 15:24
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	24.10.2025 15:24
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	28.10.2025 16:15
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	28.10.2025 16:04 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	28.10.2025 09:57

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Диспетчерезация лифта				
1	1	6125-0601-0701ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 140	16 140
2	2	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Блок контроля в комплекте с пультом диспетчера СДК-331.207RS	шт.	1	178 625	178 625
3	3	6125-0801-0802ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	2	2 647	5 294
4	4	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Технологическое переговорное устройство СДК-029Т	шт.	1	14 209	14 209
5	5	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Лифтовое переговорное устройство СДК-029.1	шт.	1	9 127	9 127
6	6	243-905-0102РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	1	5 170	5 170
			Итого по локальной смете: Диспетчерезация лифта				**228 565**
			ИТОГО по акту:				**228 565**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	228565.000 x 6.90%	15 771
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	228565.000 + 15770.985	244 336
	Сметная прибыль, (5.00%)	244335.985 x 5.00%	12 217
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	244335.985 x 2.000%	4 887
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		261 440
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	261439.504 x 1.0000	261 440
	НДС (12%)	261439.504 x 12%	31 373
	Итого с НДС	261439.504 + 31372.741	292 812

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:11
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:37
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:30
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 16:08
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:34
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:22 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

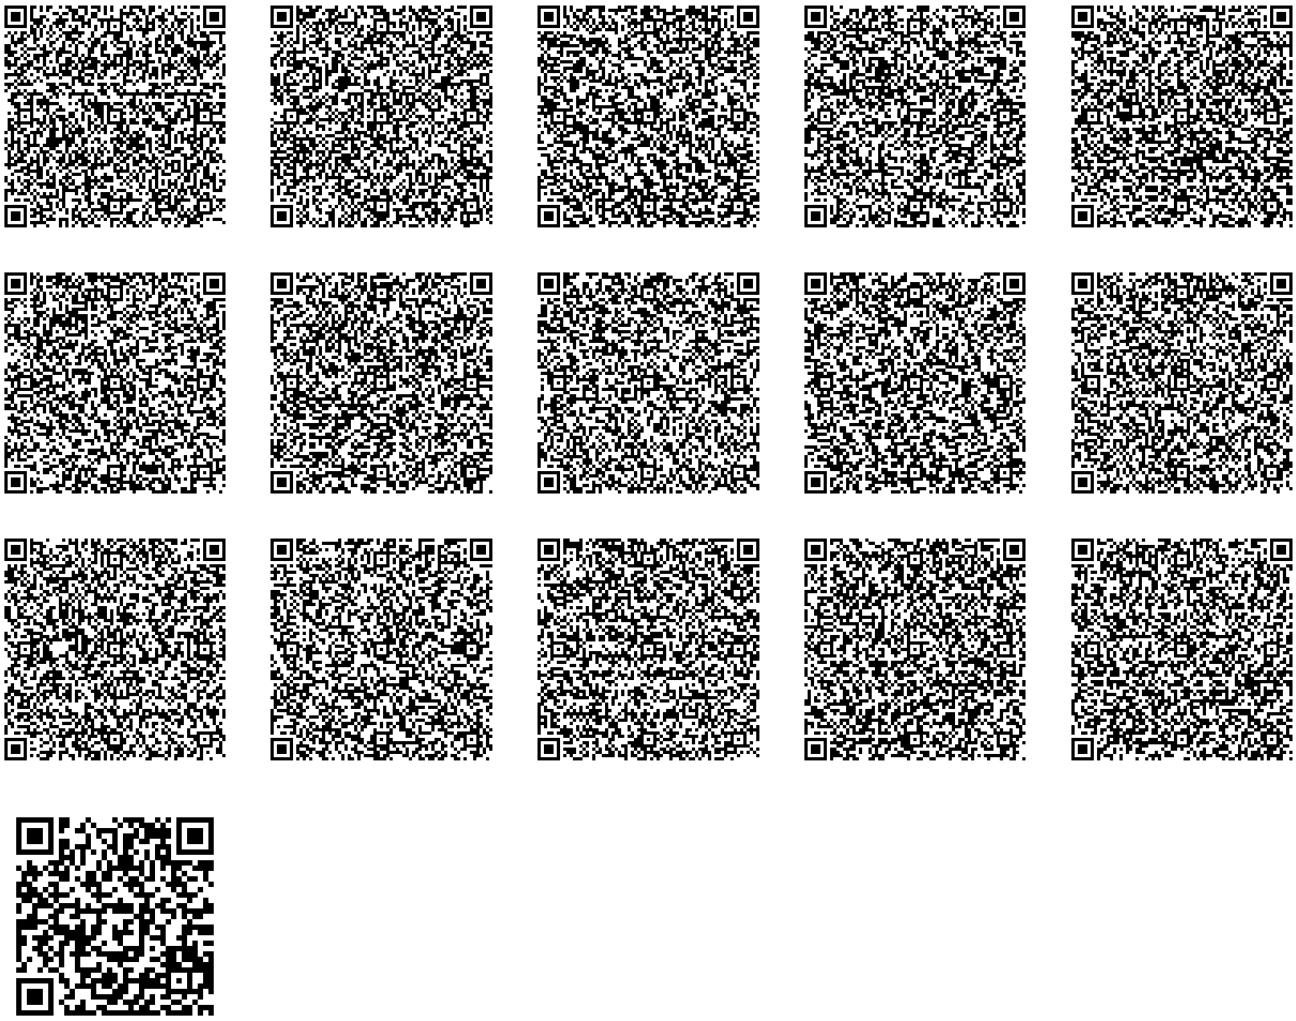

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление и вентиляция				
			Раздел: Отопление				
1	1	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	107.91	2 868	309 486
2	2	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1135	2 231	2 532 185
3	3	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	118	763	90 034
4	4	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	118	120	14 160
5	5	245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	118	1 056	124 608
6	6	6114-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	118	762	89 916
7	7	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	118	3 350	395 300
8	20	6116-0602-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка воздухоотводчиков	шт.	8	9 411	75 288

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	21	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	4 549	36 392
10	42	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	13	2 319	30 147
11	43	242-312-1401 СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	19 315	77 260
12	44	242-312-1402 СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	22 507	180 056
13	45	242-312-1403 СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	30 842	30 842
14	46	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	4	2 319	9 276
15	47	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	5	2 652	13 260
16	48	242-312-1701 СпрСЦ 08.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	26 802	107 208
17	51	242-312-1704 СпрСЦ 08.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	54 922	274 610
18	58	6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	978.76	754	737 985
19	59	6114-0103-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	281.2	1 199	337 159
20	60	6114-0103-0314 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	116.47	1 316	153 275
21	61	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	968.9724	189	183 136

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	62	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	278.388	282	78 506
23	63	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	115.3053	468	53 963
24	78	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	327	17	5 559
25	79	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	69	31	2 139
26	80	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	16	48	768
27	81	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	172	34	5 848
28	82	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	16	52	832
29	84	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	0.6	2 868	1 721
30	85	245-105-0202 РСНБ РК 2022	Радиатор металлический с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 мощностью 1 кВт	комплект	4	159 796	639 184
31	88	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	1376.43	1 890	2 601 453
32	89	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	1076.636	189	203 484
33	90	234-303-0110 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	309.32	236	73 000
34	91	234-303-0112 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	128.117	303	38 820
			Итого по разделу: Отопление				**9 506 857**
			Раздел: Тепловой пункт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	838	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	78 832	78 832
36	839	511-901-0301 СпрСЦ 08.2024	Шкаф управления циркуляционными насосами до 6-ти шт., CONTROL MPC SERIES 2000-1P to 6P, арт. 99550415	шт.	1	477 954	477 954
37	840	6116-0603-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 200 до 300 кг	шт.	2	41 282	82 564
38	841	513-205-1108 СпрСЦ 08.2024	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС, для подключения к автономной котельной по одноступенчатой схеме, T1±70°C/T2±50°C, B1±5°C/T3±60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 30 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss производительностью 2,0 м3/ч - 2,5 м3/ч, количество пластин 13, модель XGF№14A-TO 16/13-TKTM83	шт.	2	773 223	1 546 446
39	842	1312-1101-0302 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	22 478	22 478
40	843	242-310-0605 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	302 455	302 455
41	844	245-405-2559 РСНБ РК 2022	Привод электрический AMV 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	296 938	296 938
42	845	1312-1101-0302 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	22 478	22 478
43	846	242-310-0605 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	302 455	302 455
44	847	245-405-2559 РСНБ РК 2022	Привод электрический AMV 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	296 938	296 938
45	848	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 103	6 103
46	849	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219 967	219 967
47	850	245-601-0411 СпрСЦ 08.2024	Ключ программирования A 376 Danfoss, для двух систем отопления (вентиляции) и одной системы ГВС	шт.	1	135 483	135 483
48	851	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939	29 939

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	852	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 103	30 515
50	853	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26 095
51	854	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	42 806	171 224
52	855	245-601-0801 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	36 018	144 072
53	856	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 652	2 652
54	857	242-312-0908 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	1	311 055	311 055
55	858	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	4	78 832	315 328
56	859	511-403-0510 СпрСЦ 08.2024	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ЕСМ, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10, арт. 2120648	шт.	2	1 089 014	2 178 028
57	860	511-403-0502 СпрСЦ 08.2024	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ЕСМ, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10, арт. 2120640	шт.	2	271 582	543 164
58	861	242-202-0310 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	66 874	133 748
59	862	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	33 341	66 682
60	863	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	15	21 158	317 370
61	864	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	10	15 791	157 910
62	865	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	13 234	66 170

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	866	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	13 008	26 016
64	867	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	8 398	50 388
65	868	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	3 901	58 515
66	869	6116-0605-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм	шт.	2	23 577	47 154
67	870	242-404-0410 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	2	143 412	286 824
68	871	6116-0605-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	1	8 689	8 689
69	872	242-404-0408 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	60 848	60 848
70	873	6116-0605-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	6 930	6 930
71	874	242-404-0407 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	50 960	50 960
72	875	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	5 594	5 594
73	876	242-404-0405 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	32 254	32 254
74	877	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	16 108	64 432
75	878	242-304-1104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	117 315	351 945
76	879	242-304-1103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	80 659	80 659

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	880	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 885	17 770
78	881	242-304-1101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	68 931	137 862
79	882	6116-0602-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка грязевиков на стальных опорах в тепловых пунктах, условный диаметр до 125 мм	шт.	2	36 256	72 512
80	883	245-404-0106 РСНБ РК 2022	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 125	шт.	2	154 920	309 840
81	884	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	30	1 328	39 840
82	885	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	30	2 870	86 100
83	886	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	14	1 811	25 354
84	887	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	14	5 844	81 816
85	888	6114-0102-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	12	6 467	77 604
86	889	261-305-0109 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	12	6 375	76 500
87	890	6114-0102-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	12	6 466	77 592
88	891	261-305-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	12	5 398	64 776
89	892	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	30	4 398	131 940

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	893	261-305-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	30	4 106	123 180
91	894	6114-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	12	3 566	42 792
92	895	241-101-0411 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	12	5 272	63 264
93	896	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	8	2 326	18 608
94	897	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	8	2 135	17 080
95	898	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	72	1 890	136 080
96	899	234-303-0523 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 133 мм	м	13.2	8 992	118 694
97	900	234-303-0520 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 108 мм	м	11	5 980	65 780
98	901	234-303-0518 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 89 мм	м	33	4 235	139 755
99	902	234-303-0516 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 76 мм	м	13.2	3 845	50 754
100	903	234-303-0510 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 48 мм	м	8.8	2 519	22 167
101	904	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	22	547	12 034
102	905	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	22	250	5 500
103	906	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	708	38 940

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Тепловой пункт				**11 470 385**
			Итого по локальной смете: Отопление и вентиляция				**20 977 242**
			ИТОГО по акту:				**20 977 242**
			В том числе оборудование:				**4 745 592**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)			16231650.030 x 6.90%	1 119 984
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			20977242.030 + 1119983.868	22 097 226
			Сметная прибыль, (5.00%)			17351633.897 x 5.00%	867 582
			Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)			22097225.897 x 2.000%	441 945
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				23 406 752
			в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000			23406752.110 x 1.0000	23 406 752
			НДС (12%)			23406752.110 x 12%	2 808 810
			Итого с НДС			23406752.110 + 2808810.253	26 215 562

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:01
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:33
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:32
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 17:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:24
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 16:30

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Охранная сигнализация				
1	9	6125-0601-0204ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	60	5 207	312 420
2	10	248-301-0916СпрСЦ 08.2024	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	60	3 659	219 540
3	11	6125-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	41	5 092	208 772
4	12	248-301-0914РСНБ РК 2022	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	21	20 060	421 260
5	13	248-301-0917СпрСЦ 08.2024	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный	шт.	20	12 967	259 340
6	14	СТСпрСЦ 08.2024	Кронштейн крепления извещателя ИО 40920-2	шт.	20	298	5 964
7	15	6125-0601-0601ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	2 844	2 844
8	16	248-304-0301РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	1	2 754	2 754
			Итого по локальной смете: Охранная сигнализация				**1 432 894**
			ИТОГО по акту:				**1 432 894**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	1432894.000 x 6.90%	98 870
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	1432894.000 + 98869.687	1 531 764
	Сметная прибыль, (5.00%)	1531763.687 x 5.00%	76 588
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	1531763.687 x 2.000%	30 635
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		1 638 987
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	1638987.145 x 1.0000	1 638 987
	НДС (12%)	1638987.145 x 12%	196 678

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				1638987.145 + 196678.457	1 835 666

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:06
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:35
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:31
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 12:04
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:32

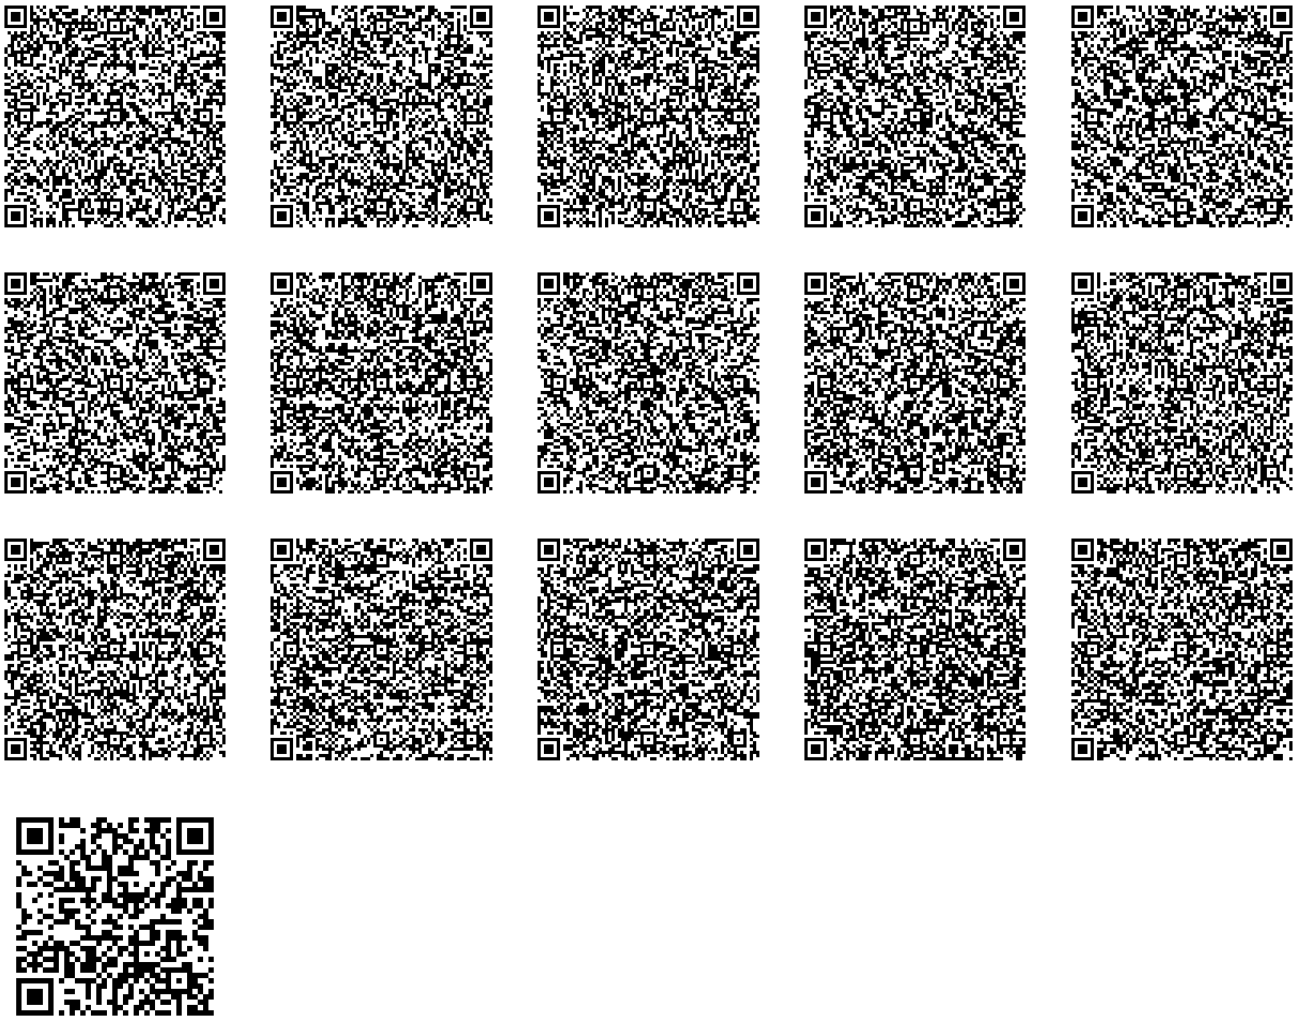

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Пожарная сигнализация				
1	15	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	60	10 174	610 440
2	16	248-302-0233СпрСЦ 08.2024	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	60	7 936	476 160
3	17	6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	18	5 092	91 656
4	18	248-302-0120СпрСЦ 08.2024	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот. R3	шт.	18	22 323	401 814
5	19	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	6	10 174	61 044
6	20	248-302-0403СпрСЦ 08.2024	Извещатель пожарный дымовой линейный Модели ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	шт.	6	139 505	837 030
7	21	6401-0103-2102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6	шт.	42	6 622	278 124
8	22	248-302-0536СпрСЦ 08.2024	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	42	6 564	275 688
9	25	6125-0601-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	4	5 207	20 828
10	26	248-301-0916СпрСЦ 08.2024	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	4	3 659	14 636
			Итого по локальной смете: Пожарная сигнализация				**3 067 420**
			ИТОГО по акту:				**3 067 420**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				3067420.000 x 6.90%	211 652
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				3067420.000 + 211651.983	3 279 072
		Сметная прибыль, (5.00%)				3279071.983 x 5.00%	163 954
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				3279071.983 x 2.000%	65 581
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					3 508 607
		в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000				3508607.022 x 1.0000	3 508 607
		НДС (12%)				3508607.022 x 12%	421 033
		Итого с НДС				3508607.022 + 421032.843	3 929 640

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:02
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:34
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:31
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:11 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 12:01
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:27

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система контроля и управления доступом				
			Раздел: Оборудование и материалы				
1	9	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	100	3 824	382 400
2	10	248-405-0111СпрСЦ 08.2024	PERCo-CT/L04.2, универсальный контроллер с интерфейсом Ethernet	шт.	38	192 997	7 333 886
3	11	248-405-0352СпрСЦ 08.2024	Считыватель PERCo-IR13G	шт.	62	66 993	4 153 566
4	12	6401-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	11	6 622	72 842
5	13	248-405-0119СпрСЦ 08.2024	PERCo-CL05.2, контроллер замка со считывателем EMM/HID, Ethernet	шт.	11	77 288	850 168
6	14	248-405-0402РСНБ РК 2022	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт.	120	101	12 120
7	15	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	49	27 314	1 338 386
8	16	248-306-0340РСНБ РК 2022	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР	шт.	49	29 585	1 449 665
9	17	6401-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	49	12 027	589 323
10	18	248-306-0376СпрСЦ 08.2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	49	15 941	781 109
11	19	6401-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	11	6 622	72 842

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	20	248-405-0514РСНБ РК 2022	DHI-ASF900, кнопка "Выход"	шт.	11	3 578	39 358
13	21	6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	42	5 092	213 864
14	22	248-310-0101РСНБ РК 2022	УДП 513-10 ПУСК, устройство дистанционного пуска	шт.	42	8 514	357 588
15	23	6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	70	5 092	356 440
16	24	248-301-0102РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	70	910	63 700
17	26	6401-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	46	6 622	304 612
18	27	248-405-0605РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный DHI-ASF500A	шт.	14	143 137	2 003 918
19	28	248-405-0606РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный DHI-ASF500B	шт.	28	286 275	8 015 700
20	29	248-303-1002СпрСЦ 08.2024	IDC Мектеп, тревожная кнопка	шт.	4	632 510	2 530 040
			Итого по разделу: Оборудование и материалы				**30 921 527**
			Итого по локальной смете: Система контроля и управления доступом				**30 921 527**
			ИТОГО по акту:				**30 921 527**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	30921527.000 x 6.90%	2 133 585
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	30921527.000 + 2133585.392	33 055 112
	Сметная прибыль, (5.00%)	33055112.392 x 5.00%	1 652 756
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	33055112.392 x 2.000%	661 102
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		35 368 970
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	35368970.260 x 1.0000	35 368 970
	НДС (12%)	35368970.260 x 12%	4 244 276
	Итого с НДС	35368970.260 + 4244276.431	39 613 247

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:08
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:36
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:31
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 16:06
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:18 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:33

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система оповещения и управления эвакуацией				
1	8	6125-1101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	5 588	11 176
2	9	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Удаленная консоль для дистанционного управления системой оповещения "Тромбон" Тромбон - УК	шт.	2	84 989	169 978
3	10	6125-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования станции, пульта, установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством емкость 10 номеров	шт.	1	33 192	33 192
4	11	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Пульт звукового вещания Тромбон ПЗВ-1	шт.	1	192 406	192 406
5	12	6125-0411-0207ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	200	9 585	1 917 000
6	13	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Оповещатель речевой настенный 30/100В 1Вт Глагол Н1-1	шт.	37	7 936	293 635
7	14	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Оповещатель речевой настенный 30/100В 3Вт Глагол Н1-3	шт.	53	8 176	433 302
8	15	СТЕСЦ РСНБ РК 2024	Оповещатель речевой настенный 30/100В 5Вт Глагол Н1-5	шт.	110	8 361	919 682
9	16	6119-0401-0501ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателя светового настенного	шт.	53	3 003	159 159
10	17	248-304-0106РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	53	2 712	143 736
			Итого по локальной смете: Система оповещения и управления эвакуацией				**4 273 266**
			ИТОГО по акту:				**4 273 266**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				4273266.000 x 6.90%	294 855
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4273266.000 + 294855.358	4 568 121
		Сметная прибыль, (5.00%)				4568121.358 x 5.00%	228 406
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				4568121.358 x 2.000%	91 362

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 887 890
		в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000				4887889.853 x 1.0000	4 887 890
		НДС (12%)				4887889.853 x 12%	586 547
		Итого с НДС				4887889.853 + 586546.782	5 474 437

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:08
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:36
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:30
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:34
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:20 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 12:18

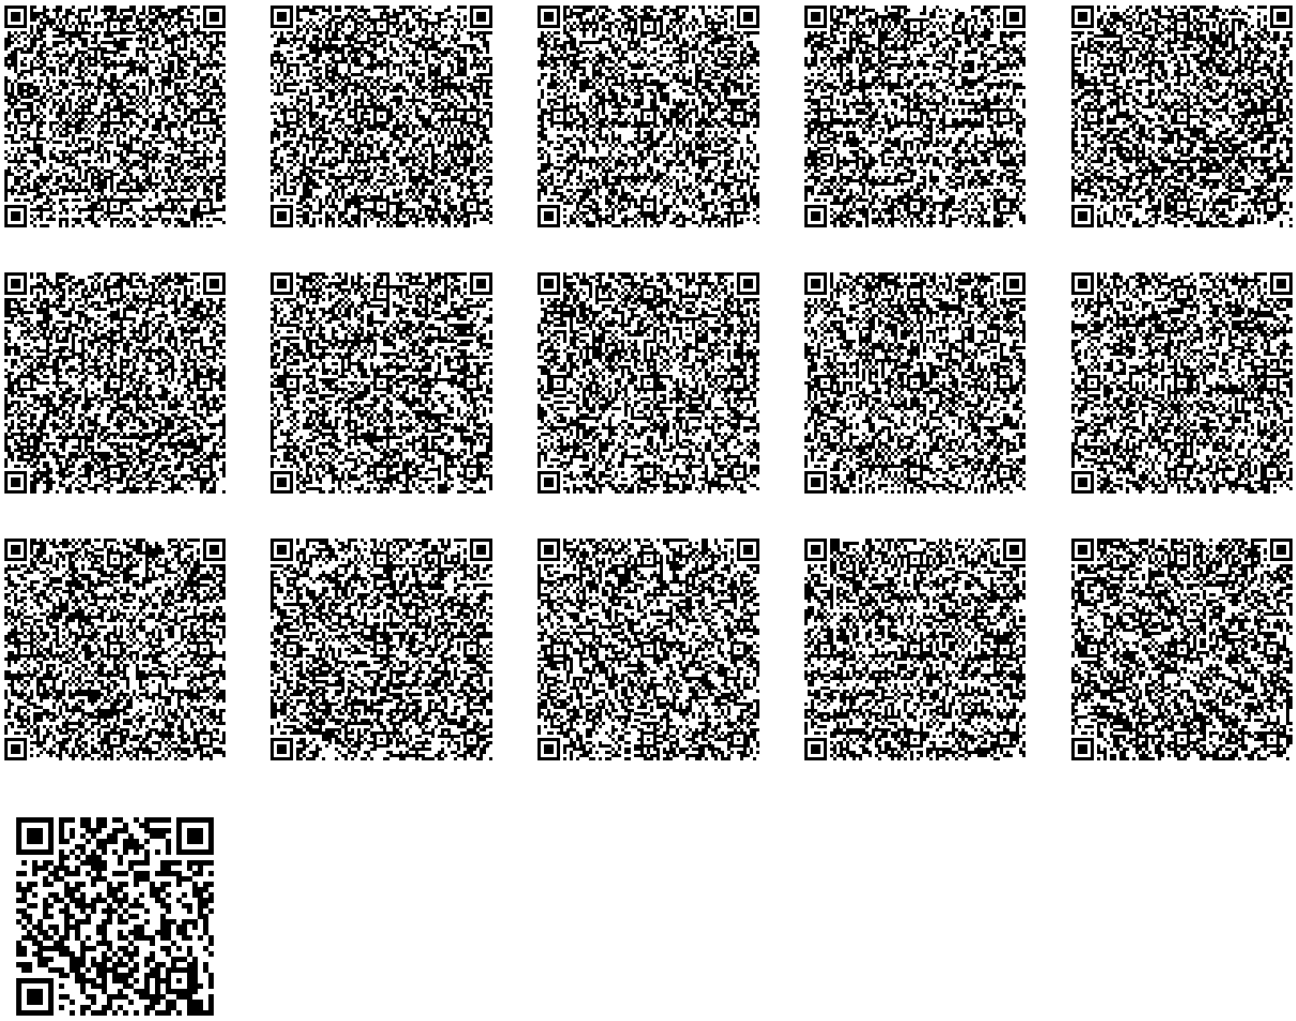

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование				
			Раздел: Кабинеты начальных классов				
1	41	522-101-1215002 СпрСЦ 08.2024	Стол без раковины массивный двухтумбовый с розеткой. Столешница ДСП 16мм с декоративно-пластиковым покрытием, тумбы и стенки ЛДСП 16мм, боковины металлокаркас. Размер 1500x800x800 мм	шт.	8	106 738	853 904
2	43	522-101-1210014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм	шт.	104	58 500	6 084 000
			Итого по разделу: Кабинеты начальных классов				**6 937 904**
			Раздел: Кабинет истории и основ государства и права				
3	211	522-101-1210014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм	шт.	13	58 500	760 500
			Итого по разделу: Кабинет истории и основ государства и права				**760 500**
			Раздел: Кабинет географии				
4	256	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стол демонстрационный. Размеры не менее 1500x800x750мм. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники.Материал ЛДСП. Основание не менее ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,4 мм. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,5 мм.	шт	1	147 483	147 483
5	258	522-101-1210014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм	шт.	13	58 500	760 500
			Итого по разделу: Кабинет географии				**907 983**
			Раздел: Кабинет музыки				
6	321	522-101-1209032 СпрСЦ 08.2024	Стол модульный для груп 600x600x760мм. Столешница квадратная ЛДСП 22мм, кромка ПВХ, металлический каркас труба круглая	шт.	25	57 364	1 434 100
			Итого по разделу: Кабинет музыки				**1 434 100**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнат				
7	342	522-101-1215002 СпрСЦ 08.2024	Стол без раковины массивный двухтумбовый с розеткой. Столешница ДСП 16мм с декоративно-пластиковым покрытием, тумбы и стенки ЛДСП 16мм, боковины металлокаркас. Размер 1500x800x800 мм	шт.	1	106 738	106 738
8	344	522-101-1210014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм	шт.	13	58 500	760 500
9	345	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Место дневального (тумбочка и подставка)	шт	1	50 360	50 360
			Итого по разделу: Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнат				**917 598**
			Раздел: STEM-лаборатория				
10	407	521-301-2901033 СпрСЦ 08.2024	Верстак бестумбовый со столешницей из деревяного бруса (CraftLab). Размер 2500x1200x1050	шт.	1	792 893	792 893
11	409	521-301-1805006 СпрСЦ 08.2024	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас, размер 1800x750x900	шт.	1	441 214	441 214
12	411	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стол модульный на 12 учеников	комплект	1	584 176	584 176
13	414	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Тумба для 3D-принтера	шт	1	120 864	120 864
14	415	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Тумба лабораторная на колесах	шт	2	18 129	36 259
15	418	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф с выдвижными лотками	шт	1	179 857	179 857
			Итого по разделу: STEM-лаборатория				**2 155 263**
			Раздел: Кабинет робототехники				
16	448	521-305-0138001 СпрСЦ 08.2024	Стол для полей (2430мм x1200мм) с бортиками и 4 выкатными тумбочками (CraftLab)	шт.	1	680 229	680 229
17	449	522-101-1209008 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический одноместный для групповых работ. Столешница 690x590мм, ЛДСП 22мм. Каркас - цельносварная металлическая труба диаметром 50x25x1,5мм, труба усилитель 25x20x1мм.	шт.	6	27 878	167 268
18	453	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Тумба для 3D-принтера	шт	1	120 864	120 864
19	454	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф с выдвижными лотками	шт	1	179 857	179 857
			Итого по разделу: Кабинет робототехники				**1 148 218**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования"				
20	481	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт	25	29 015	725 386
			Итого по разделу: Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования"				**725 386**
			Раздел: Мастерская по разделу "Дизайн и технология"				
21	627	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Комплект столов под швейную машинку на 12 учащихся	комплект	1	785 616	785 616
			Итого по разделу: Мастерская по разделу "Дизайн и технология"				**785 616**
			Раздел: Кабинет физики с лаборантской				
22	653	522-101-1211003 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200х600х750мм.	шт.	13	117 008	1 521 104
			Итого по разделу: Кабинет физики с лаборантской				**1 521 104**
			Раздел: Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и Е-библиотекой				
23	999	522-101-1209004 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с полиуретановой кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 600х500мм	шт.	4	50 399	201 596
			Итого по разделу: Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и Е-библиотекой				**201 596**
			Раздел: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобра				
			Подраздел: Р Кабинет психолога				
24	1071	522-101-1221003 СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования, размер спинки и сиденья согласно ГОСТ СТ РК EN 1729-1-2019	шт.	2	32 390	64 780
			Итого по подразделу: Р Кабинет психолога				**64 780**
			Подраздел: Р Кабинет социального педагога				
25	1091	522-101-1221003 СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования, размер спинки и сиденья согласно ГОСТ СТ РК EN 1729-1-2019	шт.	4	32 390	129 560
			Итого по подразделу: Р Кабинет социального педагога				**129 560**
			Подраздел: Р Кабинет логопеда (логопедический пункт)				
26	1112	522-101-1221003 СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования, размер спинки и сиденья согласно ГОСТ СТ РК EN 1729-1-2019	шт.	4	32 390	129 560
			Итого по подразделу: Р Кабинет логопеда (логопедический пункт)				**129 560**
			Подраздел: Р Оборудование и мебель для кабинетов поддержки инклюзивного образования при организациях образования				
27	1129	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт	18	29 015	522 278
			Итого по подразделу: Р Оборудование и мебель для кабинетов поддержки инклюзивного образования при организациях образования				**522 278**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобра				**846 178**
			Раздел: Кабинет - юриста проф ориентатора				
28	1259	522-101-1210014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	1	58 500	58 500
29	1260	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт	2	29 015	58 031
			Итого по разделу: Кабинет - юриста проф ориентатора				**116 531**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование				**18 457 977**
			ИТОГО по акту:				**18 457 977**
			В том числе оборудование:				**18 457 977**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	0.000 x 6.90%	0
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	18457977.000 + 0.000	18 457 977
	Сметная прибыль, (5.00%)	0.000 x 5.00%	0
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	18457977.000 x 2.000%	369 160
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		18 827 137
	в ценах 1,2 квартала 2024 г. , к = 1.0000	18827136.540 x 1.0000	18 827 137
	НДС (12%)	18827136.540 x 12%	2 259 256
	Итого с НДС	18827136.540 + 2259256.385	21 086 393

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	24.10.2025 15:20
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	24.10.2025 15:24
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	24.10.2025 15:24
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	28.10.2025 10:07
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	28.10.2025 16:01 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	28.10.2025 16:15

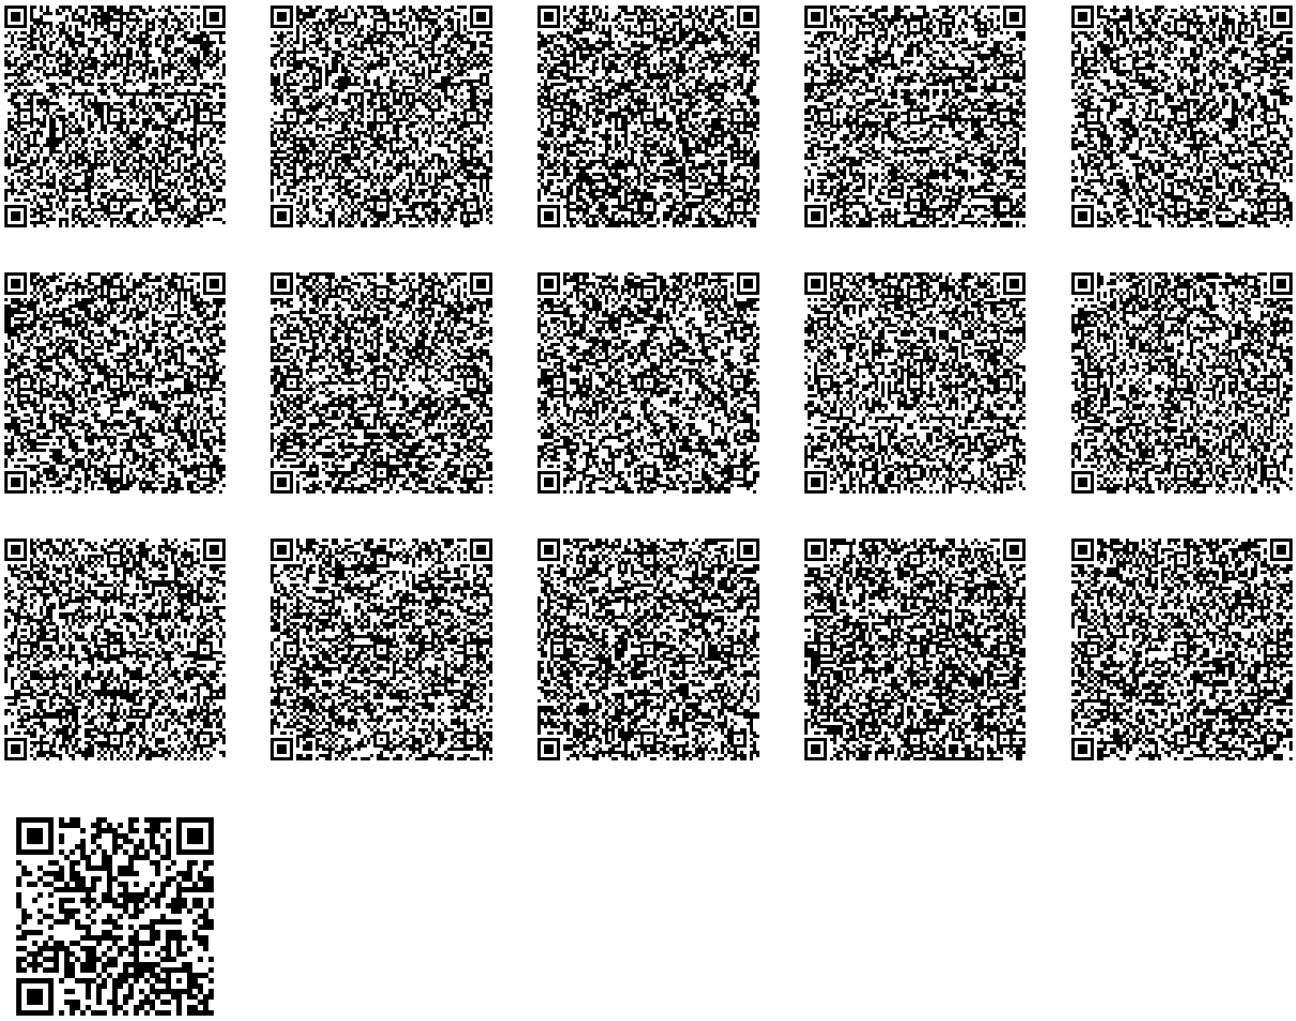

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование				
			Раздел: Учебный кабинет предшкольных классов.				
1	1	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290 118
2	4	522-101-1209014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 700х500мм	шт.	50	43 609	2 180 450
3	5	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируется по высоте h-340/380мм. Каркас металический из плосковальной трубы 50х25 и 40х20 . Сиденье и спинка и полого полипропиленого пластика	шт	50	29 015	1 450 771
4	6	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	4	79 671	318 684
			Итого по разделу: Учебный кабинет предшкольных классов.				**4 240 023**
			Раздел: Игровая комната предшкольных классов				
			Подраздел: Р Мебель для игровой комнаты				
5	27	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф для хранения игрушек и пособий	шт	2	75 540	151 080
			Итого по подразделу: Р Мебель для игровой комнаты				**151 080**
			Итого по разделу: Игровая комната предшкольных классов				**151 080**
			Раздел: Кабинеты начальных классов				
6	40	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	8	145 059	1 160 472

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	44	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380[375 мм и спинки 440[260 мм)	шт	200	29 015	5 803 084
8	45	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	16	79 671	1 274 736
			Итого по разделу: Кабинеты начальных классов				**8 238 292**
			Раздел: Кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления в начальной школе (казахский Я2/ русский Я2/ английский Я3)				
9	118	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
10	120	522-101-1209014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 700х500мм	шт.	13	43 609	566 917
11	121	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380[375 мм и спинки 440[260 мм)	шт	13	29 015	377 200
12	122	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
13	126	522-101-0602001 СпрСЦ 08.2024	Документ-камера	шт.	1	135 804	135 804
			Итого по разделу: Кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления в начальной школе (казахский Я2/ русский Я2/ английский Я3)				**1 304 651**
			Раздел: Кабинет казахского языка и литературы				
14	134	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290 118
15	136	522-101-1210014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	26	58 500	1 521 000
16	137	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380[375 мм и спинки 440[260 мм)	шт	50	29 015	1 450 771
17	138	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159 342
18	139	522-101-1231006 СпрСЦ 08.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм. ЛДСП 16мм	шт.	2	58 627	117 254
			Итого по разделу: Кабинет казахского языка и литературы				**3 538 485**
			Раздел: Кабинет английского языка				
19	147	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	3	145 059	435 177

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	149	522-101-1209014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 700х500мм	шт.	39	43 609	1 700 751
21	151	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируется по высоте h-340/380мм. Каркас металический из плосковальной трубы 50х25 и 40х20 . Сиденье и спинка и полого полипропиленого пластика	шт	39	29 015	1 131 601
22	152	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	79 671	239 013
23	153	522-101-1231006 СпрСЦ 08.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм. ЛДСП 16мм	шт.	3	58 627	175 881
			Итого по разделу: Кабинет английского языка				**3 682 423**
			Раздел: Кабинет математики				
24	163	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290 118
25	165	522-101-1210014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	26	58 500	1 521 000
26	167	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	4	79 671	318 684
			Итого по разделу: Кабинет математики				**2 129 802**
			Раздел: Кабинет русского языка и литературы				
27	195	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290 118
28	197	522-101-1210014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	14	58 500	819 000
29	198	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380[375 мм и спинки 440[260 мм)	шт	28	29 015	812 432
30	199	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159 342
31	200	522-101-1231006 СпрСЦ 08.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм. ЛДСП 16мм	шт.	2	58 627	117 254
			Итого по разделу: Кабинет русского языка и литературы				**2 198 146**
			Раздел: Кабинет истории и основ государства и права				
32	209	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	212	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380[375 мм и спинки 440[260 мм)	шт	25	29 015	725 386
34	213	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
35	214	522-101-1231006 СпрСЦ 08.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	58 627	58 627
			Итого по разделу: Кабинет истории и основ государства и права				**1 008 743**
			Раздел: Кабинет географии				
36	255	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
37	260	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
			Итого по разделу: Кабинет географии				**224 730**
			Раздел: Кабинет музыки				
38	324	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
39	325	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт	24	32 623	782 957
40	326	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф для музыкальных инструментов и нот с открытыми и закрытыми полками, а также креплениями для инструментов	шт	1	151 080	151 080
			Итого по разделу: Кабинет музыки				**1 079 096**
			Раздел: Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатик				
41	375	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
42	377	522-101-1209010 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с полипропиленовой кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, встроенный пенал, основание металлокаркас. Размер столешницы 700х500мм	шт.	13	54 902	713 726
43	379	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
			Итого по разделу: Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатик				**938 456**
			Раздел: Кабинет информатики (IT-класс)				
44	395	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	398	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
			Итого по разделу: Кабинет информатики (IT-класс)				**224 730**
			Раздел: STEM-лаборатория				
46	412	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
47	413	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)	шт	12	29 015	348 185
48	417	521-103-0301002 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	45 864	91 728
			Итого по разделу: STEM-лаборатория				**584 972**
			Раздел: Кабинет робототехники				
49	450	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
50	451	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стол с бортиками двухместный	шт	6	65 468	392 808
51	452	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)	шт	12	29 015	348 185
52	455	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
			Итого по разделу: Кабинет робототехники				**965 723**
			Раздел: Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования"				
53	476	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
54	479	522-101-1209014 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 700x500мм	шт.	25	43 609	1 090 225
55	482	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159 342
			Подраздел: Р Мебель				
56	499	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159 342
			Итого по подразделу: Р Мебель				**159 342**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования"				**1 553 968**
			Раздел: Мастерская по разделу "Культура дома" и "Гончарная студия" (совм				
57	518	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
58	520	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф для одежды двухсекционный с 800х500х2000 мм	шт	1	75 540	75 540
59	521	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф закрытый 800х450х2000 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые	шт	2	83 274	166 549
60	522	522-101-1231005 СпрСЦ 08.2024	Шкаф инструментальный 1000х500х2000 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые	шт.	1	107 005	107 005
61	523	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159 342
			Итого по разделу: Мастерская по разделу "Культура дома" и "Гончарная студия" (совм				**653 495**
			Раздел: Мастерская по разделу "Культура питания"				
			Подраздел: Р Комплект кухонной мебели:				
62	604	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф для одежды двухсекционный с 800х500х2000 мм	шт	1	75 540	75 540
63	605	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
			Итого по подразделу: Р Комплект кухонной мебели:				**220 599**
			Итого по разделу: Мастерская по разделу "Культура питания"				**220 599**
			Раздел: Мастерская по разделу "Дизайн и технология"				
64	626	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
65	631	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф для одежды двухсекционный с 800х500х2000 мм	шт	1	75 540	75 540
66	632	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159 342
			Итого по разделу: Мастерская по разделу "Дизайн и технология"				**379 941**
			Раздел: Кабинет физики с лаборантской				
67	650	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р Мебель для лаборантской				
68	657	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
69	660	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф закрытый	шт	2	151 080	302 160
70	661	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф открытый	шт	2	80 576	161 152
			Итого по подразделу: Р Мебель для лаборантской				**608 371**
			Итого по разделу: Кабинет физики с лаборантской				**753 430**
			Раздел: Кабинет биологии с лаборантской				
71	755	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
72	760	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159 342
			Подраздел: Р Мебель для лаборантской				
73	761	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
74	764	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф закрытый	шт	2	151 080	302 160
75	765	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф открытый	шт	2	80 576	161 152
			Итого по подразделу: Р Мебель для лаборантской				**608 371**
			Итого по разделу: Кабинет биологии с лаборантской				**912 772**
			Раздел: Кабинет химии с лаборантской				
76	812	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
77	817	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159 342
			Подраздел: Р Мебель для лаборантской				
78	818	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	821	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф закрытый	шт	2	151 080	302 160
80	822	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф открытый	шт	2	80 576	161 152
			Итого по подразделу: Р Мебель для лаборантской				**608 371**
			Итого по разделу: Кабинет химии с лаборантской				**912 772**
			Раздел: Кабинет руководителя организации образования				
81	868	522-101-1233033 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1990мм, две распашные двери в нижней части, верхние открытые полки, ЛДСП 16мм	шт.	2	88 125	176 250
			Итого по разделу: Кабинет руководителя организации образования				**176 250**
			Раздел: Приемная-кабинет делопроизводства				
82	876	522-101-1233009 СпрСЦ 08.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	58 570	58 570
83	877	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Стеллаж для документов	шт	1	75 909	75 909
			Итого по разделу: Приемная-кабинет делопроизводства				**134 479**
			Раздел: Методический кабинет/учительская(2 шт. на 2 и 3 этажах)				
84	884	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	4	79 671	318 684
			Итого по разделу: Методический кабинет/учительская(2 шт. на 2 и 3 этажах)				**318 684**
			Раздел: Кабинет заместителя руководителя				
85	894	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
			Итого по разделу: Кабинет заместителя руководителя				**79 671**
			Раздел: Бухгалтерия				
86	901	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
			Итого по разделу: Бухгалтерия				**79 671**
			Раздел: Отдел кадров				
87	908	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
			Итого по разделу: Отдел кадров				**79 671**
			Раздел: Кабинет преподавателей физической культуры				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	913	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
89	916	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
			Итого по разделу: Кабинет преподавателей физической культуры				**224 730**
			Раздел: Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и Е-библиотекой				
90	1003	522-101-1233004 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
			Итого по разделу: Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и Е-библиотекой				**79 671**
			Раздел: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобра				
			Подраздел: Р Кабинет психолога				
91	1064	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
			Итого по подразделу: Р Кабинет психолога				**145 059**
			Подраздел: Р Кабинет социального педагога				
92	1086	522-101-1233033 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1990мм, две распашные двери в нижней части, верхние открытые полки, ЛДСП 16мм	шт.	1	88 125	88 125
			Итого по подразделу: Р Кабинет социального педагога				**88 125**
			Подраздел: Р Кабинет логопеда (логопедический пункт)				
93	1105	522-101-1233033 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1990мм, две распашные двери в нижней части, верхние открытые полки, ЛДСП 16мм	шт.	2	88 125	176 250
			Итого по подразделу: Р Кабинет логопеда (логопедический пункт)				**176 250**
			Подраздел: Р Оборудование и мебель для кабинетов поддержки инклюзивного образования при организациях образования				
94	1128	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
95	1130	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф для одежды двухсекционный с 800х500х2000 мм	шт	2	75 540	151 080
			Итого по подразделу: Р Оборудование и мебель для кабинетов поддержки инклюзивного образования при организациях образования				**296 139**
			Итого по разделу: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобра				**705 573**
			Раздел: Кабинет врача/процедурная				
96	1165	522-101-1233009 СпрСЦ 08.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	58 570	117 140

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	1167	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290 118
			Итого по разделу: Кабинет врача/процедурная				**407 258**
			Раздел: Спортзал для младшей школы				
98	1195	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
			Итого по разделу: Спортзал для младшей школы				**145 059**
			Раздел: Комнаты охраны				
99	1254	522-101-1233009 СпрСЦ 08.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850x400x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	58 570	58 570
100	1255	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф для одежды двухсекционный с 800x500x2000 мм	шт	1	75 540	75 540
			Итого по разделу: Комнаты охраны				**134 110**
			Раздел: Кабинет - юриста проф ориентатора				
101	1256	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
102	1258	522-101-1233009 СпрСЦ 08.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850x400x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	58 570	58 570
			Итого по разделу: Кабинет - юриста проф ориентатора				**203 629**
			Раздел: Пом. №89. Кабинет заведующего производством (столовой).				
103	1352	522-101-1205003 СпрСЦ 08.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145 059
104	1356	522-101-1231001 СпрСЦ 08.2024	Шкаф закрытый 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые	шт.	1	82 857	82 857
			Итого по разделу: Пом. №89. Кабинет заведующего производством (столовой).				**227 916**
			Раздел: Пом. №85. Гардеробная персонал				
105	1358	522-101-1229005 СпрСЦ 08.2024	Шкаф для одежды 600x450x1800 мм	шт.	6	44 643	267 858
			Итого по разделу: Пом. №85. Гардеробная персонал				**267 858**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование				**39 160 559**
			ИТОГО по акту:				**39 160 559**
			В том числе оборудование:				**39 160 559**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)			0.000 x 6.90%	0
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			39160559.000 + 0.000	39 160 559
			Сметная прибыль, (5.00%)			0.000 x 5.00%	0
			Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)			39160559.000 x 2.000%	783 211
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				39 943 770
			в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000			39943770.180 x 1.0000	39 943 770
			НДС (12%)			39943770.180 x 12%	4 793 252
			Итого с НДС			39943770.180 + 4793252.422	44 737 023

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:13
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:37
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:30
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 16:27
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 18:25 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:35

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электрочасофикация. Звонковая сигнализация				
			Раздел: Электрочасофикация				
1	3	6125-0602-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних	шт.	25	9 289	232 225
2	4	518-203-0202СпрСЦ 08.2024	Standing 114, 448 мм x 186 мм x 12 мм, 220В, температур от -10 до +45	шт.	25	89 406	2 235 150
3	5	6401-0103-2002ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	шт.	25	7 481	187 025
4	6	518-203-0301СпрСЦ 08.2024	Standing-BGR, блок гальванической развязки	шт.	25	10 343	258 575
5	7	6401-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 103	54 927
6	8	518-203-0302СпрСЦ 08.2024	Standing-AUS, активный усилитель сигнала и напряжения	шт.	9	88 129	793 161
7	9	6125-0601-0303ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	27 314	27 314
8	10	248-306-0901СпрСЦ 08.2024	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В	шт.	1	48 018	48 018
			Итого по разделу: Электрочасофикация				**3 836 395**
			Итого по локальной смете: Электрочасофикация. Звонковая сигнализация				**3 836 395**
			ИТОГО по акту:				**3 836 395**
			В том числе оборудование:				**3 286 886**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	549509.000 x 6.90%	37 916
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	3836395.000 + 37916.122	3 874 311
	Сметная прибыль, (5.00%)	587425.122 x 5.00%	29 371
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	3874311.122 x 2.000%	77 486

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					3 981 169
		в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000				3981168.600 x 1.0000	3 981 169
		НДС (12%)				3981168.600 x 12%	477 740
		Итого с НДС				3981168.600 + 477740.232	4 458 909

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:06
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:35
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:31
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:16 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 16:03
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:32

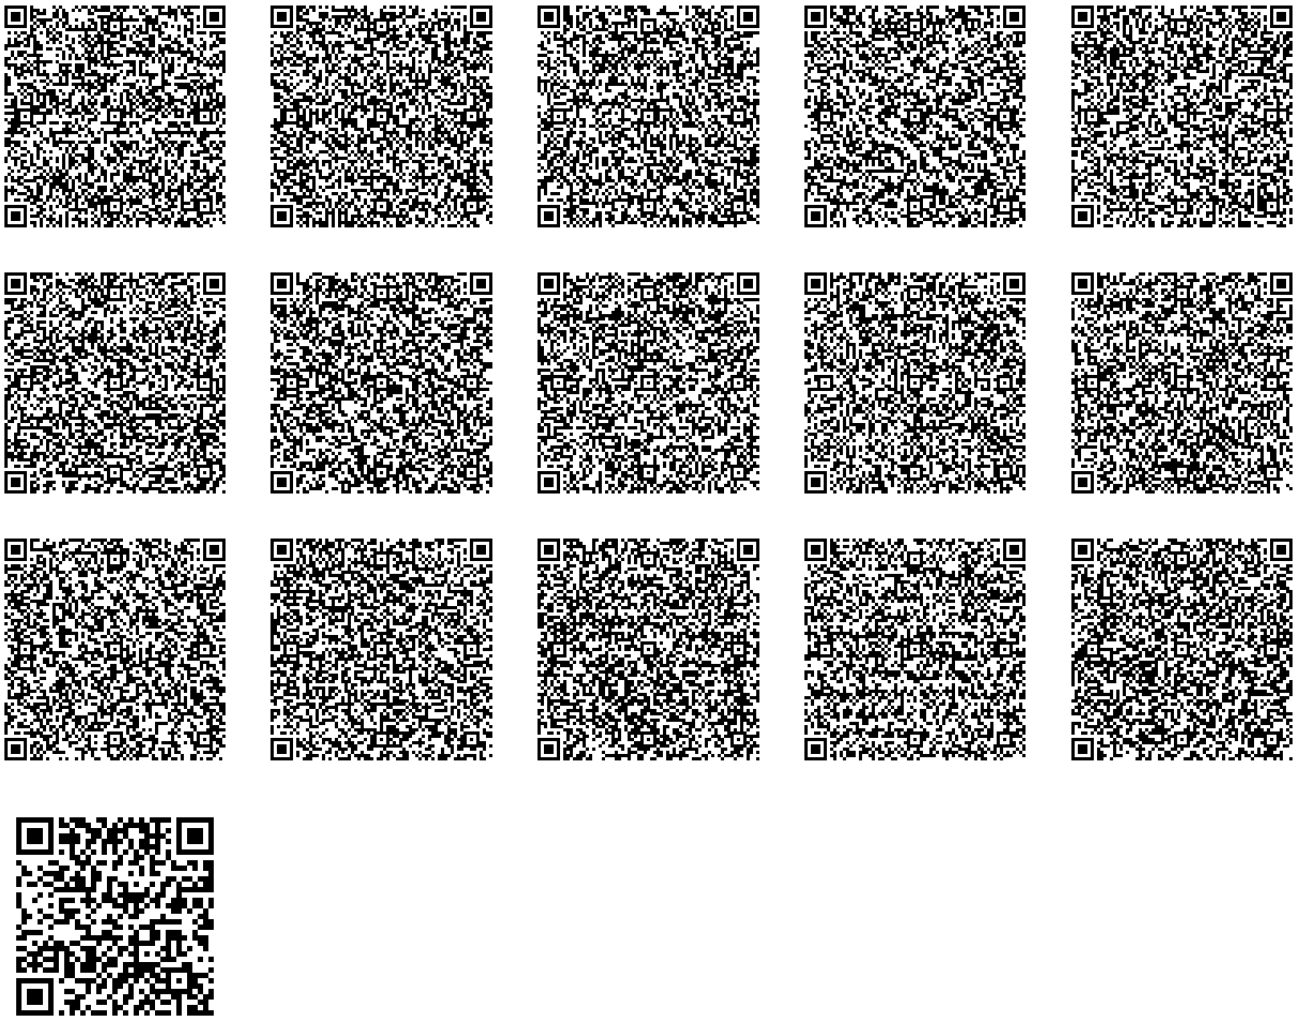

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-планировочные решения (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №2 от 04.09.2025 г.)				
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип IV				
1	21	6109-0201-0502ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	101.16	2 540	256 946
2	22	6109-0308-0105ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2	1329.315	3 056	4 062 387
			Итого по подразделу: Тип IV				**4 319 333**
			Подраздел: Тип XIII				
3	29	6109-0308-0105ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2	30.2343	3 056	92 396
			Итого по подразделу: Тип XIII				**92 396**
			Итого по разделу: Полы				**4 411 729**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-планировочные решения (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №2 от 04.09.2025 г.)				**4 411 729**
			ИТОГО по акту:				**4 411 729**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	4411728.815 x 6.90%	304 409
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4411728.815 + 304409.292	4 716 138
	Сметная прибыль, (5.00%)	4716138.107 x 5.00%	235 807
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	4716138.107 x 2.000%	94 323
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		5 046 268
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	5046267.775 x 1.0000	5 046 268
	НДС (12%)	5046267.775 x 12%	605 552
	Итого с НДС	5046267.775 + 605552.133	5 651 820

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:27
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:38
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:30
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:41
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:25 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 16:20

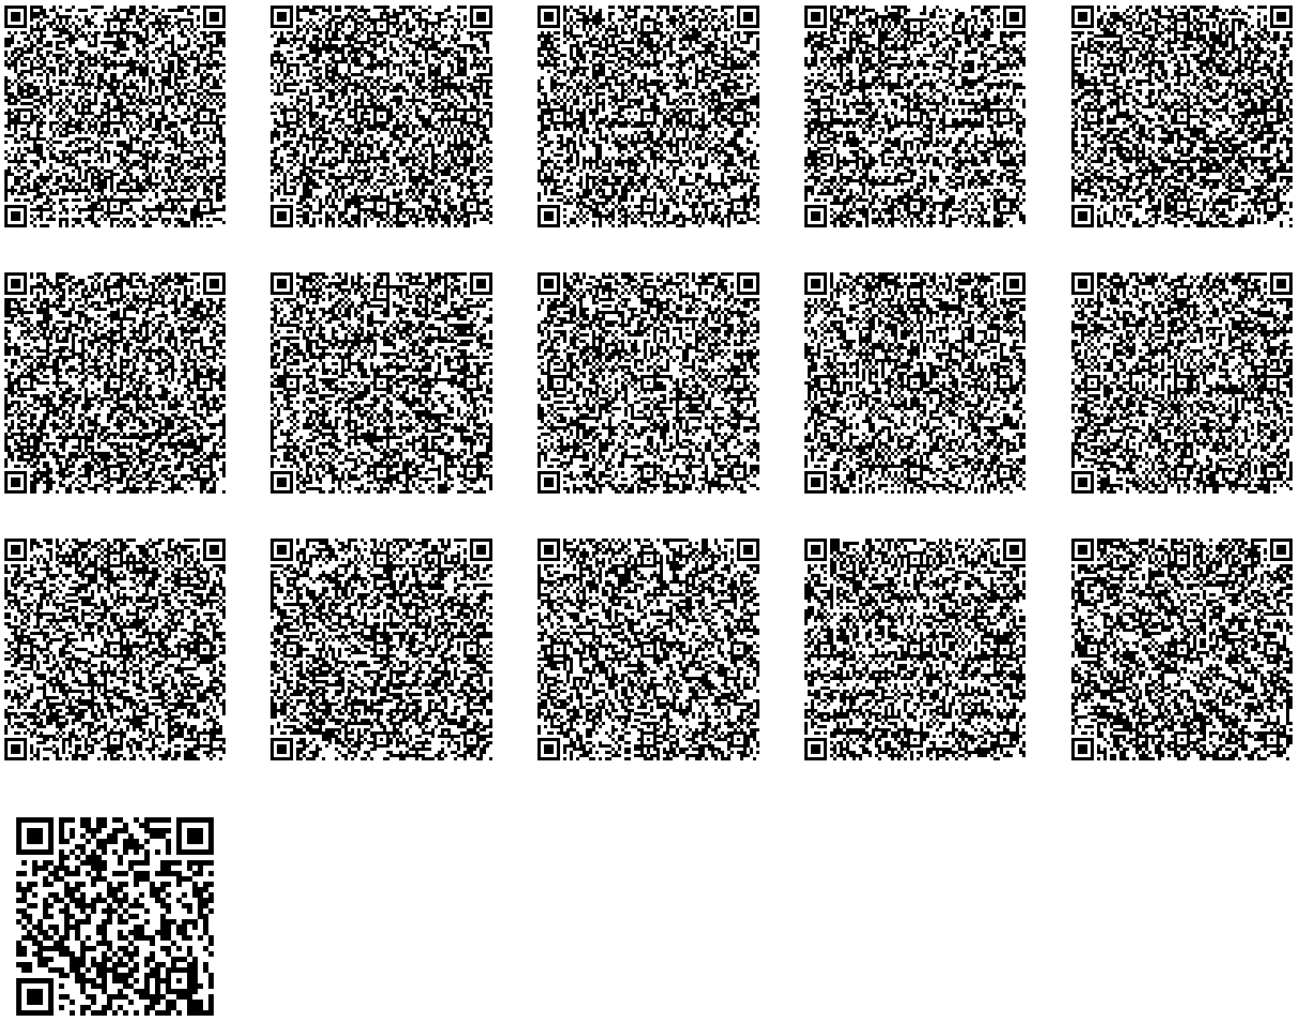

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Автоматическое газовое пожаротушение				
1	1	1312-0701-0801РСНБ РК 2022	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	1	9 157	9 157
2	2	248-310-0103СпрСЦ 08.2024	МПТ-1, модуль автоматики пожаротушения	шт.	1	119 449	119 449
3	3	6401-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 103	6 103
4	4	248-305-1301СпрСЦ 08.2024	ЭДУ-ПТ Рубеж, элемент дистанционного управления	шт.	1	19 017	19 017
5	5	6125-1101-0701ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	4 384	4 384
6	6	248-306-0833СпрСЦ 08.2024	Модуль контроля и управления РМ-4К-R3, модуль релейный	шт.	1	27 184	27 184
7	7	1312-0701-0801РСНБ РК 2022	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	2	9 157	18 314
8	8	248-305-0826СпрСЦ 08.2024	Модуль пожаротушения газовый МПТГ-С-20 "FIREX" 25-20-20	шт.	2	265 374	530 748
9	9	261-107-0891РСНБ РК 2022	Фреон	т	0.058	854 190	49 543
10	10	6125-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	5 092	5 092
11	11	248-301-0102РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	1	910	910
12	12	6125-0601-0303ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	27 314	27 314
13	13	248-306-0340РСНБ РК 2022	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2 х7-Р БР	шт.	1	29 585	29 585
14	14	6125-0601-0601ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарногосветозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	4	2 844	11 376

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	248-304-0106РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	1	2 712	2 712
16	16	248-304-0106РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	1	2 712	2 712
17	17	248-304-0106РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	1	2 712	2 712
18	18	248-304-0301РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	1	2 754	2 754
19	19	1308-0105-0101РСНБ РК 2022	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	12 027	24 054
20	20	248-306-0376СпрСЦ 08.2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882
21	21	6119-0102-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	28	795	22 260
22	22	243-305-0301РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	7.14	86	614
23	23	243-305-0303РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	11.22	118	1 324
24	24	243-305-0307СпрСЦ 08.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	10.2	344	3 509
25	25	6119-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	72	1 367	98 424
26	26	241-207-0202РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	50.5	88	4 444
27	27	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	22.22	54	1 200
			Итого по локальной смете: Автоматическое газовое пожаротушение				**1 056 777**
			ИТОГО по акту:				**1 056 777**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	1056777.000 x 6.90%	72 918
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	1056777.000 + 72917.614	1 129 695
	Сметная прибыль, (5.00%)	1129694.614 x 5.00%	56 485
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	1129694.614 x 2.000%	22 594
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		1 208 773
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	1208773.237 x 1.0000	1 208 773
	НДС (12%)	1208773.237 x 12%	145 053
	Итого с НДС	1208773.237 + 145052.788	1 353 826

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:02
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:34
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:31
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 16:10
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:13 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:28

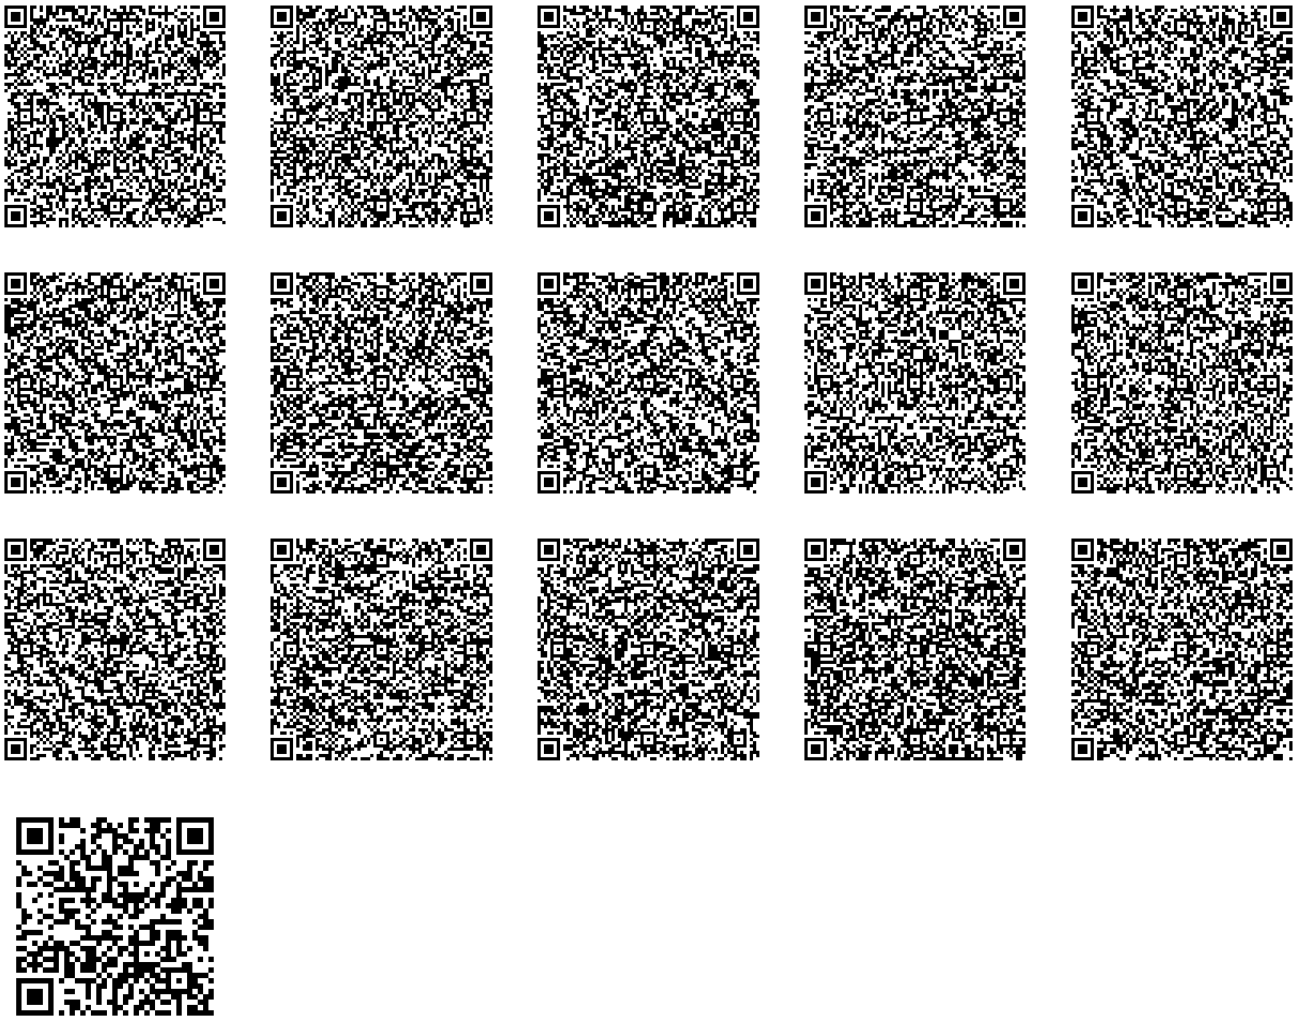

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-планировочные решения (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №2 от 04.09.2025 г.)				
			Раздел: Внутренняя отделка потолков				
			Подраздел: Реечный потолок по дизайн-проекту в Вестибюле				
1	7	6112-0501-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	79.56	5 738	456 515
2	8	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	83.538	5 045	421 449
			Итого по подразделу: Реечный потолок по дизайн-проекту в Вестибюле				**877 964**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка потолков				**877 964**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-планировочные решения (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №2 от 04.09.2025 г.)				**877 964**
			ИТОГО по акту:				**877 964**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	877964.000 x 6.90%	60 580
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	877964.000 + 60579.517	938 544
	Сметная прибыль, (5.00%)	938543.517 x 5.00%	46 927
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	938543.517 x 2.000%	18 771
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		1 004 242
	в ценах 1,2 квартала 2024 г. , к = 1.0000	1004241.563 x 1.0000	1 004 242
	НДС (12%)	1004241.563 x 12%	120 509
	Итого с НДС	1004241.563 + 120508.988	1 124 751

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	07.10.2025 14:28
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	07.10.2025 14:38
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	07.10.2025 14:30
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	07.10.2025 15:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	07.10.2025 15:30
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	07.10.2025 16:24

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-планировочные решения				
			Раздел: Окна /Лист-13/				
			Подраздел: Подоконники				
1	55	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	30.1	3 166	95 297
2	56	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	30.1	2 347	70 645
			Итого по подразделу: Подоконники				**165 941**
			Подраздел: Откосы и отливы				
3	58	6111-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	31	35 055	1 086 705
4	59	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	29.76	16 362	486 933
5	60	6107-0205-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе	м откоса	1593.7	1 842	2 935 595
6	61	232-105-0301 РСНБ РК 2022	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	м2	620	1 451	899 620
			Итого по подразделу: Откосы и отливы				**5 408 853**
			Итого по разделу: Окна /Лист-13/				**5 574 794**
			Раздел: Внутренняя отделка стен				
			Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	147	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	4621.74	799	3 692 770
			Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска				**3 692 770**
			Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска				
8	150	6112-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м2	692.37	1 218	843 307
			Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска				**843 307**
			Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска				
9	155	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	4340.41	799	3 467 988
			Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+ВЭ покраска				**3 467 988**
			Подраздел: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска				
10	158	6112-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м2	99.57	1 218	121 276
			Итого по подразделу: Улучш.штукатурка+выравнивание+простая масляная окраска				**121 276**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка стен				**8 125 341**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип II				
11	220	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	212.4	6 899	1 465 348
12	221	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	216.648	3 066	664 243
			Итого по подразделу: Тип II				**2 129 590**
			Подраздел: Тип III				
13	227	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	180.69	5 882	1 062 819
14	228	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	184.3038	7 520	1 385 965
			Итого по подразделу: Тип III				**2 448 783**
			Подраздел: Тип V				
15	240	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	790.12	2 540	2 006 905
			Итого по подразделу: Тип V				**2 006 905**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Тип VI				
16	248	6106-0306-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж съемного металлического покрытия полов, размер 500х500 мм из стальных штампованных плит	м2	10.35	23 305	241 207
17	249	233-202-0501 СпрСЦ 08.2024	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м2, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке	м2	10.35	94 479	977 858
			Итого по подразделу: Тип VI				**1 219 065**
			Подраздел: Тип VII				
18	254	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1555034	63 196	9 827
19	255	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1555034	397 364	61 791
			Итого по подразделу: Тип VII				**71 618**
			Подраздел: Тип XI				
20	258	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3.582	26 173	93 752
21	259	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	2.8656	33 951	97 290
22	262	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	35.82	5 882	210 693
23	263	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	36.5364	7 520	274 754
			Итого по подразделу: Тип XI				**676 489**
			Подраздел: Тип I				
24	285	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	48.12	5 882	283 042
25	286	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	49.0824	7 520	369 100
			Итого по подразделу: Тип I				**652 141**
			Подраздел: Тип IV				
26	302	233-101-0115 СпрСЦ 08.2024	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC	м2	1488.8328	4 613	6 867 986
			Итого по подразделу: Тип IV				**6 867 986**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Тип XIII				
27	306	233-101-0115 СпрСЦ 08.2024	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC	м2	33.8624	4 613	156 207
			Итого по подразделу: Тип XIII				**156 207**
			Подраздел: Тип II				
28	317	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	92.25	5 616	518 076
29	318	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	92.25	3 367	310 606
			Итого по подразделу: Тип II				**828 682**
			Итого по разделу: Полы				**17 057 467**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-планировочные решения				**30 757 602**
			ИТОГО по акту:				**30 757 602**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)	30757601.881 x 6.90%	2 122 275
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	30757601.881 + 2122274.559	32 879 876
	Сметная прибыль, (5.00%)	32879876.441 x 5.00%	1 643 994
	Непредвиденные расходы, (2.000%)	32879876.441 x 2.000%	657 598
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		35 181 468
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	35181467.791 x 1.0000	35 181 468
	НДС (12%)	35181467.791 x 12%	4 221 776
	Итого с НДС	35181467.791 + 4221776.135	39 403 244

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	16.10.2025 16:58
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	16.10.2025 17:02
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	16.10.2025 16:59
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 17:51
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 18:39 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:40

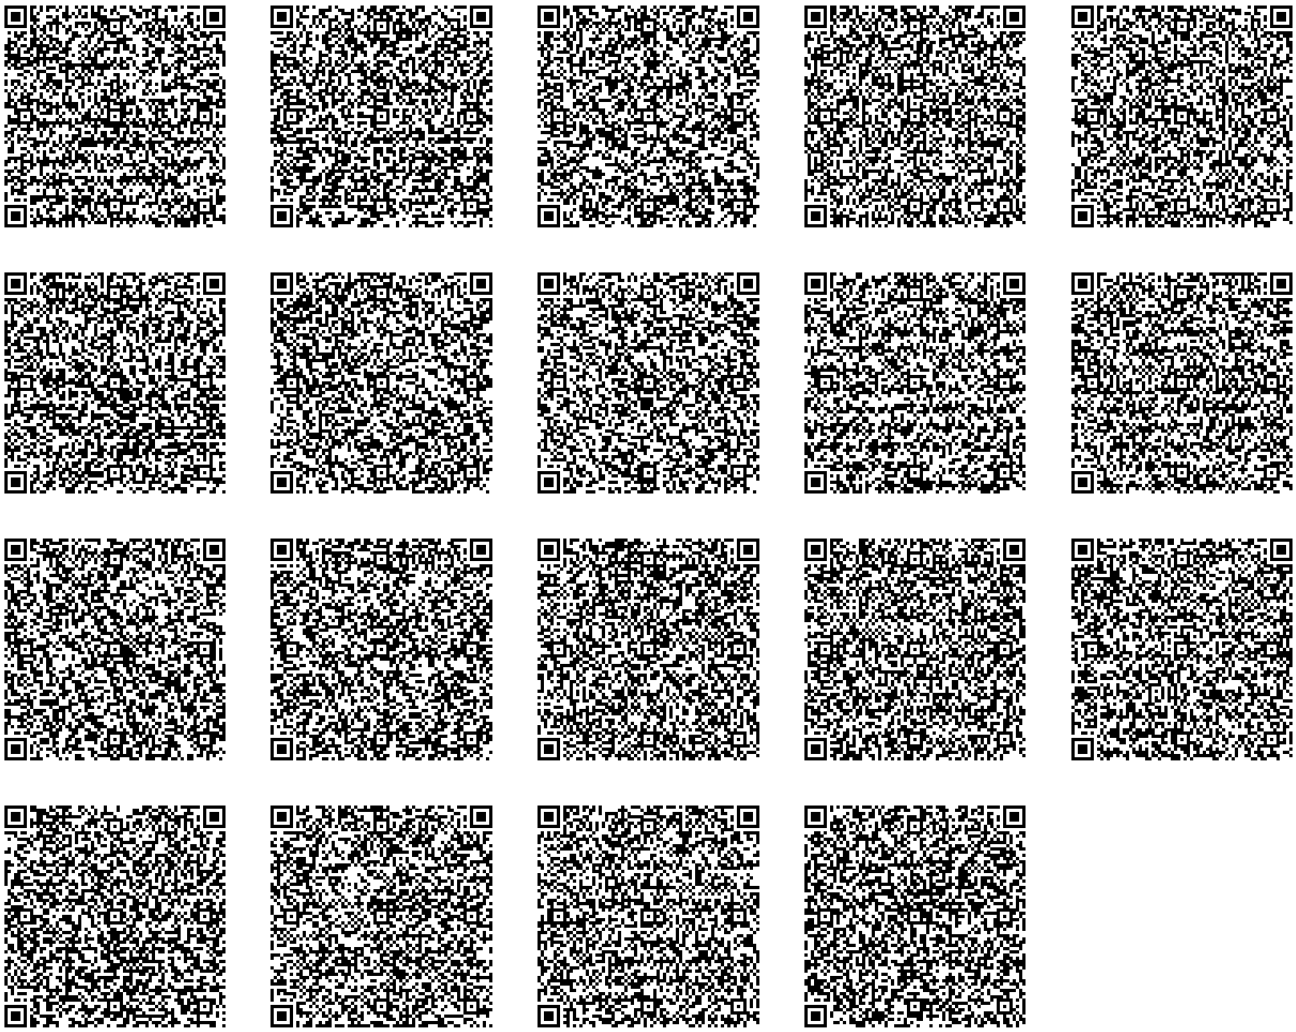

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-строительные чертежи				
			Раздел: Стены и перегородки /Листы - 6-7/				
			Подраздел: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				
1	1	6105-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	28.62	9 702	277 671
2	2	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.442448	77 102	111 216
3	3	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05368	300 662	16 140
4	4	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.05368	85 269	4 577
			Итого по подразделу: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				**409 604**
			Подраздел: Гипсокартонные перегородки по металлическому каркасу				
5	5	6107-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м2	186.7	5 536	1 033 571
			Итого по подразделу: Гипсокартонные перегородки по металлическому каркасу				**1 033 571**
			Подраздел: Гипсокартонные перегородки по металлическому каркасу				
6	28	6107-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м2	286.5	5 536	1 586 064
			Итого по подразделу: Гипсокартонные перегородки по металлическому каркасу				**1 586 064**
			Подраздел: Гипсокартонные перегородки по металлическому каркасу				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	51	6107-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м2	232	5 536	1 284 352
			Итого по подразделу: Гипсокартонные перегородки по металлическому каркасу				**1 284 352**
			Подраздел: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				
8	52	6105-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	16.0566667	9 702	155 782
9	53	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.809256	77 102	62 395
10	54	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.02193435	300 662	6 595
11	55	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.02193435	85 269	1 870
12	56	6105-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	2.92	9 702	28 330
13	57	213-102-0201РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0.147168	53 522	7 877
14	58	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.00345115	300 662	1 038
15	59	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.00345115	85 269	294
			Итого по подразделу: Перегородки t=120 мм на растворе марки М50				**264 181**
			Подраздел: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				
16	60	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены внутренней	м3	29.04	38 800	1 126 752
17	61	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	11.0352	55 564	613 160
18	62	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.3331446	292 085	97 307
19	63	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3331446	300 662	100 164
20	64	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.3331446	85 269	28 407
			Итого по подразделу: Кирпичные стены t=380 мм на растворе марки М100				**1 965 789**
			Подраздел: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	65	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	23.28	40 214	936 182
22	66	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	6.95386911	55 564	386 385
23	67	213-102-0306РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	0.64231461	78 700	50 550
24	68	213-101-0403РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1.25026629	106 147	132 712
25	69	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.19413944	292 085	56 705
26	70	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.19413944	300 662	58 370
27	71	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.19413944	85 269	16 554
28	72	1126-0201-0108РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	527.06035276	3 505	1 847 347
29	73	234-101-0110РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	53.76015598	44 521	2 393 456
			Итого по подразделу: Наружные кирпичные стены t=640 мм на растворе марки М100				**5 878 261**
			Подраздел: Р Утепление и отделка цоколя /Лист-12/				
30	83	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	7.11335	689 449	4 904 292
31	84	1126-0201-0108РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	776	3 127	2 426 552
32	85	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1595	54	86 130
33	86	217-109-0110РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	1332	71	94 572
34	87	234-101-0110РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	79.152	44 521	3 523 926
35	88	261-107-0235РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1214	96	116 544
			Итого по подразделу: Р Утепление и отделка цоколя /Лист-12/				**11 152 016**
			Подраздел: Р Дополнительное армирование в местах пересечения СД-1 - СД-8 /Лист-16/				
36	89	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	4.293122	292 085	1 253 957
37	90	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4.204935	397 364	1 670 890
			Итого по подразделу: Р Дополнительное армирование в местах пересечения СД-1 - СД-8 /Лист-16/				**2 924 846**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Стены и перегородки /Листы - 6-7/				**26 498 684**
			Раздел: Крыльца				
			Подраздел: Фундамент крыльца №1 /Лист-40/				
38	219	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1.44	8 904	12 822
39	220	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.22	35 252	7 755
40	221	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	2.5	66 023	165 058
41	222	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.209664	311 690	65 350
42	223	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.28728	294 911	84 722
43	224	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03093	323 349	10 001
44	225	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.30816	418 459	128 952
45	228	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	13	4 160	54 080
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №1 /Лист-40/				**528 740**
			Подраздел: Колонна К-1 /Лист-41/				
46	229	1106-0501-0109РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4.44	76 328	338 896
47	230	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.50064	294 911	147 644
48	231	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11718	323 349	37 890
49	232	214-208-0102РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.01344	404 965	5 443
50	233	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.05184	418 459	21 693
			Итого по подразделу: Колонна К-1 /Лист-41/				**551 566**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм1-2шт /Лист-42/				
51	234	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3.84	109 983	422 335
52	235	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.2488	294 911	368 285
53	236	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.16268	323 349	52 602

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	237	214-208-0102РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0045354	404 965	1 837
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1-2шт /Лист-42/				**845 059**
			Подраздел: Ригель монолитный Рм2-3шт /Лист-42/				
55	238	1106-0701-0401РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1.47	109 983	161 675
56	239	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.72996	294 911	215 273
57	240	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.10608	323 349	34 301
58	241	214-208-0102РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0068031	404 965	2 755
			Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм2-3шт /Лист-42/				**414 004**
			Подраздел: Монолитная плита Мп-1 /Лист-43/				
59	242	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	64	5 308	339 712
60	243	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	64	2 947	188 608
61	244	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	1.49769	104 071	155 866
62	245	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	12.8	47 502	608 026
63	246	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.42069	311 690	442 815
64	247	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.077	323 349	24 898
			Итого по подразделу: Монолитная плита Мп-1 /Лист-43/				**1 759 925**
			Подраздел: Фундамент крыльца №3 /Лист-50/				
65	317	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	2.28	8 904	20 301
66	318	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1.07	55 502	59 387
67	319	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0378288	311 690	11 791
68	320	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02052	323 349	6 635

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	321	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9.5	4 160	39 520
70	322	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01988	1 487 579	29 573
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №3 /Лист-50/				**167 207**
			Подраздел: Фундамент крыльца №4 /Лист-56/				
71	358	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	2.52	8 904	22 438
72	359	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	2.1	55 502	116 554
73	360	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07459	311 690	23 249
74	361	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0399	323 349	12 902
75	362	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	19.2	4 160	79 872
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №4 /Лист-56/				**255 015**
			Подраздел: Основание крыльца №4 /Лист-56/				
76	363	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	7.58	611	4 631
77	364	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4.04	15 131	61 129
78	365	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	3	1 341	4 023
79	366	234-102-0202РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0.103	38 225	3 937
80	367	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	5.72	38 792	221 890
81	368	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1896	418 459	79 340
			Итого по подразделу: Основание крыльца №4 /Лист-56/				**374 950**
			Подраздел: Фундамент крыльца №5 /Лист-57/				
82	414	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1.15	8 904	10 240

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	415	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1.28	55 502	71 043
84	416	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05005	311 690	15 600
85	417	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02622	323 349	8 478
86	418	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	15.2	4 160	63 232
87	419	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01988	1 487 579	29 573
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №5 /Лист-57/				**198 166**
			Подраздел: Фундамент крыльца №7 /Лист-67/				
88	521	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1.08	8 904	9 616
89	522	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	0.99	55 502	54 947
90	523	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03516	311 690	10 959
91	524	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01767	323 349	5 714
92	525	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8	4 160	33 280
93	526	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01988	1 487 579	29 573
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №7 /Лист-67/				**144 089**
			Подраздел: Фундамент крыльца №8 /Лист-71/				
94	563	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1.82	8 904	16 205
95	564	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	2.85	55 502	158 181
96	565	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1124208	311 690	35 040
97	566	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05472	323 349	17 694

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	567	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22	4 160	91 520
99	568	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.02982	1 487 579	44 360
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №8 /Лист-71/				**363 000**
			Подраздел: Фундамент крыльца №8 /Лист-75/				
100	611	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	1	39 428	39 428
101	612	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.38	77 102	29 299
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №8 /Лист-75/				**68 727**
			Подраздел: Фундамент крыльца №12 /Лист-86/				
102	749	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	8.67	8 904	77 198
103	750	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	4.89	55 502	271 405
104	751	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1742256	311 690	54 304
105	752	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09348	323 349	30 227
106	753	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	33	4 160	137 280
107	754	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01988	1 487 579	29 573
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №12 /Лист-86/				**599 987**
			Подраздел: Фундамент крыльца №14 /Лист-93/				
108	840	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1.15	8 904	10 240
109	841	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1.28	55 502	71 043
110	842	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05044	311 690	15 722
111	843	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02622	323 349	8 478

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	844	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	21	4 160	87 360
113	845	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01988	1 487 579	29 573
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №14 /Лист-93/				**222 416**
			Подраздел: Фундамент крыльца №15 /Лист-98/				
114	897	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	5.15	8 904	45 856
115	898	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	2.83	55 502	157 071
116	899	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.055944	311 690	17 437
117	900	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0496	323 349	16 038
118	901	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	15.7	4 160	65 312
119	902	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.02982	1 487 579	44 360
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №15 /Лист-98/				**346 074**
			Итого по разделу: Крыльца				**6 838 925**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-строительные чертежи				**33 337 609**
			ИТОГО по акту:				**33 337 609**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)	33337608.945 x 6.90%	2 300 295
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	33337608.945 + 2300295.049	35 637 904
	Сметная прибыль, (5.00%)	35637903.994 x 5.00%	1 781 895
	Непредвиденные расходы, (2.000%)	35637903.994 x 2.000%	712 758
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		38 132 557
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	38132557.274 x 1.0000	38 132 557
	НДС (12%)	38132557.274 x 12%	4 575 907
	Итого с НДС	38132557.274 + 4575906.873	42 708 464

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	17.10.2025 09:41
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	17.10.2025 09:45
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	17.10.2025 09:43
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	17.10.2025 10:01
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	17.10.2025 11:19 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	17.10.2025 13:06

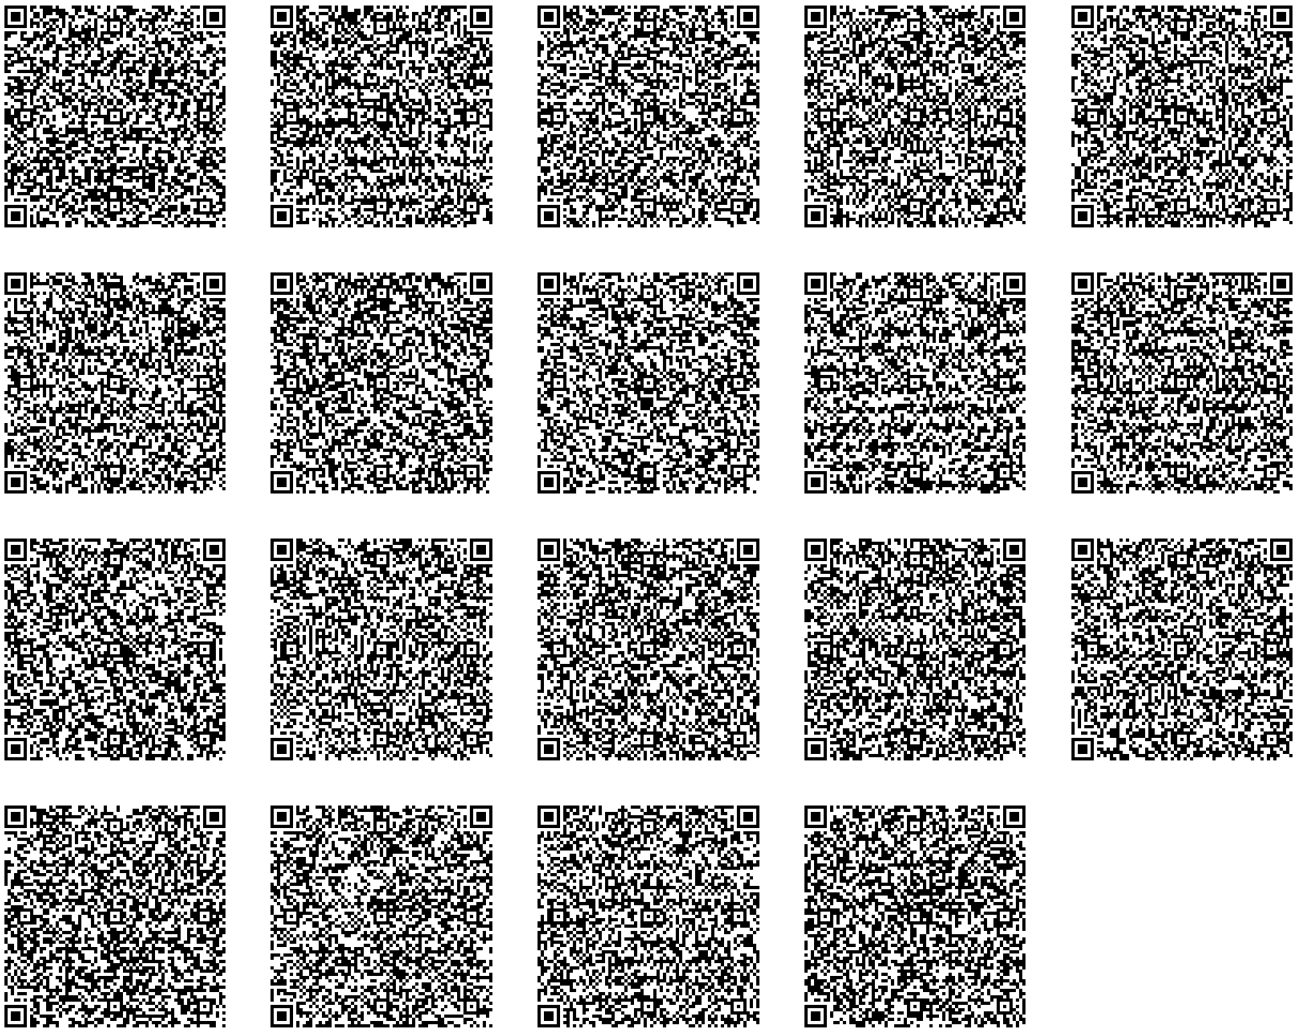

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурн-строительные чертежи				
			Раздел: Стены и перегородки /Листы - 6-7/				
			Подраздел: Р Закладные детали				
1	81	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.576	2 175 095	1 252 855
			Итого по подразделу: Р Закладные детали				**1 252 855**
			Подраздел: Р Зашивка стояков и трубопроводов из ГКЛВ /Лист-7, прим./				
2	82	6107-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м2	110	5 401	594 110
			Итого по подразделу: Р Зашивка стояков и трубопроводов из ГКЛВ /Лист-7, прим./				**594 110**
			Итого по разделу: Стены и перегородки /Листы - 6-7/				**1 846 965**
			Раздел: Крыльца				
			Подраздел: Фундамент крыльца №1 /Лист-40/				
3	226	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	0.5	39 428	19 714
4	227	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.19	77 102	14 649
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №1 /Лист-40/				**34 363**
			Подраздел: Стойки /Лист-52/				
5	323	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.16024	74 653	11 962

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	324	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.16024	1 131 729	181 348
7	325	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.64696	389	1 808
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-52/				**195 118**
			Подраздел: Балки /Лист-52/				
8	326	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.14264	180 995	25 817
9	327	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.14264	1 131 729	161 430
10	328	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.13656	389	1 609
			Итого по подразделу: Балки /Лист-52/				**188 856**
			Подраздел: Прогоны /Лист-52/				
11	329	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.12768	107 271	13 696
12	330	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.12768	1 131 729	144 499
13	331	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3.70272	389	1 440
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-52/				**159 635**
			Подраздел: Связи /Лист-52/				
14	332	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.05588	336 509	18 804
15	333	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.05588	1 131 729	63 241
16	334	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.62052	389	630
			Итого по подразделу: Связи /Лист-52/				**82 675**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-52/				
17	335	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.2759	336 509	92 843

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	336	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2759	1 131 729	312 244
19	337	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8.0011	389	3 112
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-52/				**408 199**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-52/				
20	338	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.2548	286 888	73 099
21	339	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2548	1 131 729	288 365
22	340	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.3892	389	2 874
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-52/				**364 338**
			Подраздел: Материалы /Лист-52/				
23	341	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	14.5	2 183	31 654
24	342	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16.675	5 269	87 861
25	343	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	2.1	4 764	10 004
26	344	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2.1	3 958	8 312
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-52/				**137 831**
			Подраздел: Основание крыльца №3 /Лист-52/				
27	350	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	16.4	611	10 020
28	351	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.58	15 131	39 038
29	352	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3.2	39 775	127 280
30	353	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.13859	418 459	57 994

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Основание крыльца №3 /Лист-52/				**234 332**
			Подраздел: Стойки /Лист-56/				
31	378	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.46846	74 653	34 972
32	379	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.46846	1 131 729	530 170
33	380	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13.58534	389	5 285
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-56/				**570 427**
			Подраздел: Балки /Лист-56/				
34	381	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	1.34134	180 995	242 776
35	382	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1.34134	1 131 729	1 518 033
36	383	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	38.89886	389	15 132
			Итого по подразделу: Балки /Лист-56/				**1 775 941**
			Подраздел: Прогоны /Лист-56/				
37	384	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.32248	107 271	34 593
38	385	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.32248	1 131 729	364 960
39	386	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9.35192	389	3 638
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-56/				**403 191**
			Подраздел: Связи /Лист-56/				
40	387	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.10219	336 509	34 388
41	388	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.10219	1 131 729	115 651
42	389	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.96351	389	1 153

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Связи /Лист-56/				**151 192**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-56/				
43	390	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.33456	286 888	95 981
44	391	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.33456	1 131 729	378 631
45	392	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9.70224	389	3 774
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-56/				**478 386**
			Подраздел: Материалы /Лист-56/				
46	393	6110-0101-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	м2	25.1	1 820	45 682
47	394	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	25.1	2 183	54 793
48	395	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	28.865	3 846	111 015
49	396	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	26.8	4 764	127 675
50	397	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	26.8	3 958	106 074
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-56/				**445 239**
			Подраздел: Элементы водосточной системы /Лист-56/				
51	405	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	949	1 898
			Итого по подразделу: Элементы водосточной системы /Лист-56/				**1 898**
			Подраздел: Стойки /Лист-59/				
52	420	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.23728	74 653	17 714
53	421	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.23728	1 131 729	268 537
54	422	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6.88112	389	2 677

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-59/				**288 928**
			Подраздел: Балки /Лист-59/				
55	423	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.15236	180 995	27 576
56	424	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.15236	1 131 729	172 430
57	425	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.41844	389	1 719
			Итого по подразделу: Балки /Лист-59/				**201 725**
			Подраздел: Прогоны /Лист-59/				
58	426	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.085	107 271	9 118
59	427	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.085	1 131 729	96 197
60	428	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.465	389	959
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-59/				**106 274**
			Подраздел: Связи /Лист-59/				
61	429	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.03475	336 509	11 694
62	430	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.03475	1 131 729	39 328
63	431	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.00775	389	392
			Итого по подразделу: Связи /Лист-59/				**51 414**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-59/				
64	432	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.1458	336 509	49 063
65	433	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1458	1 131 729	165 006
66	434	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.2282	389	1 645

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-59/				**215 714**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-59/				
67	435	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.09983	286 888	28 640
68	436	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.09983	1 131 729	112 981
69	437	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.89507	389	1 126
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-59/				**142 747**
			Подраздел: Материалы /Лист-59/				
70	438	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	8.9	2 183	19 429
71	439	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	10.235	5 269	53 928
72	440	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	2.1	4 764	10 004
73	441	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2.1	3 958	8 312
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-59/				**91 673**
			Подраздел: Основание крыльца №5 /Лист-59/				
74	449	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	11.3	611	6 904
75	450	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1.8	15 131	27 236
76	451	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.78	38 792	69 050
77	452	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.09132	418 459	38 214
			Итого по подразделу: Основание крыльца №5 /Лист-59/				**141 404**
			Подраздел: Стойки /Лист-70/				
78	528	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.17866	74 653	13 338

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	529	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.17866	1 131 729	202 195
80	530	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.18114	389	2 015
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-70/				**217 548**
			Подраздел: Балки /Лист-70/				
81	532	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.11208	1 131 729	126 844
82	533	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3.25032	389	1 264
			Итого по подразделу: Балки /Лист-70/				**128 108**
			Подраздел: Прогоны /Лист-70/				
83	534	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.08218	107 271	8 816
84	535	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.08218	1 131 729	93 005
85	536	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.38322	389	927
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-70/				**102 748**
			Подраздел: Связи /Лист-70/				
86	537	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.04269	336 509	14 366
87	538	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.04269	1 131 729	48 314
88	539	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.23801	389	482
			Итого по подразделу: Связи /Лист-70/				**63 162**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-70/				
89	540	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.2005	336 509	67 470
90	541	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2005	1 131 729	226 912

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	542	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.8145	389	2 262
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-70/				**296 644**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-70/				
92	543	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.20035	286 888	57 478
93	544	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.20035	1 131 729	226 742
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-70/				**284 220**
			Подраздел: Материалы /Лист-70/				
94	546	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	9.13	2 183	19 931
95	547	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	10.4995	5 269	55 322
96	548	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.6	4 764	7 622
97	549	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	1.6	3 958	6 333
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-70/				**89 208**
			Подраздел: Основание крыльца №7 /Лист-70/				
98	555	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	14.2	611	8 676
99	557	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.78	38 792	69 050
100	558	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.08927	418 459	37 356
			Итого по подразделу: Основание крыльца №7 /Лист-70/				**115 082**
			Подраздел: Стойки /Лист-74/				
101	569	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.25848	74 653	19 296
102	570	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.25848	1 131 729	292 529

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	571	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.49592	389	2 916
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-74/				**314 741**
			Подраздел: Балки /Лист-74/				
104	572	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.31186	180 995	56 445
105	573	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.31186	1 131 729	352 941
106	574	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9.04394	389	3 518
			Итого по подразделу: Балки /Лист-74/				**412 904**
			Подраздел: Прогоны /Лист-74/				
107	575	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.26838	107 271	28 789
108	576	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.26838	1 131 729	303 733
109	577	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.78302	389	3 028
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-74/				**335 550**
			Подраздел: Связи /Лист-74/				
110	578	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.08397	336 509	28 257
111	579	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.08397	1 131 729	95 031
112	580	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.43513	389	947
			Итого по подразделу: Связи /Лист-74/				**124 235**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-74/				
113	581	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.4303	336 509	144 800
114	582	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.4303	1 131 729	486 983

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	583	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12.4787	389	4 854
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-74/				**636 637**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-74/				
116	584	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.28407	286 888	81 496
117	585	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.28407	1 131 729	321 490
118	586	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8.23803	389	3 205
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-74/				**406 191**
			Подраздел: Материалы /Лист-74/				
119	587	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	20.1	2 183	43 878
120	588	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	23.115	5 269	121 793
121	589	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4.65	4 764	22 153
122	590	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	4.65	3 958	18 405
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-74/				**206 229**
			Подраздел: Основание крыльца №8 /Лист-74/				
123	596	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	25	611	15 275
124	597	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3.1	15 131	46 906
125	598	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	5.11	38 792	198 227
126	599	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.22831	418 459	95 538
			Итого по подразделу: Основание крыльца №8 /Лист-74/				**355 946**
			Подраздел: Фундамент крыльца №8 /Лист-75/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	606	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1.08	8 904	9 616
128	607	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	0.99	55 502	54 947
129	608	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03516	311 690	10 959
130	609	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01767	323 349	5 714
131	610	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8	4 160	33 280
132	613	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01988	1 487 579	29 573
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №8 /Лист-75/				**144 089**
			Подраздел: Стойки /Лист-77/				
133	614	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.25208	74 653	18 819
134	615	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.25208	1 131 729	285 286
135	616	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.31032	389	2 844
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-77/				**306 949**
			Подраздел: Балки /Лист-77/				
136	617	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.12484	180 995	22 595
137	618	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.12484	1 131 729	141 285
138	619	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3.62036	389	1 408
			Итого по подразделу: Балки /Лист-77/				**165 288**
			Подраздел: Прогоны /Лист-77/				
139	620	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.0558	107 271	5 986

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	621	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0558	1 131 729	63 150
141	622	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.6182	389	629
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-77/				**69 765**
			Подраздел: Связи /Лист-77/				
142	623	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.02961	336 509	9 964
143	624	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.02961	1 131 729	33 510
144	625	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0.85869	389	334
			Итого по подразделу: Связи /Лист-77/				**43 808**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-77/				
145	626	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.1957	336 509	65 855
146	627	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1957	1 131 729	221 479
147	628	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.6753	389	2 208
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-77/				**289 542**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-77/				
148	629	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.20102	286 888	57 670
149	630	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.20102	1 131 729	227 500
150	631	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.82958	389	2 268
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-77/				**287 438**
			Подраздел: Материалы /Лист-77/				
151	632	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	8.3	2 183	18 119

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	633	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9.545	5 269	50 293
153	634	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.77	4 764	3 668
154	635	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	0.77	3 958	3 048
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-77/				**75 128**
			Подраздел: Основание крыльца №9 /Лист-77/				
155	642	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	37.17	611	22 711
156	643	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1.23	15 131	18 611
157	644	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.75	38 792	67 886
158	645	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0764	418 459	31 970
			Итого по подразделу: Основание крыльца №9 /Лист-77/				**141 178**
			Подраздел: Стойки /Лист-80/				
159	665	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.16108	74 653	12 025
160	666	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.16108	1 131 729	182 299
161	667	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.67132	389	1 817
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-80/				**196 141**
			Подраздел: Балки /Лист-80/				
162	668	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.15502	180 995	28 058
163	669	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.15502	1 131 729	175 441
164	670	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.49558	389	1 749

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Балки /Лист-80/				**205 248**
			Подраздел: Прогоны /Лист-80/				
165	671	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.15681	107 271	16 821
166	672	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.15681	1 131 729	177 466
167	673	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.54749	389	1 769
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-80/				**196 056**
			Подраздел: Связи /Лист-80/				
168	674	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.10302	336 509	34 667
169	675	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.10302	1 131 729	116 591
170	676	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.98758	389	1 162
			Итого по подразделу: Связи /Лист-80/				**152 420**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-80/				
171	677	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.2668	336 509	89 781
172	678	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2668	1 131 729	301 945
173	679	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.7372	389	3 010
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-80/				**394 736**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-80/				
174	680	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.2575	286 888	73 874
175	681	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2575	1 131 729	291 420
176	682	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.4675	389	2 905

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-80/				**368 199**
			Подраздел: Материалы /Лист-80/				
177	683	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	16.58	2 183	36 194
178	684	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	19.067	5 269	100 464
179	685	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.8	4 764	8 575
180	686	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	1.8	3 958	7 124
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-80/				**152 357**
			Подраздел: Основание крыльца №10 /Лист-80/				
181	692	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	62.5	611	38 188
182	693	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.78	15 131	42 064
183	694	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3	38 792	116 376
184	695	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.16441	418 459	68 799
			Итого по подразделу: Основание крыльца №10 /Лист-80/				**265 427**
			Подраздел: Стойки /Лист-83/				
185	711	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.20496	74 653	15 301
186	712	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.20496	1 131 729	231 959
187	713	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.94384	389	2 312
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-83/				**249 572**
			Подраздел: Балки /Лист-83/				
188	714	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.11208	180 995	20 286

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
189	715	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.11208	1 131 729	126 844
190	716	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3.25032	389	1 264
			Итого по подразделу: Балки /Лист-83/				**148 394**
			Подраздел: Прогоны /Лист-83/				
191	717	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.09672	107 271	10 375
192	718	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.09672	1 131 729	109 461
193	719	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.80488	389	1 091
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-83/				**120 927**
			Подраздел: Связи /Лист-83/				
194	720	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.04269	336 509	14 366
195	721	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.04269	1 131 729	48 314
196	722	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.23801	389	482
			Итого по подразделу: Связи /Лист-83/				**63 162**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-83/				
197	723	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.2005	336 509	67 470
198	724	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2005	1 131 729	226 912
199	725	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.8145	389	2 262
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-83/				**296 644**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-83/				
200	726	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.20035	286 888	57 478

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	727	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.20035	1 131 729	226 742
202	728	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.81015	389	2 260
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-83/				**286 480**
			Подраздел: Материалы /Лист-83/				
203	729	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	9.13	2 183	19 931
204	730	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	10.4995	5 269	55 322
205	731	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.6	4 764	7 622
206	732	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	1.6	3 958	6 333
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-83/				**89 208**
			Подраздел: Основание крыльца №11 /Лист-83/				
207	738	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	5.4	611	3 299
208	739	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1.93	15 131	29 203
209	740	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.78	38 792	69 050
210	741	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.08927	418 459	37 356
			Итого по подразделу: Основание крыльца №11 /Лист-83/				**138 908**
			Подраздел: Стойки /Лист-88/				
211	755	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.2452	74 653	18 305
212	756	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2452	1 131 729	277 500
213	757	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.1108	389	2 766

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-88/				**298 571**
			Подраздел: Балки /Лист-88/				
214	758	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.12758	180 995	23 091
215	759	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.12758	1 131 729	144 386
216	760	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3.69982	389	1 439
			Итого по подразделу: Балки /Лист-88/				**168 916**
			Подраздел: Прогоны /Лист-88/				
217	761	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.0558	107 271	5 986
218	762	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0558	1 131 729	63 150
219	763	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.6182	389	629
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-88/				**69 765**
			Подраздел: Связи /Лист-88/				
220	764	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.02961	336 509	9 964
221	765	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.02961	1 131 729	33 510
222	766	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0.85869	389	334
			Итого по подразделу: Связи /Лист-88/				**43 808**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-88/				
223	767	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.1957	336 509	65 855
224	768	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1957	1 131 729	221 479
225	769	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.6753	389	2 208

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-88/				**289 542**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-88/				
226	770	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.20102	286 888	57 670
227	771	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.20102	1 131 729	227 500
228	772	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.82958	389	2 268
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-88/				**287 438**
			Подраздел: Материалы /Лист-88/				
229	773	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	8.3	2 183	18 119
230	774	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9.545	5 269	50 293
231	775	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.77	4 764	3 668
232	776	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	0.77	3 958	3 048
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-88/				**75 128**
			Подраздел: Основание крыльца №12 /Лист-88/				
233	785	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	35	611	21 385
234	786	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3	15 131	45 393
235	787	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	5	38 792	193 960
236	788	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.25212	418 459	105 502
			Итого по подразделу: Основание крыльца №12 /Лист-88/				**366 240**
			Подраздел: Стойки /Лист-95/				
237	846	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.24208	74 653	18 072

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
238	847	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.24208	1 131 729	273 969
239	848	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.02032	389	2 731
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-95/				**294 772**
			Подраздел: Балки /Лист-95/				
240	849	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.16586	180 995	30 020
241	850	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.16586	1 131 729	187 709
242	851	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.80994	389	1 871
			Итого по подразделу: Балки /Лист-95/				**219 600**
			Подраздел: Прогоны /Лист-95/				
243	852	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.092	107 271	9 869
244	853	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.092	1 131 729	104 119
245	854	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.668	389	1 038
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-95/				**115 026**
			Подраздел: Связи /Лист-95/				
246	855	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.04822	336 509	16 226
247	856	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.04822	1 131 729	54 572
248	857	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.39838	389	544
			Итого по подразделу: Связи /Лист-95/				**71 342**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-95/				
249	858	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.1458	336 509	49 063

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
250	859	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1458	1 131 729	165 006
251	860	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.2282	389	1 645
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-95/				**215 714**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-95/				
252	861	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.10491	286 888	30 097
253	862	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.10491	1 131 729	118 730
254	863	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3.04239	389	1 183
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-95/				**150 010**
			Подраздел: Материалы /Лист-95/				
255	864	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	9.6	2 183	20 957
256	865	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11.04	5 269	58 170
257	866	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	2.3	4 764	10 957
258	867	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2.3	3 958	9 103
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-95/				**99 187**
			Подраздел: Основание крыльца №14 /Лист-95/				
259	873	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	12.9	611	7 882
260	874	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1.9	15 131	28 749
261	875	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.8	39 522	71 140
262	876	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.10045	418 459	42 034

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Основание крыльца №14 /Лист-95/				**149 805**
			Подраздел: Основание крыльца №15 /Лист-102/				
263	906	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	95	611	58 045
264	907	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	11.2	15 131	169 467
265	908	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	7.88	38 792	305 681
266	909	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.42186	418 459	176 531
267	914	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	57	4 160	237 120
268	915	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	3.7	39 428	145 884
269	916	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.406	77 102	108 405
			Итого по подразделу: Основание крыльца №15 /Лист-102/				**1 201 133**
			Подраздел: Стойки /Лист-102/				
270	920	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.25848	74 653	19 296
271	921	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.25848	1 131 729	292 529
272	922	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.49592	389	2 916
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-102/				**314 741**
			Подраздел: Балки /Лист-102/				
273	923	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.50946	180 995	92 210
274	924	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.50946	1 131 729	576 571
275	925	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14.77434	389	5 747

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Балки /Лист-102/				**674 528**
			Подраздел: Прогоны /Лист-102/				
276	926	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.24768	107 271	26 569
277	927	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.24768	1 131 729	280 307
278	928	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.18272	389	2 794
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-102/				**309 670**
			Подраздел: Связи /Лист-102/				
279	929	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.09844	336 509	33 126
280	930	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.09844	1 131 729	111 407
281	931	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.85476	389	1 111
			Итого по подразделу: Связи /Лист-102/				**145 644**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-102/				
282	932	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.3942	336 509	132 652
283	933	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.3942	1 131 729	446 128
284	934	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11.4318	389	4 447
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-102/				**583 227**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-102/				
285	935	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.2618	286 888	75 107
286	936	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2618	1 131 729	296 287
287	937	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7.5922	389	2 953

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-102/				**374 347**
			Подраздел: Материалы /Лист-102/				
288	938	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	20.3	2 183	44 315
289	939	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	23.345	3 846	89 785
290	940	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4.7	4 764	22 391
291	941	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	4.7	3 958	18 603
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-102/				**175 094**
			Подраздел: Фундамент крыльца №16 /Лист-103/				
292	944	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	2.46	8 904	21 904
293	945	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	2.95	55 502	163 731
294	946	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08738	311 690	27 235
295	947	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05146	323 349	16 640
296	948	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	32.8	4 160	136 448
297	949	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.04473	1 487 579	66 539
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №16 /Лист-103/				**432 497**
			Подраздел: Основание крыльца №16 /Лист-107/				
298	954	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	12	611	7 332
299	955	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	6	15 131	90 786
300	956	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	8.2	1 341	10 996

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
301	957	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0.103	38 225	3 937
302	958	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	6.15	38 792	238 571
303	959	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.309285	418 459	129 423
304	964	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	1.78	39 428	70 182
305	965	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.6764	77 102	52 152
			Итого по подразделу: Основание крыльца №16 /Лист-107/				**603 379**
			Подраздел: Стойки /Лист-107/				
306	969	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.51291	74 653	38 290
307	970	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.51291	1 131 729	580 475
308	971	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14.87439	389	5 786
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-107/				**624 551**
			Подраздел: Балки /Лист-107/				
309	972	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.52854	180 995	95 663
310	973	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.52854	1 131 729	598 164
311	974	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15.32766	389	5 962
			Итого по подразделу: Балки /Лист-107/				**699 789**
			Подраздел: Прогоны /Лист-107/				
312	975	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.42126	107 271	45 189
313	976	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.42126	1 131 729	476 752

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
314	977	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12.21654	389	4 752
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-107/				**526 693**
			Подраздел: Связи /Лист-107/				
315	978	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.04655	336 509	15 664
316	979	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.04655	1 131 729	52 682
317	980	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.34995	389	525
			Итого по подразделу: Связи /Лист-107/				**68 871**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-107/				
318	981	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.6534	336 509	219 875
319	982	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.6534	1 131 729	739 472
320	983	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18.9486	389	7 371
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-107/				**966 718**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-107/				
321	984	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.40033	286 888	114 850
322	985	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.40033	1 131 729	453 065
323	986	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11.60957	389	4 516
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-107/				**572 431**
			Подраздел: Материалы /Лист-107/				
324	987	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	45.89	2 183	100 178
325	988	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	52.7735	3 846	202 967

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
326	989	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5.36	4 764	25 535
327	990	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	5.36	3 958	21 215
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-107/				**349 895**
			Подраздел: Фундамент крыльца №18 /Лист-112/				
328	1051	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1.95	8 904	17 363
329	1052	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1.45	55 502	80 478
330	1053	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05772	311 690	17 991
331	1054	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03135	323 349	10 137
332	1055	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	11	4 160	45 760
333	1056	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01988	1 487 579	29 573
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №18 /Лист-112/				**201 302**
			Подраздел: Основание крыльца №18 /Лист-114/				
334	1057	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	6	611	3 666
335	1058	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.98	15 131	14 828
336	1059	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	2	1 341	2 682
337	1060	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0.103	38 225	3 937
338	1061	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.7	38 792	65 946

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
339	1062	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.09168	418 459	38 364
			Итого по подразделу: Основание крыльца №18 /Лист-114/				**129 423**
			Подраздел: Стойки /Лист-114/				
340	1070	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.21148	74 653	15 788
341	1071	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.21148	1 131 729	239 338
342	1072	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6.13292	389	2 386
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-114/				**257 512**
			Подраздел: Балки /Лист-114/				
343	1073	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.191	180 995	34 570
344	1074	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.191	1 131 729	216 160
345	1075	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5.539	389	2 155
			Итого по подразделу: Балки /Лист-114/				**252 885**
			Подраздел: Прогоны /Лист-114/				
346	1076	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.0602	107 271	6 458
347	1077	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0602	1 131 729	68 130
348	1078	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.7458	389	679
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-114/				**75 267**
			Подраздел: Связи /Лист-114/				
349	1079	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.01111	336 509	3 739
350	1080	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.01111	1 131 729	12 574

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
351	1081	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0.32219	389	125
			Итого по подразделу: Связи /Лист-114/				**16 438**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-114/				
352	1082	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.13812	286 888	39 625
353	1083	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.13812	1 131 729	156 314
354	1084	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.00548	389	1 558
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-114/				**197 497**
			Подраздел: Материалы /Лист-114/				
355	1085	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	7.2	2 183	15 718
356	1086	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8.28	5 269	43 627
357	1087	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0.75	4 764	3 573
358	1088	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	0.75	3 958	2 969
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-114/				**65 887**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-114/				
359	1091	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.137	336 509	46 102
360	1092	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.137	1 131 729	155 047
361	1093	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3.973	389	1 545
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-114/				**202 694**
			Подраздел: Фундамент крыльца №19 /Лист-118/				
362	1124	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1.95	8 904	17 363

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
363	1126	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	5	5 144	25 720
364	1127	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	0.635	34 022	21 604
365	1128	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1.93	55 502	107 119
366	1129	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0575424	311 690	17 935
367	1130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0341	323 349	11 026
368	1131	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22.5	4 160	93 600
369	1132	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01988	1 487 579	29 573
			Итого по подразделу: Фундамент крыльца №19 /Лист-118/				**323 940**
			Подраздел: Стойки /Лист-121/				
370	1133	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.17221	74 653	12 856
371	1134	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.17221	1 131 729	194 895
372	1135	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.99409	389	1 943
			Итого по подразделу: Стойки /Лист-121/				**209 694**
			Подраздел: Балки /Лист-121/				
373	1136	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.12532	180 995	22 682
374	1137	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.12532	1 131 729	141 828
375	1138	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3.63428	389	1 414
			Итого по подразделу: Балки /Лист-121/				**165 924**
			Подраздел: Прогоны /Лист-121/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
376	1139	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.09758	107 271	10 468
377	1140	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.09758	1 131 729	110 434
378	1141	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.82982	389	1 101
			Итого по подразделу: Прогоны /Лист-121/				**122 003**
			Подраздел: Связи /Лист-121/				
379	1142	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.04546	336 509	15 298
380	1143	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.04546	1 131 729	51 448
381	1144	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.31834	389	513
			Итого по подразделу: Связи /Лист-121/				**67 259**
			Подраздел: Панель П-1 /Лист-121/				
382	1145	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.3042	336 509	102 366
383	1146	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.3042	1 131 729	344 272
384	1147	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8.8218	389	3 432
			Итого по подразделу: Панель П-1 /Лист-121/				**450 070**
			Подраздел: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-121/				
385	1148	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.16251	286 888	46 622
386	1149	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.16251	1 131 729	183 917
387	1150	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.71279	389	1 833
			Итого по подразделу: Фронтон ФР-1 и элементы крепления фронтона ФР-1 /Лист-121/				**232 372**
			Подраздел: Материалы /Лист-121/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
388	1151	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	13.55	2 183	29 580
389	1152	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	15.5825	5 269	82 104
390	1153	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4.8	4 764	22 867
391	1154	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	4.8	3 958	18 998
			Итого по подразделу: Материалы /Лист-121/				**153 549**
			Подраздел: Основание крыльца №19 /Лист-121/				
392	1160	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	11	611	6 721
393	1161	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.2	15 131	33 288
394	1162	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2.4	39 522	94 853
395	1163	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0145	418 459	6 068
			Итого по подразделу: Основание крыльца №19 /Лист-121/				**140 930**
			Итого по разделу: Крыльца				**30 610 435**
			Раздел: Будка выхода на кровлю 4 шт /Лист 136-143/				
396	1235	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	8.04	39 662	318 882
397	1236	213-101-0401 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3.0552	95 098	290 543
398	1237	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.170128	689 449	117 295
399	1238	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 600	6 400
400	1239	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.068	123 926	8 427

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
401	1240	6104-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	8	13 783	110 264
402	1241	222-105-0107 СпрСЦ 08.2024	Плита перекрытия сплошная для крупнопанельных зданий предварительно напряженная типа ПЖ толщиной 160 мм	м2	17.92	32 583	583 887
403	1242	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	11.2	1 645	18 424
404	1243	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /30 мм/	м2	11.2	450	5 040
405	1244	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	17.92	1 645	29 478
406	1245	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /20-50 мм/	м2	17.92	598	10 716
407	1246	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	11	3 496	38 456
408	1247	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1.8128	57 830	104 834
409	1248	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	11.2	2 322	26 006
410	1249	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	20	942	18 840
411	1250	235-103-0309 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	23	1 074	24 702
412	1251	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	23	1 351	31 073
413	1252	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	8.04	2 183	17 551
414	1253	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9.246	5 269	48 717
			Итого по разделу: Будка выхода на кровлю 4 шт /Лист 136-143/				**1 809 535**
			Раздел: Лестницы				
			Подраздел: Р Лестница в осях 7-9 /Лист-149/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
415	1273	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	182.598384	389	71 031
416	1274	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 2 слоя	м2	33	9 043	298 419
			Итого по подразделу: Р Лестница в осях 7-9 /Лист-149/				**369 450**
			Итого по разделу: Лестницы				**369 450**
			Раздел: Ограждения				
			Подраздел: Р Ограждение ОЛ-1 и ОЛ-2 /Лист-150/				
417	1275	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	31.54	33 190	1 046 813
			Итого по подразделу: Р Ограждение ОЛ-1 и ОЛ-2 /Лист-150/				**1 046 813**
			Подраздел: Р Ограждение ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5 и ОЛ-6 /Лист-151/				
418	1276	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	76.12	36 661	2 790 635
			Итого по подразделу: Р Ограждение ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5 и ОЛ-6 /Лист-151/				**2 790 635**
			Подраздел: Р Ограждение ОЛ-8, ОЛ-9 и ОЛ-10 /Лист-151.1/				
419	1277	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	103.2	44 184	4 559 789
			Итого по подразделу: Р Ограждение ОЛ-8, ОЛ-9 и ОЛ-10 /Лист-151.1/				**4 559 789**
			Итого по разделу: Ограждения				**8 397 237**
			Итого по локальной смете: Архитектурн-строительные чертежи				**43 033 622**
			ИТОГО по акту:				**43 033 622**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.900%)	43033622.000 x 6.90%	2 969 320
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	43033622.000 + 2969319.959	46 002 942
	Сметная прибыль, (5.00%)	46002941.959 x 5.00%	2 300 147
	Непредвиденные расходы, (2.000%)	46002941.959 x 2.000%	920 059
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		49 223 148
	в ценах 3,4 квартала 2023 г., к = 0.9699	49223147.896 x 0.9699	47 743 111
	НДС (12%)	47743111.441 x 12%	5 729 173
	Итого с НДС	47743111.441 + 5729173.373	53 472 285

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	07.10.2025 12:33
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	07.10.2025 14:38
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	07.10.2025 14:29
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	07.10.2025 15:56
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	07.10.2025 17:22 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	07.10.2025 18:30

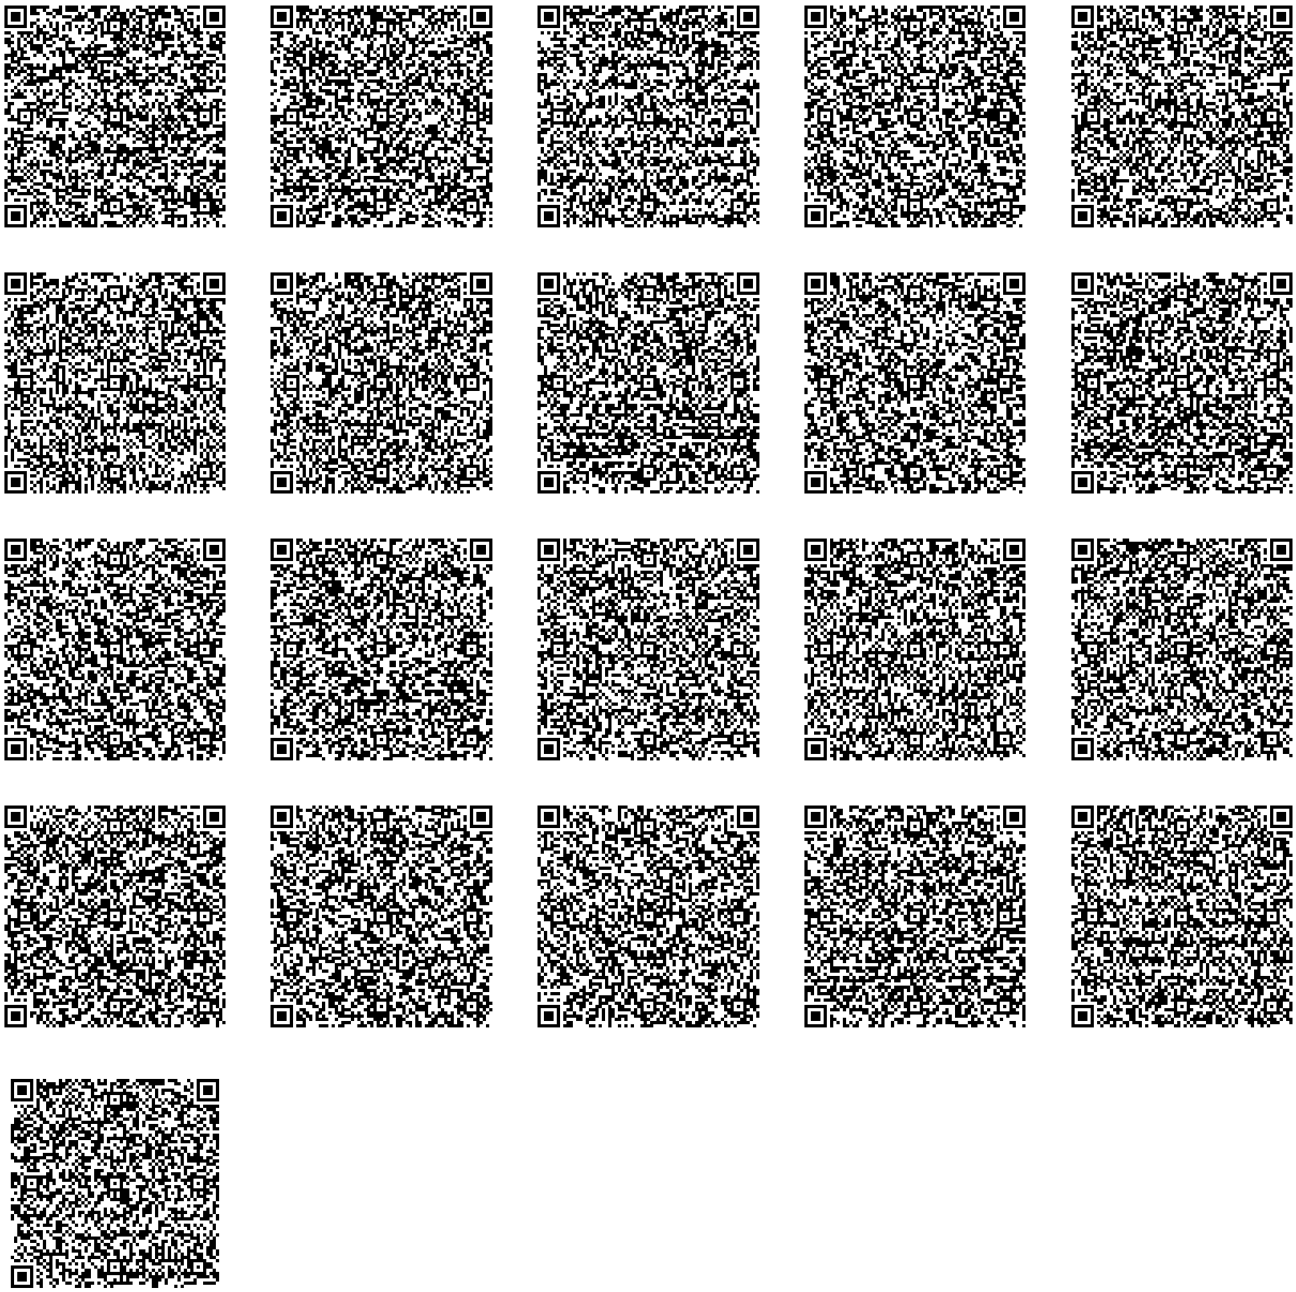

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Благоустройство				
			Раздел: Покрытия				
			Подраздел: Отмостка зданий, шириной 1 м. ТИП7				
1	37	6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	296.09	2 163	640 443
2	38	6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать до 10 см на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м2	296.09	-549	-162 553
3	39	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	29.609	46 542	1 378 062
			Итого по подразделу: Отмостка зданий, шириной 1 м. ТИП7				**1 855 952**
			Итого по разделу: Покрытия				**1 855 952**
			Итого по локальной смете: Благоустройство				**1 855 952**
			ИТОГО по акту:				**1 855 952**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				1855952.000 x 6.90%	128 061
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1855952.000 + 128060.690	1 984 013
		Сметная прибыль, (5.00%)				1984012.690 x 5.00%	99 201
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				1984012.690 x 2.000%	39 680
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					2 122 894
		в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000				2122893.578 x 1.0000	2 122 894
		НДС (12%)				2122893.578 x 12%	254 747

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				2122893.578 + 254747.229	2 377 641

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:27
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:38
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:30
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 16:14
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:23 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:40

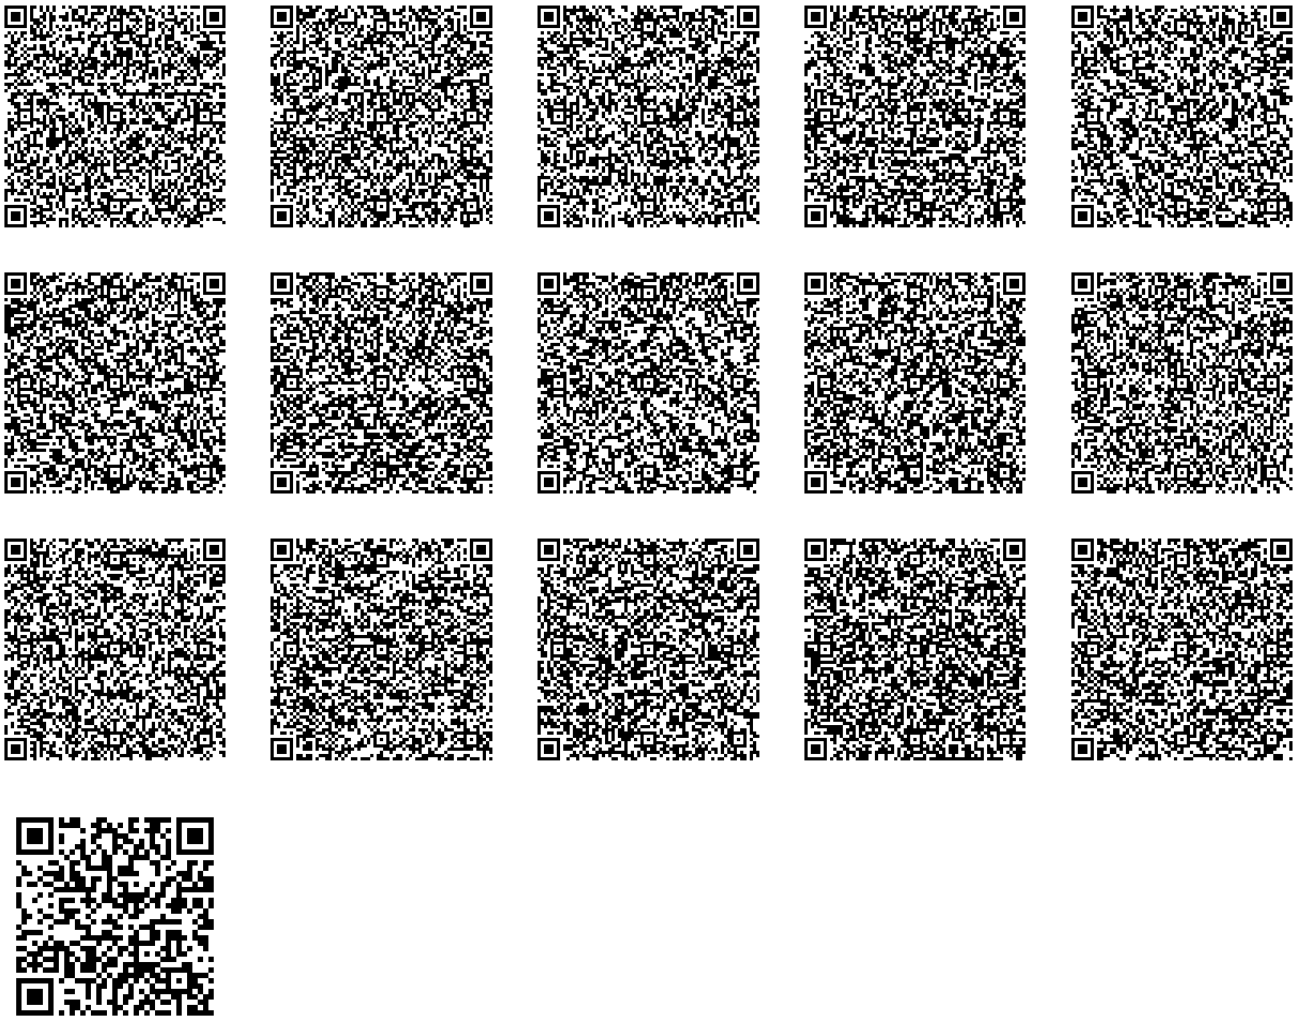

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Водопровод и канализация				
			Раздел: Канализация				
			Подраздел: Р Канализация К3Н				
1	171	242-303-0104РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	8 678	43 390
2	172	6114-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	8 885	44 425
3	173	242-306-0402РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	5	70 542	352 710
4	174	511-101-0104РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	5	192 963	964 815
5	175	261-301-0219РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6.31	708	4 467
			Итого по подразделу: Р Канализация К3Н				**1 409 807**
			Подраздел: Р Канализация К3 (столовая и кухня)				
6	197	6118-0204-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	2 336	2 336
7	198	246-301-0301РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	6 565	6 565
			Итого по подразделу: Р Канализация К3 (столовая и кухня)				**8 901**
			Подраздел: Р Канализация К2 (внутренний водосток)				
8	214	242-303-0104РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	8 678	34 712
9	215	261-301-0219РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	159	708	112 572
			Итого по подразделу: Р Канализация К2 (внутренний водосток)				**147 284**
			Итого по разделу: Канализация				**1 565 992**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	22	6114-0103-0901ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	119.5	1 431	171 004
11	23	261-301-0370РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	119.5	524	62 618
12	45	261-301-0405РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	10	120	1 200
13	46	242-207-1001РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2 691	26 910
14	70	6114-0103-0901ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	67	1 431	95 877
15	71	261-301-0370РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	67	524	35 108
16	77	6115-0104-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	4	3 516	14 064
17	78	241-101-0404РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5.96	1 718	10 239
18	99	6115-0104-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	2	3 516	7 032
19	100	241-101-0404РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2.98	1 718	5 120
20	111	6114-0601-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	22	5 374	118 228
21	112	242-303-0301РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	22	23 182	510 004
22	113	244-403-0101РСНБ РК 2022	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	22	1 130	24 860
23	114	244-401-0102РСНБ РК 2022	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	22	786	17 292
24	115	244-401-0101РСНБ РК 2022	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	44	932	41 008
25	116	244-402-0101РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	440	1 214	534 160
26	117	6114-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	22	7 634	167 948
27	118	248-307-0106РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	22	33 919	746 218
			Итого по локальной смете: Водопровод и канализация				**4 154 882**
			ИТОГО по акту:				**4 154 882**
			В том числе оборудование:				**964 815**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	3190067.000 x 6.90%	220 115
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4154882.000 + 220114.626	4 374 997
	Сметная прибыль, (5.00%)	3410181.626 x 5.00%	170 509
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	4374996.626 x 2.000%	87 500

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 633 006
		в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000				4633005.640 x 1.0000	4 633 006
		НДС (12%)				4633005.640 x 12%	555 961
		Итого с НДС				4633005.640 + 555960.677	5 188 966

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 14:54
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:32
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:32
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:23
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	16.10.2025 16:44
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:57 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

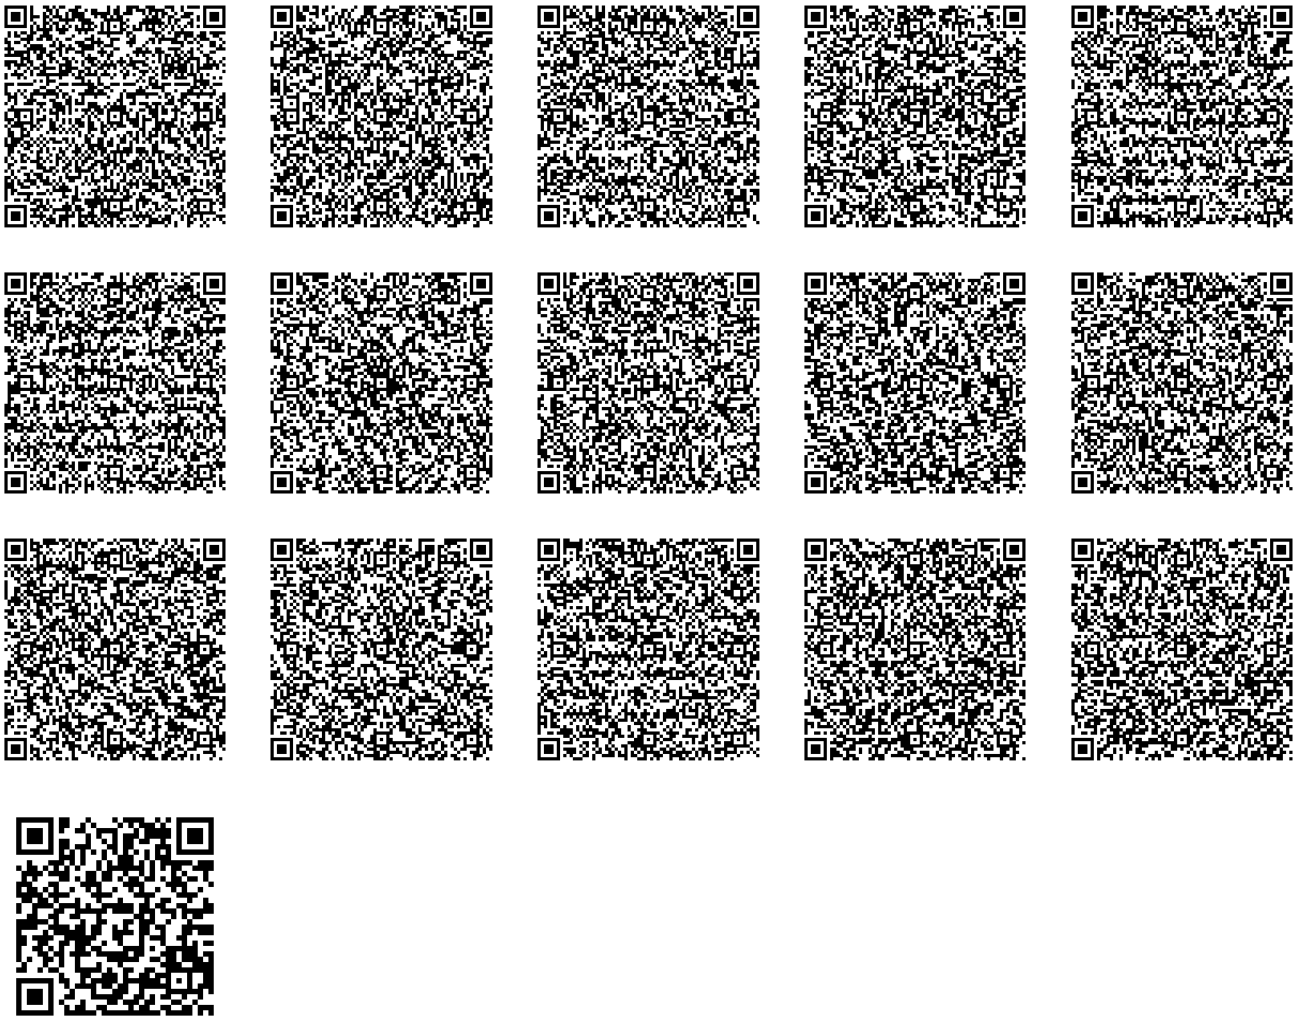

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Видеонаблюдение				
1	9	6125-0801-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	23	18 409	423 407
2	10	248-402-0106РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	23	66 414	1 527 522
3	12	6125-0801-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	80	15 800	1 264 000
4	13	248-402-0204РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3532LB-ADZK-G-C, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	80	66 414	5 313 120
			Итого по локальной смете: Видеонаблюдение				**8 528 049**
			ИТОГО по акту:				**8 528 049**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	8528049.000 x 6.90%	588 435
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	8528049.000 + 588435.389	9 116 484
	Сметная прибыль, (5.00%)	9116484.389 x 5.00%	455 824
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	9116484.389 x 2.000%	182 330
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		9 754 638
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	9754638.296 x 1.0000	9 754 638
	НДС (12%)	9754638.296 x 12%	1 170 557
	Итого с НДС	9754638.296 + 1170556.596	10 925 195

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	15.10.2025 15:01
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	15.10.2025 15:33
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	15.10.2025 15:32
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	15.10.2025 18:09
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2025 16:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2025 18:27
