Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Тепловые сети (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				
1	1	6303-0101-0206ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0.112	6 306 083	706 281
2	2	241-102-0218РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	112	5 411	606 032
3	3	241-112-0212РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	4	7 815	31 260
4	4	241-412-0109РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	32	8 313	266 016
5	5	241-411-0109РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	4	139 243	556 972
6	6	6301-0201-0141ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0.112	7 667 997	858 816
7	7	6111-0301-0701ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	55	2 008	110 440
8	8	261-105-0190РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.06325	552 642	34 955
			Итого по локальной смете: Тепловые сети (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				**3 170 772**
			ИТОГО по акту:				**3 170 772**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	3170772.000 x 6.90%	218 783
Итого с затратами на организацию и управление СМР	3170772.000 + 218783.271	3 389 555
Сметная прибыль, (5.00%)	3389555.271 x 5.00%	169 478
Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	3389555.271 x 2.000%	67 791
Итого с непредвидемыми работами и затратами		3 626 824
в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	3626824.140 x 1.0000	3 626 824
НДС (12%)	3626824.140 x 12%	435 219

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				3626824.140 + 435218.897	4 062 043

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:59
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:28
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:25
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:36 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:03
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:22

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Тепловые сети. Конструкции железобетонные (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				
1	1	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	6.25	15 271	95 444
			Итого по локальной смете: Тепловые сети. Конструкции железобетонные (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				**95 444**
			ИТОГО по акту:				**95 444**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				95444.000 x 6.90%	6 586
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				95444.000 + 6585.636	102 030
		Сметная прибыль, (5.00%)				102029.636 x 5.00%	5 101
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				102029.636 x 2.000%	2 041
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					109 172
		в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000				109171.711 x 1.0000	109 172
		НДС (12%)				109171.711 x 12%	13 101
		Итого с НДС				109171.711 + 13100.605	122 272

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:59
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:29
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:25
Представители заказчика		
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:04
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:22
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:36 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

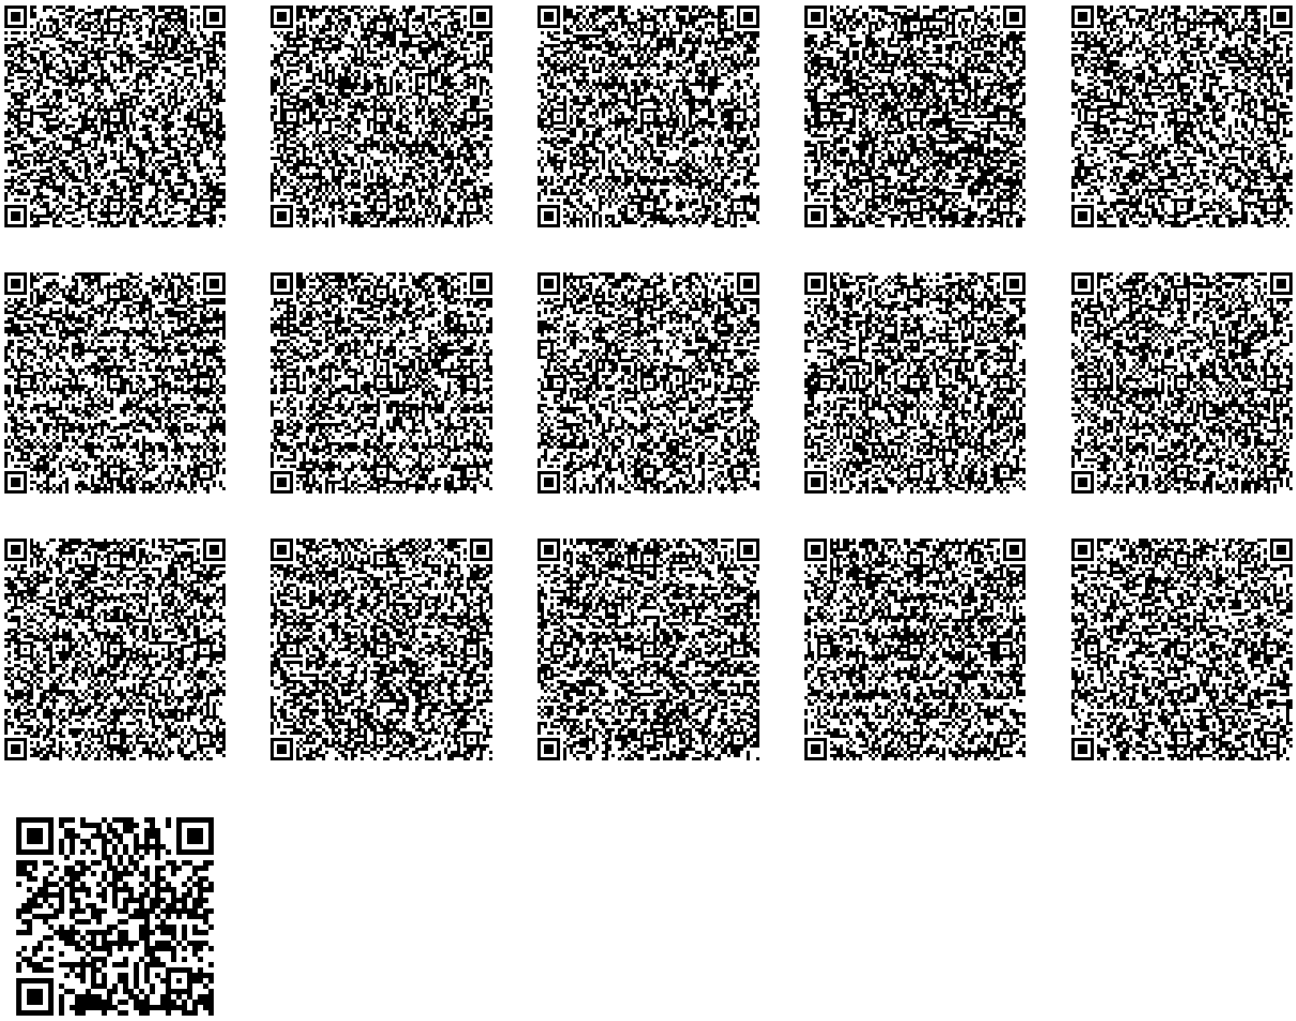

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование				
			Раздел: Учебный кабинет предшкольных классов.				
1	3	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-2	43 705	-87 410
			Итого по разделу: Учебный кабинет предшкольных классов.				**-87 410**
			Раздел: Кабинеты начальных классов				
2	42	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-8	43 705	-349 640
			Подраздел: Р Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира				
3	93	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Назначение: Физика природы. Планировать и проводить эксперимент.	набор	-40	40 288	-1 611 520
4	99	521-202-0604002 СпрСЦ 08.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Механика" типа Cornelsen Experimenta 16100K	набор	-8	186 236	-1 489 888
5	100	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Оптика" типа Cornelsen Experimenta 16110	набор	-8	86 267	-690 133
6	102	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Электричество" Cornelsen Experimenta 31772	набор	-8	115 808	-926 463
7	107	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Оптика" типа Cornelsen Experimenta 16110	набор	-8	64 461	-515 686
			Итого по подразделу: Р Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира				**-5 233 690**
			Итого по разделу: Кабинеты начальных классов				**-5 583 330**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления в начальной школе (казахский Я2/ русский Я2/ английский Я3)				
8	119	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по разделу: Кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления в начальной школе (казахский Я2/ русский Я2/ английский Я3)				**-43 705**
			Раздел: Кабинет казахского языка и литературы				
9	135	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-2	43 705	-87 410
			Итого по разделу: Кабинет казахского языка и литературы				**-87 410**
			Раздел: Кабинет английского языка				
10	150	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-3	43 705	-131 115
			Итого по разделу: Кабинет английского языка				**-131 115**
			Раздел: Кабинет математики				
11	164	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-2	43 705	-87 410
			Итого по разделу: Кабинет математики				**-87 410**
			Раздел: Кабинет русского языка и литературы				
12	196	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-2	43 705	-87 410
			Итого по разделу: Кабинет русского языка и литературы				**-87 410**
			Раздел: Кабинет истории и основ государства и права				
13	210	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по разделу: Кабинет истории и основ государства и права				**-43 705**
			Раздел: Кабинет географии				
14	257	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по разделу: Кабинет географии				**-43 705**
			Раздел: Кабинет музыки				
15	321	522-101-1209032 СпрСЦ 08.2024	Стол модульный для груп 600х600х760мм. Столешница квадратная ЛДСП 22мм, кромка ПВХ, металлический каркас труба круглая	шт.	-25	57 364	-1 434 100
16	322	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Кабинет музыки				**-1 477 805**
			Раздел: Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнат				
17	343	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по разделу: Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнат				**-43 705**
			Раздел: Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатик				
18	376	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
19	377	522-101-1209010 СпрСЦ 08.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с полипропиленовой кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, встроенный пенал, основание металлокаркас. Размер столешницы 700х500мм	шт.	-13	54 902	-713 726
			Итого по разделу: Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатик				**-757 431**
			Раздел: STEM-лаборатория				
20	408	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-13	43 705	-568 165
			Итого по разделу: STEM-лаборатория				**-568 165**
			Раздел: Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования"				
21	478	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по разделу: Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования"				**-43 705**
			Раздел: Мастерская по разделу "Дизайн и технология"				
22	624	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по разделу: Мастерская по разделу "Дизайн и технология"				**-43 705**
			Раздел: Кабинет физики с лаборантской				
23	652	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по разделу: Кабинет физики с лаборантской				**-43 705**
			Раздел: Кабинет биологии с лаборантской				
24	757	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по разделу: Кабинет биологии с лаборантской				**-43 705**
			Раздел: Кабинет химии с лаборантской				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	814	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по разделу: Кабинет химии с лаборантской				**-43 705**
			Раздел: Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и Е-библиотекой				
26	991	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-2	43 705	-87 410
			Итого по разделу: Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и Е-библиотекой				**-87 410**
			Раздел: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобра				
			Подраздел: Р Кабинет психолога				
27	1065	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по подразделу: Р Кабинет психолога				**-43 705**
			Подраздел: Р Кабинет социального педагога				
28	1085	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	-1	43 705	-43 705
			Итого по подразделу: Р Кабинет социального педагога				**-43 705**
			Итого по разделу: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобра				**-87 410**
			Раздел: Спортзал для младшей школы				
29	1201	522-201-0507002 СпрСЦ 08.2024	Дорожка для профилактики плоскостопии и развития крупной моторики, ловкости и координации движений (12 шаровых сегментов) типа Инт парк 29550	шт.	-5	204 335	-1 021 675
			Итого по разделу: Спортзал для младшей школы				**-1 021 675**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование				**-10 457 326**
			ИТОГО по акту:				**-10 457 326**
			В том числе оборудование:				**-10 457 326**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	0.000 x 6.90%	0
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	-10457326.000 + 0.000	-10 457 326
	Сметная прибыль, (5.00%)	0.000 x 5.00%	0
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	-10457326.000 x 2.000%	-209 147
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		-10 666 473
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	-10666472.520 x 1.0000	-10 666 473
	НДС (12%)	-10666472.520 x 12%	-1 279 977
	Итого с НДС	-10666472.520 + -1279976.702	-11 946 449

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:57
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:32
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:26
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:24
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:39 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:06

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				
			Раздел: Учебный кабинет предшкольных классов.				
1	1	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	2	43 705	87 410
2	2	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	2	425 915	851 831
			Подраздел: Р Учебные пособия и оборудование для оснащения предметно-развивающей среды				
3	3	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Набор геометрических фигур демонстрационный	набор	2	16 820	33 640
4	4	521-301-0306001 СпрСЦ 08.2024	Набор геометрических фигур и разверток демонстрационный	набор	26	2 338	60 788
			Итого по подразделу: Р Учебные пособия и оборудование для оснащения предметно-развивающей среды				**94 428**
			Итого по разделу: Учебный кабинет предшкольных классов.				**1 033 669**
			Раздел: Кабинеты начальных классов				
5	5	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	8	43 705	349 640
6	6	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	8	936 696	7 493 568
7	7	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"р Acer Vero	шт	8	425 916	3 407 325
			Подраздел: Р Наглядные пособия и литература				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Часы с циферблатом для учащихся	шт	8	4 079	32 633
9	9	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Развивающий набор "Объемные геометрические фигуры"	шт	8	10 072	80 576
10	10	521-301-0306001 СпрСЦ 08.2024	Набор геометрических фигур и разверток демонстрационный	набор	104	2 338	243 152
11	11	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Часы с циферблатом для учащихся	шт	104	4 057	421 928
			Итого по подразделу: Р Наглядные пособия и литература				**778 289**
			Подраздел: Р Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира				
12	12	521-301-1101002 СпрСЦ 08.2024	Анемометр типа Invicta 084059/42443	шт.	8	35 891	287 128
13	13	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Набор для юных физиков типа Experia PHE-016	набор	40	40 288	1 611 520
14	14	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Набор для юных биологов типа Experia PHE-017	набор	40	444 528	17 781 109
15	15	521-202-0604002 СпрСЦ 08.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Механика" типа Experia PHE-022	набор	8	186 236	1 489 888
16	16	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Оптика" типа Experia PHE-023	набор	8	86 267	690 133
17	17	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Набор для изучения электричества в начальной школы (на 13 учебных групп) типа Experia PHE-028	набор	8	115 808	926 463
18	18	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Набор демонстрационный для изучения Оптики в начальной школе типа Experia PHE-025	набор	8	64 461	515 686
19	19	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Einstein™Tablet+3.Планшет ENTAB3.13 встроенных датчиков: видео датчик,акселерометр,точка росы,индекс тепла,датчик звука,барометрическое давление,GPS/местоположение,микрофон,УФ,свет,температура,частота сердцебиения,влажность	комплект	8	401 081	3 208 649
			Итого по подразделу: Р Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира				**26 510 576**
			Итого по разделу: Кабинеты начальных классов				**38 539 398**
			Раздел: Кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления в начальной школе (казахский Я2/ русский Я2/ английский Я3)				
20	20	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	1	425 916	425 916
			Итого по разделу: Кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления в начальной школе (казахский Я2/ русский Я2/ английский Я3)				**469 621**
			Раздел: Кабинет казахского языка и литературы				
22	22	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	2	43 705	87 410
23	23	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	2	936 696	1 873 392
24	24	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	2	425 915	851 831
			Итого по разделу: Кабинет казахского языка и литературы				**2 812 633**
			Раздел: Кабинет английского языка				
25	25	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	3	43 705	131 115
26	26	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	3	936 696	2 810 088
27	27	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	3	425 916	1 277 747
			Итого по разделу: Кабинет английского языка				**4 218 950**
			Раздел: Кабинет математики				
28	28	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	2	43 705	87 410
29	29	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	2	936 696	1 873 392
30	30	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	2	425 915	851 831
			Итого по разделу: Кабинет математики				**2 812 633**
			Раздел: Цифровая лаборатория по математике с графическим калькулятором				
			Подраздел: Р Пособия демонстрационные				
31	31	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Развивающий набор "Объемные геометрические фигуры"	набор	2	10 072	20 144
			Итого по подразделу: Р Пособия демонстрационные				**20 144**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р Пособия лабораторные				
32	32	521-301-0306001 СпрСЦ 08.2024	Набор геометрических фигур и разверток демонстрационный	набор	26	2 338	60 788
			Итого по подразделу: Р Пособия лабораторные				**60 788**
			Итого по разделу: Цифровая лаборатория по математике с графическим калькулятором				**80 932**
			Раздел: Кабинет русского языка и литературы				
33	33	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	2	43 705	87 410
34	34	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	2	936 696	1 873 392
35	35	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	2	425 915	851 831
			Итого по разделу: Кабинет русского языка и литературы				**2 812 633**
			Раздел: Кабинет истории и основ государства и права				
36	36	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
37	37	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	1	936 696	936 696
38	38	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	1	425 916	425 916
39	39	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	ASUS Vivobook 16 WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Mic rosoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик	шт	13	402 880	5 237 440
			Итого по разделу: Кабинет истории и основ государства и права				**6 643 757**
			Раздел: Кабинет географии				
40	40	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
41	41	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	1	936 696	936 696
42	42	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	1	425 916	425 916
			Итого по разделу: Кабинет географии				**1 406 317**
			Раздел: Кабинет музыки				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	522-101-1209032 СпрСЦ 08.2024	Стол модульный одноместный, размером 700х600х760мм. Столешница пятиугольной формы ЛДСП 22мм, кромка ПВХ, металлический каркас труба овальная	шт.	25	57 364	1 434 100
44	44	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480х510х1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
45	45	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	1	425 916	425 916
46	46	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	1	936 696	936 696
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**1 362 612**
			Итого по разделу: Кабинет музыки				**2 840 417**
			Раздел: Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнат				
47	47	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480х510х1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
48	48	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	1	425 916	425 916
49	49	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	1	936 696	936 696
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**1 362 612**
			Итого по разделу: Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнат				**1 406 317**
			Раздел: Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности,информатик				
50	50	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480х510х1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
51	51	522-101-1209010 СпрСЦ 08.2024	Стол компьютерный одноместный сборно-разборной конструкцией, регулируемый по высоте с полиуретановой кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, крючок для портфеля и лоток для хранения вещей, основание металлокаркас.Размер столешницы 700х500 мм	шт.	13	54 902	713 726
52	52	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	1	936 696	936 696
53	53	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	1	425 916	425 916
54	54	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	13	425 916	5 536 904

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности,информатик				**7 656 947**
			Раздел: Кабинет информатики (IT-класс)				
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
55	55	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	1	936 696	936 696
56	56	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	13	425 916	5 536 904
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**6 473 600**
			Итого по разделу: Кабинет информатики (IT-класс)				**6 473 600**
			Раздел: STEM-лаборатория				
57	57	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	13	43 705	568 165
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
58	58	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	1	936 696	936 696
59	59	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	1	425 916	425 916
60	60	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	ASUS Vivobook 16 WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Mic rosoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик	шт	4	402 880	1 611 520
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**2 974 132**
			Итого по разделу: STEM-лаборатория				**3 542 297**
			Раздел: Кабинет робототехники				
61	61	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	1	425 916	425 916
62	62	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	ASUS Vivobook 16 WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Mic rosoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик	шт	6	402 880	2 417 280
			Итого по разделу: Кабинет робототехники				**2 843 196**
			Раздел: Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования"				
63	63	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
			Подраздел: Р Технические средства обучения				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	1	425 916	425 916
65	65	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	1	936 696	936 696
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**1 362 612**
			Подраздел: Р Пособия,инструменты и принадлежности				
66	66	522-101-0316001 СпрСЦ 08.2024	Мольберт напольный алюминиевый, размеры не менее 960x960x1800 мм	шт.	12	14 550	174 600
			Итого по подразделу: Р Пособия,инструменты и принадлежности				**174 600**
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
67	67	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	ASUS Vivobook 16 WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Mic rosoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик	шт	26	402 880	10 474 880
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**10 474 880**
			Итого по разделу: Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования"				**12 055 797**
			Раздел: Мастерская по разделу "Культура дома" и "Гончарная студия" (совм				
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
68	68	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	шт	1	425 916	425 916
69	69	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	1	936 696	936 696
70	70	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	ASUS Vivobook 16 WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Mic rosoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик	шт	1	402 880	402 880
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**1 765 492**
			Подраздел: Р Станки и оборудование:				
71	71	521-301-2968001 СпрСЦ 08.2024	Лазерный станок Ruida 60W 1000x700 мм	шт.	1	1 167 947	1 167 947
			Итого по подразделу: Р Станки и оборудование:				**1 167 947**
			Итого по разделу: Мастерская по разделу "Культура дома" и "Гончарная студия" (совм				**2 933 439**
			Раздел: Мастерская по разделу "Дизайн и технология"				
72	72	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
			Итого по разделу: Мастерская по разделу "Дизайн и технология"				**43 705**
			Раздел: Кабинет физики с лаборантской				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
			Итого по разделу: Кабинет физики с лаборантской				**43 705**
			Раздел: Кабинет биологии с лаборантской				
74	74	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
			Подраздел: Р Модели по анатомии				
75	75	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Модель головного мозга	шт	1	11 482	11 482
			Итого по подразделу: Р Модели по анатомии				**11 482**
			Итого по разделу: Кабинет биологии с лаборантской				**55 187**
			Раздел: Кабинет химии с лаборантской				
76	76	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
			Итого по разделу: Кабинет химии с лаборантской				**43 705**
			Раздел: Методический кабинет/учительская(2 шт.на 2 и 3 этажах)				
77	77	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	комплект	2	936 696	1 873 392
			Итого по разделу: Методический кабинет/учительская(2 шт.на 2 и 3 этажах)				**1 873 392**
			Раздел: Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и Е-библиотекой				
78	78	521-402-0301021 СпрСЦ 08.2024	Диван, посадочных мест 3, материал: обивка - ткань (микровелюр), напонитель - паролон, синтепон, синтепух. Размеры: 2200x850x700 мм. Цвет: бежевый	шт.	1	222 040	222 040
79	79	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	2	43 705	87 410
80	80	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Интерактивная панель Speechi Touch SuperGlass+ s 75"	шт	1	936 696	936 696
81	81	521-101-0419002 СпрСЦ 08.2024	Принтер А3 цветной Xerox VersaLink C7000N,HiQ LED, 35/35 стр/мин (А4)/ 19/19 стр/мин (А3), 520+100 стр., 1.05GHz DualCore, 2GB, PostScript 3, PCL5c/6, USB 3.0, 10/100/1000 ethernet, optional wi-fi, 1200x2400DPI, VersaLink C7000 (C7000EUD)	шт.	1	949 286	949 286
			Итого по разделу: Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и Е-библиотекой				**2 195 432**
			Раздел: Актовый зал - Кинолекторий (количество мест согласно СП)				
82	82	522-101-1263014 СпрСЦ 08.2024	Кресло театральное,каркас металлический цветной,подлокотники с деревянной накладкой,обивка - гобелен.Размер: 480x420x670мм	шт.	130	33 300	4 329 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	ASUS Vivobook 16 WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Mic rosoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик	шт	1	402 880	402 880
			Итого по разделу: Актовый зал - Кинолекторий (количество мест согласно СП)				**4 731 880**
			Раздел: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобра				
			Подраздел: Р Кабинет психолога				
84	84	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
85	85	526-301-0116002 СпрСЦ 08.2024	Облучатель бактерицидный типа ОБНП-01/15 настенно-потолочный	шт.	1	35 257	35 257
			Итого по подразделу: Р Кабинет психолога				**78 962**
			Подраздел: Р Кабинет социального педагога				
86	86	522-101-1224002 СпрСЦ 08.2024	Кресло, модель "Worker", материал: крестовина -- нейлон повышенной прочности, подлокотники ударопрочный пластик, обивка - износостойкая ткань. Размер: 480x510x1100 мм. Материал спинки: сетка. Материал сиденья: Полипропилен. Материал крестовины: Пластик. Максимальная нагрузка 120 кг. Цвет: черный	шт.	1	43 705	43 705
87	87	526-301-0116002 СпрСЦ 08.2024	Облучатель бактерицидный типа ОБНП-01/15 настенно-потолочный	шт.	1	35 257	35 257
			Итого по подразделу: Р Кабинет социального педагога				**78 962**
			Подраздел: Р Оборудование и мебель для кабинетов поддержки инклюзивного образования при организациях образования				
88	88	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	ASUS Vivobook 16 WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Mic rosoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик	шт	1	402 880	402 880
			Итого по подразделу: Р Оборудование и мебель для кабинетов поддержки инклюзивного образования при организациях образования				**402 880**
			Итого по разделу: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобра				**560 804**
			Раздел: Спортзал для младшей школы				
89	89	522-201-0507002 СпрСЦ 08.2024	Доска наклонная ребристая 1,5 м TSF-4575 (дерево). Размеры 1500x2400 мм. Материал: березовая фанера 18 мм	шт.	5	204 335	1 021 675
			Итого по разделу: Спортзал для младшей школы				**1 021 675**
			Раздел: Кабинет - юриста проф ориентатора				
90	90	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	комплект	1	425 916	425 916
			Итого по разделу: Кабинет - юриста проф ориентатора				**425 916**
			Раздел: Пом.№80.Охлаждающая камера для пищевых отходов.				
91	91	522-103-0132002 СпрСЦ 08.2024	Рукомойник из нержавеющей стали 400x400x150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	1	153 585	153 585
			Итого по разделу: Пом.№80.Охлаждающая камера для пищевых отходов.				**153 585**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пом.№81,82,94.Овощная кладовая,охлаждаемая камера для замороженных полуфабрикатов,охлаждаемая камера овощных полуфабрикатов.				
92	92	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Шкаф шоковой заморозки POLAIR- Grande CR15-G	шт	4	3 728 707	14 914 827
			Итого по разделу: Пом.№81,82,94.Овощная кладовая,охлаждаемая камера для замороженных полуфабрикатов,охлаждаемая камера овощных полуфабрикатов.				**14 914 827**
			Раздел: Пом.№96.Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов				
93	93	522-103-0310 СпрСЦ 08.2024	Стол холодильный СХС-3-70 (1775х700х850/935)	шт.	1	1 049 451	1 049 451
94	94	522-103-0301 СпрСЦ 08.2024	Шкаф холодильный СМ114-S (V±1400 л, 0..+6°С, 1402х925х1996 мм, 0,55 кВт, 220 В)	шт.	1	1 344 643	1 344 643
			Итого по разделу: Пом.№96.Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов				**2 394 094**
			Раздел: Пом.№93.Цех мучных,кулинарных и булочных изделий				
95	95	522-103-0166001 СпрСЦ 08.2024	Стол специализированный кондитерский СКП-15/8 (1500х800х850)	шт.	1	287 935	287 935
			Итого по разделу: Пом.№93.Цех мучных,кулинарных и булочных изделий				**287 935**
			Раздел: Пом.№98.Холодный цех.				
96	96	522-103-0310 СпрСЦ 08.2024	Стол холодильный СХС-3-70 (1775х700х850/935)	шт.	1	1 049 451	1 049 451
			Итого по разделу: Пом.№98.Холодный цех.				**1 049 451**
			Раздел: Пом.№78.Моечная столовой посуды				
97	97	522-103-0511004 СпрСЦ 08.2024	Машина посудомоечная купольная типа Empero EMP.1000-F. Напряжение 380 В. Мощность 6.55 кВт. Размер: 695х765х1485 мм. В комплекте с душирующим устройством со смесителем типа JP.OYD.03, столом предмоечным (с цельнотянутой мойкой) типа EMP.BYG.75150-1EC-L, раздаточным столом типа EMP.BYC.75120-T-L 1200х750х890мм, помпой (дренажный насос для принудительного слива воды)	комплект	1	4 078 696	4 078 696
98	98	522-103-0236001 СпрСЦ 08.2024	Тележка банкетная тепловая Empero EMP.BQ1, Турция	шт.	1	1 659 414	1 659 414
			Итого по разделу: Пом.№78.Моечная столовой посуды				**5 738 110**
			Раздел: Пом.№91.Горячий цех				
99	99	522-103-0132002 СпрСЦ 08.2024	Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	1	153 585	153 585
100	100	522-103-0301 СпрСЦ 08.2024	Шкаф холодильный СМ114-S (V±1400 л, 0..+6°С, 1402х925х1996 мм, 0,55 кВт, 220 В)	шт.	1	1 344 643	1 344 643
101	101	522-103-0202 СпрСЦ 08.2024	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160/9Т, 18,1 кВт, 380 В	шт.	1	1 310 856	1 310 856

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	522-103-0212 СпрСЦ 08.2024	Плита электрическая ЭП-6ЖШ (1475x895x860 мм, 22,8 кВт, 380 В)	шт.	1	824 985	824 985
			Итого по разделу: Пом.№91.Горячий цех				**3 634 069**
			Раздел: Пом.№91.Раздаточная при обеденном зале				
103	103	522-103-1014002 СпрСЦ 08.2024	Прилавок для столовых приборов и разносов ПСПРТ	шт.	1	386 449	386 449
104	104	522-103-1002 СпрСЦ 08.2024	Прилавок-витрина охлаждаемый ПОЗТ-1,5	шт.	1	943 750	943 750
105	105	522-103-1010 СпрСЦ 08.2024	Прилавок нейтральный ПНТ-1,5	шт.	1	502 500	502 500
106	106	522-103-0228 СпрСЦ 08.2024	Мармит 1-х блюд ПМПТ-1,12 (1120x980x1230)	шт.	1	549 443	549 443
107	107	522-103-0226 СпрСЦ 08.2024	Мармит 2-х блюд паровой ПМВТ-1,5 (Bain Marie) с 2 полками (1500x980x1230)	шт.	1	996 429	996 429
108	108	522-103-0236001 СпрСЦ 08.2024	Тележка банкетная тепловая Empero EMP.BQ1, Турция	шт.	1	1 659 414	1 659 414
			Итого по разделу: Пом.№91.Раздаточная при обеденном зале				**5 037 985**
			Раздел: Пом.№75.Обеденный зал столовой на 175 п.м.(в т.ч.2 места для МГН).				
109	109	522-102-0102002 СпрСЦ 08.2024	Пластиковый стул с интегрированными металлическими ножками. Размеры: 460x500x800 мм	шт.	173	8 242	1 425 866
			Итого по разделу: Пом.№75.Обеденный зал столовой на 175 п.м.(в т.ч.2 места для МГН).				**1 425 866**
			Раздел: Пом.№89.Кабинет заведующего производством (столовой).				
110	110	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Компьютер Nomad (Intel Core i5 12400,l6ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб- камерой, сетевой фильтр + монитор 23,8"	комплект	1	425 916	425 916
			Итого по разделу: Пом.№89.Кабинет заведующего производством (столовой).				**425 916**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				**146 639 792**
			ИТОГО по акту:				**146 639 792**
			В том числе оборудование:				**146 639 792**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				0.000 x 6.90%	0
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				146639792.000 + 0.000	146 639 792
		Сметная прибыль, (5.00%)				0.000 x 5.00%	0
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				146639792.000 x	2 932 796

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						2.000%	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				149 572 588
			в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000			149572587.840 x 1.0000	149 572 588
			НДС (12%)			149572587.840 x 12%	17 948 711
			Итого с НДС			149572587.840 + 17948710.541	167 521 298

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 16:01
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:24
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:24
Представители заказчика		
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 19:59
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:32 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:20

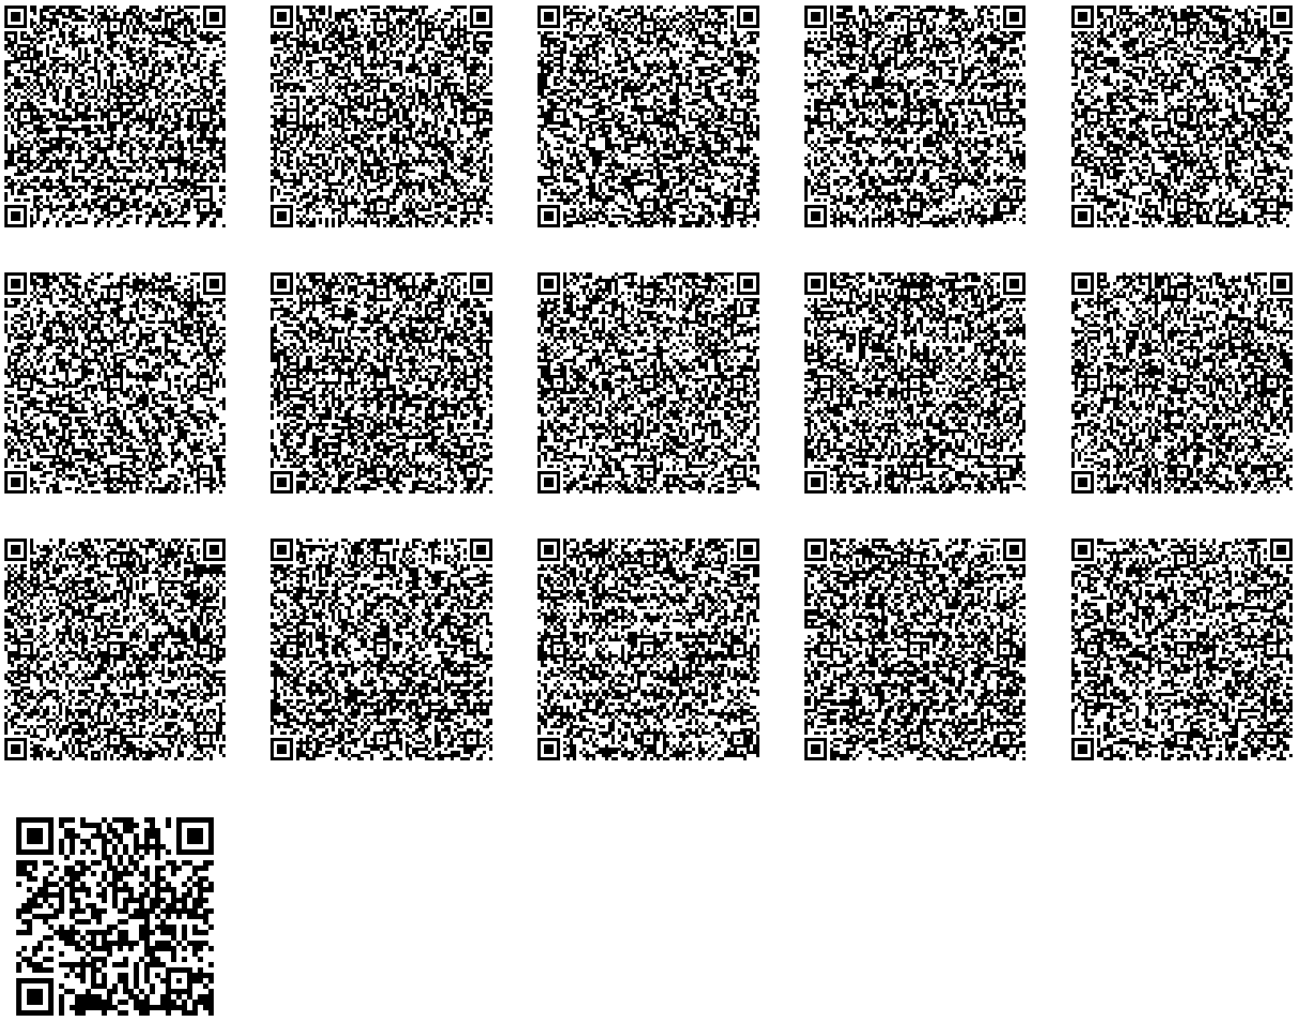

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование				
			Раздел: Учебный кабинет предшкольных классов.				
1	10	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	2	161 152	322 304
2	11	521-101-0417006 СпрСЦ 08.2024	Телевизор WADE 55L23100 4K, 55" (139 см), Ultra HD 4K (3840x2160), DLED, Smart TV	шт.	2	224 812	449 624
			Подраздел: Р Учебные пособия и оборудование для оснащения предметно-развивающей среды				
3	15	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Демонстрационные часы с циферблатом	шт	2	11 331	22 662
4	21	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Набор плоскостных геометрических фигур	набор	2	7 554	15 108
			Итого по подразделу: Р Учебные пособия и оборудование для оснащения предметно-развивающей среды				**37 770**
			Итого по разделу: Учебный кабинет предшкольных классов.				**809 698**
			Раздел: Кабинеты начальных классов				
5	50	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	8	161 152	1 289 216
			Подраздел: Р Наглядные пособия и литература				
6	64	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Часы с циферблатом демонстрационные	шт	8	4 057	32 456
			Итого по подразделу: Р Наглядные пособия и литература				**32 456**
			Подраздел: Р Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	104	521-301-1103001 СпрСЦ 08.2024	Дождемер типа Invicta 084059/42443	шт.	8	12 404	99 232
			Итого по подразделу: Р Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира				**99 232**
			Итого по разделу: Кабинеты начальных классов				**1 420 904**
			Раздел: Кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления в начальной школе (казахский Я2/ русский Я2/ английский Я3)				
8	125	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления в начальной школе (казахский Я2/ русский Я2/ английский Я3)				**161 152**
			Раздел: Кабинет казахского языка и литературы				
9	143	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	2	161 152	322 304
			Итого по разделу: Кабинет казахского языка и литературы				**322 304**
			Раздел: Кабинет английского языка				
10	157	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	3	161 152	483 456
			Итого по разделу: Кабинет английского языка				**483 456**
			Раздел: Кабинет математики				
11	171	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	2	161 152	322 304
			Итого по разделу: Кабинет математики				**322 304**
			Раздел: Цифровая лаборатория по математике с графическим калькулятором				
			Подраздел: Р Пособия демонстрационные				
12	179	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Набор плоских фигур	набор	6	5 036	30 216
13	180	521-301-0305001 СпрСЦ 08.2024	Набор для исследования законов вероятности типа Invicta 113159/42432	набор	2	69 620	139 240
14	181	521-301-0310001 СпрСЦ 08.2024	Набор Дробные части квадрата и круга типа Invicta	набор	6	66 000	396 000
			Итого по подразделу: Р Пособия демонстрационные				**565 456**
			Итого по разделу: Цифровая лаборатория по математике с графическим калькулятором				**565 456**
			Раздел: Кабинет русского языка и литературы				
15	204	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	2	161 152	322 304

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Кабинет русского языка и литературы				**322 304**
			Раздел: Кабинет истории и основ государства и права				
16	218	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Кабинет истории и основ государства и права				**161 152**
			Раздел: Кабинет географии				
17	265	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Кабинет географии				**161 152**
			Раздел: Кабинет музыки				
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
18	330	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**161 152**
			Итого по разделу: Кабинет музыки				**161 152**
			Раздел: Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнат				
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
19	349	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**161 152**
			Итого по разделу: Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнат				**161 152**
			Раздел: Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатик				
20	388	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатик				**161 152**
			Раздел: Кабинет информатики (IT-класс)				
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
21	403	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**161 152**
			Итого по разделу: Кабинет информатики (IT-класс)				**161 152**
			Раздел: STEM-лаборатория				
			Подраздел: Р Технические средства обучения				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	422	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**161 152**
			Итого по разделу: STEM-лаборатория				**161 152**
			Раздел: Кабинет робототехники				
23	458	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Кабинет робототехники				**161 152**
			Раздел: Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования"				
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
24	486	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**161 152**
			Итого по разделу: Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования"				**161 152**
			Раздел: Мастерская по разделу "Культура дома" и "Гончарная студия" (совм				
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
25	527	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Epson EcoTank	шт	1	161 152	161 152
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**161 152**
			Итого по разделу: Мастерская по разделу "Культура дома" и "Гончарная студия" (совм				**161 152**
			Раздел: Совмещенный кабинет биотехнологии / нанотехнологии				
26	751	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Ноутбук с запасной аккумуляторной батареей в комплекте	шт	26	402 880	10 474 880
			Итого по разделу: Совмещенный кабинет биотехнологии / нанотехнологии				**10 474 880**
			Раздел: Кабинет руководителя организации образования				
27	869	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	1	425 916	425 916
28	870	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Кабинет руководителя организации образования				**587 068**
			Раздел: Приемная-кабинет делопроизводства				
29	878	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	1	425 916	425 916

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	879	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Приемная-кабинет делопроизводства				**587 068**
			Раздел: Методический кабинет/учительская(2 шт. на 2 и 3 этажах)				
31	885	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	2	425 915	851 831
32	886	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	2	161 152	322 304
			Итого по разделу: Методический кабинет/учительская(2 шт. на 2 и 3 этажах)				**1 174 135**
			Раздел: Кабинет заместителя руководителя				
33	895	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	1	425 916	425 916
34	896	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Кабинет заместителя руководителя				**587 068**
			Раздел: Бухгалтерия				
35	903	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	1	425 916	425 916
36	904	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Бухгалтерия				**587 068**
			Раздел: Отдел кадров				
37	909	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	1	425 916	425 916
38	910	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Отдел кадров				**587 068**
			Раздел: Кабинет преподавателей физической культуры				
			Подраздел: Р Технические средства обучения				
39	917	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	1	425 916	425 916
40	919	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Р Технические средства обучения				**587 068**
			Итого по разделу: Кабинет преподавателей физической культуры				**587 068**
			Раздел: Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и Е-библиотекой				
41	1009	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	2	161 152	322 304
42	1010	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	6	425 916	2 555 494
			Итого по разделу: Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и Е-библиотекой				**2 877 798**
			Раздел: Актовый зал - Кинолекторий (количество мест согласно СП)				
43	1023	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	LED-экранЭкран с проектором/	комплект	1	8 561 200	8 561 200
			Итого по разделу: Актовый зал - Кинолекторий (количество мест согласно СП)				**8 561 200**
			Раздел: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобра				
			Подраздел: Р Сенсорная комната				
44	1060	522-201-0507001 СпрСЦ 08.2024	Тактильная дорожка (7 составных модулей)	шт.	1	255 474	255 474
			Итого по подразделу: Р Сенсорная комната				**255 474**
			Подраздел: Р Кабинет психолога				
45	1074	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	1	425 916	425 916
46	1076	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
			Итого по подразделу: Р Кабинет психолога				**587 068**
			Подраздел: Р Кабинет социального педагога				
47	1093	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	1	425 916	425 916
48	1095	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
			Итого по подразделу: Р Кабинет социального педагога				**587 068**
			Подраздел: Р Кабинет логопеда (логопедический пункт)				
49	1107	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	1	425 916	425 916

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	1109	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
51	1125	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Облучатель бактерицидный настенный	шт	1	58 994	58 994
			Итого по подразделу: Р Кабинет логопеда (логопедический пункт)				**646 062**
			Итого по разделу: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобра				**2 075 672**
			Раздел: Кабинет врача/процедурная				
52	1168	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой	комплект	1	425 916	425 916
53	1169	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
54	1170	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	шт	4	58 994	235 975
			Итого по разделу: Кабинет врача/процедурная				**823 043**
			Раздел: Спортзал для младшей школы				
55	1188	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно- телефонной гарнитурой и web-камерой	комплект	1	425 916	425 916
			Итого по разделу: Спортзал для младшей школы				**425 916**
			Раздел: Кабинет - юриста проф ориентатора				
56	1262	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Кабинет - юриста проф ориентатора				**161 152**
			Раздел: Пом. №80. Охлаждающая камера для пищевых отходов.				
57	1271	522-103-0301СпрСЦ 08.2024	Шкаф холодильный CM114-S (V±1400 л, 0..+6°C, 1402x925x1996 мм, 0,55 кВт, 220 В)	шт.	1	1 344 643	1 344 643
			Итого по разделу: Пом. №80. Охлаждающая камера для пищевых отходов.				**1 344 643**
			Раздел: Пом. №81,82,94. Овощная кладовая, охлаждаемая камера для замороженных полуфабрикатов, охлаждаемая камера овощных полуфабрикатов.				
58	1273	522-103-0304СпрСЦ 08.2024	Шкаф среднетемпературный V± 700 л ARKTO R0, 7-G (710x880x2200 мм, 0…+6 °C, нерж.)	шт.	3	657 081	1 971 243
			Итого по разделу: Пом. №81,82,94. Овощная кладовая, охлаждаемая камера для замороженных полуфабрикатов, охлаждаемая камера овощных полуфабрикатов.				**1 971 243**
			Раздел: Пом. №95. Доготовочный цех овощных полуфабрикатов.				
59	1276	526-301-0115014 СпрСЦ 08.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный типа РВБ 01/15 Настенный, бактериальная эффективность 99%, производительность 30-50 м3/ч	шт.	1	110 809	110 809

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1277	522-103-0132002 СпрСЦ 08.2024	Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	1	153 585	153 585
			Итого по разделу: Пом. №95. Доготовочный цех овощных полуфабрикатов.				**264 394**
			Раздел: Пом. №96. Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов				
61	1282	526-301-0115014 СпрСЦ 08.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный типа РВБ 01/15 Настенный, бактериальная эффективность 99%, производительность 30-50 м3/ч	шт.	1	110 809	110 809
62	1283	522-103-0132002 СпрСЦ 08.2024	Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	1	153 585	153 585
			Итого по разделу: Пом. №96. Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов				**264 394**
			Раздел: Пом. №93. Цех мучных, кулинарных и булочных изделий				
63	1290	526-301-0115014 СпрСЦ 08.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный типа РВБ 01/15 Настенный, бактериальная эффективность 99%, производительность 30-50 м3/ч	шт.	1	110 809	110 809
64	1291	522-103-0132002 СпрСЦ 08.2024	Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	1	153 585	153 585
			Итого по разделу: Пом. №93. Цех мучных, кулинарных и булочных изделий				**264 394**
			Раздел: Пом. №98. Холодный цех.				
65	1298	522-103-0132002 СпрСЦ 08.2024	Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	1	153 585	153 585
66	1304	522-103-0302СпрСЦ 08.2024	Шкаф холодильный СМ107-S (V±700 л, 0..+6°С, 697х925х1996 мм, 0,35 кВт, 220 В)	шт.	1	598 183	598 183
67	1305	526-301-0117004 СпрСЦ 08.2024	Облучатель бактерицидный типа ОБПН-02/15 переносной, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 120 м3/ч	шт.	1	57 421	57 421
			Итого по разделу: Пом. №98. Холодный цех.				**809 189**
			Раздел: Пом. №78. Моечная столовой посуды				
68	1312	526-301-0117004 СпрСЦ 08.2024	Облучатель бактерицидный типа ОБПН-02/15 переносной, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 120 м3/ч	шт.	1	57 421	57 421
			Итого по разделу: Пом. №78. Моечная столовой посуды				**57 421**
			Раздел: Пом. №89. Кабинет заведующего производством (столовой).				
69	1353	522-101-1227010 СпрСЦ 08.2024	Кресло офисное. Регулировка высоты (газлифт), крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: спинка- сетка, сиденье- ткань. Размер: 480х440х890 мм	шт.	1	44 554	44 554
70	1355	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт	1	161 152	161 152
			Итого по разделу: Пом. №89. Кабинет заведующего производством (столовой).				**205 706**
			Раздел: Пом. №85. Гардеробная персонал				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	1359	522-101-1309001 СпрСЦ 08.2024	Фен настенный для сушки волос типа ALMACOM HFD-1200A. Мощность: 1200Вт, скорость воздух: 12м/с, скорость вращения двигателя: 170 000 об/мин	шт.	1	15 641	15 641
72	1360	522-201-0502001 СпрСЦ 08.2024	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8 588	8 588
73	1362	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Ролл шторы	м2	23	8 058	185 325
74	1363	Т пункт перечня СпрСЦ 08.2024	Мусорное ведро	шт	112	806	90 245
			Итого по разделу: Пом. №85. Гардеробная персонал				**299 799**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование				**41 596 485**
			ИТОГО по акту:				**41 596 485**
			В том числе оборудование:				**41 596 485**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	0.000 x 6.90%	0
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	41596485.000 + 0.000	41 596 485
	Сметная прибыль, (5.00%)	0.000 x 5.00%	0
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	41596485.000 x 2.000%	831 930
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		42 428 415
	в ценах 3,4 кварталов 2023г., к = 0.9699	42428414.700 x 0.9699	41 152 682
	НДС (12%)	41152681.571 x 12%	4 938 322
	Итого с НДС	41152681.571 + 4938321.789	46 091 003

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:53
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:17
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:27
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:26
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:10

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроснабжение и электроосвещение				
			Раздел: Освещение				
			Подраздел: Установочное оборудование				
1	62	252-207-3980РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	-650	1 095	-711 750
			Итого по подразделу: Установочное оборудование				**-711 750**
			Итого по разделу: Освещение				**-711 750**
			Раздел: Освещение фасада				
2	324	252-207-3980РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	-120	1 095	-131 400
			Итого по разделу: Освещение фасада				**-131 400**
			Итого по локальной смете: Электроснабжение и электроосвещение				**-843 150**
			ИТОГО по акту:				**-843 150**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	-843150.000 x 6.90%	-58 177
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	-843150.000 + -58177.351	-901 327
	Сметная прибыль, (5.00%)	-901327.351 x 5.00%	-45 066
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	-901327.351 x 2.000%	-18 027
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		-964 420
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	-964420.265 x 1.0000	-964 420
	НДС (12%)	-964420.265 x 12%	-115 730
	Итого с НДС	-964420.265 + -115730.432	-1 080 151

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:56
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:27
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:26
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:24
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:07

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроснабжение и электроосвещение				
			Раздел: Силовое оборудование				
			Подраздел: Установочное оборудование				
1	257	252-207-3980РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	-1580	1 095	-1 730 100
			Итого по подразделу: Установочное оборудование				**-1 730 100**
			Итого по разделу: Силовое оборудование				**-1 730 100**
			Итого по локальной смете: Электроснабжение и электроосвещение				**-1 730 100**
			ИТОГО по акту:				**-1 730 100**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				-1730100.000 x 6.90%	-119 377
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				-1730100.000 + -119376.902	-1 849 477
		Сметная прибыль, (5.00%)				-1849476.902 x 5.00%	-92 474
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				-1849476.902 x 2.000%	-36 990
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					-1 978 940
		в ценах 3,4 кварталов 2023г., к = 0.9699				-1978940.285 x 0.9699	-1 919 438
		НДС (12%)				-1919437.716 x 12%	-230 333
		Итого с НДС				-1919437.716 + -230332.526	-2 149 770

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:56
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:31
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:26
Представители заказчика		
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:06
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:24
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:40 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроснабжение и электроосвещение (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				
			Раздел: Освещение				
			Подраздел: Осветительная арматура				
1	1	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	1197	3 148	3 768 156
2	2	247-102-2355 СпрСЦ 08.2024	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT LED FUSION, мощность 18 Вт WH, 1620lm, 4000K, степень защиты IP 20	шт.	233	5 643	1 314 819
3	3	247-102-4347 СпрСЦ 08.2024	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 LED ДВО13-38-001 Panel 840ASTZ, IP20, мощность 38 Вт, 4400 Лм, 4000K, 595x595x11, LGP панель	шт.	68	46 318	3 149 624
4	4	247-102-3874 СпрСЦ 08.2024	Светильник светодиодный офисный-2 LED ДВО SOLO встраиваемый спот 36W 3240Lm D220x7.5mm 6500K IP20	шт.	828	3 326	2 753 928
5	5	247-102-3030 СпрСЦ 08.2024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов LED ДБО SKY для школьных досок 30W 2400Lm 1180x49x51 4000K IP20	шт.	68	10 105	687 140
			Итого по подразделу: Осветительная арматура				**11 673 667**
			Подраздел: Установочное оборудование				
6	6	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	110	1 164	128 040
7	7	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	536	21 440
8	8	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	70	846	59 220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	247-202-1312 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для силового оборудования T25 F, трудновоспламеняющаяся 960 °C, полипропиленовая, с уплотнениями 4xM25, наружний размер D80x51 мм, IP65, 500В, сечение кабеля 2,5 мм2, крышка с полем для надписи.	шт.	350	786	275 100
10	10	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	300	1 187	356 100
11	11	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателя светового настенного	шт.	39	3 003	117 117
12	12	247-102-2520 СпрСЦ 08.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)	шт.	39	5 893	229 827
13	13	6118-0206-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка герметического	шт.	11	11 397	125 367
14	14	247-216-1417 СпрСЦ 08.2024	Люк электротехнический для организации рабочего места типа Shelbi напольный 12 модулей (45x22,5), корпус пластик, с пластиковым основанием 189,5x189,5x76 мм, IP20	шт.	3	23 607	70 821
15	15	247-216-1419 СпрСЦ 08.2024	Люк электротехнический для организации рабочего места типа Shelbi напольный 16/24 модулей (45x22,5), корпус пластик, с пластиковым основанием 303,5x213,5x75 мм, IP20	шт.	8	27 335	218 680
			Итого по подразделу: Установочное оборудование				**1 601 712**
			Подраздел: Провода и кабели				
16	16	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2020	795	1 605 900
17	17	243-107-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	836.4	469	392 272
18	18	243-107-2702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	1224	609	745 416
19	19	247-202-1312 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для силового оборудования T25 F, трудновоспламеняющаяся 960 °C, полипропиленовая, с уплотнениями 4xM25, наружний размер D80x51 мм, IP65, 500В, сечение кабеля 2,5 мм2, крышка с полем для надписи.	шт.	88	786	69 168
			Итого по подразделу: Провода и кабели				**2 812 756**
			Подраздел: Доп.работы по подвалу				
20	20	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 445	11 445
21	21	247-201-0907 СпрСЦ 08.2024	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 8 модулей, BOXS-08-p-s-t, IP41, 231x200x104мм, литой корпус	шт.	1	2 978	2 978

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	265	1 367	362 255
23	23	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	267.65	224	59 954
24	24	6119-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	300	427	128 100
25	25	243-107-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	309	469	144 921
26	26	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	14	1 187	16 618
27	27	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	20	3 148	62 960
28	28	247-102-2355 СпрСЦ 08.2024	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT LED FUSION, мощность 18 Вт WH, 1620lm, 4000K, степень защиты IP 20	шт.	20	5 643	112 860
29	29	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	9	994	8 946
30	30	247-212-0211 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	9	1 431	12 879
			Итого по подразделу: Доп.работы по подвалу				**923 916**
			Подраздел: Доп.работы по монтажу электросушителя				
31	31	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	25	1 367	34 175
32	32	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	25.25	224	5 656
33	33	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	6	795	4 770
34	34	6119-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	25	427	10 675
35	35	243-107-2503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	36.05	730	26 316

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	4	1 187	4 748
37	37	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 164	4 656
38	38	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	613	2 452
			Итого по подразделу: Доп.работы по монтажу электросушителя				**93 448**
			Итого по разделу: Освещение				**17 105 499**
			Раздел: Силовое оборудование				
			Подраздел: Установочное оборудование				
39	39	247-202-1312 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для силового оборудования T25 F, трудновоспламеняющаяся 960 °C, полипропиленовая, с уплотнениями 4xM25, наружний размер D80x51 мм, IP65, 500В, сечение кабеля 2,5 мм2, крышка с полем для надписи.	шт.	450	786	353 700
40	40	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1130	1 187	1 341 310
			Итого по подразделу: Установочное оборудование				**1 695 010**
			Подраздел: Доп.работы кухни				
41	41	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	4	11 445	45 780
42	42	247-201-0122 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54	шт.	1	26 178	26 178
43	43	247-201-0101 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	8 452	25 356
44	44	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 103	61 030
45	45	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 309	4 618
46	46	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 288	4 576
47	47	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 941	1 941
48	48	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 805	7 220
50	50	6119-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	28	1 202	33 656
51	51	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	16.48	129	2 126
52	52	243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	12.36	693	8 565
53	53	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	70	1 367	95 690
54	54	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	70.7	224	15 837
55	55	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	46	300	13 800
56	56	243-142-0314 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	6.18	950	5 871
57	57	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	4.12	362	1 491
58	58	243-102-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х4-0,66	м	6.18	1 910	11 804
59	59	243-102-0506 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х6-0,66	м	30.9	2 787	86 118
60	60	6119-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	110	427	46 970
61	61	243-107-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 5х2,5 (ок)-0,66	м	82.4	1 200	98 880
62	62	243-107-2503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5 (ок)-0,66	м	30.9	730	22 557
63	63	261-404-0567 РСНБ РК 2022	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	658	6 580

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	247-215-0303 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А	шт.	1	6 544	6 544
65	65	243-902-0101 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	12	41	492
66	66	243-902-0203 РСНБ РК 2022	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-6	100 шт.	0.01	3 138	31
			Итого по подразделу: Доп.работы кухни				**635 595**
			Подраздел: Доп.работы котельной				
67	67	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	55 947	111 894
68	68	515-301-1205 РСНБ РК 2022	ШРС-1-250-5-100, 250А на 5 групп, шкаф распределительный силовой, 1700х700х400мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-35 250А - 1шт (ввод), предохранитель ППН33 16-100А - 5шт (отходящие), шина алюминиевая 4х30мм. Ввод и вывод кабелей снизу	шт.	1	176 410	176 410
69	69	247-211-1901 СпрСЦ 08.2024	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A	шт.	1	376 855	376 855
70	70	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 401	5 401
71	71	247-301-0309 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	46 086	46 086
72	72	6401-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	10 119	30 357
73	73	6401-0203-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	42	1 640	68 880
			Итого по подразделу: Доп.работы котельной				**815 883**
			Итого по разделу: Силовое оборудование				**3 146 488**
			Раздел: Освещение фасада				
74	74	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	120	1 187	142 440
			Итого по разделу: Освещение фасада				**142 440**
			Итого по локальной смете: Электроснабжение и электроосвещение (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				**20 394 427**
			ИТОГО по акту:				**20 394 427**
			В том числе оборудование:				**176 410**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				20218017.000 x 6.90%	1 395 043

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				20394427.000 + 1395043.192	21 789 470
		Сметная прибыль, (5.00%)				21613060.192 x 5.00%	1 080 653
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				21789470.192 x 2.000%	435 789
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					23 305 913
		в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000				23305912.606 x 1.0000	23 305 913
		НДС (12%)				23305912.606 x 12%	2 796 710
		Итого с НДС				23305912.606 + 2796709.513	26 102 622

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 16:01
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:25
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:24
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:21
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:33 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:00

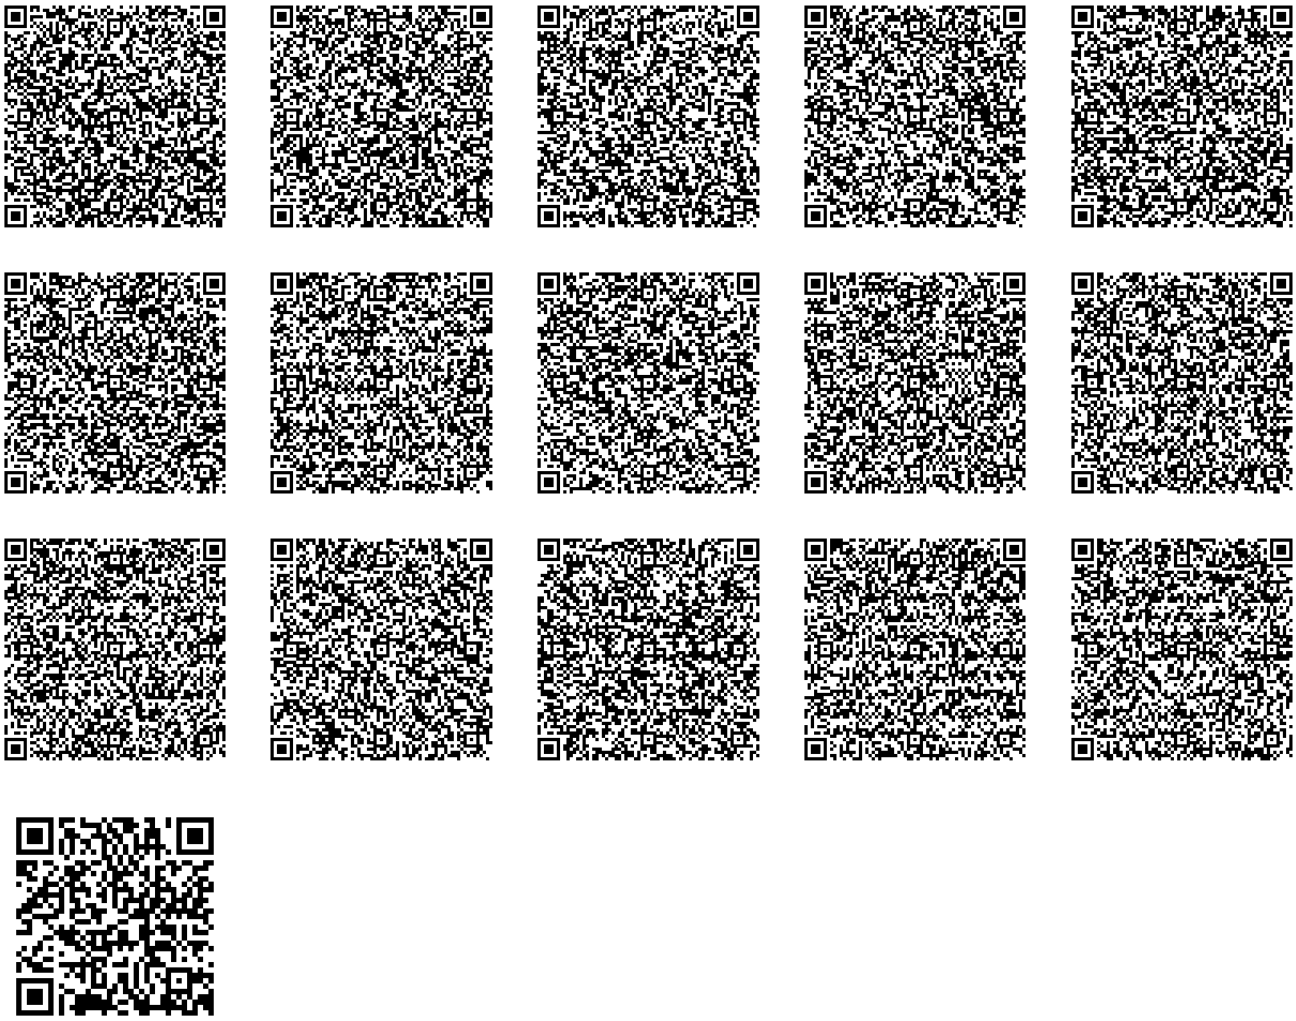

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Водопровод и канализация				
			Раздел: Канализация				
			Подраздел: Р Канализация К2 (внутренний водосток)				
1	214	242-303-0104РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	-4	8 678	-34 712
2	215	261-301-0219РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-159	708	-112 572
			Итого по подразделу: Р Канализация К2 (внутренний водосток)				**-147 284**
			Подраздел: Р Оборудование				
3	229	6115-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	-75	11 287	-846 525
4	230	244-101-0102РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	-59	10 871	-641 389
5	231	244-101-0101РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	-16	13 128	-210 048
			Итого по подразделу: Р Оборудование				**-1 697 962**
			Подраздел: Промывка и дезинфекция				
6	255	6301-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	-1.6911	257 300	-435 120
7	256	6301-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	-0.09	263 927	-23 753
			Итого по подразделу: Промывка и дезинфекция				**-458 873**
			Итого по разделу: Канализация				**-2 304 119**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	45	261-301-0405РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	-10	120	-1 200
9	46	242-207-1001РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	-10	2 691	-26 910
10	103	234-303-0107РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	-24.2	186	-4 501
			Итого по локальной смете: Водопровод и канализация				**-2 336 730**
			ИТОГО по акту:				**-2 336 730**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	-2336729.801 x 6.90%	-161 234
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	-2336729.801 + -161234.358	-2 497 964
	Сметная прибыль, (5.00%)	-2497964.159 x 5.00%	-124 898
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	-2497964.159 x 2.000%	-49 959
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		-2 672 822
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	-2672821.650 x 1.0000	-2 672 822
	НДС (12%)	-2672821.650 x 12%	-320 739
	Итого с НДС	-2672821.650 + -320738.598	-2 993 560

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:55
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:26
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:27
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:24
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:07
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Плиты перекрытия /Лист-82/				
			Подраздел: Участок моеолитный УМ-1...УМ40, ОПм1 /Лист 83-84, 127-128/				
1	85	6111-0403-0503ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1.9	40 582	77 106
			Итого по подразделу: Участок моеолитный УМ-1...УМ40, ОПм1 /Лист 83-84, 127-128/				**77 106**
			Итого по разделу: Плиты перекрытия /Лист-82/				**77 106**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**77 106**
			ИТОГО по акту:				**77 106**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	77105.839 x 6.90%	5 320
Итого с затратами на организацию и управление СМР	77105.839 + 5320.303	82 426
Сметная прибыль, (5.00%)	82426.142 x 5.00%	4 121
Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	82426.142 x 2.000%	1 649
Итого с непредвидемыми работами и затратами		88 196
в ценах 3,4 кварталов 2023г., к = 0.9699	88195.972 x 0.9699	85 544
НДС (12%)	85544.104 x 12%	10 265
Итого с НДС	85544.104 + 10265.293	95 809

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:54
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:18
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:27
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:44 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:25
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:09

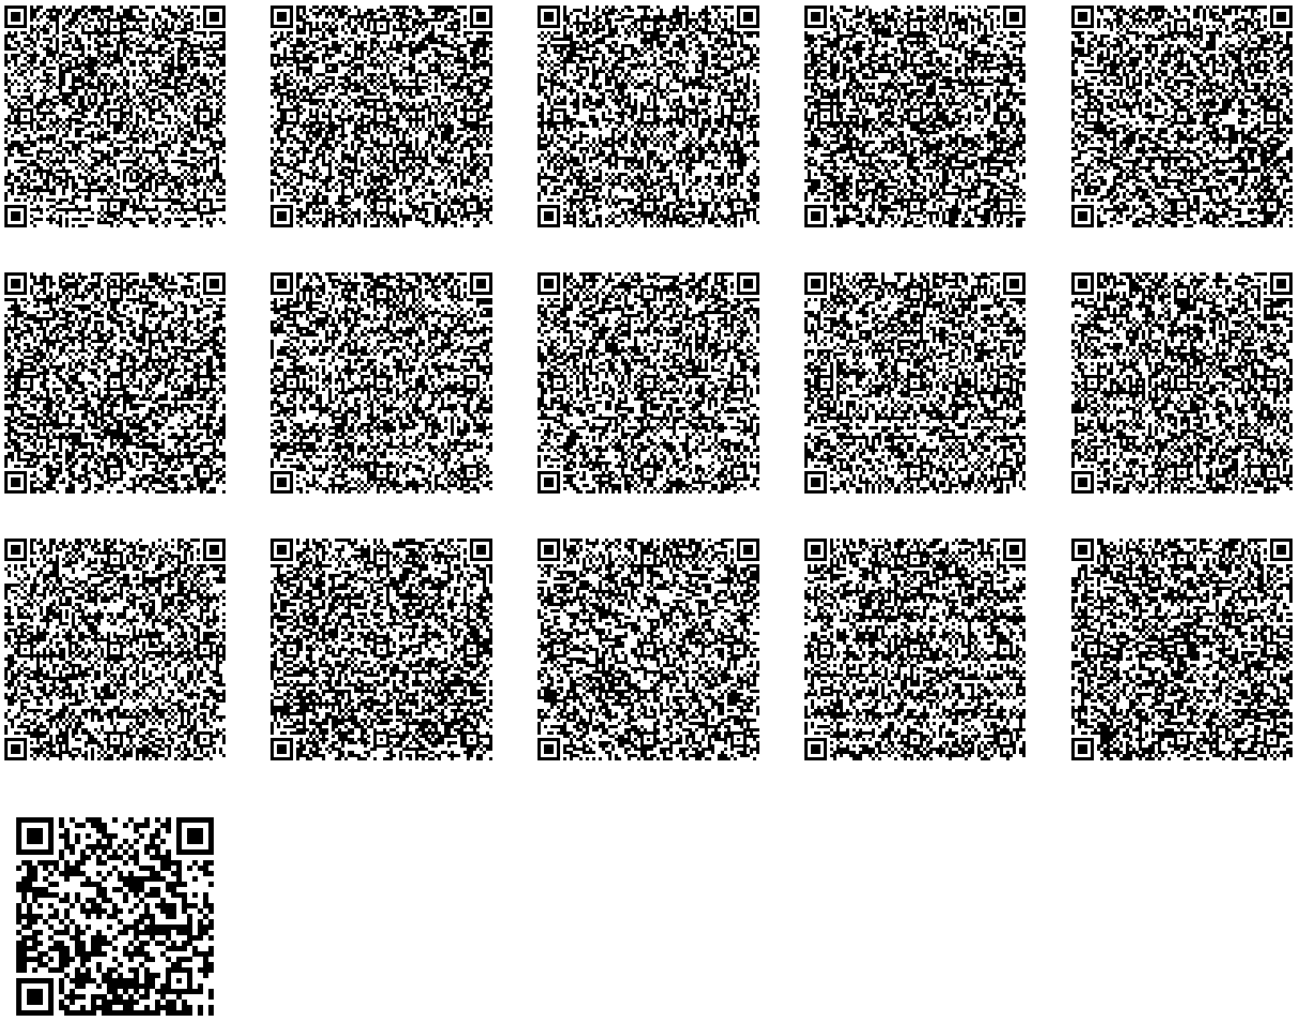

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции металлические				
			Раздел: Блок-Е /Лист-2/				
			Подраздел: Р Вертикальные связи ВС-2е				
1	46	6106-0302-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	-0.00056	286 888	-161
			Итого по подразделу: Р Вертикальные связи ВС-2е				**-161**
			Итого по разделу: Блок-Е /Лист-2/				**-161**
			Итого по локальной смете: Конструкции металлические				**-161**
			ИТОГО по акту:				**-161**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	-160.657 x 6.90%	-11
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	-160.657 + -11.085	-172
	Сметная прибыль, (5.00%)	-171.742 x 5.00%	-9
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	-171.742 x 2.000%	-3
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		-184
	в ценах 3,4 кварталов 2023г., к = 0.9699	-183.764 x 0.9699	-178
	НДС (12%)	-178.239 x 12%	-21
	Итого с НДС	-178.239 + -21.389	-200

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:57
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:32
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:26
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:39 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:06
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:23

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление и вентиляция				
			Раздел: Отопление				
1	6	6114-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	-231	762	-176 022
2	7	245-510-0301РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	-231	3 350	-773 850
3	23	242-312-0101РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	-10	84 708	-847 080
4	24	242-312-0102РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	-1	91 228	-91 228
5	25	242-312-0103РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	-1	110 474	-110 474
6	27	242-312-0104РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	-9	127 320	-1 145 880
7	28	242-312-0105РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	-1	135 073	-135 073
			Итого по разделу: Отопление				**-3 279 607**
			Итого по локальной смете: Отопление и вентиляция				**-3 279 607**
			ИТОГО по акту:				**-3 279 607**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				-3279607.000 x 6.90%	-226 293
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				-3279607.000 + -226292.886	-3 505 900
		Сметная прибыль, (5.00%)				-3505899.886 x 5.00%	-175 295
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				-3505899.886 x 2.000%	-70 118
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					-3 751 313

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		в ценах 3,4 кварталов 2023г., к = 0.9699				-3751312.878 x 0.9699	-3 638 519
		НДС (12%)				-3638518.795 x 12%	-436 622
		Итого с НДС				-3638518.795 + -436622.255	-4 075 141

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:55
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:20
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:27
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:25
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:43 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:08

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление и вентиляция(ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				
			Раздел: Отопление				
1	1	6114-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	698	762	531 876
2	2	242-303-0501 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	698	4 376	3 054 448
3	3	242-312-1401 СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	19 315	193 150
4	4	242-312-1402 СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	22 507	22 507
5	5	242-312-1403 СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	30 842	30 842
6	6	242-312-1404 СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	42 936	386 424
7	7	242-312-1405 СпрСЦ 08.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	47 060	47 060
			Подраздел: Доп.работы /для автоматизации систем отопления/				
8	8	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	78 832	78 832

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	511-702-0110 СпрСЦ 08.2024	Насос горизонтальный многоступенчатый Medana CH1-L.202-1/E/E/10T, Q±2,6 м3/ч, H±10,0 м вод.ст.	шт.	1	481 429	481 429
10	10	6116-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,5 м3	шт.	1	77 856	77 856
11	11	241-603-0205 РСНБ РК 2022	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 40х1 1/2", PN 20	шт.	4	2 843	11 372
12	12	241-604-0105 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 40х1 1/2", PN 10, прямой	шт.	4	13 856	55 424
13	13	245-601-1023 СпрСЦ 08.2024	Датчик давления жидкости дифф. SPW102-114, вых.0-10В, диап.0…16 бар	шт.	1	475 231	475 231
14	14	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 885	35 540
15	15	242-307-0105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	11 380	34 140
16	16	242-313-0307 СпрСЦ 08.2024	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 40, Kvs-24 м3/ч	шт.	1	130 267	130 267
17	17	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	5 594	5 594
18	18	242-404-0605 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	9 962	9 962
			Итого по подразделу: Доп.работы /для автоматизации систем отопления/				**1 395 647**
			Итого по разделу: Отопление				**5 661 954**
			Раздел: Тепловой пункт				
19	19	6116-0603-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах в тепловых пунктах, масса до 500 кг	шт.	2	40 842	81 684
20	20	513-205-1246 СпрСЦ 08.2024	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), Т1±95°С/Т2±70°С, Т11±85°С/Т21±65°С, PN 16, Tmax 150°С, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 116, модель XGF№21-TC 16/116-TMTL70	шт.	2	5 052 880	10 105 760
21	21	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0.1	1 079 062	107 906
22	22	6116-0601-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.	2	138 612	277 224

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	261-302-0256 РСНБ РК 2022	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 325 мм, длиной 2,5 м и 6 патрубков, Dн 108 мм	комплект	2	65 465	130 930
24	24	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	10	8 885	88 850
25	25	242-202-0404 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	10	42 704	427 040
26	26	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	26	16 108	418 808
27	27	242-202-0405 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	8	32 835	262 680
28	28	242-202-0406 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	12	48 214	578 568
29	29	242-202-0407 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	6	91 000	546 000
30	30	6114-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	2	37 033	74 066
31	31	242-202-0408 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	161 805	323 610
32	32	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	12	1 742	20 904
33	33	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	3 901	39 010
34	34	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5 466	10 932
35	35	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	10	1 328	13 280
36	36	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10	2 870	28 700
37	37	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	10	1 811	18 110

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	245-713-0201 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	10	3 136	31 360
39	39	241-211-1411 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 63х2"	шт.	10	3 656	36 560
40	40	241-119-0101 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	10	70	700
41	41	241-119-0102 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	2	92	184
42	42	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	7 815	15 630
43	43	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	18	3 324	59 832
44	44	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	700	5 600
45	45	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	14	1 016	14 224
46	46	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	4	1 339	5 356
47	47	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	5 210	10 420
48	48	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-108х3,5 мм	шт.	2	7 944	15 888
49	49	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	7 944	15 888
50	50	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21 240
			Итого по разделу: Тепловой пункт				**13 786 944**
			Раздел: Отопление ниже 0.000				
51	51	6114-0102-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	110	6 466	711 260

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	261-305-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	110	5 398	593 780
53	53	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	496	4 392	2 178 432
54	54	261-305-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	73	4 106	299 738
55	55	261-305-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	423	3 230	1 366 290
56	56	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	304	3 938	1 197 152
57	57	261-305-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	304	2 701	821 104
58	58	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	700
59	59	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1 016	1 016
60	60	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	3 324	3 324
61	61	241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1 795	1 795
62	62	241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1 826	1 826
63	63	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	2 882
64	64	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585	585
65	65	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	988	988
66	66	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	1 079	1 079

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	241-119-0101 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	10	70	700
68	68	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	300	708	212 400
69	69	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	10	8 885	88 850
70	70	242-103-0901 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 64, марки 30с76нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	10	165 885	1 658 850
71	71	241-116-0407 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	3 490	69 800
72	72	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 885	35 540
73	73	242-202-0404 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	42 704	170 816
74	74	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	16 108	32 216
75	75	242-202-0405 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	32 835	65 670
76	76	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	10	8 792	87 920
77	77	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1 742	17 420
78	78	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	3 901	39 010
79	79	241-211-1401 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	10	133	1 330
80	80	6301-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм	км	0.304	103 740	31 537
81	81	6301-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 75-80 мм	км	0.496	107 392	53 266

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	6301-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм	км	0.11	112 496	12 375
83	83	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	910	1 890	1 719 900
84	84	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	334.4	599	200 306
85	85	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	465.3	815	379 220
86	86	234-303-0223 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	80.3	1 006	80 782
87	87	234-303-0225 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	121	1 635	197 835
88	88	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	235	250	58 750
89	89	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	235	372	87 420
			Итого по разделу: Отопление ниже 0.000				**12 483 864**
			Итого по локальной смете: Отопление и вентиляция(ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				**31 932 762**
			ИТОГО по акту:				**31 932 762**
			В том числе оборудование:				**10 587 189**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	21345573.000 x 6.90%	1 472 845
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	31932762.000 + 1472844.557	33 405 607
	Сметная прибыль, (5.00%)	22818417.557 x 5.00%	1 140 921
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	33405606.557 x 2.000%	668 112
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		35 214 640
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	35214639.566 x 1.0000	35 214 640
	НДС (12%)	35214639.566 x 12%	4 225 757
	Итого с НДС	35214639.566 + 4225756.748	39 440 396

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 16:00
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:26
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:25
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:35 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:02
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:21

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление и вентиляция				
			Раздел: Отопление				
1	64	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	32.6	3 326	108 428
2	65	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	32.6	1 453	47 368
3	66	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	182.6	4 392	801 979
4	67	241-102-0151РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	167.9	1 962	329 420
5	68	241-102-0160РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	14.7	2 309	33 942
6	69	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	508.4	2 046	1 040 186
7	70	6114-0102-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	255.5	2 674	683 207
8	71	241-101-0202РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	410.2	594	243 659
9	72	241-101-0203РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	7	613	4 291
10	73	241-101-0204РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15.1	1 102	16 640
11	74	241-101-0206РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	80.1	1 184	94 838

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	75	241-101-0208РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	255.5	1 453	371 242
13	76	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	107.71	250	26 928
14	77	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	107.71	193	20 788
15	92	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	983.1	1 890	1 858 059
16	93	234-303-0703РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 28 мм	м	451.22	9 695	4 374 578
17	94	234-303-0704РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 35 мм	м	7.7	10 052	77 400
18	95	234-303-0705РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 42 мм	м	16.61	10 598	176 033
19	96	234-303-0706РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 48 мм	м	88.11	11 149	982 338
20	97	234-303-0707РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 57 мм	м	281.05	11 659	3 276 762
21	98	234-303-0709РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 70 мм	м	35.86	17 458	626 044
22	99	234-303-0711РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 80 мм	м	184.69	17 875	3 301 334
23	100	234-303-0713РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 102 мм	м	16.17	18 525	299 549
			Итого по разделу: Отопление				**18 795 013**
			Раздел: Система теплоснабжения приточных установок				
24	103	261-301-0219РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	708	70 800
25	104	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	59.3	2 046	121 328
26	105	241-101-0102РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0.9	391	352
27	106	241-101-0105РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	11	644	7 084
28	107	241-101-0112РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	37.2	918	34 150
29	108	241-101-0115РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,8 мм	м	10.2	1 100	11 220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	109	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	19.8	3 326	65 855
31	110	241-102-0139РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	19.8	1 679	33 244
32	111	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	257.9	4 392	1 132 697
33	112	241-102-0153РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	257.9	2 240	577 696
34	113	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	31	4 398	136 338
35	114	241-102-0162РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	31	3 043	94 333
36	115	6114-0102-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	14.9	6 466	96 343
37	116	241-102-0177РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14.9	3 617	53 893
38	117	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	79.1	357	28 239
39	118	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	303.8	369	112 102
40	119	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	382.9	1 890	723 681
41	120	234-305-0501РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 25 мм диаметром 15 мм	м	0.99	2 747	2 720
42	121	234-305-0504РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 25 мм диаметром 28 мм	м	12.1	2 763	33 432
43	122	234-305-0505РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 25 мм диаметром 35 мм	м	40.92	3 289	134 586
44	123	234-305-0506РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 25 мм диаметром 42 мм	м	11.22	3 849	43 186
45	124	234-305-0507РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 25 мм диаметром 48 мм	м	21.78	4 142	90 213
46	125	234-305-0511РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 25 мм диаметром 63 мм	м	283.69	6 542	1 855 900
47	126	234-305-0514РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 25 мм диаметром 89 мм	м	34.1	8 540	291 214
48	127	234-305-0515РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 25 мм диаметром 102 мм	м	16.39	10 213	167 391

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	128	242-207-0901РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	3 901	93 624
50	129	242-207-0903РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8 398	16 796
51	130	242-207-0904РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	12 677	126 770
52	131	242-207-0905РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18 982	37 964
53	132	242-207-0906РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	30 222	120 888
54	133	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 319	2 319
55	134	245-506-0106РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	1	28 946	28 946
56	135	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	8	2 652	21 216
57	136	245-506-0113РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	5	19 260	96 300
58	137	245-506-0114РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/ч, DN 40	шт.	1	24 262	24 262
59	138	245-506-0115РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 2", Kvs 15,1 м3/ч, DN 50	шт.	2	30 254	60 508
60	139	6116-0602-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка воздухоотводчиков	шт.	6	9 411	56 466
61	140	245-405-1502РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	4 549	27 294
62	141	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	86.5	547	47 316
63	142	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	86.5	250	21 625
			Итого по разделу: Система теплоснабжения приточных установок				**6 700 291**
			Итого по локальной смете: Отопление и вентиляция				**25 495 304**
			ИТОГО по акту:				**25 495 304**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	25495304.000 x 6.90%	1 759 176
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	25495304.000 + 1759176.000	27 254 480
	Сметная прибыль, (5.00%)	27254480.000 x 5.00%	1 362 724

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				27254480.000 x 2.000%	545 090
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					29 162 294
		в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000				29162293.600 x 1.0000	29 162 294
		НДС (12%)				29162293.600 x 12%	3 499 475
		Итого с НДС				29162293.600 + 3499475.232	32 661 769

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:53
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:16
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:27
Представители заказчика		
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:10
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:26
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление и вентиляция				
			Раздел: Отопление				
1	6	6114-0204-0104ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	-118	762	-89 916
2	7	245-510-0301РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	-118	3 350	-395 300
			Итого по разделу: Отопление				**-485 216**
			Итого по локальной смете: Отопление и вентиляция				**-485 216**
			ИТОГО по акту:				**-485 216**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				-485216.000 x 6.90%	-33 480
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				-485216.000 + -33479.904	-518 696
		Сметная прибыль, (5.00%)				-518695.904 x 5.00%	-25 935
		Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)				-518695.904 x 2.000%	-10 374
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					-555 005
		в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000				-555004.618 x 1.0000	-555 005
		НДС (12%)				-555004.618 x 12%	-66 601
		Итого с НДС				-555004.618 + -66600.554	-621 605

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 15:54
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:19
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:27
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:25
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:09
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:43 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система контроля и управления доступом (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				
			Раздел: Оборудование и материалы				
1	1	6125-0801-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж турникета -трипода напольного	шт.	2	15 713	31 426
2	2	248-405-1418СпрСЦ 08.2024	Турникет тумбовый NT02	шт.	2	847 509	1 695 018
3	3	6125-0801-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж турникета -калитки электромеханической	шт.	2	10 609	21 218
4	4	248-405-0809РСНБ РК 2022	Турникет-трипод PERCo-TB01	шт.	2	589 500	1 179 000
5	5	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	2	3 824	7 648
6	6	248-405-0111СпрСЦ 08.2024	PERCo-CT/L04.2, универсальный контроллер с интерфейсом Ethernet	шт.	2	192 997	385 994
7	7	6401-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 622	6 622
8	8	248-404-0706СпрСЦ 08.2024	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0524-E(B)	шт.	1	119 685	119 685
9	9	6119-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	4	1 202	4 808
10	10	243-907-0114РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	м	4.12	637	2 624

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	4	1 367	5 468
12	12	241-207-0303РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	4.04	78	315
13	13	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	150	300	45 000
14	14	243-304-0133РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	154.5	121	18 694
15	15	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	20	374	7 480
16	16	243-802-0102РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	20.6	103	2 122
			Итого по разделу: Оборудование и материалы				**3 533 122**
			Итого по локальной смете: Система контроля и управления доступом (ДОБАВИТЬ ПО ПРОТОКОЛУ №5 от 21.11.2025 г.)				**3 533 122**
			ИТОГО по акту:				**3 533 122**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	3533122.000 x 6.90%	243 785
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	3533122.000 + 243785.421	3 776 907
	Сметная прибыль, (5.00%)	3776907.421 x 5.00%	188 845
	Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	3776907.421 x 2.000%	75 538
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		4 041 291
	в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	4041290.941 x 1.0000	4 041 291
	НДС (12%)	4041290.941 x 12%	484 955
	Итого с НДС	4041290.941 + 484954.913	4 526 246

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 16:00
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:21
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:24
Представители заказчика		
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:34 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 20:01
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:21

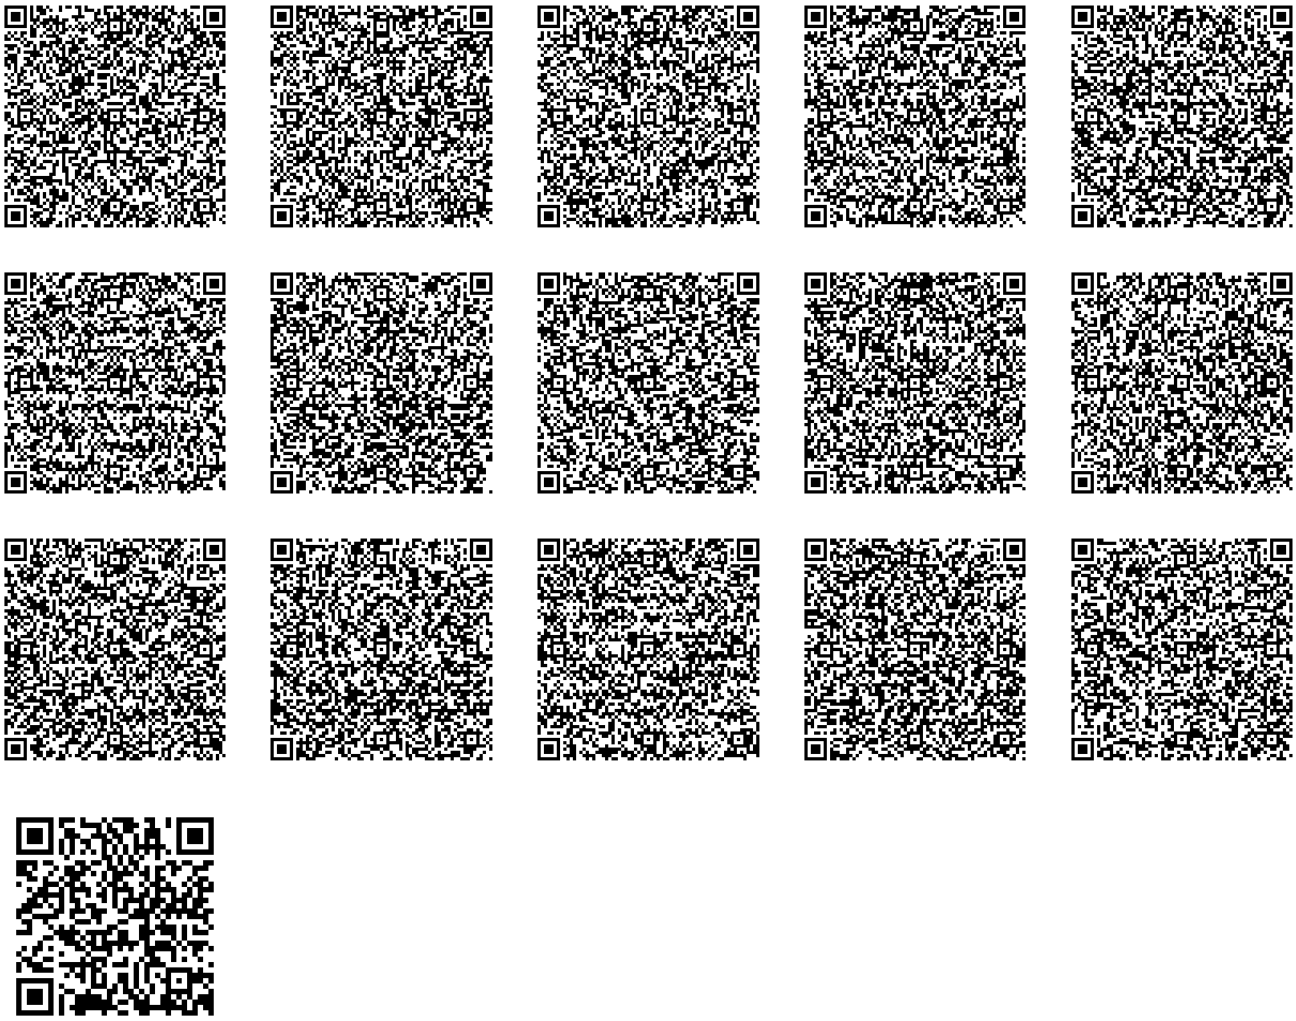

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060340011760 - ТОО "SG Kurylys"**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Жанаконыс-2" г. Актобе Актюбинской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **108 от 31.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система контроля и управления доступом				
			Раздел: Оборудование и материалы				
1	1	СТ	Базовое программное обеспечение "Школа" PERCo-SS02	шт.	1	262 478	262 478
2	5	6125-0801-0503ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж турникета -трипода напольного	шт.	7	15 713	109 991
3	6	248-405-1418СпрСЦ 08.2024	Турникет тумбовый NT02	шт.	7	847 509	5 932 563
4	7	6125-0801-0506ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж турникета -калитки электромеханической	шт.	2	10 609	21 218
5	8	248-405-0809РСНБ РК 2022	Турникет-трипод PERCo-TB01	шт.	2	589 500	1 179 000
			Итого по разделу: Оборудование и материалы				**7 505 250**
			Итого по локальной смете: Система контроля и управления доступом				**7 505 250**
			ИТОГО по акту:				**7 505 250**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	7505250.000 x 6.90%	517 862
Итого с затратами на организацию и управление СМР	7505250.000 + 517862.257	8 023 112
Сметная прибыль, (5.00%)	8023112.257 x 5.00%	401 156
Непредвиденные работы и затраты, (2.000%)	8023112.257 x 2.000%	160 462
Итого с непредвидемыми работами и затратами		8 584 730
в ценах 1,2 квартала 2024 г., к = 1.0000	8584730.115 x 1.0000	8 584 730
НДС (12%)	8584730.115 x 12%	1 030 168
Итого с НДС	8584730.115 + 1030167.614	9 614 898

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860117399073 - АЛДАМУРАТОВ ДАРМЕН КОЙШИБАЕВИЧ	Директор	13.12.2025 16:03
Представители технического надзора		
880220300573 - ТУРУМОВ НУРЛАН АЙБЕКОВИЧ	Эксперт	13.12.2025 16:21
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	13.12.2025 17:23
Представители заказчика		
960501351770 - БАЙҚАЗАҚ НҰРБЕК СЕРІКБАЙҰЛЫ	Ведущий специалист	13.12.2025 19:20
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.12.2025 19:29 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
951217351094 - НЕСИПКАЗИЕВ НУРДАУЛЕТ БОЛАТОВИЧ	Региональный руководитель	13.12.2025 19:56
