Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **011240001633 - КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **031240001439 - ТОО "Alem Qurylys AQ"**

Стройка: **Строительство поликлиники на 500 посещений, по адресу: пр. Гагарина, Бостандыкский район, г. Алматы**

Договор подряда (контракт) №: **8 от 13.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета: общестроительные работы - КЖ. Блок 3					
			Раздел: Фундаменты					
			Подраздел: Фундамент на отм. -3,800 (л.7)					
1	1	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	114	10 568	1 204 752	
2	2	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	116.28	19 087	2 219 436	Казахстан
3	3	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	594.38343	14 667	8 717 822	
4	4	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	603.29918145	21 990	13 266 549	Казахстан
			Итого по подразделу: Фундамент на отм. -3,800 (л.7)				**25 408 559**	
			Итого по разделу: Фундаменты				**25 408 559**	
			Итого по локальной смете: общестроительные работы - КЖ. Блок 3				**25 408 559**	
			ИТОГО по акту:				**25 408 559**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)			25408558.949 x 6.60%	1 676 965	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			25408558.949 + 1676964.866	27 085 524	
			Сметная прибыль, (5.00%)			27085523.816 x 5.00%	1 354 276	
			Непредвиденные расходы, (5.000%)			27085523.816 x 5.000%	1 354 276	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				29 794 076	
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2025 год 1 квартал, к = 1.0192			29794076.197 x 1.0192	30 366 122	
			НДС (12%)			30366122.460 x 12%	3 643 935	
			Итого с НДС			30366122.460 + 3643934.695	34 010 057	

Лист согласования
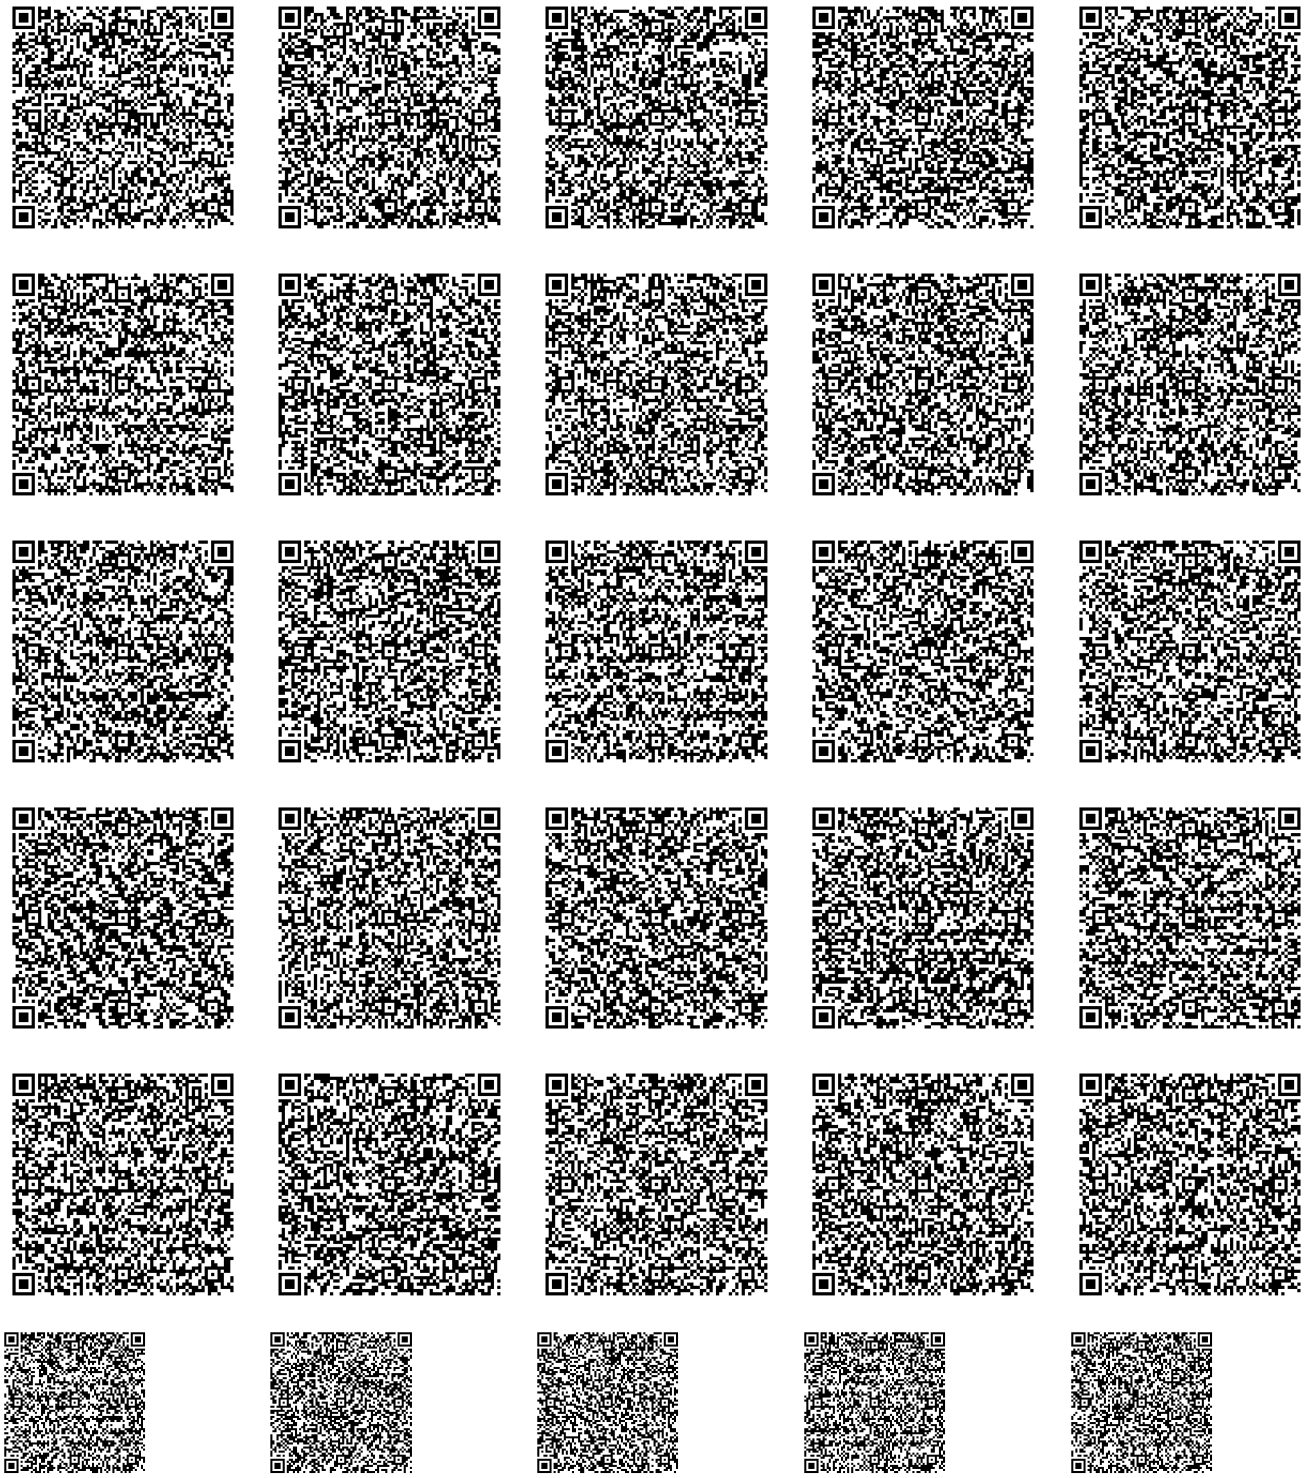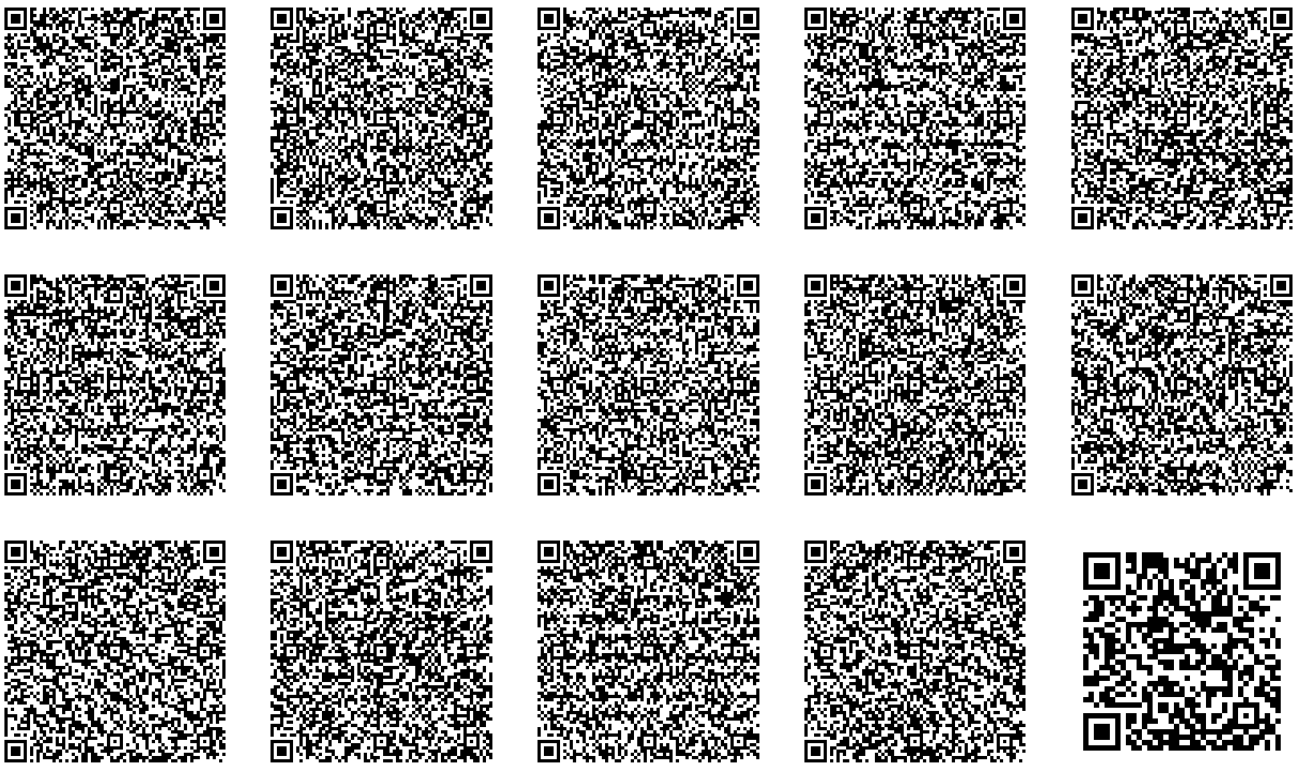
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
921220300131 - ӘЛИХАН НҰРЖАН НҰРЛАНҰЛЫ	Руководитель проекта	11.06.2025 17:26
Представители технического надзора		
890412302713 - АСАНБАЕВ МЕЙРБЕК ОРАЗАЛИЕВИЧ	Эксперт Технического Надзора	12.06.2025 13:48
950316301698 - МАҚСҰТ МҰХАММЕДӘЛИ ТАЛҒАТҰЛЫ	Сметчик	12.06.2025 17:50
Представители авторского надзора		
880802302305 - БЕДЕБАЕВ АРДАК НУРЛАНОВИЧ	Авторский Надзор	13.06.2025 13:50
Представители заказчика		
960301400557 - РЫС МАҚПАЛ ҚЫДЫРБАЙҚЫЗЫ	Главный специалист	25.06.2025 18:07
000110500417 - БЕКБОЛҰЛЫ АЙТБЕК null	Главный специалист	16.06.2025 19:10
