Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" **Генпроектировщик**: ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» **Источник финансирования:** Государственные инвестиции **Место расположения**: г.Атырау	**Наименование рабочего проекта:** **Строительство сливной станции для сброса сточных вод ассенизаторского транспорта с инженерной инфраструктурой на территории КОС (левобережной) г.Атырау** **«»**	**Исходные данные:** -Задание на проектирование утвержденное руководителем ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"; - АПЗ KZ70VUA01292023 Дата выдачи: 04.12.2024 г.

Графические материалы основных сооружений

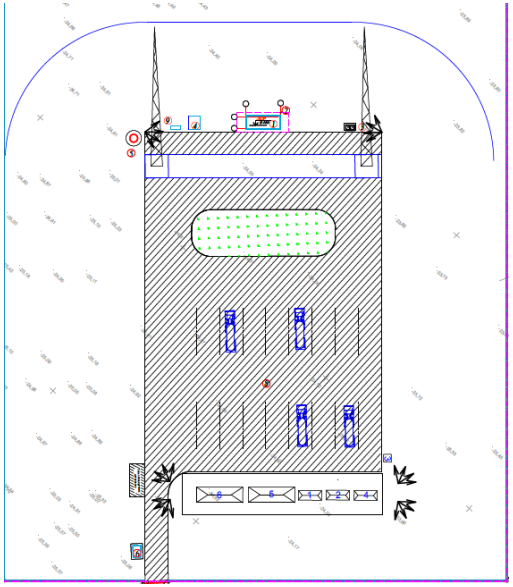

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Мощность предприятия	
Технические параметры: - Блочно-модульная сливная станция – 100м3/час; - Блочно-модульная КНС -100м3/час; - Самотечная канализация из гофрированных труб, со структурированной стенкой DN/ID 200 SN8 по ГОСТ Р 54475-201; - Напорная канализация полиэтиленовым трубопроводом ПЭ 100 SDR 17 S8 d200x11.9 тип "техническая", по ГОСТ-у 18599-2001.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 3 квартала 2025г.:– 562 821,645 тыс.тенге; в том числе СМР– 264 686,527 тыс.тенге; Оборудование - 209 176,617 тыс.тенге; прочие– 88 958,501 тыс.тенге; Продолжительность строительства – 5 месяцев.

Дополнительные сведения, в том числе:

Сливная станция предназначена для приема и учета привозных стоков с ассенизационного автотранспорта (автоцистерн), а также для защиты канализационной сети и очистных сооружений от нерегулируемого поступления неочищенных и неразбавленных септических и промышленных стоков.

Данный рабочий проект включает в себя: установку двух блочно-модульных сливных станции общей производительностью 1,5 тыс.м3/сутки, водоснабжение и электроснабжение сливной станции, самотечная канализация от сливной станции до проектируемой модульной КНС на территории сливной станции, напорная канализация от проектируемой КНС до существующей приёмной камеры на территории КОС.

- состав рабочего проекта– ОПЗ, ГП, ВС, НК,СК, ТХ, ЭС, СД, ПОС, ПП, РООС.
- сведения о климатических условиях:

Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков.

Климатические характеристики приводятся по метеостанции Атырау.

Климатический район: IVГ.

Район по давлению ветра-III .

Район по весу снежного покрова -IV

Директор Кусбаева К.К

Главный инженер проекта Ерман К.

дата составления 10.06.2025г.
