Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного здания с административным корпусом" для КГУ "СДЮСШ № 1им.В.Н.Цехановича" в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

СПРАВКА №3 и.т.д за отчетный месяц
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
160140010537	060540008995			**338**	**23.12.2024 г.**		
				338/1	**19.03.2025 г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	612 137 584,00	612 137 584,00	546 551 414,29				65 586 169,71	612 137 584,00
в том числе: за июль месяц 2025 года	51 867 977,00	51 867 977,00	46 310 693,75				5 557 283,25	51 867 977,00

Заказчик: **Руководитель управления ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537, Мұздыбаев Е.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "Нур-Талап и К", БИН 060540008995, Керейтбаев К.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Директор ТОО "STROYИНЖИНИРИНГ", БИН 161140004149, Мусаинов Б.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#a23a0198-cca9-4b99-911f-c9951835cd37)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Талап и К"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного здания с административным корпусом" для КГУ "СДЮСШ № 1им.В.Н.Цехановича" в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

Реестр актов выполненных работ
за июль месяц 2025 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №8	Общестроительные работы	51 867 977
		ИТОГО	**51 867 977**

Заказчик: **Руководитель управления ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537, Мұздыбаев Е.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "Нур-Талап и К", БИН 060540008995, Керейтбаев К.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Директор ТОО "STROYИНЖИНИРИНГ", БИН 161140004149, Мусаинов Б.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#a23a0198-cca9-4b99-911f-c9951835cd37)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 790402302659 - КЕРЕЙТБАЕВ КАНАТБЕК null	Генеральный подрядчик	Подписано: 22.07.2025 14:15
Технический надзор: ИИН 910830350504 - МУСАИНОВ БЕКБУЛАТ null	Директор	Подписано: 22.07.2025 15:42
Заказчик: ИИН 930408301169 - ЕСЕНГУЛОВ ЖАНДОС null	Заместитель руководителя управления	Подписано: 23.07.2025 10:19
Заказчик: ИИН 820815300041 - ЛЕПЕСОВ САМАТ null	Руководитель производственного отдела	Подписано: 23.07.2025 12:34
Заказчик: ИИН 910129300418 - МҰЗДЫБАЕВ ЕРЖАН null	Руководитель управления	Подписано: 23.07.2025 14:58

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

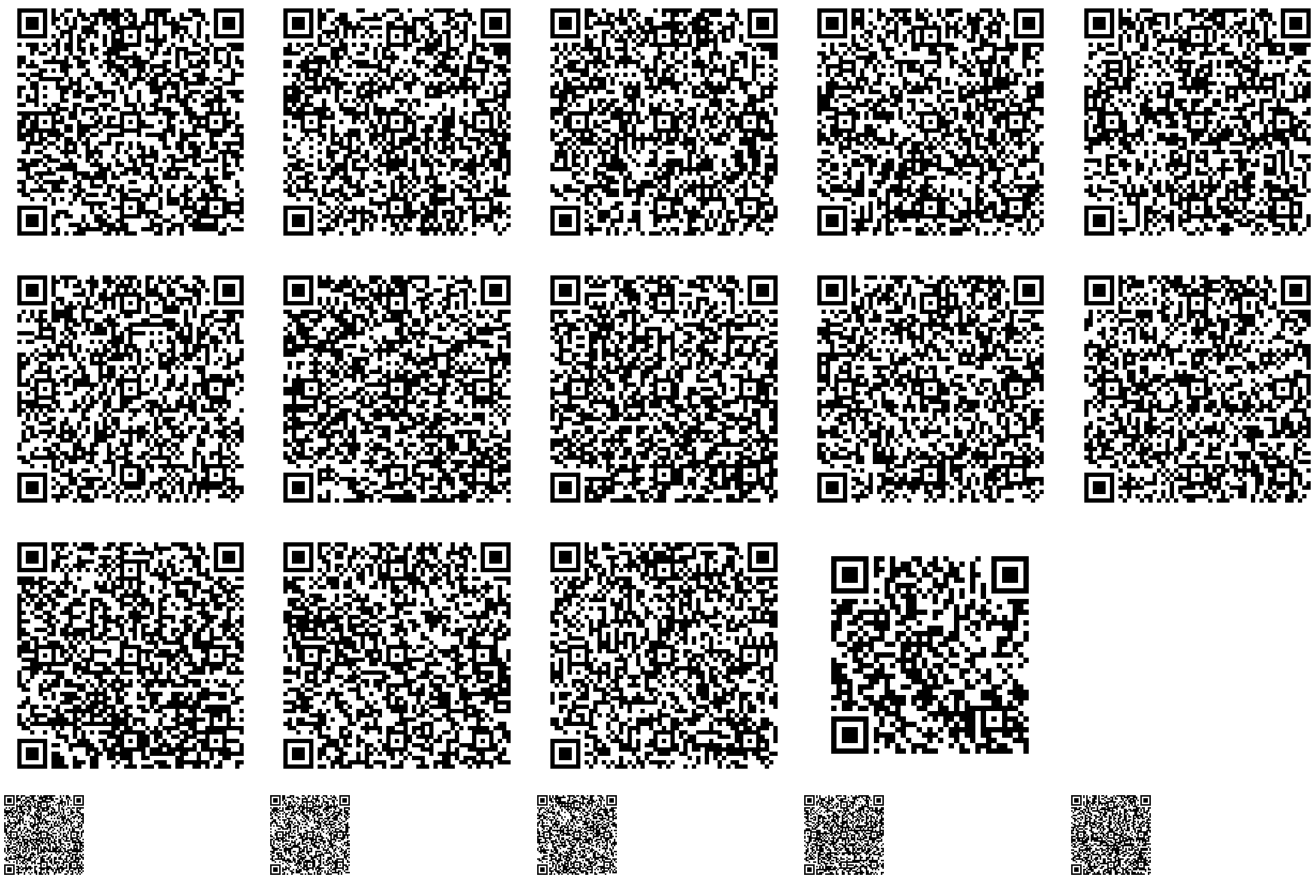

Подписано через EQURYLYS.KZ (#a23a0198-cca9-4b99-911f-c9951835cd37)

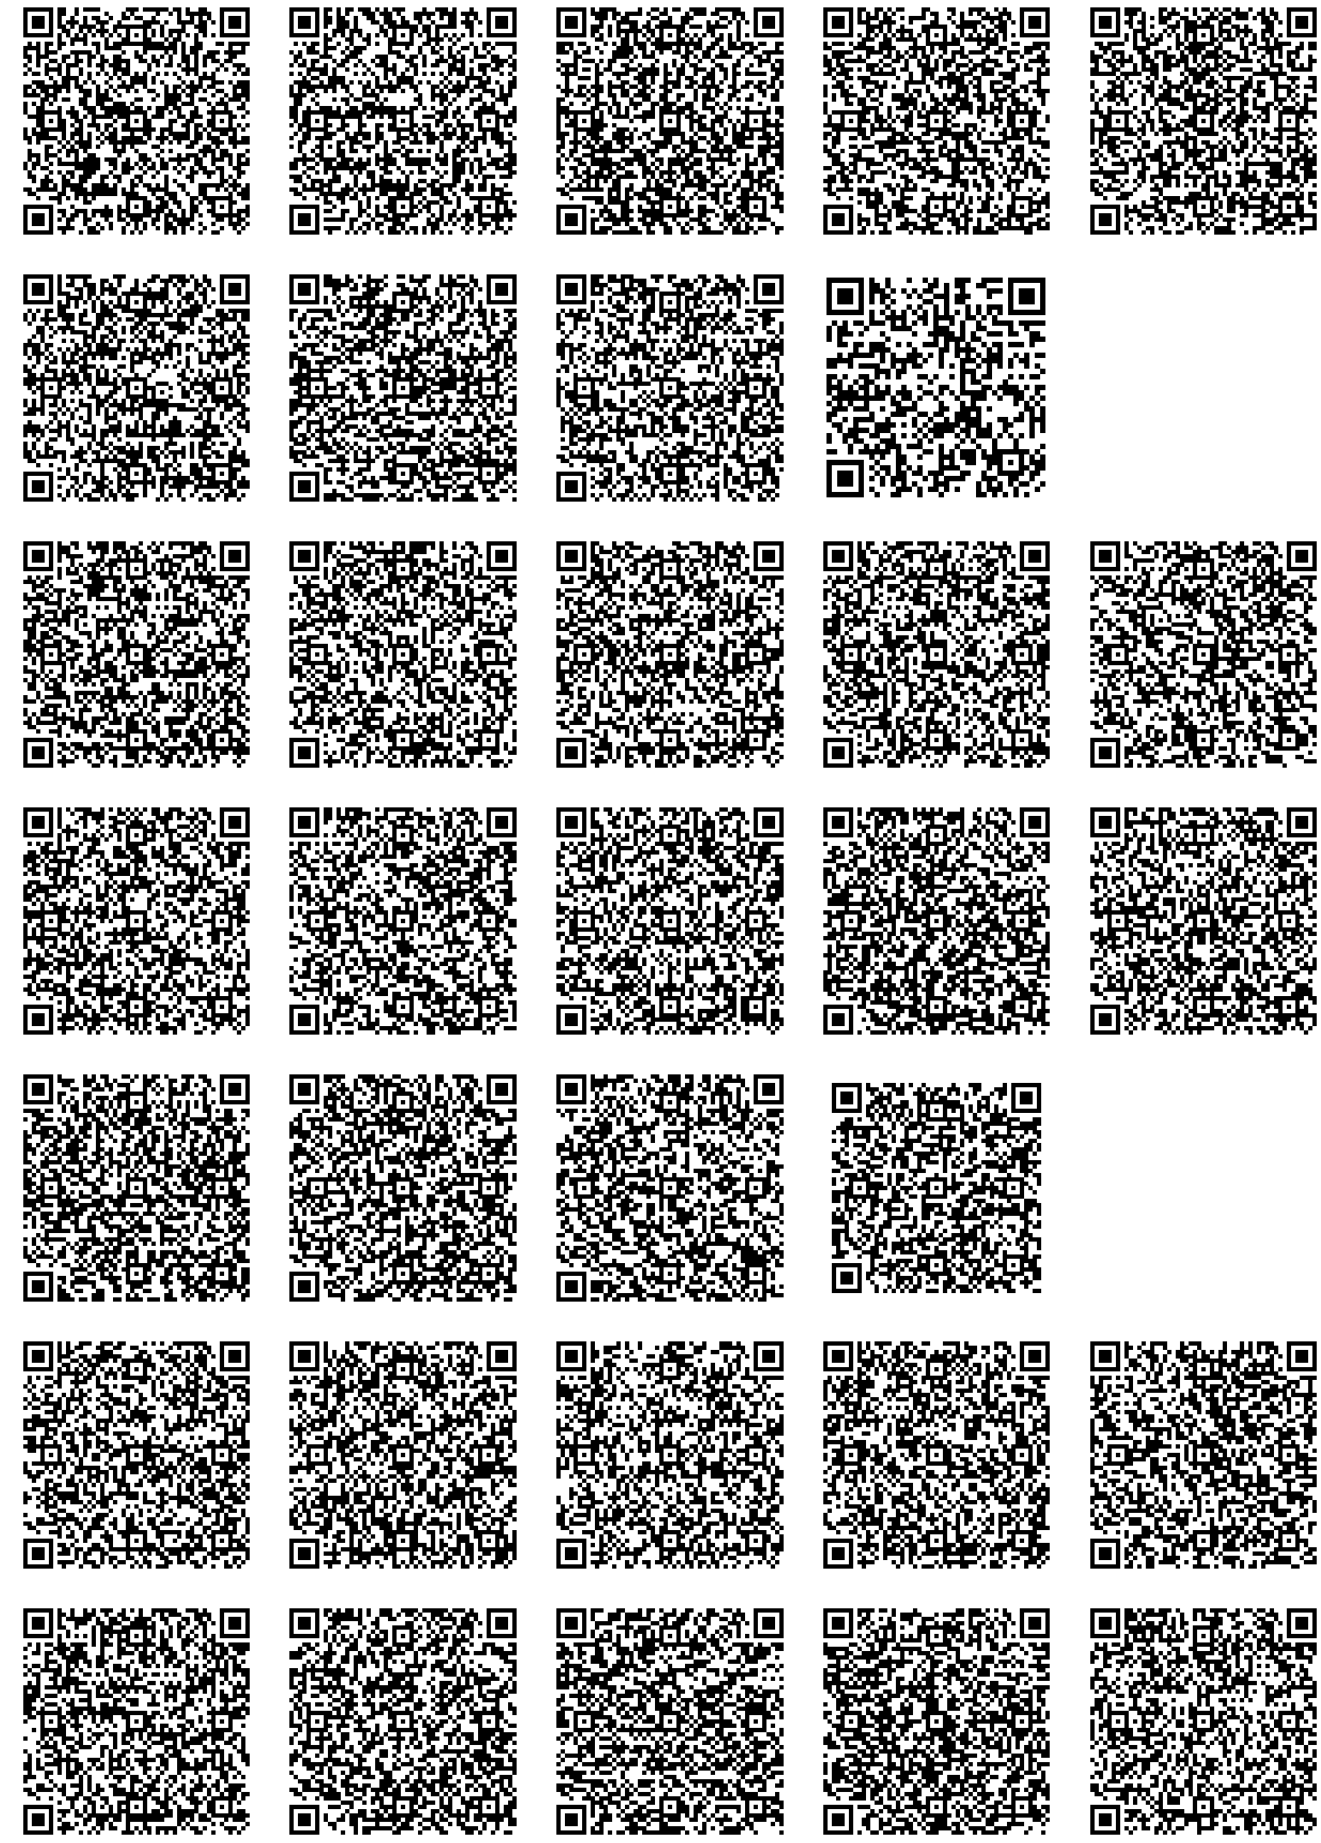

Подписано через EQURYLYS.KZ (#a23a0198-cca9-4b99-911f-c9951835cd37)

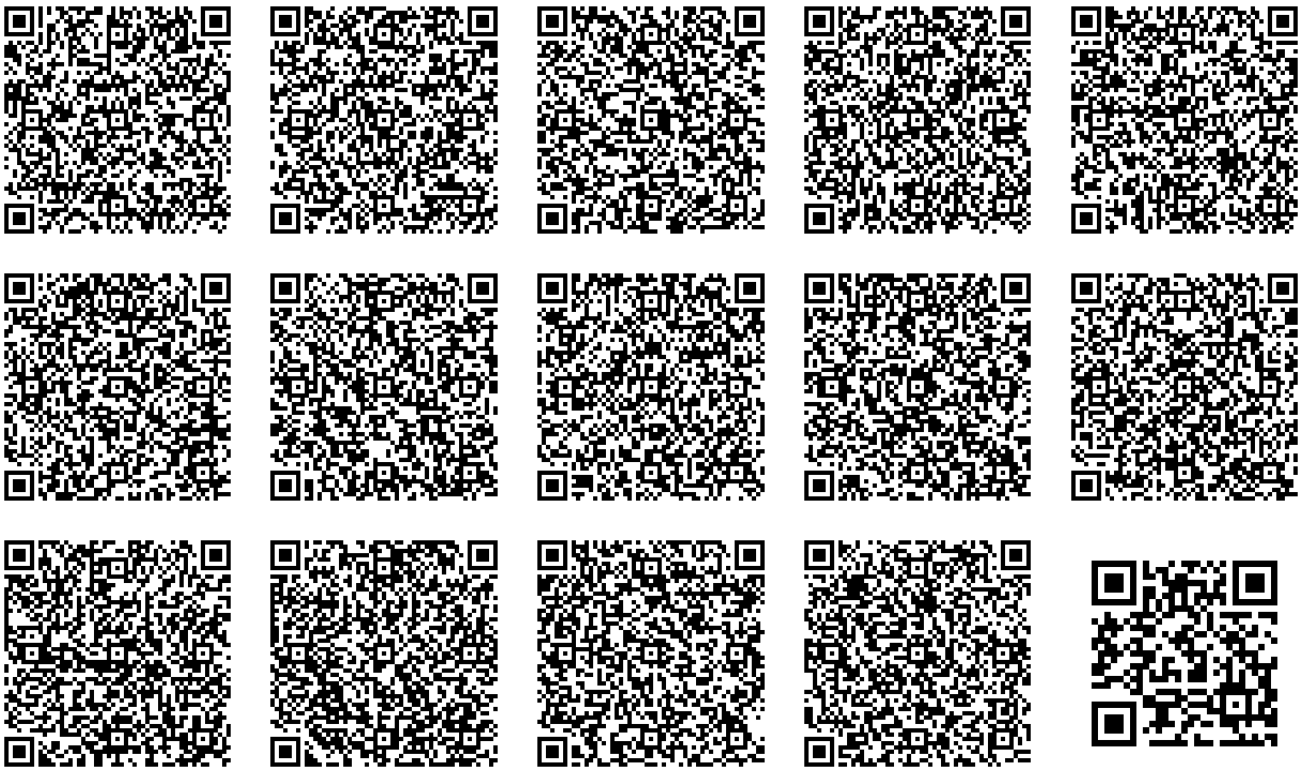

Подписано через EQURYLYS.KZ (#a23a0198-cca9-4b99-911f-c9951835cd37)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **160140010537 - ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **060540008995 - ТОО Нур-Талап и К**

Стройка: **Строительство спортивного здания КГУ «СДЮШС №1 им.В.Н.Цехановича» в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**

Договор подряда (контракт) №: **338 от 23.12.2024 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4180	64	267 520
2	4	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4180	610	2 549 800
3	5	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4180	209	873 620
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**3 690 940**
			Раздел: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ К1 21ШТ				
4	59	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	12.096	80 113	969 047
5	60	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.89796	321 540	288 730
6	61	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.31668	346 743	109 807
			Итого по разделу: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ К1 21ШТ				**1 367 584**
			Раздел: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				
			Подраздел: РМ-1 3ШТ				
7	62	1106-0701-0102РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	16.14	146 801	2 369 368
8	63	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.78134	321 540	572 772
9	64	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.50304	346 743	174 426

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	65	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0114	2 171 971	24 760
			Итого по подразделу: РМ-1 3ШТ				**3 141 326**
			Подраздел: РМ-2 7ШТ				
11	66	1106-0701-0102РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13.02	146 801	1 911 349
12	67	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.46062	321 540	469 648
13	68	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.406	346 743	140 778
14	69	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0399	2 171 971	86 662
			Итого по подразделу: РМ-2 7ШТ				**2 608 437**
			Итого по разделу: РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ				**5 749 763**
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
15	70	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	60	22 651	1 359 060
16	71	222-203-0303РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	394.12	9 071	3 575 063
			Итого по разделу: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				**4 934 123**
			Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ				
17	147	6106-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	54.87	285 948	15 689 967
18	148	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	12.58	335 415	4 219 521
19	149	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	16.18	107 002	1 731 292
			Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ				**21 640 780**
			Итого по локальной смете: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**37 383 190**
			ИТОГО по акту:				**37 383 190**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				37383190.009 x 6.90%	2 579 440
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				37383190.009 + 2579440.146	39 962 630
		Сметная прибыль, (5.00%)				39962630.156 x 5.00%	1 998 132
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				39962630.156 x 5.000%	1 998 132
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					43 958 893

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в ценах на 2024, к = 1.0750				43958893.171 x 1.0750	47 255 810
		НДС (12%)				47255810.159 x 12%	5 670 697
		Итого с НДС				47255810.159 + 5670697.219	52 926 507
		Итого со скидкой				52926507.378 - 2.00%	51 867 977

Лист согласования
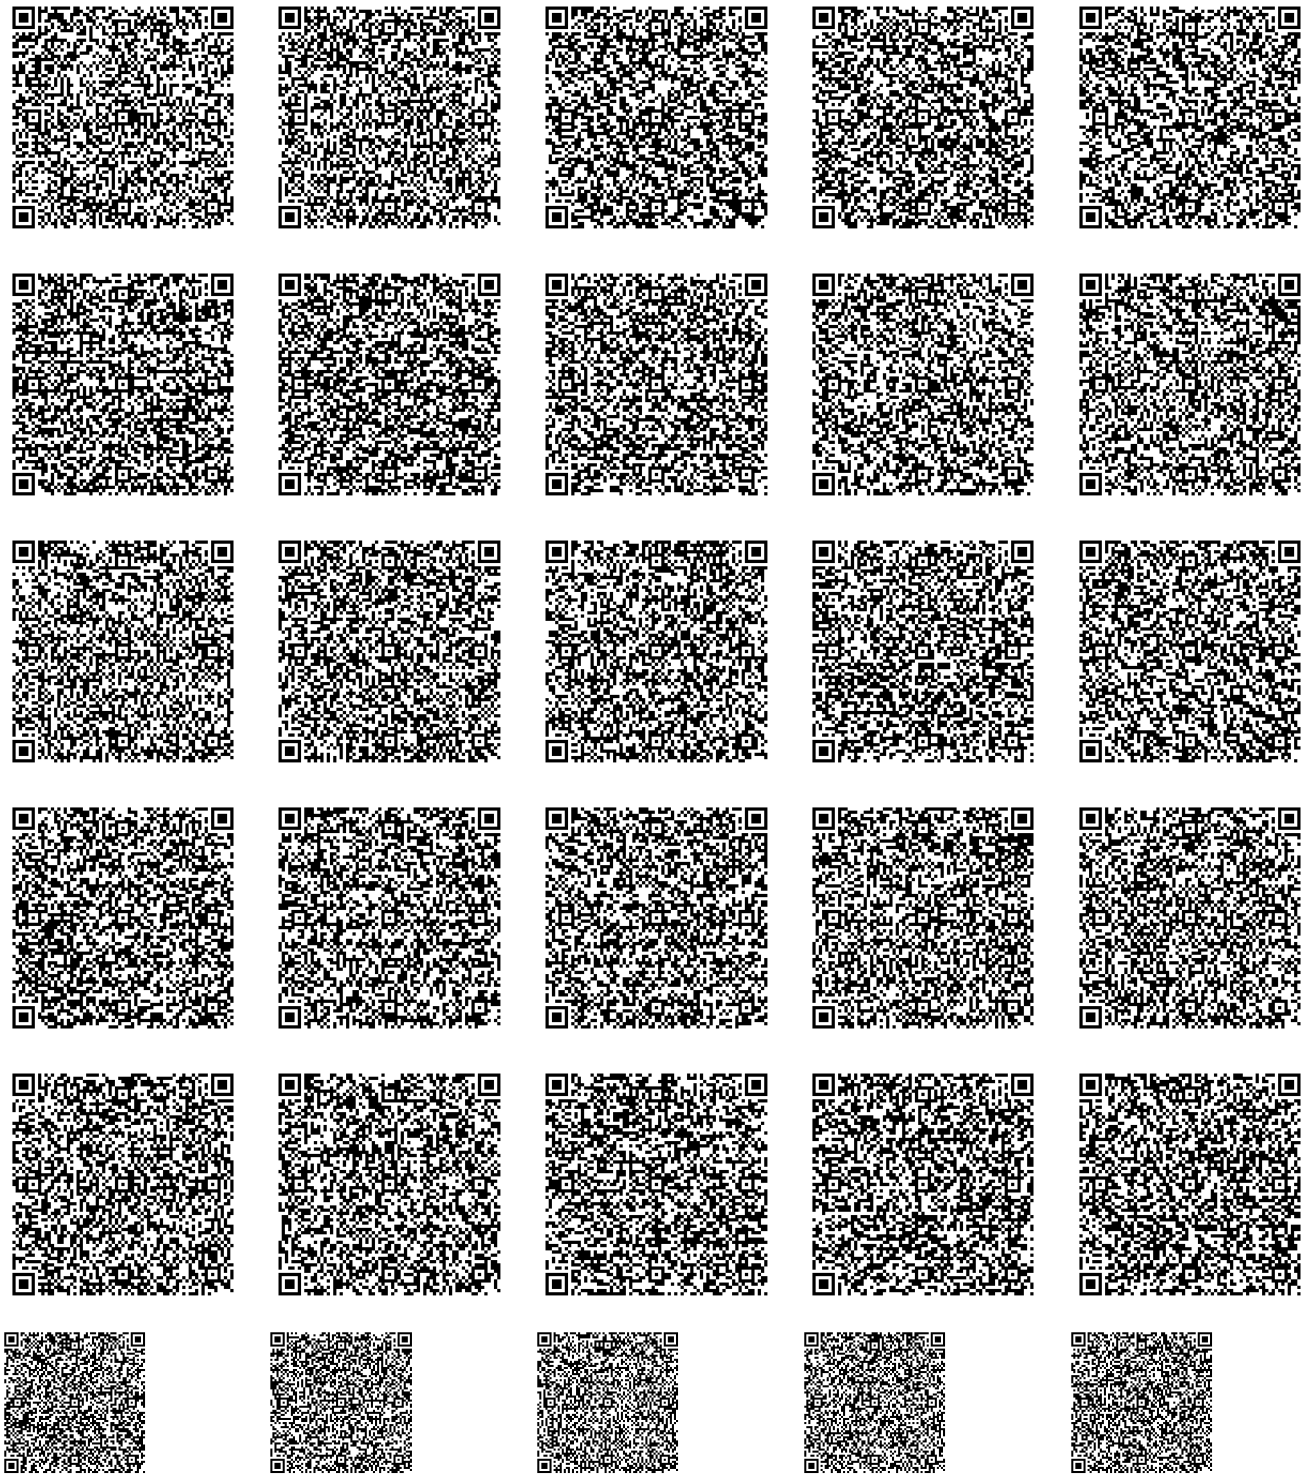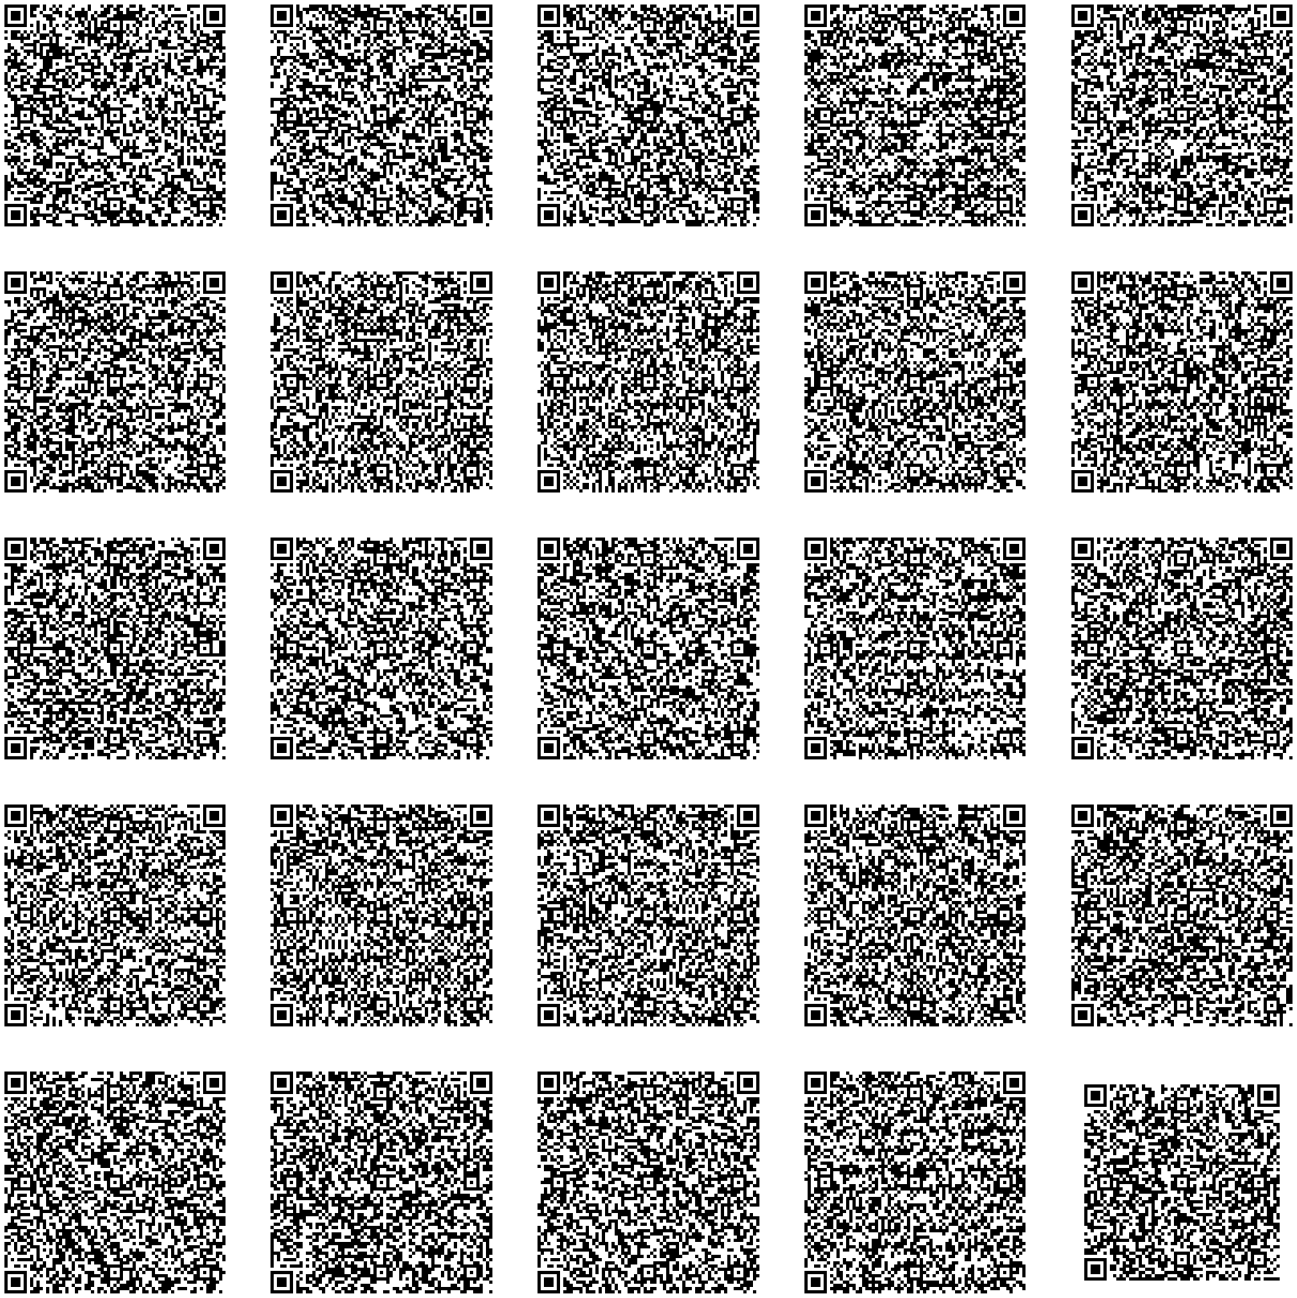
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
790402302659 - КЕРЕЙТБАЕВ КАНАТБЕК ИСАБЕКҰЛЫ	Генеральный подрядчик	22.07.2025 11:50
Представители технического надзора		
640109302408 - ИНИРБАЕВ ТАЛГАТ УНГАРБАЕВИЧ	Эксперт технического надзора	22.07.2025 12:39
Представители авторского надзора		
910513301879 - УРАЗБАЕВ НУРЖАН БАХИТБЕРДЫЕВИЧ	Эксперт авторского надзора	22.07.2025 13:53
Представители заказчика		
930408301169 - ЕСЕНГУЛОВ ЖАНДОС ЖОМАРТОВИЧ	Заместитель руководителя управления	23.07.2025 10:18
960618451802 - ҚАНТӨРИНА МӨЛДІР БАҚТЫБАЙҚЫЗЫ	Главный специалист	23.07.2025 10:25
820815300041 - ЛЕПЕСОВ САМАТ УЛГАЙСЫНОВИЧ	Руководитель производственного отдела	23.07.2025 12:33
