Приложение 2 к приказу

Исполняющего обязанности

министра промышленности

и строительства Республики Казахстан

от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1

к Правилам организации

деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан" г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БИН 220840048968

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1 БИН/ИИН 050940013378

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебно-административные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, ул.Кенесары 36

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 220840048968	БИН/ИИН 050940013378			16	12.02.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце,		из них:			
				без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А		1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебно-административные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Алматы, ул.Кенесары 36		1 607 825 656,96	790 461 444,64	108 496 358,53	106 395 442,73	2 100 915,81		17 359 417,37	125 855 775,90
ИТОГО:									125 855 775,90
Удержание аванса 30%									37 756 732,77
Гарантийные обязательства 3%									3 775 673,28
Итого к оплате									84 323 369,85

СДАЛ: (ПОДРЯДЧИК)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1 БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Нургалиев А.Г.**

Представитель технического надзора
ТОО "Аркада KZ"
Приказ № 05-02 от 03марта2025года

Главный эксперт _____ Красиков К.С.
Аттестат № KZ34VJE00047503

ПРИНЯЛ: (ЗАКАЗЧИК)

Государственное учреждение "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан" г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8 БИН 220840048968

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

_____ **Кожахмет М.Д.**

Подписано через EQURYLYS.KZ (#ebc4cc73-dd39-4a7b-a19d-726acd2f5186)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Астана, проспект Мангилик Ел, дом № 8**	**220840048968**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль ул. Әлихан Бөкейхан, дом № 10/1, к.1**	**050940013378**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) доп соглашение № 220840048968/250026/03 от15 апреля 2026г к договору №16 от 12.02.2025

Номер документа	Дата составления
47	**08.05.2026**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебно административные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36			работа	1	125 855 775,90	125 855 775,90	17 359 417,37
				Итого	1	x	125 855 775,90	17 359 417,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нургалиев А.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.05.2026

М.П.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#ebc4cc73-dd39-4a7b-a19d-726acd2f5186)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ null	Начальник ПТО	Подписано: 11.05.2026 14:13
Технический надзор: ИИН 860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ null	Технический директор	Подписано: 11.05.2026 16:39
Заказчик: ИИН 860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР null	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	Подписано: 12.05.2026 09:43
Заказчик: ИИН 870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР null	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	Подписано: 12.05.2026 09:53
Заказчик: ИИН 840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР null	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	Подписано: 12.05.2026 14:37

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#ebc4cc73-dd39-4a7b-a19d-726acd2f5186)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#ebc4cc73-dd39-4a7b-a19d-726acd2f5186)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#ebc4cc73-dd39-4a7b-a19d-726acd2f5186)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Май 2026 года
Архитектурная часть

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть				
			Раздел: 1 ЭТАЖ				
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-122,4 м2				
1	3	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	104.04	8 057	838 250
2	4	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	106.1208	3 065	325 260
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-122,4 м2				**1 163 511**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/575,6м2/				
3	86	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	489.26	296	144 821
4	87	236-101-0116РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	97.852	326	31 900
5	88	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	489.26	4 677	2 288 269
6	89	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	489.26	9 245	4 523 209
7	90	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	499.0452	3 034	1 514 103
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/575,6м2/				**8 502 302**
			Итого по разделу: 1 ЭТАЖ				**9 665 812**
			Раздел: 2 ЭТАЖ.═══════════════════════════════				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/138,5м2/				
8	180	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	117.725	296	34 847
9	181	236-101-0116РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23.545	326	7 676
10	182	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	117.725	4 677	550 599
11	183	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	117.725	9 245	1 088 367
12	184	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	120.0795	3 034	364 321
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/138,5м2/				**2 045 810**
			Итого по разделу: 2 ЭТАЖ.═══				**2 045 810**
			Раздел: 3 ЭТАЖ═══				
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-4,3 м2				
13	209	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3.655	8 057	29 448
14	210	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3.7281	3 065	11 427
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-4,3 м2				**40 875**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/40,3м2/				
15	251	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	34.255	296	10 140
16	252	236-101-0116РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6.581	326	2 146
17	253	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	34.255	4 677	160 211
18	254	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	34.255	9 245	316 688
19	255	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	34.9401	3 034	106 009
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/40,3м2/				**595 192**
			Итого по разделу: 3 ЭТАЖ═══				**636 067**
			Раздел: 4 ЭТАЖ.═══				
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-3,7 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	264	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3.145	8 057	25 339
21	265	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3.2079	3 065	9 832
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-3,7 м2				**35 171**
			Итого по разделу: 4 ЭТАЖ.═══				**35 171**
			Раздел: 7 ЭТАЖ.═══				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				
22	458	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	132.15	1 611	212 893
23	459	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	116.8206	3 205	374 410
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				**587 304**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/339,2м2/				
24	495	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	271.36	1 266	343 542
25	496	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	271.36	649	176 113
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/339,2м2/				**519 654**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./503,8м2/				
26	502	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	403.04	1 266	510 249
27	503	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	403.04	649	261 573
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./503,8м2/				**771 822**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/178,2м2/				
28	507	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	151.47	9 245	1 400 340
29	508	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	154.4994	3 034	468 751
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/178,2м2/				**1 869 091**
			Итого по разделу: 7 ЭТАЖ.═══				**3 747 871**
			Раздел: 8 ЭТАЖ.═══				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	524	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	96.4	1 611	155 300
31	525	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	100.256	3 205	321 320
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				**476 621**
			Подраздел: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/112,7м2/				
32	550	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	78.89	25 349	1 999 782
33	551	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых/кубообразный/ реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	78.89	6 637	523 593
			Итого по подразделу: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/112,7м2/				**2 523 375**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/266,61м2/				
34	561	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	213.288	1 266	270 022
35	562	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	213.288	649	138 424
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/266,61м2/				**408 446**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./428,46м2/				
36	568	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	342.768	1 266	433 944
37	569	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	342.768	649	222 457
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./428,46м2/				**656 401**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/154,84м2/				
38	573	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	131.614	9 245	1 216 772
39	574	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	134.2463	3 034	407 303
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/154,84м2/				**1 624 075**
			Итого по разделу: 8 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**5 688 919**
			Раздел: 9 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				
40	590	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	96.4	1 611	155 300

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	591	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	100.256	3 205	321 320
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				**476 621**
			Подраздел: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/112,8м2/				
42	616	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	78.96	25 349	2 001 557
43	617	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых/кубообразный/ реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	78.96	6 637	524 058
			Итого по подразделу: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/112,8м2/				**2 525 615**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/280м2/				
44	627	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	224	1 266	283 584
45	628	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	224	649	145 376
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/280м2/				**428 960**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./509м2/				
46	634	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	407.2	1 266	515 515
47	635	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	407.2	649	264 273
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./509м2/				**779 788**
			Итого по разделу: 9 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**4 210 984**
			Раздел: 10 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				
48	656	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	132.15	1 611	212 893
49	657	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	137.436	3 205	440 482
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				**653 376**
			Подраздел: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/119,6м2/				
50	682	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	83.72	25 349	2 122 218
51	683	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых/кубообразный/ реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	83.72	6 637	555 649
			Итого по подразделу: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/119,6м2/				**2 677 867**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/268м2/				
52	693	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	214.4	1 266	271 430
53	694	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	214.4	649	139 146
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/268м2/				**410 576**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./528,28м2/				
54	700	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	422.624	1 266	535 042
55	701	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	422.624	649	274 283
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./528,28м2/				**809 325**
			Итого по разделу: 10 ЭТАЖ.═══════════════════════════════				**4 551 144**
			Раздел: 11 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-281,6 м2				
56	722	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	140.8	1 611	226 829
57	723	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	146.432	3 205	469 315
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-281,6 м2				**696 143**
			Подраздел: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/104,9м2/				
58	748	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	72.38	25 349	1 834 761
59	749	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых/кубообразный/ реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	72.38	6 637	480 386
			Итого по подразделу: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/104,9м2/				**2 315 146**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/383,8м2/				
60	761	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	307.04	1 266	388 713
61	762	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	307.04	649	199 269
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/383,8м2/				**587 982**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./530,7м2/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	768	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	424.56	1 266	537 493
63	769	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	424.56	649	275 539
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./530,7м2/				**813 032**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/143,6м2/				
64	773	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	122.06	9 245	1 128 445
65	774	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	124.5012	3 034	377 737
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/143,6м2/				**1 506 181**
			Итого по разделу: 11 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**5 918 485**
			Раздел: 12 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-262,73 м2				
66	790	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	131.365	1 611	211 629
67	791	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	136.6196	3 205	437 866
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-262,73 м2				**649 495**
			Подраздел: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/105,4м2/				
68	816	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	73.78	25 349	1 870 249
69	817	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых/кубообразный/ реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	73.78	6 637	489 678
			Итого по подразделу: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/105,4м2/				**2 359 927**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/271м2/				
70	827	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	216.8	1 266	274 469
71	828	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	216.8	649	140 703
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/271м2/				**415 172**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./552м2/				
72	834	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	441.6	1 266	559 066

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	835	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	441.6	649	286 598
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./552м2/				**845 664**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/158м2/				
74	839	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	134.3	9 245	1 241 603
75	840	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	136.986	3 034	415 615
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/158м2/				**1 657 219**
			Итого по разделу: 12 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**5 927 477**
			Раздел: ПРОЕМЫ/АС л.74/				
			Подраздел: ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ/Д.1,1",15,17,18,19,20,21/замки и ручки в комплекте/				
76	857	1109-0403-0405 РСНБ РК 2022	Блоки дверные металлические/Д.1,1",15,17,18/ противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка	м2	66.36	17 238	1 143 914
77	859	223-207-0201РСНБ РК 2022	Блок дверной/1,1",15,17,18/ стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	66.36	64 311	4 267 678
			Итого по подразделу: ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ/Д.1,1",15,17,18,19,20,21/замки и ручки в комплекте/				**5 411 591**
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ/АС л.74/				**5 411 591**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть				**47 839 331**
			ИТОГО по акту:				**47 839 331**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)	47839331.489 x 6.30%	3 013 878
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	47839331.489 + 3013877.975	50 853 209
	Сметная прибыль, (5.00%)	50853209.464 x 5.00%	2 542 660
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	50853209.464 x 5.000%	2 542 660
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		55 938 530
	Итого в текущих ценах 2025 года к=1,155, к = 1.1550	55938530.410 x 1.1550	64 609 003
	Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700	64609002.624 x 0.1700	10 983 530
	Договорной коэфициент 0,98, к = 0.9800	10983530.446 x 0.9800	10 763 860
	НДС (16%)	10763859.837 x 16%	1 722 218
	Итого с НДС	10763859.837 + 1722217.574	12 486 077

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	11.05.2026 12:01
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	11.05.2026 16:40
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	11.05.2026 12:34 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	12.05.2026 09:42
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	12.05.2026 09:53
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	12.05.2026 14:38

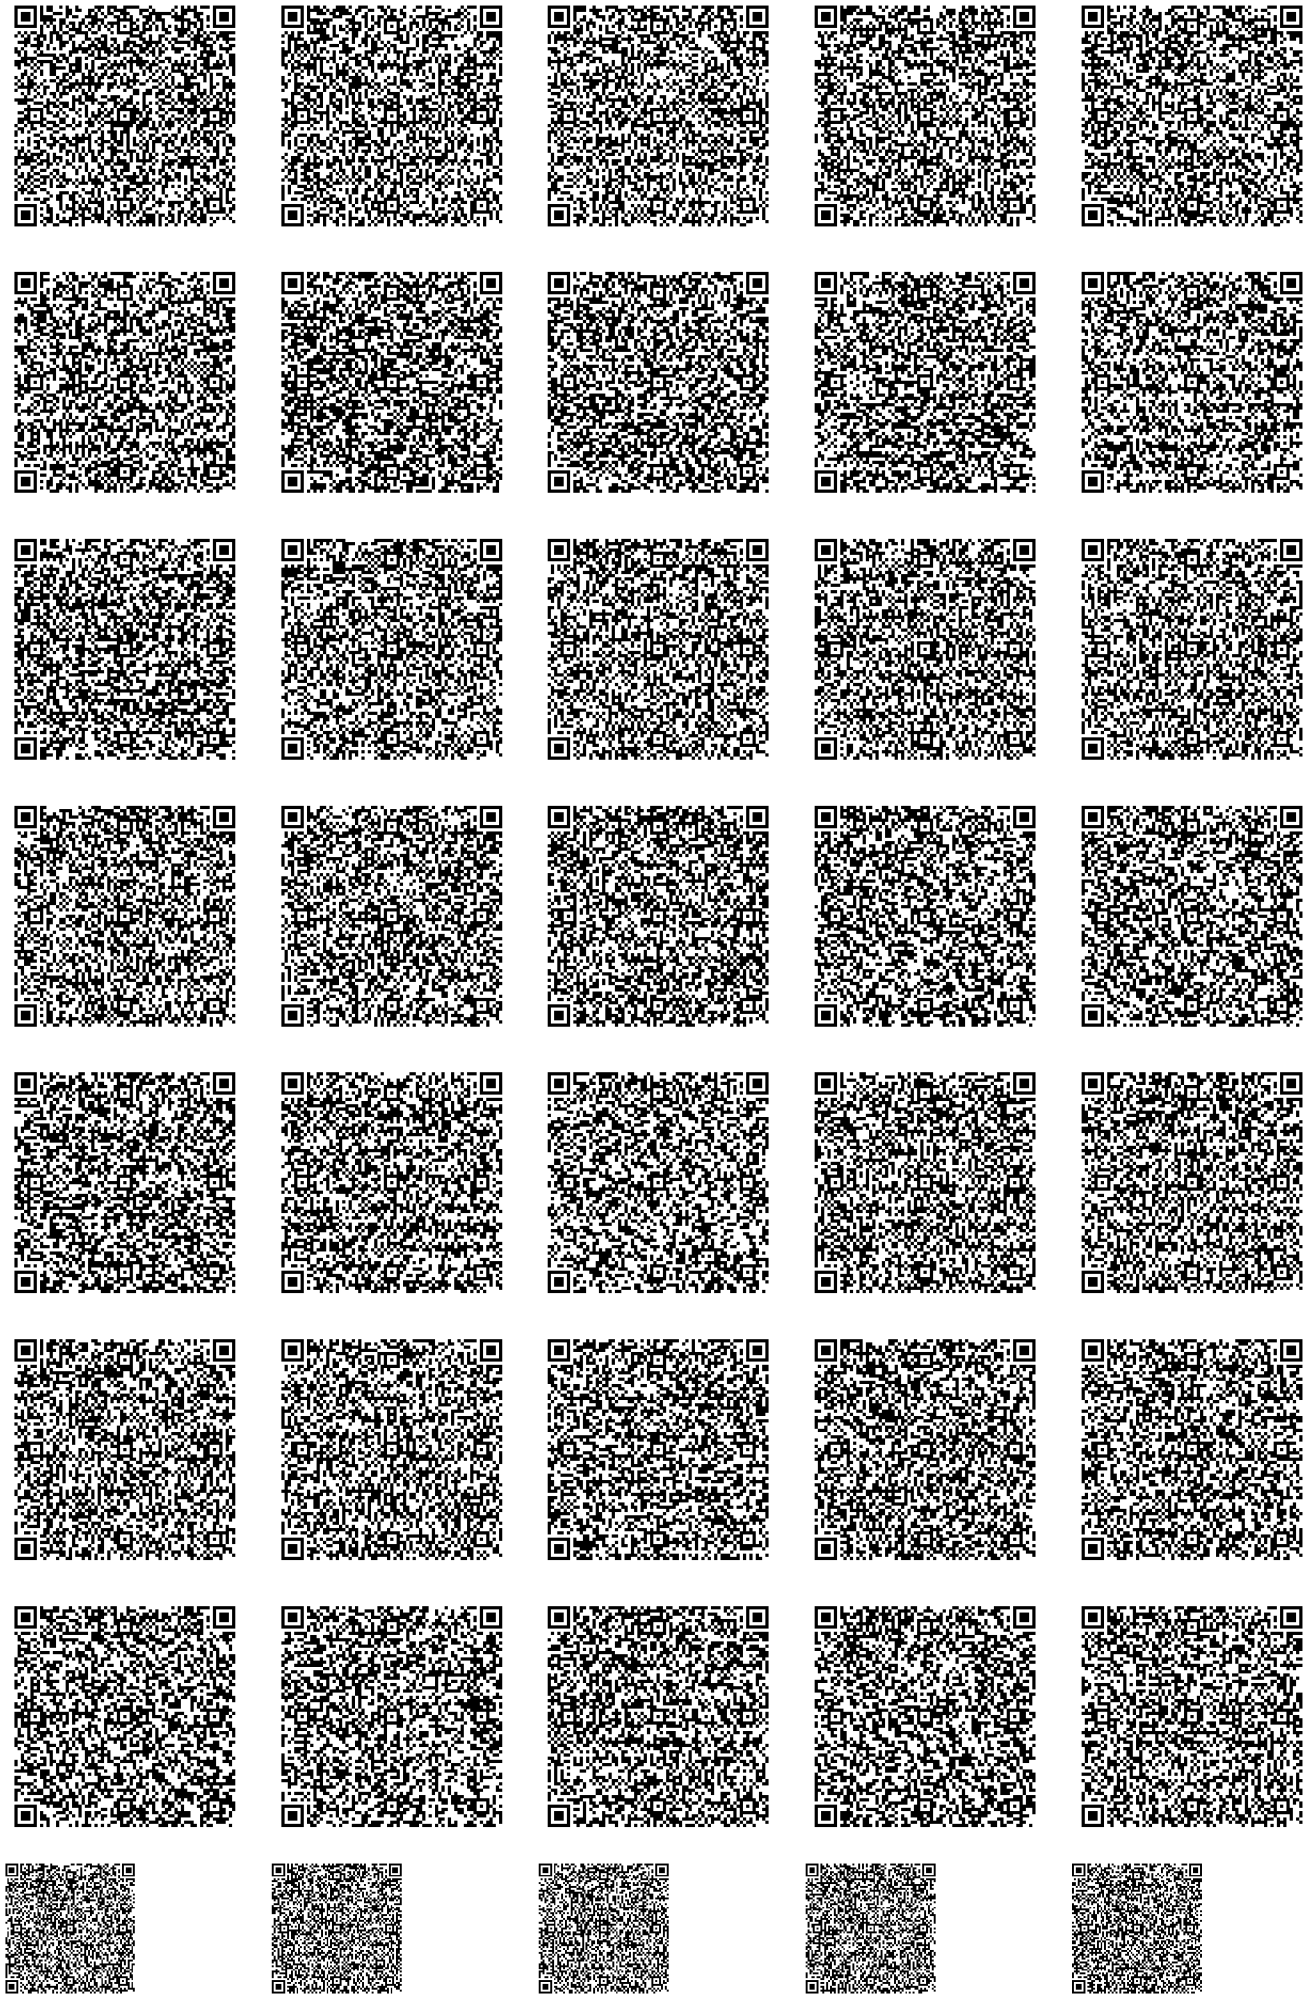

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ № 37
за Май 2026 года
Архитектурная часть

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть				
			Раздел: 1 ЭТАЖ				
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-122,4 м2				
1	3	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	104.04	8 057	838 250
2	4	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	106.1208	3 065	325 260
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-122,4 м2				**1 163 511**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/575,6м2/				
3	86	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	489.26	296	144 821
4	87	236-101-0116РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	97.852	326	31 900
5	88	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	489.26	4 677	2 288 269
6	89	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	489.26	9 245	4 523 209
7	90	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	499.0452	3 034	1 514 103
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/575,6м2/				**8 502 302**
			Итого по разделу: 1 ЭТАЖ				**9 665 812**
			Раздел: 2 ЭТАЖ.═══════════════════════════════				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/138,5м2/				
8	180	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	117.725	296	34 847
9	181	236-101-0116РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23.545	326	7 676
10	182	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	117.725	4 677	550 599
11	183	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	117.725	9 245	1 088 367
12	184	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	120.0795	3 034	364 321
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/138,5м2/				**2 045 810**
			Итого по разделу: 2 ЭТАЖ.═══				**2 045 810**
			Раздел: 3 ЭТАЖ═══				
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-4,3 м2				
13	209	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3.655	8 057	29 448
14	210	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3.7281	3 065	11 427
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-4,3 м2				**40 875**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/40,3м2/				
15	251	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	34.255	296	10 140
16	252	236-101-0116РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6.581	326	2 146
17	253	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	34.255	4 677	160 211
18	254	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	34.255	9 245	316 688
19	255	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	34.9401	3 034	106 009
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/40,3м2/				**595 192**
			Итого по разделу: 3 ЭТАЖ═══				**636 067**
			Раздел: 4 ЭТАЖ.═══				
			Подраздел: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-3,7 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	264	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3.145	8 057	25 339
21	265	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3.2079	3 065	9 832
			Итого по подразделу: ТИП НП2/санузлы, ПУИ/-3,7 м2				**35 171**
			Итого по разделу: 4 ЭТАЖ.═══				**35 171**
			Раздел: 7 ЭТАЖ.═══				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				
22	458	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	132.15	1 611	212 893
23	459	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	116.8206	3 205	374 410
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				**587 304**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/339,2м2/				
24	495	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	271.36	1 266	343 542
25	496	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	271.36	649	176 113
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/339,2м2/				**519 654**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./503,8м2/				
26	502	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	403.04	1 266	510 249
27	503	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	403.04	649	261 573
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./503,8м2/				**771 822**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/178,2м2/				
28	507	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	151.47	9 245	1 400 340
29	508	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	154.4994	3 034	468 751
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/178,2м2/				**1 869 091**
			Итого по разделу: 7 ЭТАЖ.═══				**3 747 871**
			Раздел: 8 ЭТАЖ.═══				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	524	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	96.4	1 611	155 300
31	525	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	100.256	3 205	321 320
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				**476 621**
			Подраздел: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/112,7м2/				
32	550	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	78.89	25 349	1 999 782
33	551	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых/кубообразный/ реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	78.89	6 637	523 593
			Итого по подразделу: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/112,7м2/				**2 523 375**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/266,61м2/				
34	561	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	213.288	1 266	270 022
35	562	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	213.288	649	138 424
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/266,61м2/				**408 446**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./428,46м2/				
36	568	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	342.768	1 266	433 944
37	569	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	342.768	649	222 457
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./428,46м2/				**656 401**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/154,84м2/				
38	573	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	131.614	9 245	1 216 772
39	574	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	134.2463	3 034	407 303
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/154,84м2/				**1 624 075**
			Итого по разделу: 8 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**5 688 919**
			Раздел: 9 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				
40	590	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	96.4	1 611	155 300

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	591	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	100.256	3 205	321 320
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-192,8 м2				**476 621**
			Подраздел: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/112,8м2/				
42	616	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	78.96	25 349	2 001 557
43	617	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых/кубообразный/ реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	78.96	6 637	524 058
			Итого по подразделу: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/112,8м2/				**2 525 615**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/280м2/				
44	627	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	224	1 266	283 584
45	628	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	224	649	145 376
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/280м2/				**428 960**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./509м2/				
46	634	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	407.2	1 266	515 515
47	635	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	407.2	649	264 273
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./509м2/				**779 788**
			Итого по разделу: 9 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**4 210 984**
			Раздел: 10 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				
48	656	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	132.15	1 611	212 893
49	657	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	137.436	3 205	440 482
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-264,3 м2				**653 376**
			Подраздел: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/119,6м2/				
50	682	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	83.72	25 349	2 122 218
51	683	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых/кубообразный/ реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	83.72	6 637	555 649
			Итого по подразделу: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/119,6м2/				**2 677 867**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/268м2/				
52	693	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	214.4	1 266	271 430
53	694	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	214.4	649	139 146
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/268м2/				**410 576**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./528,28м2/				
54	700	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	422.624	1 266	535 042
55	701	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	422.624	649	274 283
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./528,28м2/				**809 325**
			Итого по разделу: 10 ЭТАЖ.═══════════════════════════════				**4 551 144**
			Раздел: 11 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-281,6 м2				
56	722	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	140.8	1 611	226 829
57	723	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	146.432	3 205	469 315
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-281,6 м2				**696 143**
			Подраздел: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/104,9м2/				
58	748	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	72.38	25 349	1 834 761
59	749	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых/кубообразный/ реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	72.38	6 637	480 386
			Итого по подразделу: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/104,9м2/				**2 315 146**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/383,8м2/				
60	761	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	307.04	1 266	388 713
61	762	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	307.04	649	199 269
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/383,8м2/				**587 982**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./530,7м2/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	768	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	424.56	1 266	537 493
63	769	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	424.56	649	275 539
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./530,7м2/				**813 032**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/143,6м2/				
64	773	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	122.06	9 245	1 128 445
65	774	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	124.5012	3 034	377 737
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/143,6м2/				**1 506 181**
			Итого по разделу: 11 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**5 918 485**
			Раздел: 12 ЭТАЖ.═══════════════════════════				
			Подраздел: ТИП НП3/кабинеты, и др./-262,73 м2				
66	790	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	131.365	1 611	211 629
67	791	233-101-0104РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	136.6196	3 205	437 866
			Итого по подразделу: ТИП НП3/кабинеты, и др./-262,73 м2				**649 495**
			Подраздел: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/105,4м2/				
68	816	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	73.78	25 349	1 870 249
69	817	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых/кубообразный/ реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	73.78	6 637	489 678
			Итого по подразделу: ТИП ПТ3/холл, фойе, лифтовой холл, коридоры/105,4м2/				**2 359 927**
			Подраздел: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/271м2/				
70	827	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	216.8	1 266	274 469
71	828	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	216.8	649	140 703
			Итого по подразделу: ТИП СТ1/холл, фойе, тамбуры, коридоры/271м2/				**415 172**
			Подраздел: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./552м2/				
72	834	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	441.6	1 266	559 066

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	835	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	441.6	649	286 598
			Итого по подразделу: ТИП СТ2/кабинеты, конф. зал и др./552м2/				**845 664**
			Подраздел: ТИП СТ3/санузлы/158м2/				
74	839	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	134.3	9 245	1 241 603
75	840	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	136.986	3 034	415 615
			Итого по подразделу: ТИП СТ3/санузлы/158м2/				**1 657 219**
			Итого по разделу: 12 ЭТАЖ.═══════════════════════════				**5 927 477**
			Раздел: ПРОЕМЫ/АС л.74/				
			Подраздел: ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ/Д.1,1",15,17,18,19,20,21/замки и ручки в комплекте/				
76	857	1109-0403-0405 РСНБ РК 2022	Блоки дверные металлические/Д.1,1",15,17,18/ противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка	м2	66.36	17 238	1 143 914
77	859	223-207-0201РСНБ РК 2022	Блок дверной/1,1",15,17,18/ стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	66.36	64 311	4 267 678
			Итого по подразделу: ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ/Д.1,1",15,17,18,19,20,21/замки и ручки в комплекте/				**5 411 591**
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ/АС л.74/				**5 411 591**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть				**47 839 331**
			ИТОГО по акту:				**47 839 331**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)	47839331.489 x 6.30%	3 013 878
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	47839331.489 + 3013877.975	50 853 209
	Сметная прибыль, (5.00%)	50853209.464 x 5.00%	2 542 660
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	50853209.464 x 5.000%	2 542 660
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		55 938 530
	Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300	55938530.410 x 0.8300	46 428 980
	Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750	46428980.241 x 1.0750	49 911 154
	Договорной коэфициент 0,98, к = 0.9800	49911153.759 x 0.9800	48 912 931
	НДС (16%)	48912930.684 x 16%	7 826 069
	Итого с НДС	48912930.684 + 7826068.909	56 739 000

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	11.05.2026 12:01
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	11.05.2026 16:39
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	11.05.2026 12:33 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	12.05.2026 09:53
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	12.05.2026 09:43
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	12.05.2026 14:38

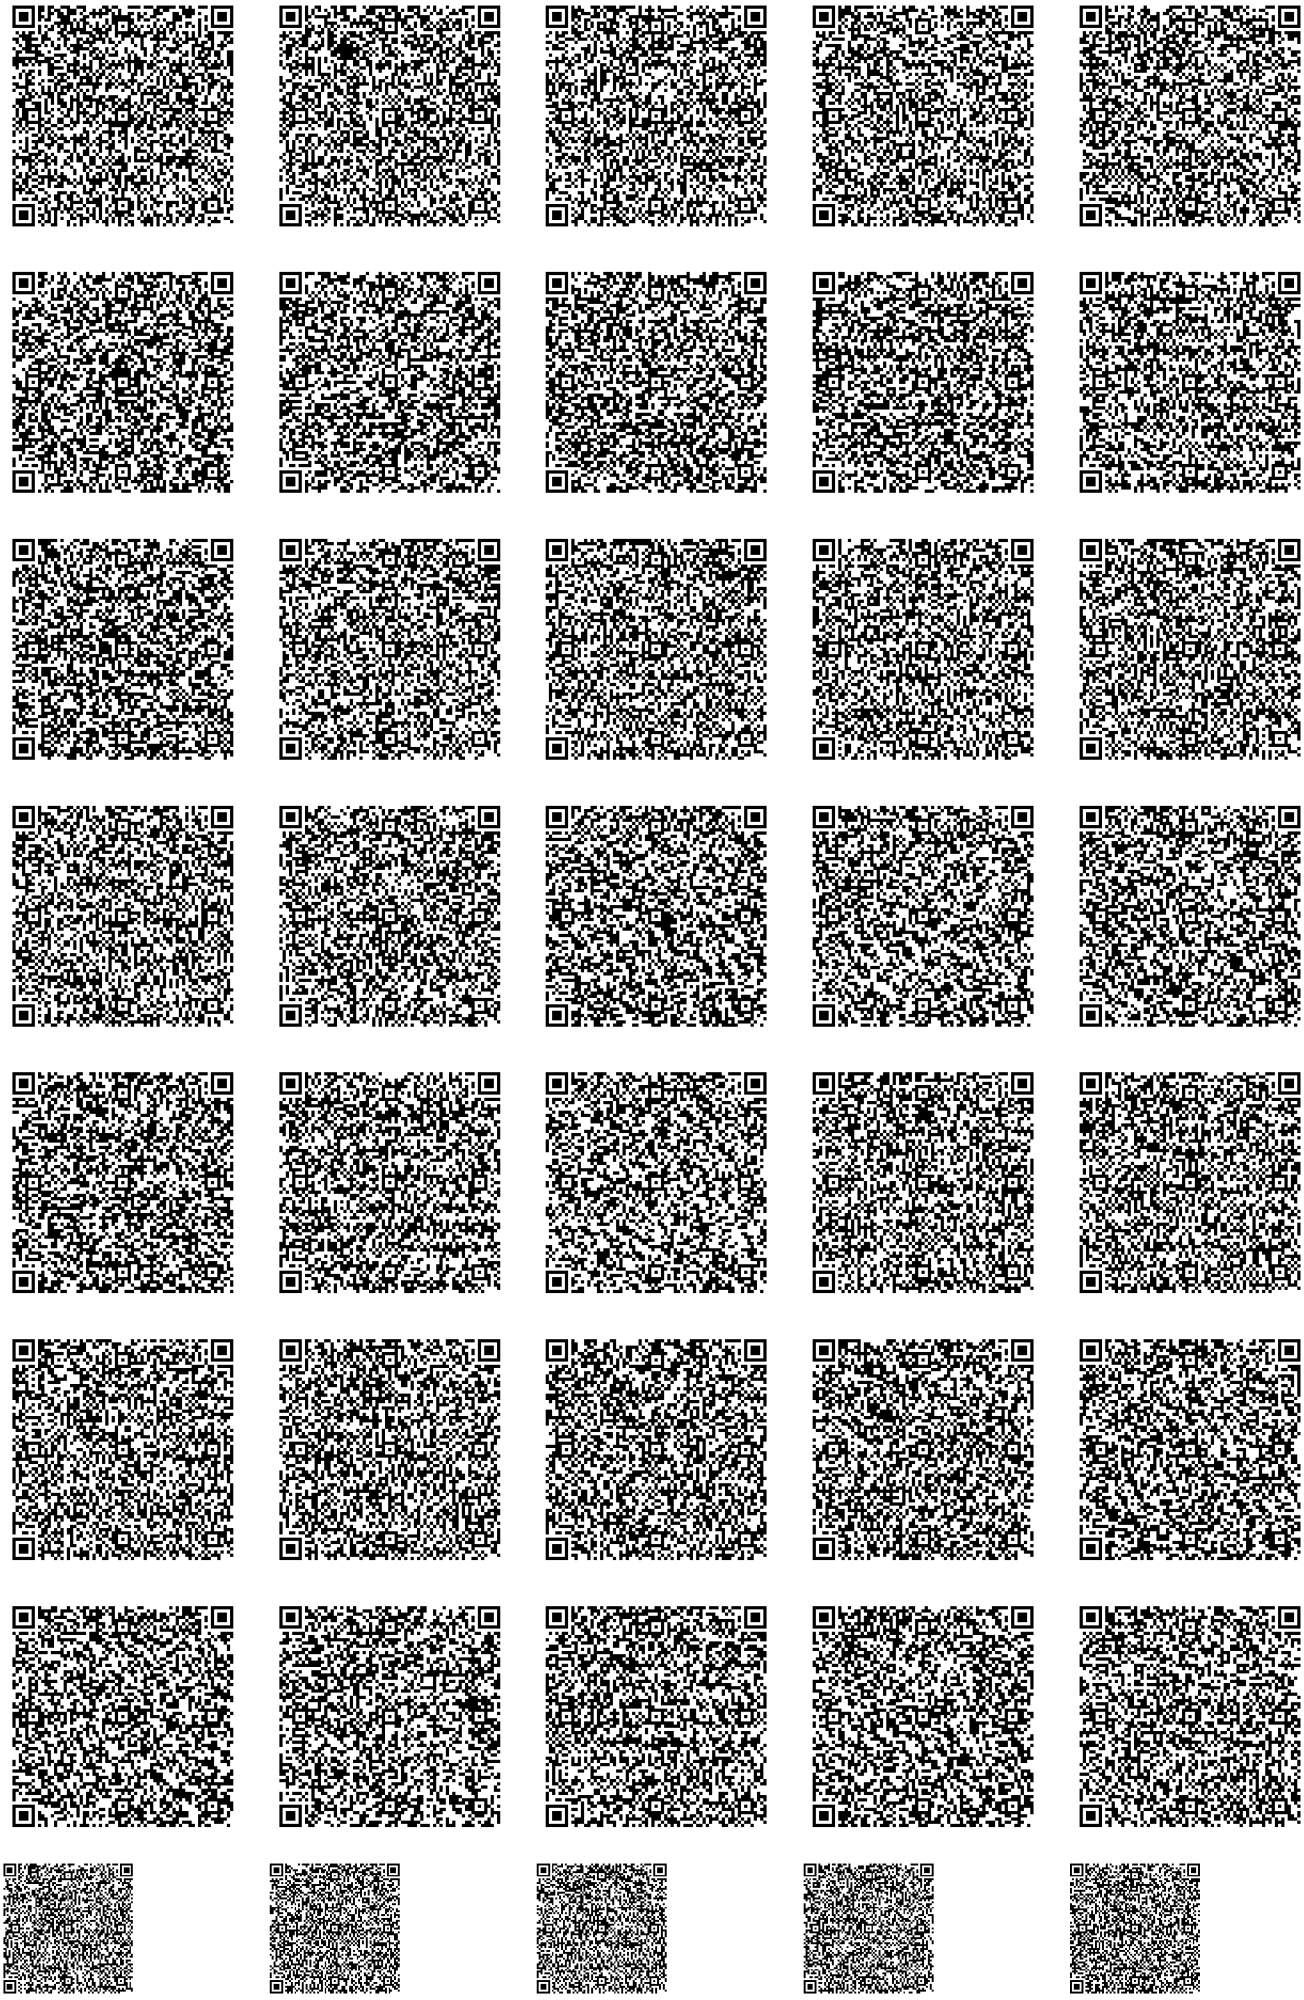

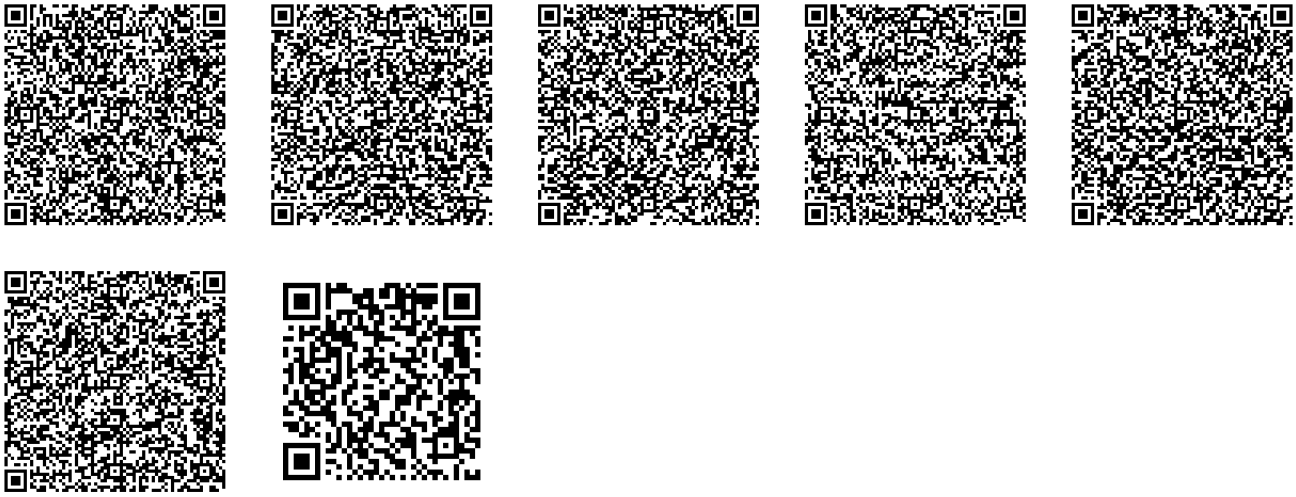

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Май 2026 года
Система оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ)				
1	3	1310-0411-0207РСНБ РК 2022	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	200	11 062	2 212 400
2	4	ТКоммерческое предложение /п.294/РСНБ РК 2022	Громкоговоритель настенный, 3 Вт SONAR SW-03	шт	200	9 378	1 875 534
			Итого по локальной смете: Система оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ)				**4 087 934**
			ИТОГО по акту:				**4 087 934**
			В том числе оборудование:				**1 875 534**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)				2212400.000 x 6.30%	139 381
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4087934.021 + 139381.204	4 227 315
		Сметная прибыль, (5.00%)				2351781.204 x 5.00%	117 589
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				4227315.225 x 5.000%	211 366
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 556 270
		Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700				4556270.046 x 0.1700	774 566
		Итого в текущих ценах 2025 года к=1,155, к = 1.1550				774565.908 x 1.1550	894 624
		Договорной коэфициент 0,98, к = 0.9800				894623.624 x 0.9800	876 731
		НДС (16%)				876731.151 x 16%	140 277
		Итого с НДС				876731.151 + 140276.984	1 017 008

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	11.05.2026 10:31
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	11.05.2026 11:39
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	11.05.2026 11:09
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	12.05.2026 09:42
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	12.05.2026 09:52
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	12.05.2026 14:41

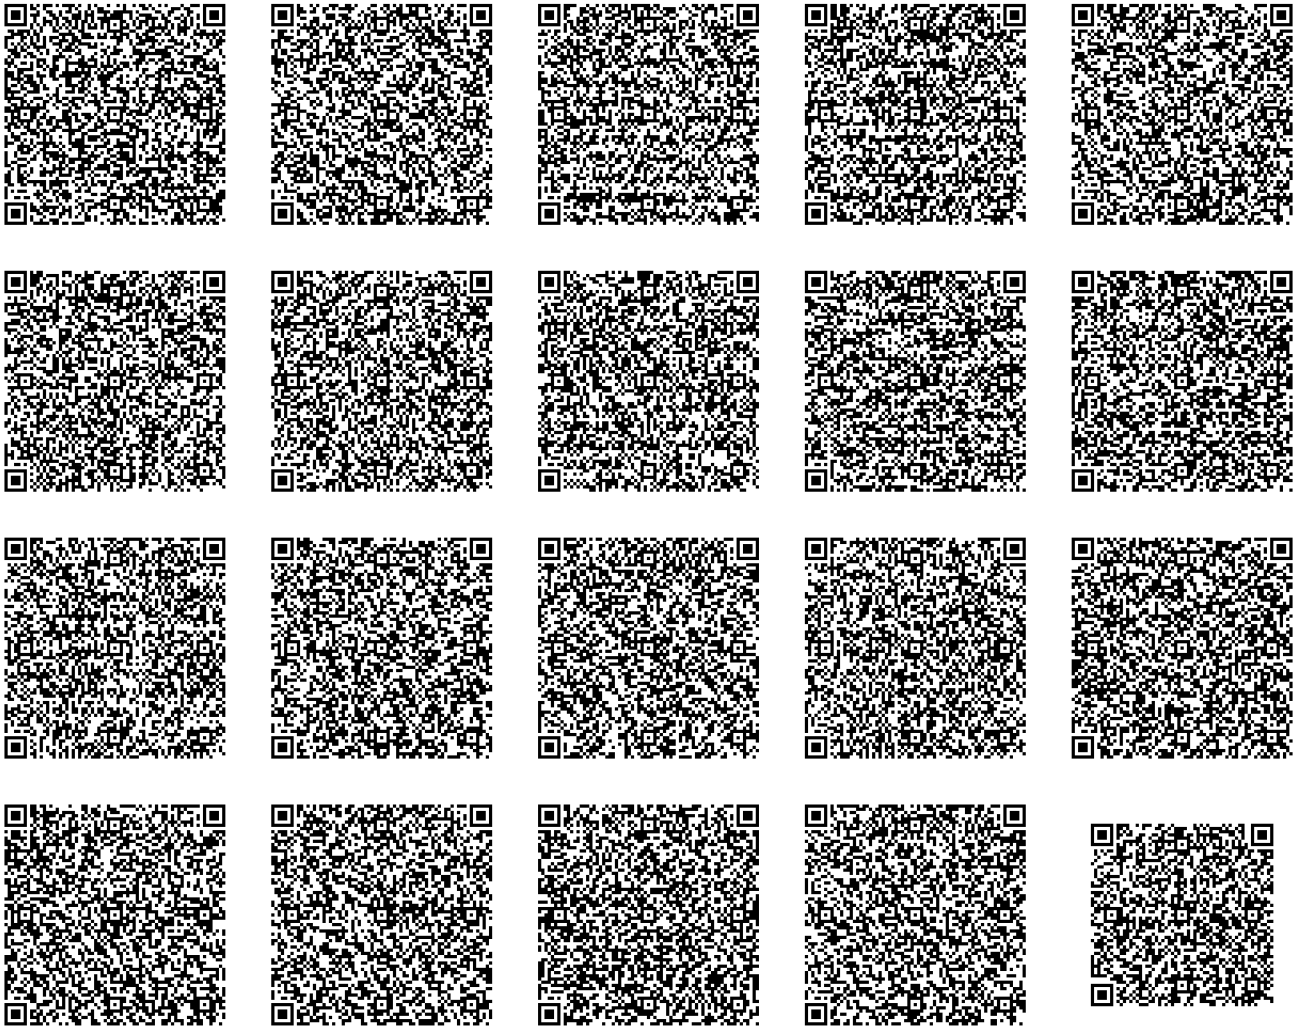

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ № 38
за Май 2026 года
Система оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ)				
1	3	1310-0411-0207РСНБ РК 2022	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	200	11 062	2 212 400
2	4	ТКоммерческое предложение /п.294/РСНБ РК 2022	Громкоговоритель настенный, 3 Вт SONAR SW-03	шт	200	9 378	1 875 534
			Итого по локальной смете: Система оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ)				**4 087 934**
			ИТОГО по акту:				**4 087 934**
			В том числе оборудование:				**1 875 534**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)				2212400.000 x 6.30%	139 381
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4087934.021 + 139381.204	4 227 315
		Сметная прибыль, (5.00%)				2351781.204 x 5.00%	117 589
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				4227315.225 x 5.000%	211 366
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 556 270
		Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300				4556270.046 x 0.8300	3 781 704
		Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750				3781704.138 x 1.0750	4 065 332
		Договорной коэфициент 0,98, к = 0.9800				4065331.949 x 0.9800	3 984 025
		НДС (16%)				3984025.310 x 16%	637 444
		Итого с НДС				3984025.310 + 637444.050	4 621 469

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	11.05.2026 10:30
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	11.05.2026 11:40
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	11.05.2026 11:10
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	12.05.2026 09:42
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	12.05.2026 09:52
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	12.05.2026 14:42

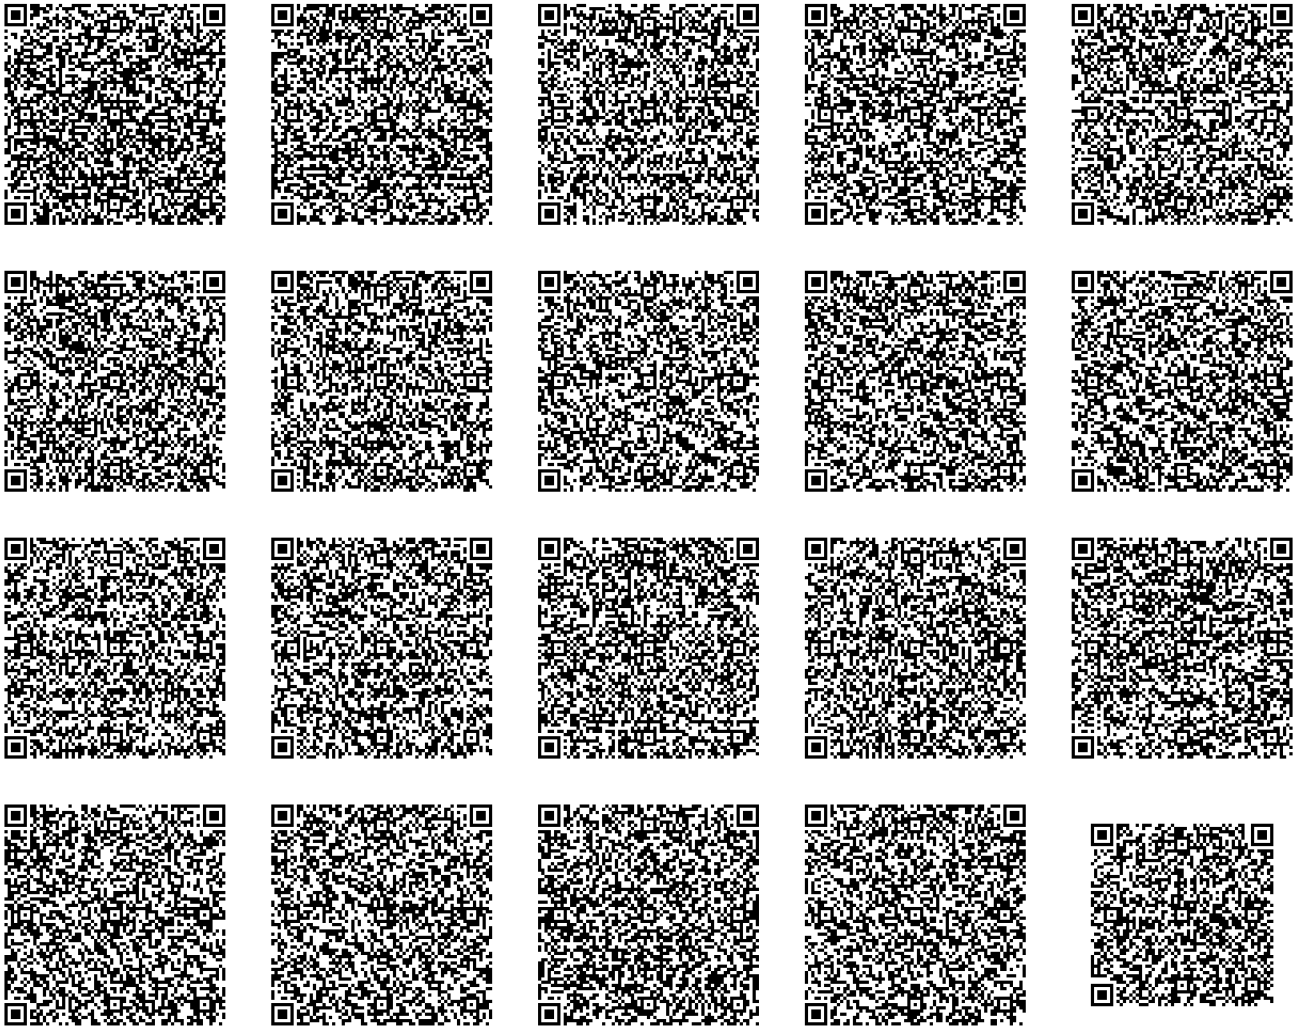

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Май 2026 года
Архитектурная часть. Дополняемые работы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть. Дополняемые работы.				
			Раздел: 2этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинеты , конференц -зал. помещение 311,3 м2/				
1	3	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	249.04	6 777	1 687 744
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинеты , конференц -зал. помещение 311,3 м2/				**1 687 744**
			Итого по разделу: 2этаж				**1 687 744**
			Раздел: 3 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /вспомогательные помещения 233,2 м2/				
2	5	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	186.56	6 777	1 264 317
3	6	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	186.56	4 122	769 000
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /вспомогательные помещения 233,2 м2/				**2 033 317**
			Итого по разделу: 3 этаж				**2 033 317**
			Раздел: 4 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /читальный зал 77,2 м2/				
4	7	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	61.76	6 777	418 547

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	61.76	4 122	254 574
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /читальный зал 77,2 м2/				**673 122**
			Итого по разделу: 4 этаж				**673 122**
			Раздел: 6 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинеты, декц аудитор,вспомогательные помещения/391,7 м2/				
6	11	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	313.96	6 777	2 127 707
7	12	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	313.96	4 122	1 294 143
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинеты, декц аудитор,вспомогательные помещения/391,7 м2/				**3 421 850**
			Итого по разделу: 6 этаж				**3 421 850**
			Раздел: 7 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/397,9 м2/				
8	13	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	318.32	6 777	2 157 254
9	14	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	318.32	4 122	1 312 115
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/397,9 м2/				**3 469 370**
			Итого по разделу: 7 этаж				**3 469 370**
			Раздел: 8 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/397,2 м2/				
10	15	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	317.76	6 777	2 153 459
11	16	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	317.76	4 122	1 309 806
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/397,2 м2/				**3 463 266**
			Итого по разделу: 8 этаж				**3 463 266**
			Раздел: 9 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/396,2 м2/				
12	17	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	316.96	6 777	2 148 038

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	18	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	316.96	4 122	1 306 509
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/396,2 м2/				**3 454 546**
			Итого по разделу: 9 этаж				**3 454 546**
			Раздел: 10 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /компьютерн класс аудит. помещ. кабинеты. учебн. аудитор и др./400,8 м2/				
14	19	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	320.64	6 777	2 172 978
15	20	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	320.64	4 122	1 321 678
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /компьютерн класс аудит. помещ. кабинеты. учебн. аудитор и др./400,8 м2/				**3 494 656**
			Итого по разделу: 10 этаж				**3 494 656**
			Раздел: 11 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинет учебн. аудитор и др./285,6 м2/				
16	21	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	228.48	6 777	1 548 409
17	22	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	228.48	4 122	941 794
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинет учебн. аудитор и др./285,6 м2/				**2 490 203**
			Итого по разделу: 11 этаж				**2 490 203**
			Раздел: 12 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /компьютерн класс учебн. аудитор и др./396м2/				
18	23	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	316.8	6 777	2 146 954
19	24	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	316.8	4 122	1 305 850
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /компьютерн класс учебн. аудитор и др./396м2/				**3 452 803**
			Итого по разделу: 12 этаж				**3 452 803**
			Раздел: Монтаж стен и перегородок (14 этаж)				
20	65	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3 кладки	4.288	31 431	134 776
21	66	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	4.2	31 172	130 922

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Монтаж стен и перегородок (14 этаж)				**265 699**
			Раздел: Конференц зал (2 этаж)				
22	68	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	271.12	6 777	1 837 380
23	69	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	284.676	4 122	1 173 434
24	70	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	352.8	412	145 354
25	71	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19.404	326	6 326
26	72	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	352.8	7 790	2 748 312
27	73	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	352.8	145	51 156
28	74	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	352.8	1 970	695 016
29	75	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	352.8	1 266	446 645
30	76	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	352.8	649	228 967
			Итого по разделу: Конференц зал (2 этаж)				**7 332 590**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть. Дополняемые работы.				**35 239 164**
			ИТОГО по акту:				**35 239 164**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.300%)	35239164.345 x 6.30%	2 220 067
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	35239164.345 + 2220067.421	37 459 232
	Сметная прибыль, (5.00%)	37459231.766 x 5.00%	1 872 962
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	37459231.766 x 5.000%	1 872 962
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		41 205 155
	Итого в текущих ценах 2025 года 17%, к = 0.1700	41205154.943 x 0.1700	7 004 876
	Итого в текущих ценах 2025 года к=1,155, к = 1.1550	7004876.340 x 1.1550	8 090 632
	Договорной коэфициент 0,98, к = 0.9800	8090632.173 x 0.9800	7 928 820
	НДС (16%)	7928819.530 x 16%	1 268 611

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				7928819.530 + 1268611.125	9 197 431

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	11.05.2026 10:03
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	11.05.2026 11:40
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	11.05.2026 11:11 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	12.05.2026 14:44
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	12.05.2026 09:41
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	12.05.2026 09:52

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **220840048968 - ГУ «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»**

Подрядчик: **050940013378 - ТОО КазЕвроСтрой**

Стройка: **Капитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений под учебноадминистративные кабинеты, в здании расположенном по адресу: г. Астана, р-н Сарырка, ул.Кенесары 36**

Договор подряда (контракт) №: **16 от 12.02.2025 года**

Акт выполненных работ № 39
за Май 2026 года
Архитектурная часть. Дополняемые работы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть. Дополняемые работы.				
			Раздел: 2этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинеты , конференц -зал. помещение 311,3 м2/				
1	3	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	249.04	6 777	1 687 744
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинеты , конференц -зал. помещение 311,3 м2/				**1 687 744**
			Итого по разделу: 2этаж				**1 687 744**
			Раздел: 3 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /вспомогательные помещения 233,2 м2/				
2	5	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	186.56	6 777	1 264 317
3	6	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	186.56	4 122	769 000
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /вспомогательные помещения 233,2 м2/				**2 033 317**
			Итого по разделу: 3 этаж				**2 033 317**
			Раздел: 4 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /читальный зал 77,2 м2/				
4	7	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	61.76	6 777	418 547

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	61.76	4 122	254 574
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /читальный зал 77,2 м2/				**673 122**
			Итого по разделу: 4 этаж				**673 122**
			Раздел: 6 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинеты, декц аудитор,вспомогательные помещения/391,7 м2/				
6	11	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	313.96	6 777	2 127 707
7	12	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	313.96	4 122	1 294 143
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинеты, декц аудитор,вспомогательные помещения/391,7 м2/				**3 421 850**
			Итого по разделу: 6 этаж				**3 421 850**
			Раздел: 7 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/397,9 м2/				
8	13	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	318.32	6 777	2 157 254
9	14	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	318.32	4 122	1 312 115
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/397,9 м2/				**3 469 370**
			Итого по разделу: 7 этаж				**3 469 370**
			Раздел: 8 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/397,2 м2/				
10	15	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	317.76	6 777	2 153 459
11	16	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	317.76	4 122	1 309 806
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/397,2 м2/				**3 463 266**
			Итого по разделу: 8 этаж				**3 463 266**
			Раздел: 9 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/396,2 м2/				
12	17	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	316.96	6 777	2 148 038

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	18	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	316.96	4 122	1 306 509
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинеты, учеб. аудитор/396,2 м2/				**3 454 546**
			Итого по разделу: 9 этаж				**3 454 546**
			Раздел: 10 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /компьютерн класс аудит. помещ. кабинеты. учебн. аудитор и др./400,8 м2/				
14	19	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	320.64	6 777	2 172 978
15	20	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	320.64	4 122	1 321 678
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /компьютерн класс аудит. помещ. кабинеты. учебн. аудитор и др./400,8 м2/				**3 494 656**
			Итого по разделу: 10 этаж				**3 494 656**
			Раздел: 11 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /кабинет учебн. аудитор и др./285,6 м2/				
16	21	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	228.48	6 777	1 548 409
17	22	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	228.48	4 122	941 794
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /кабинет учебн. аудитор и др./285,6 м2/				**2 490 203**
			Итого по разделу: 11 этаж				**2 490 203**
			Раздел: 12 этаж				
			Подраздел: ТИП. ПТ2 /компьютерн класс учебн. аудитор и др./396м2/				
18	23	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	316.8	6 777	2 146 954
19	24	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной/Армстронг/ из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	316.8	4 122	1 305 850
			Итого по подразделу: ТИП. ПТ2 /компьютерн класс учебн. аудитор и др./396м2/				**3 452 803**
			Итого по разделу: 12 этаж				**3 452 803**
			Раздел: Монтаж стен и перегородок (14 этаж)				
20	65	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3 кладки	4.288	31 431	134 776
21	66	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	4.2	31 172	130 922

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Монтаж стен и перегородок (14 этаж)				**265 699**
			Раздел: Конференц зал (2 этаж)				
22	68	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	271.12	6 777	1 837 380
23	69	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	284.676	4 122	1 173 434
24	70	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	352.8	412	145 354
25	71	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19.404	326	6 326
26	72	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	352.8	7 790	2 748 312
27	73	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	352.8	145	51 156
28	74	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	352.8	1 970	695 016
29	75	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	352.8	1 266	446 645
30	76	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	352.8	649	228 967
			Итого по разделу: Конференц зал (2 этаж)				**7 332 590**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть. Дополняемые работы.				**35 239 164**
			ИТОГО по акту:				**35 239 164**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.300%)	35239164.345 x 6.30%	2 220 067
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	35239164.345 + 2220067.421	37 459 232
	Сметная прибыль, (5.00%)	37459231.766 x 5.00%	1 872 962
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	37459231.766 x 5.000%	1 872 962
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		41 205 155
	Итого в текущих ценах 2024 года 83%, к = 0.8300	41205154.943 x 0.8300	34 200 279
	Итого в текущих ценах 2024 года к=1,075, к = 1.0750	34200278.603 x 1.0750	36 765 299
	Договорной коэфициент 0,98, к = 0.9800	36765299.498 x 0.9800	36 029 994
	НДС (16%)	36029993.508 x 16%	5 764 799

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				36029993.508 + 5764798.961	41 794 792

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
831206350418 - АКИЛЬБЕКОВ АХМЕДЬЯ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	Начальник ПТО	11.05.2026 09:40
Представители технического надзора		
860807350894 - КРАСИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ	Технический директор	11.05.2026 11:40
Представители авторского надзора		
870113350754 - БОНДАРЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ	Эксперт авторского надзора.	11.05.2026 11:13 Комментарий: Единичные расценки проверены.
Представители заказчика		
860322350174 - НУРПЕИСОВ ДАМИР САГЫМЖАНОВИЧ	Руководитель управления инфраструктурных проектов ДИПГЗА МНВО РК	12.05.2026 09:41
870706301938 - ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ	Директор Департамента инфраструктурных проектов, государственных закупок и активов МНВО РК	12.05.2026 09:51
840213350712 - ҚОЖАХМЕТ МАДИЯР ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ	Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан	12.05.2026 14:45
