Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Аппарат акима Жамбылской области", РК, г.Тараз, пр. Абая 125	920240000563
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Проект Мастер групп",080000, РК, Жамбылская область, г. Тараз мкр. «Талас» д.23,кв.86	091040016520
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор № 11-15/113 от 23.05.2018г	

Номер документа	Дата составления
1	25.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проектные работы по текущему ремонту ограждения и устройству навеса на территории резиденции акима Жамбылской области			усл	1	240 000,00	240 000,00
				Итого	1	x	240 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Ыскаков Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): Зам. Руководителя аппарата акима РКО / _____ / Нурымбетов Т.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

ТОО «Проект Мастер групп»

Заказчик:
«КГУ «Аппарат акима
Жамбылской области»

Текущий ремонт ограждения и устройство навеса на территории резиденции областного акима Жамбылской области

Смета

Директор Ыскаков Д.

г. Тараз 2018 г.

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме 13369,267 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 1432,421 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Текущий ремонт ограждения и устройство навеса на территории резиденции областного акима Жамбылской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2018 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	11936,846	-	-	11936,846
2.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	1432,421	1432,421
		Всего по сводному сметному расчету	11936,846	-	1432,421	13369,267

Руководитель проектной организации _____ Исмаилов Д.

Главный инженер проекта _____

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 13369,267 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 1432,421 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Текущий ремонт ограждения и устройство навеса на территории резиденции областного акима Жамбылской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	02-02-01	-Ограждения	11702,79	-	-	11702,79
		Всего по главе	11702,79	-	-	11702,79
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	11702,79	-	-	11702,79
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	11702,79	-	-	11702,79
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	11702,79	-	-	11702,79
2.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	234,056	-	-	234,056
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11936,846	-	-	11936,846
3.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	1432,421	1432,421
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	11936,846	-	1432,421	13369,267

Руководитель проектной организации _____ Исанов Д.

Главный инженер проекта _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт ограждения и устройство навеса на территории резиденции областного акима Жамбылской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт ограждения и устройство навеса на территории резиденции областного акима Жамбылской области

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02-01
(Локальный сметный расчет)

НА Строительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	11702,79 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1328,671 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,353 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		3-х уровневый барьер безопасности из колючей проволоки СББ "Гюрза" 900/108/5 (10м)															
1.				3,15	419131,32	61175,1	1320264	192702	704548	294693	1744153						
	1109-0701 -0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стойки для колючей проволоки. Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций		134290	1294,5	423014	4078	--	129197							
2.				30	2091,6	--	62748	--	--	45179	116561						
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2091,6	--	62748	--	--	8634							
3.				30	19798,15	70,44	593944	2113	460560	120079	771145						
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		4375,7	22,78	131271	683	--	57122							
4.				2,004	49737,73	11730,03	99674	23507	2653	50728	162434						
	1109-0501 -0203 РСНБ РК	-Ограждения из уголка. Электродуговая сварка при монтаже	т		36683,8	2,13	73514	4	--	12032							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
5.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,004	207120	--	415068	--	415068	--	448274
					--	--	--	--	--	33205	
6.	СТ Прайс лист	-Стоимость и установка 3-х уровневый барьер безопасности из колючей проволоки СББ "Гюрза" 750/74/5	шт	90	25008,75	--	2250788	--	2250788	--	2430851
					--	--	--	--	--	180063	
7.	СТ Прайс лист	-Струна для натяжения	м	1800	59	--	106200	--	106200	--	114696
					--	--	--	--	--	8496	
8.	СТ Прайс лист	-Скоба монтажная оцинкованная	шт	600	32	--	19200	--	19200	--	20736
					--	--	--	--	--	1536	
		Навес									
9.	1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,0	1150,38	--	14265	--	--	10271	26498
					1150,38	--	14265	--	--	1963	
10.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9	21929,7	963,26	197367	8669	157635	31050	246691
					3451,44	339,78	31063	3058	--	18273	
11.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,01	693,04	--	2086	--	--	1502	3875
					693,04	--	2086	--	--	287	
12.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3	129,77	62,27	389	187	1	206	643
					67,5	27,98	203	84	--	48	
13.	1106-0301	-Детали закладные весом	т	0,11	358651,73	1157,73	39452	127	17981	19469	63634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0407 РСНБ РК 2015	до 4 кг. Установка			194040	452,31	21344	50	--	4714	
14.	1109-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,4	319494,62 19697,65	8466,44 2898,24	447292 27577	11853 4058	407862 --	21828 37530	506650
15.	1109-0402 -0104 РСНБ РК 2015	-Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	75	12265,8 1570,16	701,92 244,93	919935 117762	52644 18370	749529 --	93931 81109	1094975
16.	1109-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	64	10544,85 392	290,35 98,99	674871 25088	18582 6336	631201 --	21682 55724	752277
17.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12	7728,11 2653,56	1458,81 586,3	92737 31843	17506 7036	43388 --	36546 10343	139626
18.	1111-0101 -1406 РСНБ РК 2015	-Полы бетонные армированные толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	50	3097,52 247,13	81,41 21,49	154876 12356	4070 1075	138450 --	12625 13400	180901
19.	1111-0101 -1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Полы бетонные армированные. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	50	205,94 13,19	5,98 1,89	10297 659	299 94	9339 --	709 880	11886
20.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	50	2913,45 983,68	22,06 6,82	145673 49184	1103 341	95386 --	46554 15378	207604
21.	1111-0101 -1903 РСНБ РК	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.	м2 покрытия	25	925,71 125,27	16,23 6,61	23143 3132	406 165	19605 --	3099 2099	28341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Устройство									
22.	1111-0101 -1904 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	125	166,86	3,05	20858	381	18276	2232	24937
					17,61	1,39	2201	173	--	1847	
23.	1109-0403 -0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструк ций	0,81	96315,79	22851,04	78016	18509	17898	32313	119155
					51369,12	6446,84	41609	5222	--	8826	
24.	2109-0403 -0406 РСНБ РК 2015	-Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х30 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	262528	--	525056	--	525056	--	567060
					--	--	--	--	--	42004	
		Навес открытый									
25.	1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	1150,38	--	18406	--	--	13252	34191
					1150,38	--	18406	--	--	2533	
26.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	12	21929,7	963,26	263156	11559	210180	41400	328921
					3451,44	339,78	41417	4077	--	24365	
27.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	693,04	--	2772	--	--	1996	5150
					693,04	--	2772	--	--	381	
28.	1101-0201 -0501 РСНБ РК	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3 уплотнен ного	4	129,77	62,27	519	249	--	275	858
					67,5	27,98	270	112	--	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	трамбовками	грунта								
29.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11	358651,73 / 194040	1157,73 / 452,31	52722 / 28524	170 / 66	24028 / --	26017 / 6299	85038
30.	1109-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,860	319494,62 / 19697,65	8466,44 / 2898,24	596496 / 36776	15807 / 5411	543913 / --	29109 / 50048	675654
31.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2	21302,88 / 13084,8	6719,35 / 2346,92	4261 / 2617	1344 / 469	300 / --	2130 / 511	6901
32.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2	243664 / --	-- / --	48733 / --	-- / --	48733 / --	-- / 3899	52631
33.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	89,20	3686,04 / 294,18	110,28 / 39,25	328979 / 26255	9842 / 3503	292882 / --	20533 / 27961	377473
34.	1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,35	49737,73 / 36683,8	11730,03 / 2,13	17408 / 12839	4106 / 1	463 / --	8860 / 2101	28369
35.	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения и кованные изделия	т	0,35	513035 / --	-- / --	179562 / --	-- / --	179562 / --	-- / 14365	193927
36.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	7728,11 / 2653,56	1458,81 / 586,3	6182 / 2123	1167 / 469	2892 / --	2436 / 690	9308
37.				80	737,12	64,93	58970	5194	37076	17213	82277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия		208,74	20,15	16700	1612	--	6095	
38.				320	104	0,13	33278	41	30729	2358	38487
	1111-0101 -1504 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия		7,84	--	2508	--	--	2851	
			Тенге		--	--	9825645	402139	8161382	1010275	11702788
			Тенге		--	--	1262125	66546	--	866873	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			4813393			
Материалы	Тенге			1265524			
Всего заработная плата	Тенге				494170		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			3019551			
Накладные расходы	Тенге			434465			
Сметная прибыль	Тенге			419829			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			5667687			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						578
Сметная заработная плата	Тенге				494170		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			5012252			
Материалы	Тенге			3351250			
Всего заработная плата	Тенге				834501		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			525056			
Накладные расходы	Тенге			575806			
Сметная прибыль	Тенге			447045			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			6035103			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						775
Сметная заработная плата	Тенге				834501		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11702790			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1353
Сметная заработная плата	Тенге				1328671		

Составил Магай А.

Наименование стройки- Текущий ремонт ограждения и устройство навеса на территории резиденции областного акима Жамбылской области

ФОРМА 4А АВС-4
1

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-02-01
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Строительные работы

Наименование объекта- Текущий ремонт ограждения и устройство навеса на территории резиденции областного акима Жамбылской области

Основание:

Сметная стоимость	11702,79 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1353 чел-ч
Сметная заработная плата	1328,671 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1304,36602	967,62	1262124,93
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	48,1708005	1381,47	(66546,48)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1262125
		Строительные машины и механизмы				
1	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	136,71	1331	181961,01
2	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	32,4831425	4298	139612,55
3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	107,01172	321	34350,76
4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	7,00975	2316	16234,58
5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,694208	2443	13910,95
6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,2527	4227	9522,16
7	3103-0203-0101	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,3655	9788	3577,51
8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,53023	198	698,99
9	3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0,63	1074	676,62
10	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	23,22018	26	603,72
11	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,158	42	552,64
12	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	13,214	14	185
13	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,652	16	90,43
14	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,95309	29	56,64
15	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	3,291725	14	46,08
16	3104-0203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,1625	245	39,81
17	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,231	84	19,4
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			402139
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			66546

1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
1	С Прайс лист	Стоимость и установка 3-х уровневый барьер безопасности из колючей проволоки СББ "Гюрза" 750/74/5	шт	90	25008,75	2250787,82
2	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,343	207120	1106642,16
3	2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	3,36501	277839	934931,01
4	2106-0201-0307	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	82,5	8897	734002,5
5	2106-0201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	70,4	8897	626348,8
6	2109-0403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х30 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	262528	525056
7	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	30,6	14515	444159
8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	21,42	15823	338928,66
9	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	94,605	2978	281733,69
10	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения и кованные изделия	т	0,35	513035	179562,25
11	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,3	17788	112064,4
12	С Прайс лист	Струна для натяжения	м	1800	59	106200
13	2206-0301-0618	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	51	1578	80478
14	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	3,264	18829	61457,86
15	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2	243664	48732,8
16	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,257	163454	42007,68
17	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,8975	12604	36520,09
18	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	234642	35196,3
19	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,8	2398	30694,4
20	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,058349	415411	24238,82
21	С Прайс лист	Скоба монтажная оцинкованная	шт	600	32	19200
22	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,3676	6994	16558,99
23	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05985	207096	12394,7
24	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,712	3269	12134,53
25	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,65	16752	10888,8
26	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0247374	404706	10011,37
27	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	10,395	907	9428,27
28	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02236538	395251	8839,94

1	2	3	4	5	6	7
29	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1449	58360	8456,36
30	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,036661	220651	8089,29
31	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,448	2555	6254,64
32	2113-0208-0204	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 60 мм	1000 шт.	0,714	8424	6014,74
33	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,53	2589	3961,17
34	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,1449	27220	3944,18
35	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14,00065	258	3612,17
36	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,152	2947	3394,94
37	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00131218	1880677	2467,79
38	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,84017	310	2430,45
39	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	53953	2266,03
40	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00403884	509715	2058,66
41	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00306352	572134	1752,74
42	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475903	212247	1010,09
43	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0351	26870	943,14
44	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	5,98308	147	879,51
45	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0193	40416	780,03
46	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0129375	54214	701,39
47	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01114931	60194	671,12
48	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	8,74471	70	612,13
49	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,1707099	3360	573,59
50	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0043125	129523	558,57
51	2105-0307-1019	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,89	591	525,99
52	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,4697	30	224,09
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			8161382
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			9825645
		Накладные расходы	тенге			1010271
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			10835916
		Сметная прибыль	тенге			866873
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			11702789

Составил Магай А.

Фасад

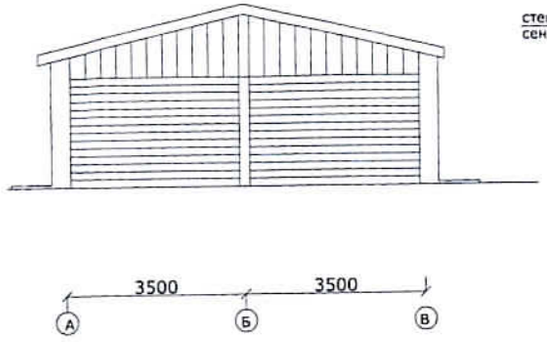

план

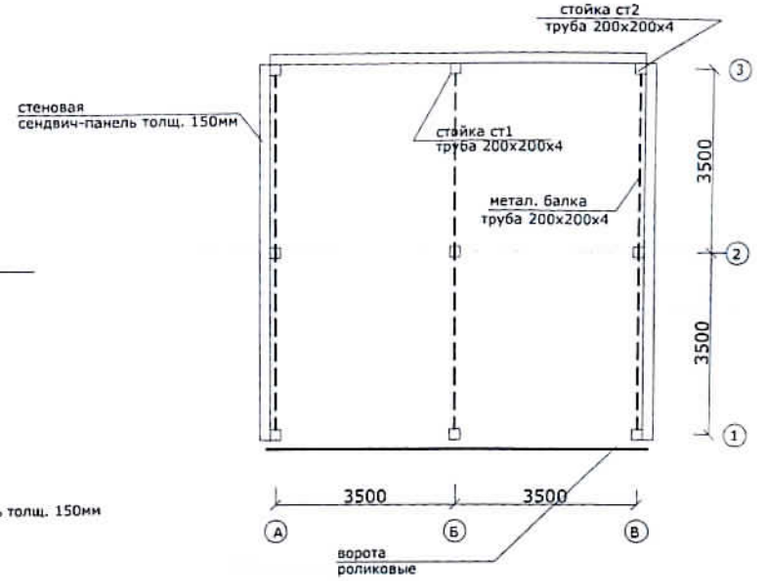

план фундамента

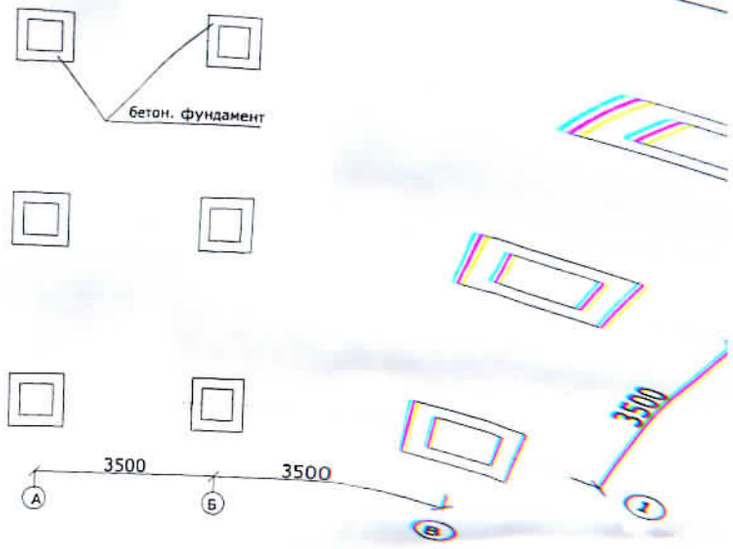

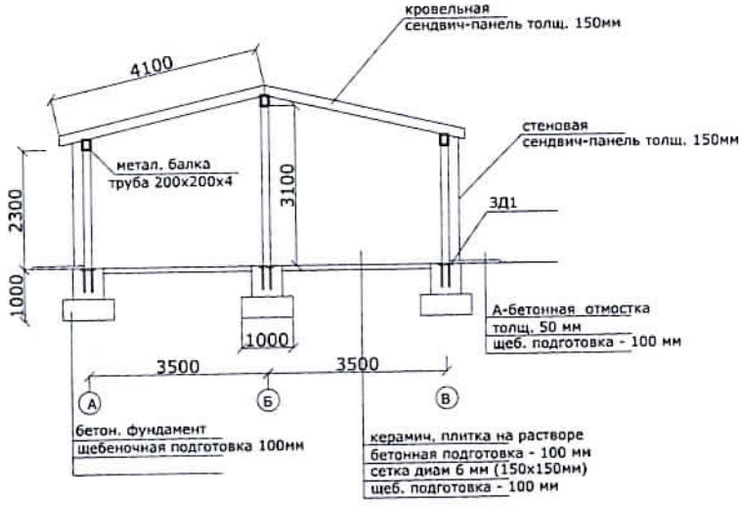

1. Стойки (9 шт) труба 200х200х4 - 700 кг
2. Балки (3 шт) труба 200х200х4 - 700 кг
3. метал. лист (толщ. 10мм) для зд1 - 78,5 кг
4. арматура диам 16А1 для зд1 - 31,6 кг
5. устройство фунд-та - бетон кл В15 - 9 м3
6. устройство бетон пола - бетон кл В15 - 6 м3
7. Армирование пола сеткой фб А1 (150х150) - 50 м2
8. устройство щеб. подготовки - щебень - 12 м3
9. метал. лист (толщ. 10мм) для зд1 - 78,5 кг
10. арматура диам 16А1 для зд1 - 31,6 кг
11. Устройство керамич. плитки на пол - 50 м2
12. А-бетонная отмостка толщ. 50 мм - 25 м2
13. Монтаж стеновых сендвич панелей тощ. 150мм - 75 м2
14. Монтаж кровельных сендвич панелей толщ. 150 мм - 64 м2
15. Установка роликовых ворот (на эл. приводе)- 1 шт
16. Земл. работы 12 м3

Стойка для колюч. проволки

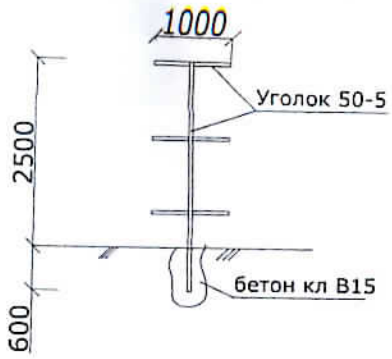

Расход материала

1. Стойка из уголка 50-5 (150 шт) - 3500 кг
2. связь между стойками уголок 50-5 (600 п.м.) - 2300 кг
3. бетон кл. В15 - 30 м3
4. Спералевидная колючая проволка - на 300 м.п. (трехуровневого бвръера)
