ТОО «КоргауKZ »
010000, Казахстан
г. Астана, ул. Лепсі 49
тел/факс: +7 7172 505 715
info@korgau.com

«Korgau KZ» LLP
010000, Kazakhstan
Astana, Lepsi St. 49
tel./fax: +7 7172 505 715
info@korgau.com

ҚОРҒАУ KZ
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»

_____

_____

«17» июня 2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОО «Қорғау KZ»

_____ Г.Г.Шелестов

«17» июня 2018г.

АКТ № 007 -KZ от 09.06.2018г.
На оказание услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса автоматизированной системы радиационного контроля «Янтарь» в количестве 4 (четырёх) шт., согласно договору №092/00 от 30.05.2018

Период проведения работ:	**с 08 июня по 09 июня 2018 года**
Наименование пункта пропуска:	**Таможенный пост «Темир Баба»**
Сотрудники ТОО «Қорғау KZ», принимающие участие в ТО	**Керимбаев Т.А., Карпов С.С.**

В ходе проведения работ по техническому обслуживанию, выполнен комплекс мероприятий с целью поддержания комплекса АКДРМ на базе стационарных систем радиационного контроля «Янтарь» в исправном состоянии в течение установленного срока службы и предупреждения возможных неисправностей.

Информация по составу оборудования на объекте:

Вид оборудования	Наименование	Серийный номер	Примечание
РПМ	«Янтарь-1А-04Х»	0069-12	В исправном состоянии
Комплект видеонаблюдения	ВН-02АЦ-11	0970-12	В исправном состоянии
РПМ	«Янтарь-2П»	0377-12	В исправном состоянии
Комплект видеонаблюдения	ВН-04П	0116-12	В исправном состоянии
Комплект видеонаблюдения	ВН-04П	0117-12	В исправном состоянии
РПМ	«Янтарь-2П»	0374-12	В исправном состоянии
Комплект видеонаблюдения	ВН-04П	0115-12	В исправном состоянии
РПМ	«Янтарь-1А-04Х»	0068-12	В исправном состоянии
Комплект видеонаблюдения	ВН-02АЦ-11	0969-12	В исправном состоянии
Коммутационный шкаф	ШКВ-02-01	621-12	В исправном состоянии

Рабочая станция	ССД-04	621-12	В исправном состоянии
Принтер	HP LaserJet CP1525n	CNCF248188	В исправном состоянии
Сканер	HP ScanJet 8270	CN19UA0206	В исправном состоянии
Переносной детектор	МКС-А03-1	0979-12	В исправном состоянии
Переносной детектор	МКС-А03-1	0980-12	В исправном состоянии
Источник Бесперебойного Питания	SVC V-1500F	1406036050508 L	В неисправном состоянии. Отправлен на ремонт.

Описание действий по техническому обслуживанию:

Перечень работ по техническому обслуживанию

№	Задача техобслуживания	Статус работ
	Работы по техническому обслуживанию системы АСРК	
	- Устойчивость положения стоек монитора на месте установки	Исполнено
	- Внешний осмотр кабельных трасс	Исполнено
	- Проверка параметров и настройка детекторов и датчиков Объекта СПЭК	Исполнено
	- Анализ статистики отказов оборудования	Исполнено
	- Проверка параметров детекторов и датчиков объекта СПЭКа	Исполнено
	- Проверка параметров настройки системы радиационного контроля	Исполнено
	- Проверка световой и звуковой сигнализации стоек	Исполнено
	- Проверка напряжения на контактах стоек	Исполнено
	- Проверка гамма и нейтронного канала	Исполнено
	- Настройка дискриминаторов по величине ДИСП/ФОН	Исполнено
	- проверка параметров детекторов нейтронного канала	Исполнено
	- проверка световой и звуковой сигнализации стоек	Исполнено
	- проверка напряжения на контактах стоек	Исполнено
	- Проверка и анализ причин ложных срабатываний системы	Исполнено
	- Проверка чувствительности детекторов гамма и нейтронного канала калибровочными ИИИ соответствующей активности дл Co-57 (19 – 370 кБк), Cs-137 (37 – 370 кБк), Cf-252 (17 – 170) кБк (данные работы производятся в ходе второго полугодового ТО)	
	- Проверка срабатывания монитора погамма каналу (один раз в год)	
	- Проверка срабатывания монитора по нейтронному каналу (один раз в год)	
	- Проверка амплитудных спектров БДН (один раз в год)	
	- Проверка амплитудных спектров БДС-Г (один раз в год)	
	- Проверка эффективности регистрации БДН (один раз в год)	
	- Проверка эффективности регистрации БДС-Г (один раз в год)	
	- Транспортировка и работа с калибровочными источниками один раз в год (данные работы производятся в ходе второго полугодового ТО)	
	- Проверка функционирования системы видеонаблюдения	Исполнено
	- Внешний осмотр системы видеонаблюдения	Исполнено
	- Проверка устойчивости расположения комплектов видеонаблюдения и надежность креплений	Исполнено
	- Проверка фокусировки видеокамер	Исполнено
	- Техническое обслуживание внутренних узлов системы	Исполнено

	видеонаблюдения	
	- Регулировка видеокамер	Исполнено
	- Проверка и настройка прибора управления освещением (при необходимости)	Исполнено
	- Проверка способности передавать информацию	Исполнено
	- Просмотр журнала событий на видеосервере (Log-файл)	Исполнено
	- Проверка ложных тревожный записей	Исполнено
	- Проверка качества системы передачи видеоинформации	Исполнено
	- Проверка и настройка устройств для передачи видео сигнала по витой паре	Исполнено
	Комплект оборудования ССДУ, видеосервера	
	- Функциональная диагностика сервера сбора данных ССД	Исполнено
	- Функциональная диагностика сервера баз данных ССД	Исполнено
	- Проверка состояния репликации	Исполнено
	- Проверка синхронизации времени на всех сетевых устройствах	Исполнено
	- Техническое обслуживание комплекса оборудования ССДУ, видеосервера, проверка функционирования программного обеспечения	Исполнено
	- Проверка прочности конструкции крепления шкафов	Исполнено
	- Проверка надежности крепления блоков внутри шкафов	Исполнено
	- Проверка работоспособности сервера баз данных	Исполнено
	- Настройка сервера сбора данных, службы времени и безопасности	Исполнено
	Комплект оборудования АРМ-сервер	
	- Внешний осмотр АРМа и ССД	Исполнено
	- Функциональная диагностика АРМ	Исполнено
	- Просмотр и анализ журналов системы безопасности на сервере и АРМе	Исполнено
	- Проверка функционирования – запись «Тревоги» в архив, чтение «Тревоги» из архива, просмотр камер и мониторов	Исполнено
	- Проверка сетевых подключений в соответствии с адресацией (PING-тест)	Исполнено
	- Проверка программного обеспечения	Исполнено
	- Проверка – при необходимости настройка операционной системы	Исполнено
	- Проверка настроекIP – адресов	Исполнено
	- Проверка и при необходимости настройка контролера домена (для Windows), настройка учетных записей	Исполнено
	- Установка/обновление антивирусной программы (при необходимости)	Исполнено
	- Проверка файловой системы	Исполнено
	- Проверка наличия файлов резервного копирования	Исполнено
	- ПроверкаMS SQL	Исполнено
	- Проверка работоспособности системы на возможность записи информации (тревог) в базу данных	Исполнено
	- Проверка параметров пульта ПВЦ	Исполнено
	- Проверка работоспособности принтера	Исполнено
	- Тестирование локальной сети	Исполнено
	- Тестирование сети RS-485	Исполнено
	Электрооборудование	
	- Проверка контура заземления	Исполнено
	- Проверка защитного заземления	Исполнено
	- Проверка состояния защитного заземления монитора	Исполнено

	- Проверка переходного сопротивления	Исполнено
	- Промывка контактов розеток и вилок спиртом ректифицированным ГОСТ 18300-87-200г	Исполнено
	- Промывка контактов разъемовсистем радиационного контроля «Янтарь», ССДУ и в/сервера	Исполнено
	- Проверка состояния аккумулятора	Исполнено
	- Проверка работоспособности и техническое обслуживание внешних устройств и источников питания UPS	Исполнено
	- Настройка управления электропитанием	Исполнено
	- Проверка включения и выключения источника бесперебойного питания (для ССД и АРМа)	Исполнено
	- Проверка аккумуляторов видеонаблюдения	Исполнено
	- Проверка состояния аккумуляторных батарей монитора	Исполнено
	- Удаление пыли с внутренних узлов стоек пылесосом	Исполнено
	- Удаление пыли с внутренних поверхностей стойки, шкафа и компьютера	Исполнено
	- Восстановление лакокрасочного покрытия системы (при необходимости)	
	- Восстановление фундамента стоек, покраска (при необходимости)	
	- Ремонт кабельной системы АСРК (при необходимости)	
	- Комплексная проверка оборудования и ввод его в эксплуатацию после проведения работ по регламентному техническому обслуживанию	Исполнено
	- Заполнение формуляров АСРК и выдача необходимых документов	Исполнено

Сведения о запасных частях/деталях использованных в ходе проведения работ по техническому обслуживанию:

№ п/п	Наименование установленного элемента, сер.номер	Оборудование в котором произведена замена/установка	Наименование демонтированного элемента, сер.номер
1	Аккумуляторная батарея Sony NP-F970 Б/Н	МКС-А03-1 №0979-12	Аккумуляторная батарея Sony NP-F970 Б/Н
2	Аккумуляторная батарея Sony NP-F970 Б/Н	МКС-А03-1 №0980-12	Аккумуляторная батарея Sony NP-F970 Б/Н

1. Техническое обслуживание оборудования проведено в полном объеме в соответствии с эксплуатационной документацией.
2. Оборудование после проведения технического обслуживания проверено, соответствует требованиям эксплуатационной документации и передано для дальнейшей эксплуатации «09» июня 2018г.

Подписи:

Представители Исполнителя:

_____ Карпов С.С.

_____ Керимбаев Т.А.

Представители Заказчика:

Юсупов М.А. _____.

Гл. спец. ОПК Г. Мухаммидов

рук-ль т/п „Тенір Бала" Алекеш

Фотоматериалы:

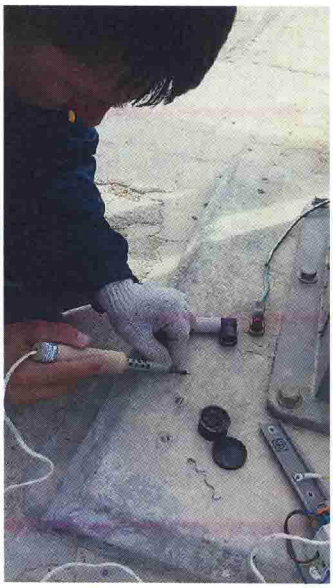

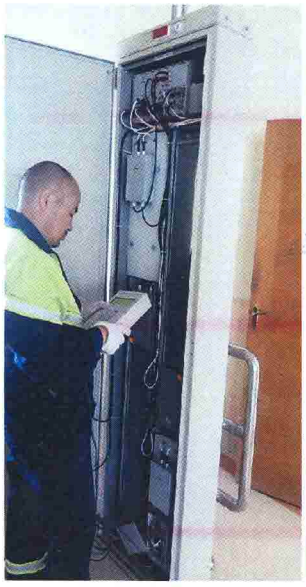

SONY
NP-F970
ALTRONIC
MKC-A03-1

SONY
NP-F970
ALTRONIC
MKC-A03-1
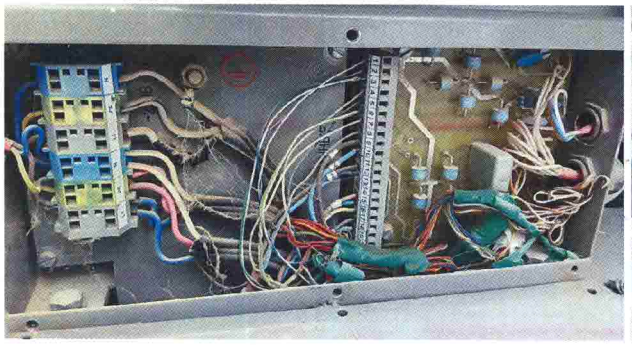
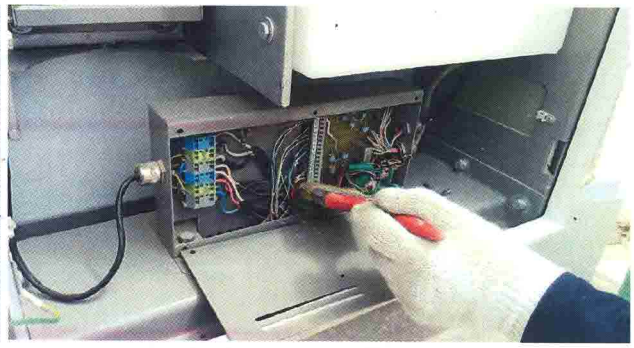

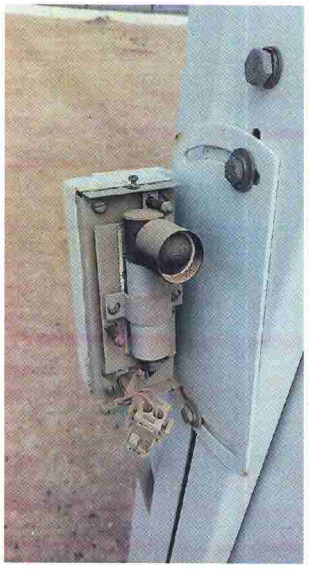

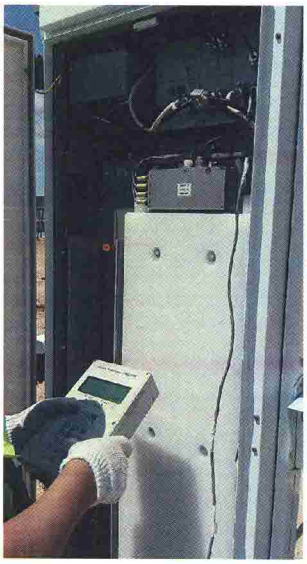

AGILENT
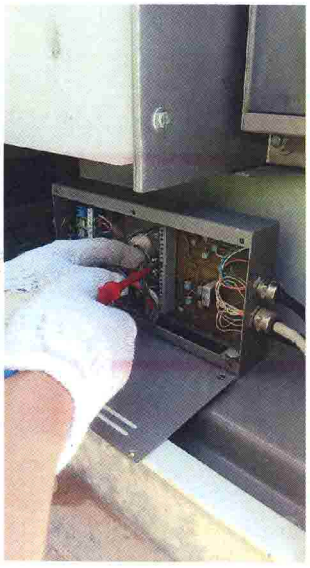
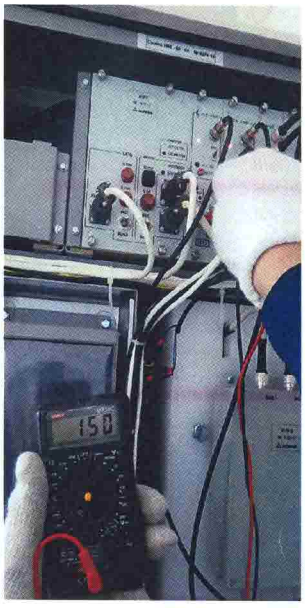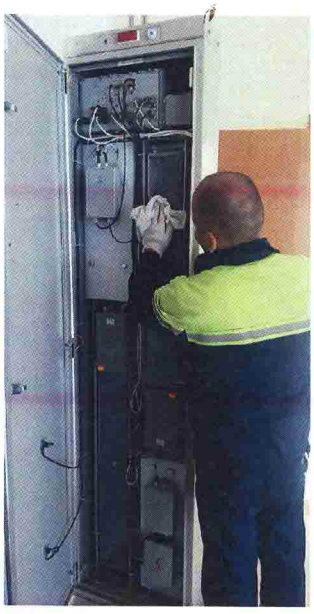
AGILENT
