Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3 управления здравоохранения Кызылординской области"
Исполнитель: ТОО "Сары тарақты"
Наименование строительство и его адрес: "Текущий ремонт здания поликлиники №3 в городе Кызылорда по улице Жибек Жолы №66"

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№157	29.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 498 000								
за отчетный период:	10 498 000	10 498 000							10 498 000

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3 управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач _____ **Максутова Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:

Технадзор _____ **Бегимбаев Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "Сары тарақты"

Руководитель _____ **Укибаев М.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО ГорСервисПроект _____ **Базарбайулы Т.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 3" управления здравоохранения Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары тарақты"

Наименование объекта: Текущий ремонт здании поликлиники №3 в городе Кызылорда по улице Жибек Жолы №66

Договор: №157 от 29.07.2019 г

Акт выполненных работ (форма №2)
за сентябрь месяц 2019 года

Составлена 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**3002,6400**		**132,89**	**399024**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,1741	522,76	762,00	398343
		Итого оплата труда:				**132,66**	**398343**
1. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	25,222	27,00	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,23**	**681**
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	30,627	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		78,40	235421
		НР второго уровня	%	3,6		7,61	22840
		Накладные расходы	%	--		86,01	258261
		Сметная прибыль	%	8		17,51	52583
		Сметная стоимость:				**236,41**	**709867**
2	**11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цоколь. Демонтаж керамических плиток на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**42,4800**		**4574,86**	**194340**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	4,017	170,642	1088,00	185659
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,827	1408,78	2573
		Итого оплата труда:				**4431,07**	**188232**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	1,257	4329,00	5443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	1,257	1554,00	1953
2. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,211	8,963	28,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	4,928	174,00	857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0134	0,569232	3631,00	2067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	0,569232	1088,00	619
2. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	3,483	18,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**204,36**	**8681**
		НР первого уровня	%	54,8		2428,23	103151
		НР второго уровня	%	3,6		252,11	10710
		Накладные расходы	%	--		2680,34	113861
		Сметная прибыль	%	8		580,42	24656
		Сметная стоимость:				**7835,61**	**332857**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**593364**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**593364**
Всего заработная плата -			Тенге				**586575**
		Накладные расходы -	Тенге				**372121**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**338572**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33549**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77239**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1042724**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**695**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**586575**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1042724**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**695**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**586575**

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

3	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Крыша.Слой 1.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3002,6400**		**628,15**	**1886101**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	729,642	762,00	555987
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	58,251	1088,00	63377
		Итого оплата труда:				**206,27**	**619364**
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	37,833	4249,00	160754

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	37,833	1088,00	41162
3. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	70,862	158,00	11196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	20,418	5764,00	117689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	20,418	1088,00	22215
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**289639**
3. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	91,881	2870,00	263698
3. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	45,94	16367,00	751906
3. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	132,116	162,00	21403
3. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	115,602	30,00	3468
		Итого материалов:				**346,52**	**1040475**
		НР первого уровня	%	56,4		116,34	349321
		НР второго уровня	%	3,6		26,80	80475
		Накладные расходы	%	--		143,14	429797
		Сметная прибыль	%	8		61,70	185272
		Сметная стоимость:				**832,99**	**2501169**
4	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Крыша.Слой 2.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3002,6400**		**628,15**	**1886101**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	729,642	762,00	555987
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	58,251	1088,00	63377
		Итого оплата труда:				**206,27**	**619364**
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	37,833	4249,00	160754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	37,833	1088,00	41162
4. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	70,862	158,00	11196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	20,418	5764,00	117689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	20,418	1088,00	22215
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**289639**
4. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	91,881	2870,00	263698
4. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	45,94	16367,00	751906
4. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	132,116	162,00	21403
4. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	115,602	30,00	3468
		Итого материалов:				**346,52**	**1040475**
		НР первого уровня	%	56,4		116,34	349321
		НР второго уровня	%	3,6		26,80	80475
		Накладные расходы	%	--		143,14	429797
		Сметная прибыль	%	8		61,70	185272

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**832,99**	**2501169**
5	**11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Крыша. Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**3002,6400**		**329,63**	**989766**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	371,427	946,00	351370
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	9,608	1300,88	12499
		Итого оплата труда:				**121,18**	**363869**
5. 3	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	6,306	96,00	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	1,802	6102,00	10993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	1,802	1088,00	1961
5. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	4,504	4329,00	19498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	4,504	1554,00	6999
5. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,300264	1888,00	567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,300264	910,00	273
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	3,003	2465,00	7402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	3,003	1088,00	3267
5. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	143,826	4,00	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**39640**
5. 9	21-100403-9901	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	3453,036	--	--
5.10	21-100403-9902	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	3453,036	--	--
5.11	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	720,634	445,00	320682
5.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	1891,663	147,00	278074
		Итого материалов:				**199,41**	**598756**
		НР первого уровня	%	56,4		68,35	205222
		НР второго уровня	%	3,6		14,33	43020
		Накладные расходы	%	--		82,67	248242
		Сметная прибыль	%	8		32,98	99041
		Сметная стоимость:				**445,29**	**1337048**
6	**21-100403-1004 РСНБ РК 2015**	**Крыша.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**3002,6400**		**498,00**	**1495315**
		НР второго уровня	%	3,6		17,93	53831
		Накладные расходы	%	--		17,93	53831

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		41,27	123932
		Сметная стоимость:				**557,20**	**1673078**
7	**21-100403-0903 РСНБ РК 2015**	**Крыша.Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**3002,6400**		**495,00**	**1486307**
		НР второго уровня	%	3,6		17,82	53507
		Накладные расходы	%	--		17,82	53507
		Сметная прибыль	%	8		41,03	123185
		Сметная стоимость:				**553,85**	**1662999**
8	**11-120101-0401 РСНБ РК 2015**	**Крыша.Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**750,0000**		**1773,49**	**1330114**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,231	173,25	1018,00	176369
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	2,7	1204,50	3252
		Итого оплата труда:				**239,49**	**179621**
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,125	5764,00	6485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,125	1088,00	1224
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,675	4329,00	2922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,675	1554,00	1049
8. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0494	37,05	729,00	27009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,9	2465,00	2219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,9	1088,00	979
		Итого эксплуатация машин:				**51,51**	**38635**
8. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	3,825	16850,00	64451
8. 8	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,52	1890	239,00	451710
8. 9	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	6,05	4537,5	132,00	598950
		Итого материалов:				**1486,82**	**1115111**
		НР первого уровня	%	56,4		135,07	101306
		НР второго уровня	%	3,6		68,71	51531
		Накладные расходы	%	--		203,78	152837
		Сметная прибыль	%	8		158,18	118636
		Сметная стоимость:				**2135,45**	**1601588**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**12-120102-0805 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц**	**м2**	**5088,0000**		**457,98**	**2330186**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,159	808,992	928,00	750745
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	5,088	1088,00	5536
		Итого оплата труда:				**148,64**	**756280**
9. 3	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0753	383,126	96,00	36780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	5,088	2465,00	12542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	5,088	1088,00	5536
9. 5	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,1506	766,253	110,00	84288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,26**	**133610**
9. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0041	20,861	90,00	1877
9. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	0,081408	386750,00	31485
9. 8	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,538	2737,344	516,00	1412470
		Итого материалов:				**284,17**	**1445832**
		НР первого уровня	%	59,1		87,85	446962
		НР второго уровня	%	3,6		19,65	99977
		Накладные расходы	%	--		107,50	546939
		Сметная прибыль	%	8		45,24	230170
		Сметная стоимость:				**610,71**	**3107295**
10	**11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цоколь. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности керамической плиткой на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**42,4800**		**4594,74**	**195185**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	4,017	170,642	1088,00	185659
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,827	1408,78	2573
		Итого оплата труда:				**4431,07**	**188232**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	1,257	4329,00	5443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	1,257	1554,00	1953
10. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,211	8,963	28,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	4,928	174,00	857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0134	0,569232	3631,00	2067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	0,569232	1088,00	619
10. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	3,483	18,00	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**204,36**	**8681**
10. 8	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,003823	220651,00	844
10. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0009	0,038232	30,00	1
		Итого материалов:				**19,89**	**845**
		НР первого уровня	%	54,8		2428,23	103151
		НР второго уровня	%	3,6		252,83	10740
		Накладные расходы	%	--		2681,06	113891
		Сметная прибыль	%	8		582,06	24726
		Сметная стоимость:				**7857,86**	**333802**
11	**21-130211-0201 РСНБ РК 2015**	**Цоколь.Кляммеры**	**1000 шт.**	**0,2360**		**48573,00**	**11463**
		НР второго уровня	%	3,6		1748,63	413
		Накладные расходы	%	--		1748,63	413
		Сметная прибыль	%	8		4025,73	950
		Сметная стоимость:				**54347,36**	**12826**
12	**22-060301-0123 РСНБ РК 2015**	**Цоколь. Плитки керамогранитные полированные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**42,4800**		**3401,00**	**144474**
		НР второго уровня	%	3,6		122,44	5201
		Накладные расходы	%	--		122,44	5201
		Сметная прибыль	%	8		281,87	11974
		Сметная стоимость:				**3805,31**	**161650**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11755012**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11755012**
Материалы -			Тенге				**5241494**
Всего заработная плата -			Тенге				**2726730**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3137559**
Накладные расходы -			Тенге				**2034454**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1555284**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**479170**
Сметная прибыль -			Тенге				**1103157**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14892623**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3119**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2726730**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14892623**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3119**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2726730**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**12348375**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3160116**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**809206**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**153189**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8379053**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1893855**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**14242231**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**512720**
		ИТОГО:	Тенге				**14754951**
		Сметная прибыль	Тенге				**1180396**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**15935347**

		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	2-1	Текущий ремонт здании поликлиники № 3	15 935 347				15 935 347
		Итого по главе 2	15 935 347				15 935 347
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения (1,5 %)	0				0
		сметная з/плата (К=0)					
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					
		Итого по главе 8	0				0
		Итого по главам 1-8	15 935 347				15 935 347
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
3	НДЗ РК 8.04-06-	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					
4	ГНОССС прил.	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска					
		Итого по главе 9	15 935 347				15 935 347
		Итого по главам 1-9	15 935 347				15 935 347
		сметная з/плата					
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по сметному расчету:					
5		**Непредвиденные работы и затраты, 2%**	0				0
		ИТОГО	15 935 347				15 935 347
6		Итого с понижающим коэффициентом К=0,6587870349	10 498 000				10 498 000
7		**Налог на добавленную стоимость 12%**	**0**				0
8		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	10 498 000				10 498 000
9		**ИТОГО К ОПЛАТЕ**					**10 498 000**

Подрядчик ТОО "Сары Тараkты"

М.Р.Укибаев

Заказчик КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 3"

Г.А.Максутова

Технический надзор: ИП "Миллион"

Ж.Ж.Бегимбаев

Авторский надзор: ТОО "ГорСервисПроект"

Т.Б.Базарбайұлы

Приложение 15
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. №562

Форма А - 5

Организация - исполнитель ТОО "Сары тарақты" ИИН/БИН 130240019826
Организация - заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №3" управления здравоохранения Кызылординской области"

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации - заказчика

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №3" управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач / **Максутова Г.А.**
должность подпись расшифровка подписи

М.П. «02» 09 2019года

Дата составления	Основание		Период ремонта				Материально - ответственное лицо организации (индивидуального предпринимателя) - сдатчика (Ф.И.О., должность)
	Договор (заказ)		По договору		Фактически		
	номер	дата	с	по	с	по	
1	2	3	4	5	6	7	8
27.08.2019г	157	29.07.2019г.	29.07.2019г.	29.07.2019г.	29.07.2019г.	02.09.2019г.	Директор - Укибаев Марат Рахымберлиевич

АКТ №1
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ (МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ) АКТИВОВ

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номер		Балансовая стоимость	Виды работ	Затраты на демонтаж	Стоимость выполненного объема работ, тенге					Стоимость после реконструкции (модернизации)	Примечание
		инвентарный	заводской номенкла-турный				по договору заказу		фактическая				
							на ремонт	реконструкции (модернизации)	по ремонту	реконструкции (модернизации)	по доставке		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт здании поликлиники № 3 в городе Кызылорда по улице Жибек Жолы №66				Кровель-ные работы		10 498 000		10 498 000				

Изменения в характеристике актива, связанных с его ремонтом, реконструкцией (модернизацией)
Текущий ремонт здании поликлиники № 3 в городе Кызылорда по улице Жибек Жолы №66 (Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы)

По окончании ремонта, реконструкции (модернизации) актив прошел испытания и передан для использования

Заключение комиссии принят в эксплуатацию

Члены комиссии:

Усенов Ж.Т. _____ **Заместитель главного врача по внутреннему аудиту**

Прмаганбетов А.А. _____ **Юрист**

Жакыпов А.Б. _____ **Инженер по ТБ**

Нугманов С.К. _____ **Инженер по ЧС**

Турганбаев К.С. _____ **Экономист**

Махашева Т.Ж. _____ **Специалист по государстенным закупкам**

Шеримбетов Б.С. _____ **Инженер механик**

Авторский надзор:
ТОО "ГорСервисПроект" _____ **Базарбайулы Т.Б.**

Технический надзор:
ИП "Миллион" _____ **Бегимбаев Ж.Ж.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Сары тарақты" _____ **Укибаев М.Р.**

Исполнительная схема

Устройство кровли из плоской двухслойной
наплавляемой битумно-полимерного материала

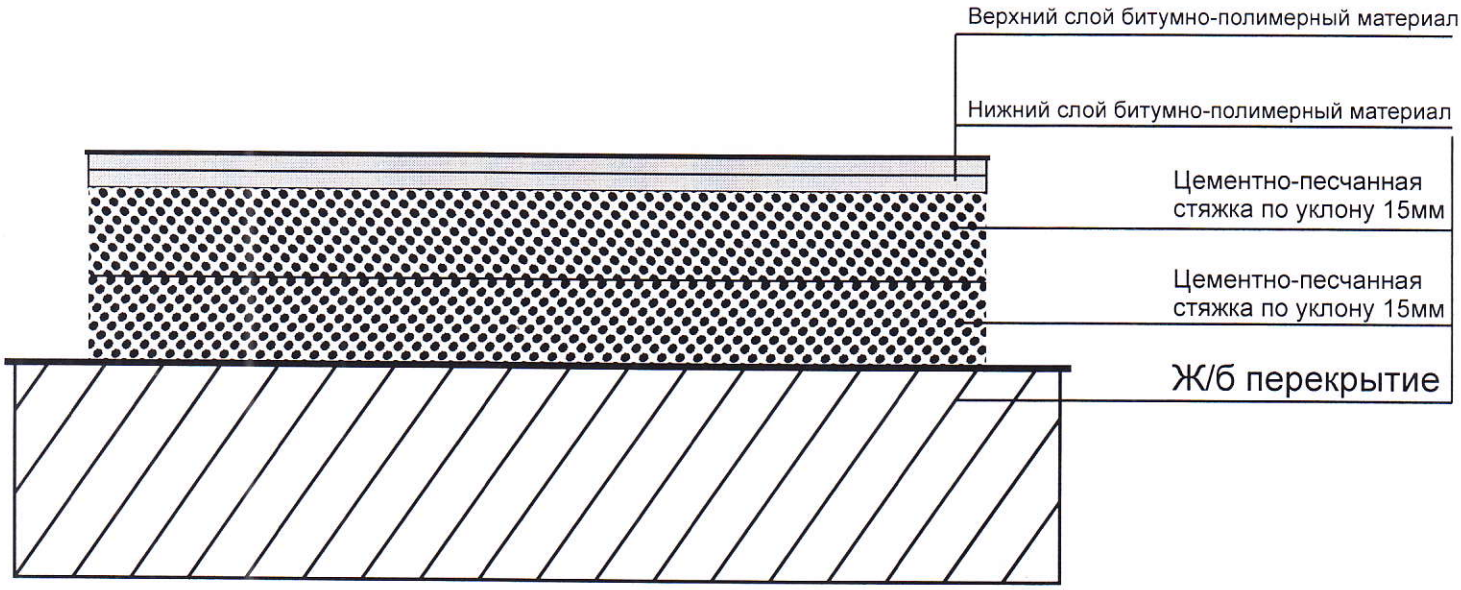

Подрядчик: ТОО “Сары тарақты” _____ Укибаев М.Р.

Технадзор: ИП “Миллион” _____ Бегимбаев Ж.Ж.

Авторский надзор: ТОО “ГорСервисПроект” _____ Базарбайулы Т.Б.

Объект: Текущий ремонт здании поликлиники №3
в г.Кызылорда по ул.Жибек Жолы №66

г. Кызылорда, 2019г.
