Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Объект: Вычислительный центр "Орбита"

Форма 2Б

Акт приемки выполненных работ на сооружение основного котлована и котлована на здание 01-1
за август 2012г

№п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						Всего с начала строительства				За отчетный месяц			
		ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге
	1. Основной котлован и котлован по зданию 01-1												
1	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на а/самосвалы и доработкой грунта с уплотнением дна котлована	м3	150 000,00	256	38 400 000,00	м3	138 179,17	256	35 373 867,52	м3	76 166,96	256	19 498 741,76
2	Перевозка грунта на 5 км	м3	150 000,00	249	37 350 000,00	м3	138 179,17	249	34 406 613,33	м3	76 166,96	249	18 965 573,04
3	Работа на отвале	м3	150 000,00	15	2 250 000,00	м3	138 179,17	15	2 072 687,55	м3	76 166,96	15	1 142 504,40
	Итого				78 000 000,00				71 853 168,40				39 606 819,20

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Заместитель Генерального директора
Руководитель проекта
Начальник ПТО
Начальник СДО
Руководитель группы ПТО
Инженер ПТО
Инженер СДО
Начальник участка

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Исполнительная съемка

Общая 125399.81 м3
31.08.2012г

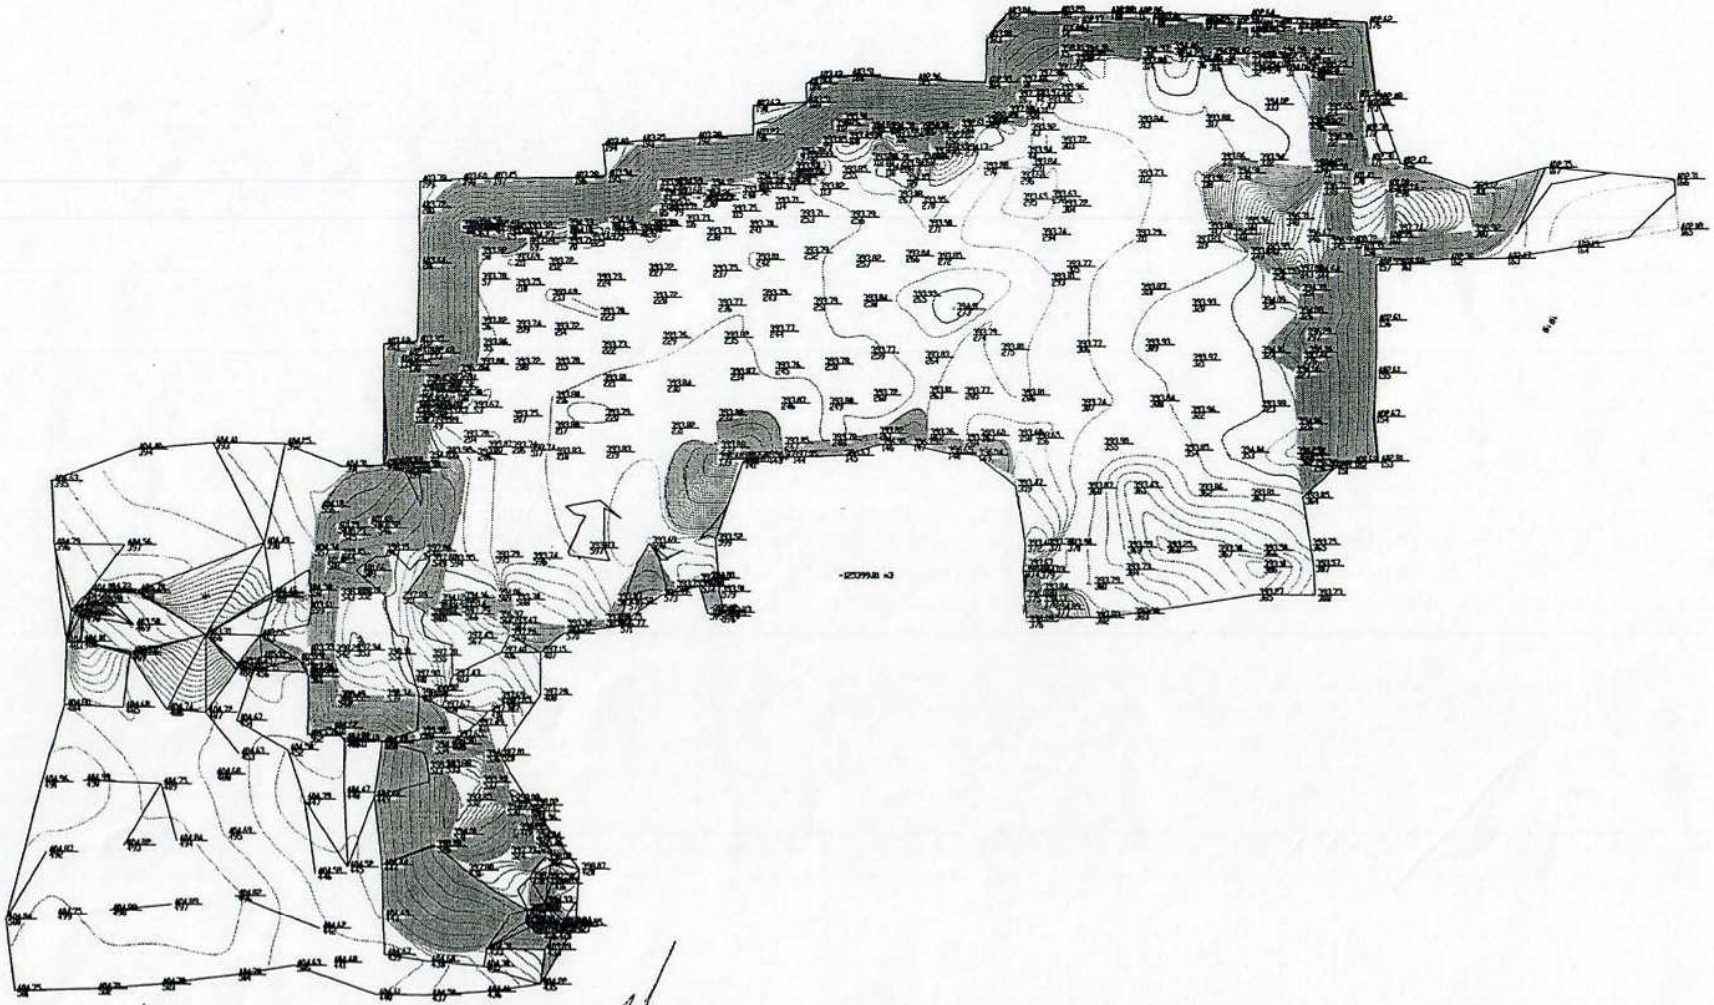

Исполнил: инженер геодезист ТОО"ТОП Геодезия" Бахитжан А.

Проверил: инженер геодезист концерна "Найза Курылыс"Тлеубергенов Б.Б.

Исполнительная съемка

Общая 12779.36 м3

30.08.2012г

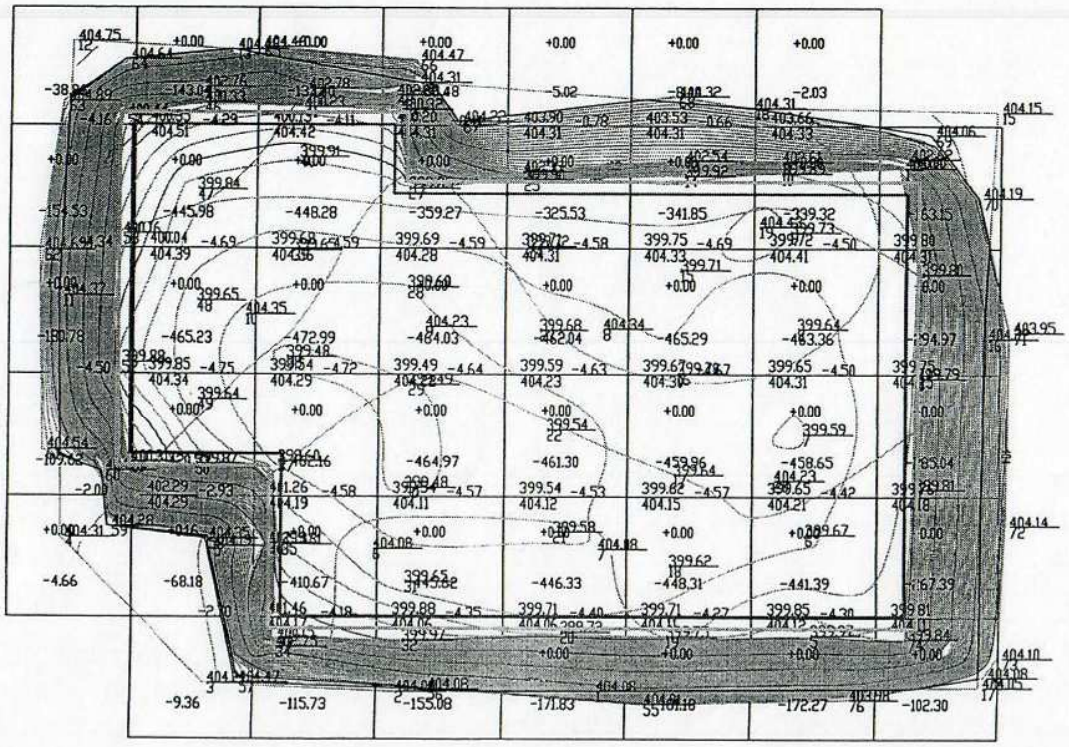

итого м3	Насыпь	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	всего м3	+0.00
	Выемка	-488.45	-552.32	-2043.23	-3928.45	-3872.05	-1905.00	-877.01	-112.85		-12779.36

Исполнил: инженер геодезист ТОО"ТОП Геодезия" Бахитжан А.

Проверил: инженер геодезист концерна "Найза Курылыс"Тлеубергенов Б.Б.

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТ
Договор: Договор №294 от 27.07.2012г.
Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита"*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 294	27.07.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	64 154 614,64									71 853 168,40
	в том числе		35 363 231,43							4 243 587,77	39 606 819,20
1	Сооружение основного котлована и котлована на здание 01-1,вычислительного центра "Орбита"	64 154 614,64	35 363 231,43							4 243 587,77	39 606 819,20
Итого к оплате тг		Тридцать девять миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот девятнадцать тенге 20 тыпн									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Подрядчик :

Директор
ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

Зам. гендиректора:

Нач. СДО:

Счет-фактура № 00000000181 от 31 августа 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №294 от 25.07.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007404, БИН: , Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка грунта котлована с вывозом грунта на 5км	тг.	1	35 363 231,43	35 363 231,43	12%	4 243 587,77	39 606 819,20	0	
Всего по счету:					**35 363 231,43**		**4 243 587,77**	**39 606 819,20**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 387 от 31 Августа 2012 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс" Телефон: 70-16-23 (бух.) 37-72-70(факс)
РНН(БИН) и адрес местонахождения поставщика: РНН 620300007404 (БИН 000140002158) Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0006269 от 07.12.2009г.
Расчетный счет поставщика: ИИК KZ33998BTB0000009871 в Столичный ф-л АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 294 от 25.07.12г. орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620300007404 (БИН 000140002158), ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
РНН (БИН), наименование и адрес местонахождения

Грузополучатель: РНН 600900527277 (БИН), ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
РНН (БИН), наименование и адрес местонахождения

Получатель: ТОО ТОП Лтд
РНН(БИН) и адрес местонахождения получателя: РНН 600900527277 (БИН) Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
Расчетный счет получателя: ИИК KZ429143989l4BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	353632.14	353632.14	12 %	42435.86	396068.00	-----	-----
Всего по счету:					**353632.14**		**42435.86**	**396068.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Богма Виктор Витальевич
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
зам. главного бухгалтера Дылькова Людмила Ивановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)

М.П. **Получил**

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 373 от 31 Августа 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице руководителя Богма Виктор Витальевич, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	396068.00	396068.00
ИТОГО					**396068.00**
в том числе НДС					**42435.86**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 39606819,2*1%

Исполнитель: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН 620300007404
ИИК KZ33998BTB0000009871 в Столичный ф-л АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3

М. П. подпись:
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик: ТОО ТОП Лтд
РНН: 600900527277
ИИК KZ429143989l4BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

М. П. подпись:
(должность, Ф.И.О.)

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Объект: Вычислительный центр "Орбита"

Форма 2Б

Акт приемки выполненных работ на сооружение основного котлована 01-8 и котлована на здание 01-1
за сентябрь 2012г

№п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						Всего с начала строительства				За отчетный месяц			
		ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге
	1. Котлован 01-8 и котлован по зданию 01-1												
1	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на а/самосвалы и доработкой грунта с уплотнением дна котлована	м3	150 000,00	256	38 400 000,00	м3	151 225,97	256	38 713 848,32	м3	13 046,80	256	3 339 980,80
2	Перевозка грунта на 5 км	м3	150 000,00	249	37 350 000,00	м3	151 225,97	249	37 655 266,53	м3	13 046,80	249	3 248 653,20
3	Работа на отвале	м3	150 000,00	15	2 250 000,00	м3	151 225,97	15	2 268 389,55	м3	13 046,80	15	195 702,00
	Итого				78 000 000,00				78 637 504,40				6 784 336,00

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Заместитель Генерального директора

Руководитель проекта

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Исполнительная съемка

Общая 138446.61 м³
04.09.2012г

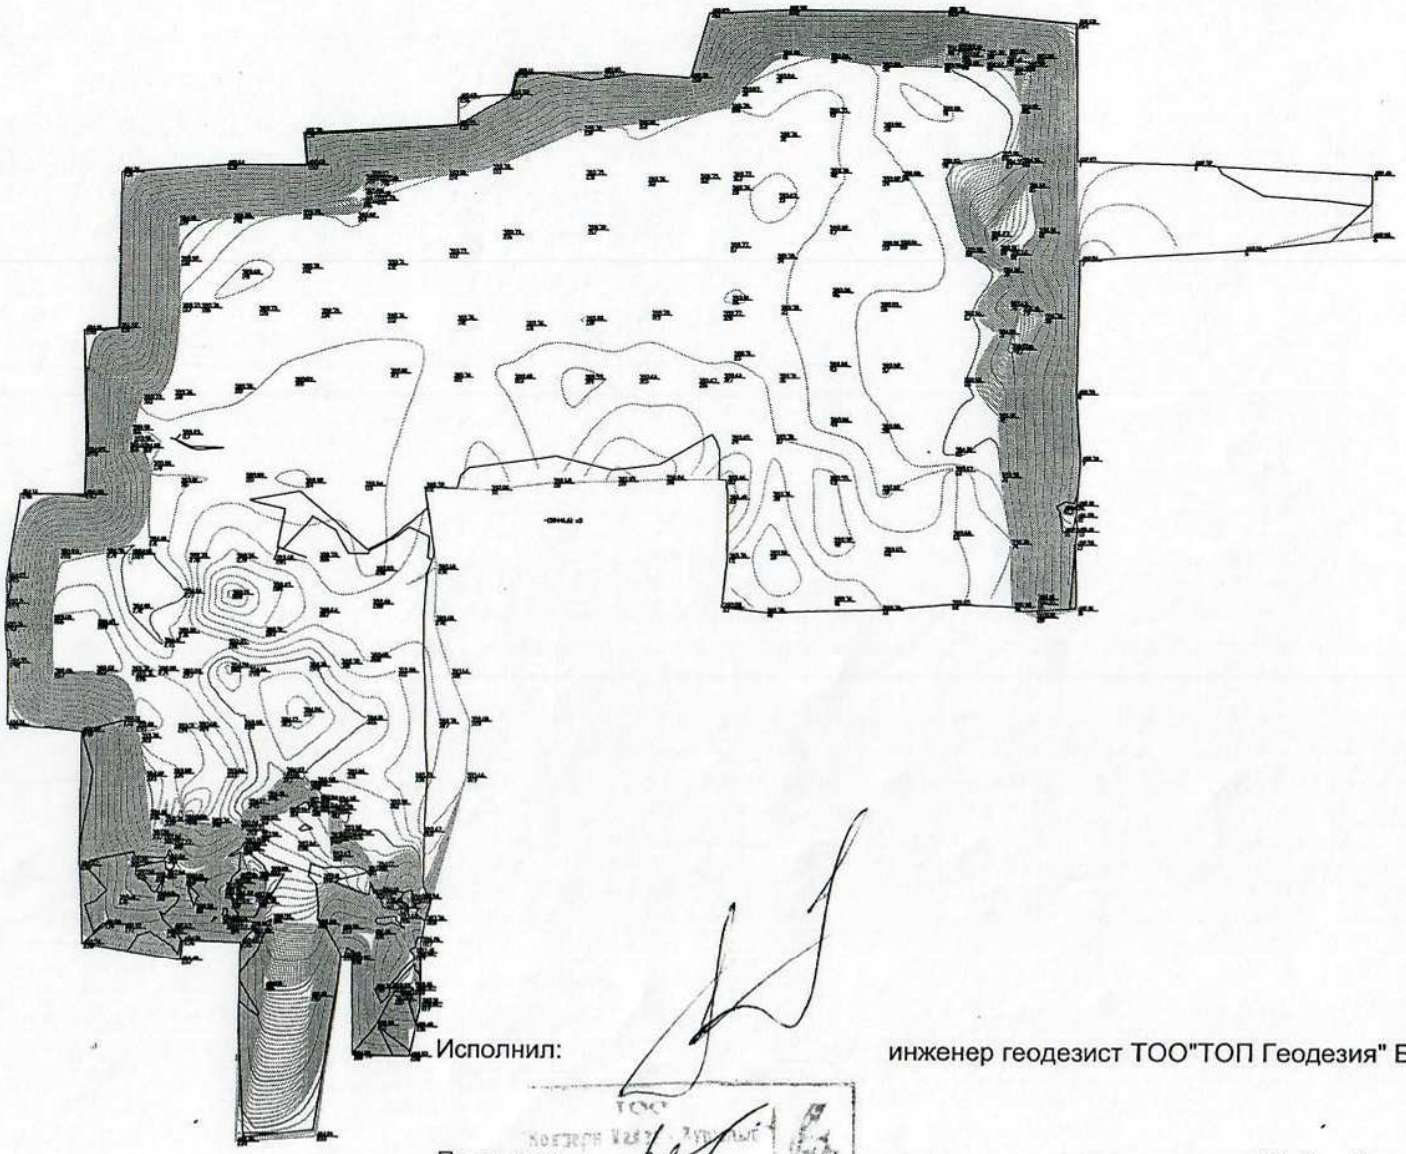

Исполнил: инженер геодезист ТОО"ТОП Геодезия" Бахитжан А.

Проверил: инженер геодезист концерна "Найза Курылыс"Тлеубергенов Б.Б.

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТ
Договор: Договор №294 от 27.07.2012г.
Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита"*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 294	27.07.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - сентябрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	70 212 057.50								726 893.14	78 637 504.40
	в том числе		6 057 442.86							726 893.14	6 784 336.00
1	Сооружение основного котлована и котлована на здание 01-1,вычислительного центра "Орбита"	70 212 057.50	6 057 442.86							726 893.14	6 784 336.00
Итого к оплате тг		Шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи триста тридцать шесть тенге									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс" Богма В.В.

ЗАМ. ГЕНДИРЕКТОРА:
НАЧ-СДО:

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

увлеч. нет доп. согл. 13.09.

Счет-фактура № 00000000189 от 5 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №294 от 25.07.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007404, БИН: , Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка грунта котлована с вывозом грунта на 5км	тг.	1	6 057 442,86	6 057 442,86	12%	726 893,14	6 784 336,00	0	
Всего по счету:					**6 057 442,86**		**726 893,14**	**6 784 336,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 404 от 10 Сентября 2012 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс" Телефон: 70-16-23 (бух.) 37-72-70(факс)
РНН(БИН) и адрес местонахождения поставщика: РНН 620300007404 (БИН 000140002158) Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
Расчетный счет поставщика: ИИК KZ33998BTB0000009871 в Столичный ф-л АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 294 от 25.07.12г. орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620300007404 (БИН 000140002158), ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
РНН (БИН), наименование и адрес местонахождения

Грузополучатель: РНН 600900527277 (БИН 031040003399), ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
РНН (БИН), наименование и адрес местонахождения

Получатель: ТОО ТОП Лтд
РНН(БИН) и адрес местонахождения получателя: РНН 600900527277 (БИН 031040003399) Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
Расчетный счет получателя: ИИК KZ429143989l4BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	60574.11	60574.11	12 %	7268.89	67843.00	-----	-----
Всего по счету:					**60574.11**		**7268.89**	**67843.00**		-----

Руководитель организации Богма Виктор Витальевич (ФИО,подпись)
Главный бухгалтер организации Какенова Динара Куанышевна (ФИО,подпись)
М.П.
Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры) зам. Главного бухгалтера Дылькова Людмила Ивановна (должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 1390 от 10 Сентября 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице руководителя Богма Виктор Витальевич, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	67843.00	67843.00
ИТОГО					**67843.00**
в том числе НДС					**7268.89**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 6784336*1%

Исполнитель: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН 620300007404
ИИК KZ33998BTB0000009871 в Столичный ф-л АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

М. П. подпись:
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик: ТОО ТОП Лтд
РНН: 600900527277
ИИК KZ429143989l4BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

М. П. подпись:
(должность, Ф.И.О.)

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Объект: Вычислительный центр "Орбита"

Форма 2Б

Акт приемки выполненных работ на сооружение котлованов
за сентябрь 2012г

№п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						Всего с начала строительства				За отчетный месяц			
		ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге
	Котлованы: №01-8; котлован под здание 01-1; котлован под здание 01-3; котлован под здание 01-4.												
1	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на а/самосвалы и доработкой грунта с уплотнением дна котлована	м3	180 000,00	256	46 080 000,00	м3	173 007,41	256	44 289 896,96	м3	21 781,44	256	5 576 048,64
2	Перевозка грунта на 5 км	м3	180 000,00	249	44 820 000,00	м3	173 007,41	249	43 078 845,09	м3	21 781,44	249	5 423 578,56
3	Работа на отвале	м3	180 000,00	15	2 700 000,00	м3	173 007,41	15	2 595 111,15	м3	21 781,44	15	326 721,60
	Итого				93 600 000,00				89 963 853,20				11 326 348,80

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Заместитель Генерального директора

Руководитель проекта

Руководитель комплекса

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

22.09.12.

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТ"

Договор: Договор №294 от 27.07.2012г.

Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита"*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

Код заказчика			Договор		Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 294	27.07.2012г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - сентябрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	80 324 868,93								1 213 537,37	89 963 853,20
	в том числе		10 112 811,43							1 213 537,37	11 326 348,80
1	Сооружение основного котлована и котлована на здание 01-1,вычислительного центра "Орбита"	80 324 868,93	10 112 811,43							1 213 537,37	11 326 348,80
Итого к оплате тг		Одиннадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч триста сорок восемь тенге 80 тыин									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД" **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000197 от 24 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №294 от 25.07.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007404, БИН: , Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка грунта котлована с вывозом грунта на 5км	тг.	1	10 112 811,43	10 112 811,43	12%	1 213 537,37	11 326 348,80	0	
Всего по счету:					**10 112 811,43**		**1 213 537,37**	**11 326 348,80**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получено

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 448 от 26 Сентября 2012 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс" Телефон: 70-16-23 (бух.) 37-72-70(факс)
РНН(БИН) и адрес местонахождения поставщика: РНН 620300007404 (БИН 000140002158) Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
Расчетный счет поставщика: ИИК KZ33998BTB0000009871 в Столичный ф-л АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 294 от 25.07.12г. орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620300007404 (БИН 000140002158), ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
РНН (БИН), наименование и адрес местонахождения

Грузополучатель: РНН 600900527277 (БИН 031040003399), ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
РНН (БИН), наименование и адрес местонахождения

Получатель: ТОО ТОП Лтд
РНН(БИН) и адрес местонахождения получателя: РНН 600900527277 (БИН 031040003399) Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
Расчетный счет получателя: ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	101127.68	101127.68	12 %	12135.32	113263.00	-----	-----
Всего по счету:					**101127.68**		**12135.32**	**113263.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Богма Виктор Витальевич
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
зам. главного бухгалтера Дылькова Людмила Ивановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр)-получателю.
Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 1432 от 26 Сентября 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице руководителя Богма Виктор Витальевич, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	113263.00	113263.00
ИТОГО					**113263.00**
в том числе НДС					**12135.32**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 11326348,8*1%

Исполнитель: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН 620300007404
ИИК KZ33998BTB0000009871 в Столичный ф-л АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

М. П. подпись:
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик: ТОО ТОП Лтд
РНН: 600900527277
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

М. П. подпись:
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА сентябрь, 2012 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп1						
15	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2167	992,90	97,07	2151614	210351	379723
		м3		112,50	36,00	243788	78012	118
16	Е0106-1-4	Устройство подготовки из бетона В12,5	212	8693,43	285,58	1843007	60543	116674
		м3		416,25	107,89	88245	22873	105
18	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В20 на сульфатостойком портландцементе W6	1300	9475,32	196,62	12317916	255606	473000
		м3		272,25	74,27	353925	96551	105
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,056	50600,00	--	2834	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,022	52400,00	--	315553	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	40,662	48200,00	--	1959908	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	57,578	46700,00	--	2688893	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
23	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	8,293	45100,00	--	374014	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1068	70437,87	304,24	7523	32	1098
		1т		9675,00	114,75	1033	12	105
		ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБЧАТЫЕ Фм1,Фм2						
25	Е0106-1-4	Устройство подготовки из бетона В12,5	40,2	8693,43	285,58	349476	11480	22124
		м3		416,25	107,89	16733	4337	105
26	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В20 на сульфатостойком портландцементе W6	40,27	10928,66	112,36	440097	4525	44987
		м3		1021,50	42,44	41136	1709	105
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1053	50600,00	--	5328	--	--
		т		--	--	--	--	--
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,2191	50900,00	--	62052	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,9828	48300,00	--	47469	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Фб1						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22 565 685		
		Накладные расходы -	Тенге			1 037 606		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 416 197		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25 019 488		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			22 565 689		
		Накладные расходы -	Тенге			1 037 606		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 416 198		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25 019 492		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	725 565			725 565
		Итого по гл.1-8			**25 745 057**		-	**25 745 057**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	633 328			633 328
		Выслуга лет		1%			257 451	257 451
		Доп. отпуска		0,4%			102 980	102 980
		Итого по главе 9			**633 328**	-	**360 431**	**993 759**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**26 378 386**	-	**360 431**	**26 738 816**
								55 823 696
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,088	~~55 078 069~~	-	~~752 580~~	~~55 830 649~~
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			~~1 116 613~~	~~1 116 613~~ 1'116'474
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			~~55 078 069~~	-	~~1 869 192~~	~~56 947 261~~ 55'940'170
		Налог на добавленную стоимость		12%			~~6 833 671~~	6 832 820 ~~6 833 671~~
		Итого			~~55 078 069~~	-	8 702 864	~~63 780 933~~ 63'772'990

63'772'990

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Заместитель Генерального директора

Руководитель управления материально-технической комплектации

Начальник ПТО

Начальник СДО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Директор ТОО "ТОП Лтд"

геодезист

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТ"

Договор: Договор №434 от 14.09.2012г.

Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита". Здание №1*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

Код заказчика	Договор			Источник		Организационная форма			
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				№ 434	14.09.2012г					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - сентябрь	В отчетном месяце - сентябрь2	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
						из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз	Дополнительные			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3			7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	56 940 170									6 832 820	63 772 990
	в том числе		56 940 170								6 832 820	63 772 990
1	Сооружение основного котлована и котлована на здание 01-1,вычислительного центра "Орбита"	56 940 170	56 940 170								6 832 820	63 772 990
Итого к оплате тг		Шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто тенге										

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс" Богун В.В.

Подрядчик

Директор ТОО "ТОП ЛТД" Матвеев А.В.

Начальник СДО:

Счет-фактура № 00000000201 от 28 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №434 от 14.09.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007404, БИН: , Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сооружение основного котлована и котлована на здание 01-1, вычислительного центра "Орбита"	тг.	1	56 940 170,00	56 940 170,00	12%	6 832 820,00	63 772 990,00	0	
Всего по счету:					**56 940 170,00**		**6 832 820,00**	**63 772 990,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Республикасы Алматы қ. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью ШАРТТАР ЖӘНЕ ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН ТОП Лтд ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получил

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

дубликат

Счет-фактура 509 от 28 Сентября 2012 г.

Поставщик: **ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"**
РНН(БИН) и адрес места нахождения поставщика: **РНН 620300007404 (ИИН/БИН 000140002158) Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,**
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
ИИК поставщика: **KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA**
Договор (контракт) № 434 от 14.09.12г орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: РНН 620300007404 (ИИН/БИН 000140002158), ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения
Грузополучатель: РНН 600900527277 (ИИН/БИН 031040003399), ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения
Получатель: **ТОО ТОП Лтд**
РНН(БИН) и адрес места нахождения получателя: **РНН 600900527277 (ИИН/БИН 031040003399) Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"**
ИИК получателя: **KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	1138803.57	1138803.57	12 %	136656.43	1275460.00	-----	-----
Всего по счету:					**1138803.57**		**136656.43**	**1275460.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Богма Виктор Витальевич
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
зам. главного бухгалтера Дылькова Людмила Ивановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 1493 от 28 Сентября 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице генеральный директор Богма Виктора Витальевича, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	1275460.00	1275460.00
ИТОГО					**1275460.00**
в том числе НДС					**136656.43**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 63772990*2%

Исполнитель:
ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН 620300007404
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

(должность, Ф.И.О.)

М. П.

(подпись:)

Заказчик:
ТОО ТОП Лтд
РНН 600900527277
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(должность, Ф.И.О.)

М. П.

(подпись:)

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс" Форма 4
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА октябрь, 2012 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3800	42,18	40,26	160284	152988	47070
		м3		1,86	10,91	7068	41458	97
9	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7410	49,50	49,50	366795	366795	73359
		т		--	9,90	0	73359	100
10	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2170	7,57	7,57	16427	16427	5178
		м3		--	2,46	0	5338	97
11	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2170	3,28	3,28	7118	7118	2231
		м3		--	1,06	0	2300	97
12	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	930	167,18	--	155477	--	175327
		м3		167,18	--	155477	0	113
13	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	700	29,64	28,03	20748	19621	5887

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1,61	7,06	1127	4942	97
14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1304	25,65	5,38	33448	7016	25639
		м3		20,27	--	26432	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			760297		
		Накладные расходы -	Тенге			334692		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65699		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1160688		
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
		ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБЧАТЫЕ Фм1,Фм2						
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	336	245,44	3,82	82468	1284	15379
		м2		37,35	1,44	12550	484	118
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Фб1						
31	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	23,52	992,90	97,07	23353	2283	4121
		м3		112,50	36,00	2646	847	118
32	Е0106-1-4	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 5 м3 под колонны	0,984	8693,43	285,58	8554	281	544
		м3		416,25	107,89	410	106	105
33	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	53,32	13602,13	308,99	725266	16475	104917
		м3		1757,25	116,73	93697	6224	105
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,35964	50600,00	--	18198	--	--
		т		--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,28372	53000,00	--	15037	--	--
		т		--	--	--	--	--
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,4912	52400,00	--	78139	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			951015		
		Накладные расходы -	Тенге			124961		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64559		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1140534		
		РАЗДЕЛ 3. ПОДВАЛ						
		Подраздел без наименования						
37	Е0106-13-4	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	321,4	11412,78	308,99	3668067	99309	358302
		м3		945,00	116,73	303723	37517	105
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,359	50600,00	--	18165	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	11,378	52400,00	--	596207	--	--
		т		--	--	--	--	--
40	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	12,758	50900,00	--	649382	--	--
		т		--	--	--	--	--
41	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0044	93997,62	304,24	414	1	153
		1т		33075,00	114,75	146	1	105
42	Е0108-4-5	**Гидроизоляция по выравненной поверхности плит перекрытия из бетона в 2 слоя**	990	1224,38	8,23	1212136	8148	99017
		м2		81,68	3,08	80863	3049	118
43	Е0108-4-6	**Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции**	990	619,33	4,19	613137	4148	47849
		м2		39,38	1,58	38986	1564	118
44	Е0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**	80,07	11759,47	378,22	941581	30284	296900
		м3		3566,25	141,75	285550	11350	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			7699090	141891	
		Накладные расходы -	Тенге			802221		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			510079		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9011389		
		РАЗДЕЛ 4.КАРКАС						
		КОЛОННЫ						
45	Е0106-14-1	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	60,8	11529,11	884,81	700970	53796	122173
		м3		1579,50	334,24	96034	20322	105
46	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	2,039	47400,00	--	96649	--	--
		т		--	--	--	--	--
47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	9,7425	48300,00	--	470563	--	--
		т		--	--	--	--	--
48	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,1531	45800,00	--	7012	--	--
		т		--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	392
		1т		33075,00	114,75	370	1	106
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1276246**		
		Накладные расходы -	Тенге			**122565**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**83929**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1482740**		
		РАЗДЕЛ 5		**ПЕРЕКРЫТИЯ**				
50	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	64	14936,04	407,30	955907	26067	170611
		м3		2385,00	153,86	152640	9847	105
51	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,108	50600,00	--	5465	--	--
		т		--	--	--	--	--
52	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	5,043	45800,00	--	230969	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	8. 02-04-2002СН	т		--	--	--	--	--	
53	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,78	50900,00	--	90602	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
54	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,095	48300,00	--	52889	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
55	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	11,94	45800,00	--	546852	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. -1,190							
56	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	297,7	10894,07	210,67	3243165	62716	309719	
		м3		911,25	79,58	271279	23691	105	
57	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	50600,00	--	243	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
58	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,8025	45800,00	--	36755	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,12573	52400,00	--	530588	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	32,07156	50900,00	--	1632442	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. +0,220							
61	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	45,4	10894,07	210,67	494591	9564	47233	50%
		м3		911,25	79,58	41371	3613	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
62	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00784	50600,00	--	397	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
63	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,234	45800,00	--	10717	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
64	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,89534	52400,00	--	413716	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
65	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04582	50900,00	--	2332	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
66	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,009885	70437,87	304,24	696	3	102	
		1т		9675,00	114,75	96	1	105	
						РИГЕЛИ Рм2 НА ОТМ. -0,100			
67	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	32,05	14936,04	407,30	478700	13054	85439	50%
		м3		2385,00	153,86	76439	4931	105	
68	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,046	50600,00	--	2328	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
69	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,458	47400,00	--	21709	--	--	
		т		--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,549	45800,00	--	116744	--	--
		т		--	--	--	--	--
71	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,144	52400,00	--	7546	--	--
		т		--	--	--	--	--
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,808	50900,00	--	92027	--	--
		т		--	--	--	--	--
73	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,72	48300,00	--	179676	--	--
		т		--	--	--	--	--
74	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,005	45800,00	--	46029	--	--
		т		--	--	--	--	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05845	93997,62	304,24	5494	18	2037
		1т		33075,00	114,75	1933	7	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9198578		
		Накладные расходы -	Тенге			615140		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588823		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10402541		
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ						
351	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	13,98	1271,09	--	17768	--	8201
		м3		477,00	--	6668	0	123
352	Е0107-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м	29	3266,80	1419,61	94737	41169	74606
				1399,50	438,08	40586	12704	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
353	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, ширина по верху 600 мм	127,7					
				4570,00	--	583589	--	--
		м		--	--	--	--	--
354	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	200,11	245,44	3,82	49115	764	9159
		м2		37,35	1,44	7474	288	118
355	Е0107-32-8	Укладка плит покрытия	65	1852,22	274,67	120394	17854	36347
		шт		317,25	82,17	20621	5341	140
356	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	10,58	19800,00	--	209563	--	--
		м3		--	--	--	--	--
357	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,02	50800,00	--	1138	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1 076 304		
		Накладные расходы -	Тенге			128 314		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72 277		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1 276 895		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			20 961 529		
		Накладные расходы -	Тенге			2 127 893		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 385 365		
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			24 474 788		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	709 769			709 769
		Итого по гл.1-8			**25 184 556**		**-**	**25 184 556**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	619 540			619 540
		Выслуга лет		1%			251 846	251 846
		Доп. отпуска		0,4%			100 738	100 738
		Итого по главе 9			**619 540**	**-**	**352 584**	**972 124**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**25 804 097**	**-**	**352 584**	**26 156 680**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	53 872 244	-	736 103	54 608 348
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 092 167	1 092 167
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			53 872 244	-	1 828 270	55 700 515
		Налог на добавленную стоимость		12%			6 684 062	6 684 062
		Итого			53 872 244	-	8 512 332	62 384 576

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Заместитель Генерального директора

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Руководитель управления материально-технической комплектации

Начальник ПТО

Начальник СДО

Инженер ПТО

Инженер СДО /Мамунова Р.А/

Начальник участка

Сад Вагаев

/Стружкина Е/

Курманалиев Б.О

Дауртаев Т

Исполнительная документация предоставлена

Нач. комплекс /Кязженов/

суб.

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТ"
Договор: Договор №434 от 14.09.2012г.
Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита". Здание №1*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 года

		Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		код
					№ 434	14.09.2012г.					
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - октябрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	112 640 685								13 516 882	126 157 566
	в том числе		55 700 515							6 684 062	62 384 576
1	Сооружение основного котлована и котлована на здание 01-1,вычислительного центра "Орбита"	56 940 170									
2	Здание №1	55 700 515	55 700 515							6 684 062	62 384 576
Итого к оплате тг		Шестьдесят два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть тенге									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс" **Богма В.В.**

Заместитель Генерального директора

Начальник СДО

Подрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Счет-фактура № 00000000222 от 29 октября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №434 от 14.09.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)
(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)
(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007404, БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительные работы по зданию №1	тг.	1	55 700 514,00	55 700 514,00	12%	6 684 062,00	62 384 576,00	0	
Всего по счету:					**55 700 514,00**		**6 684 062,00**	**62 384 576,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

ТОП Лтд

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 560 от 31 Октября 2012 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН(БИН) и адрес места нахождения поставщика: РНН 620300007404 (БИН 000140002158) Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
ИИК поставщика: KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 434 от 14.09.12г орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620300007404 (БИН 000140002158), ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения

Грузополучатель: РНН 600900527277 (БИН 031040003399), ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения

Получатель: ТОО ТОП Лтд
РНН(БИН) и адрес места нахождения получателя: РНН 600900527277 (БИН 031040003399) Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИК получателя: KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	1114010.71	1114010.71	12 %	133681.29	1247692.00	-----	-----
Всего по счету:					**1114010.71**		**133681.29**	**1247692.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Богма Виктор Витальевич
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
зам. главного бухгалтера Дылькова Людмила Ивановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 1540 от 31 Октября 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице генеральный директор Богмы Виктора Витальевича, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	1247692.00	1247692.00
ИТОГО					**1247692.00**
в том числе НДС					**133681.29**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 62384576*2%

Исполнитель:ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН 620300007404
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана
БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

(должность, Ф.И.О.)

М. П.

(подпись:)

Заказчик: ТОО ТОП Лтд
РНН 600900527277
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(должность, Ф.И.О.)

М. П.

(подпись:)

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строі СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ноябрь, 2012 г.

на Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Каркас							
	4.1 Колонны							
45	Е6-14-1	Устройство бетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке		11529,11	884,81	299757	23005	52245
		м3	26	1579,5	334,24	41067	8690	105
49	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		93997,62	304,24	451	1	168
		т	0,0048	33075	114,75	159	1	106
		Итого по разделу 4				**300 208**		
		Накладные расходы, тенге				52 413		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 157		
		Всего по разделу, тенге				**373 778**		
	Раздел 5 Перекрытие							
		т						

5.3 Покрытие на отм + 0,220

61	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	45,4	10894,07	210,67	494591	9564	47233
		м3		911,25	79,58	41371	3613	105
66	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		70437,87	304,24	696	3	102
		т	0,009885	9675	114,75	96	1	105

5.4 Ригели Рм2 на отм-0,100

67	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	32,05	14936,04	407,3	478700	13054	85439
		м3		2385	153,86	76439	4931	105
75	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		93997,62	304,24	5494	18	2037
		т	0,05845	33075	114,75	1933	7	105

5.5 Ригели Рм 2,3 и балка Бм4 на отм + 3,150

76	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	19,5	14936,04	407,3	291253	7942	51983
		м3		2385	153,86	46508	3000	105
77	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,9146	47400		43352		
		т						
78	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,9728	48300		95286		
		т						
79	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	1,602	45800		73372		
		т						

80	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1701	93997,62	304,24	15989	52	5928
		т						
				33075	114,75	5626	20	105
	5.6 Перекрытие на отм - 0,100							
81	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	76,7	12677,54	241,1	972367	18492	110621
		м3						
				1282,5	91,08	98368	6986	105
82	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2358	50600		11931		
		т						
83	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,3069	45800		14056		
		т						
84	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,072	53000		3816		
		т						
85	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	7,146	52400		374450		
		т						
86	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,153	50900		7788		
		т						
	5.7 Покрытие на отм + 3,150							
87	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	82,3	12677,54	241,1	1043362	19843	118698
		м3						
				1282,5	91,08	105550	7496	105
88	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,257	50600		13004		
		т						

89	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,3156	45800		14454		
		т						
90	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	5,542	53000		293726		
		т						
91	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,165	50900		8399		
		т						
	5.8 Ригели на отм +2,950; +5,950							
92	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	18,5	14936,04	407,3	276317	7535	49317
		м3		2385	153,86	44123	2846	105
93	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,834	47400		86932		
		т						
94	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	2,684	48300		129637		
		т						
95	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	3,512	45800		160850		
		т						
96	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1542	93997,62	304,24	14494	47	5374
		т		33075	114,75	5100	18	105
	5.9 Балки Бм1,2,3							
97	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,1	14936,04	407,3	31366	855	5598

		м3		2385	153,86	5009	323	105
98	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0825	47400		3911		
		т						
99	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,1296	48300		6260		
		т						
100	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,1837	45800		8413		
		т						
101	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0084	93997,62	304,24	790	3	293
		т						
102	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,086	33075	114,75	278	1	105
		т		70437,87	304,24	0	0	0
	5.10 Перекрытие на отм +2,950							
				9675	114,75	0	0	105
103	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	72,3	12677,54	241,1	916586	17432	104275
		м3		1282,5	91,08	92725	6585	105
104	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,26	50600		13156		
		т						
105	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,254	45800		11633		
		т						
106	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	4,924	53000		260972		
		т						
107	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,088	52400		4611		
		т						
	5.11 Перекрытие на отм +5,950							

108	Е6-21-1						
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	73,9	12677,54	241,1	936870	17817	106583
	м3		1282,5	91,08	94777	6731	105
109	4-1-4						
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,272	50600		13763		
	т						
110	4-1-6						
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,263	45800		12045		
	т						
111	4-1-23						
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	5,097	53000		270141		
	т						
112	4-1-24						
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,259	52400		13572		
	т						
113	Е26-31-1						
	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	4,8	9896,56	330,46	47503	1586	9278
	м3 изоляции		1809,25	123,75	8684	594	100
	Итого по разделу 5				**7 476 189**		
	Накладные расходы, тенге				702 864		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				490 743		
	Всего по разделу, тенге				**8 669 796**		

Раздел 6 Лестницы

6.1 Л1

114	Е9-29-1						
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,51407	13711,46	5475,86	7049	2815	3050

	т конструкций	0,51407	5040	1552,87	2591	798	90
115 2-1-146	Косоуры	0,47523	108500		51562		
	т						
116 2-1-147	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции баковых помещений и т. п.	0,03684	103500		3813		
	т						
117 Е99-11-11	Надбавка на марку стали С245(ССЦ ч.2 п3,2)	0,51407	1860	–	956	–	–
	т		–	–	–	–	–
118 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	42	211,84	12,56	8897	528	10863
	м ступеней		180	4,75	7560	200	140
119 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	42	1230		51660	0	
	м						
120 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0858	93997,62	304,24	8065	26	2990
	т		33075	114,75	2838	10	105
6.2 Л2							
122 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,30696	13711,46	5475,86	4209	1681	1821
	т конструкций		5040	1552,87	1547	477	90
123 2-1-146	Косоуры	0,27012	108500		29308		
	т						
124 2-1-147	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции баковых помещений и т. п.	0,03684	103500		3813		
	т						
125 99-11-11(пл)	Надбавка на марку стали С245 (ССЦ ч.2п3,2)	0,30696	1860		571		
	т						
126 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	24	211,84	12,56	5084	301	6208

	м ступеней		180	4,75	4320	114	140
127	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	24	1230		29520	
		м					
128	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,07164	93997,62	304,24	6734	22	2497
		т		33075	114,75	2369	8	105
130	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,34	9351,74	98,32	3179	33	264
		м3		695,25	37,145	236	13	106
		Итого по разделу 6				**214 421**		
		Накладные расходы, тенге				27 693		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14 527		
		Всего по разделу, тенге				**256 641**		

Раздел 7 Стены и перегородки

7.1 Стены наружные и внутренние,перегородки

131	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,58658	8679,65	422,15	13771	670	15754
		т металлических изделий		8257,5	157,5	13101	250	118
132	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0834	42800		3570		
		т						
133	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,675	32300		21803		
		т						
134	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	1,8859	29400		55445		
		т						
135	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1008	93997,62	304,24	9475	31	3513
		т						

				33075	114,75	3334	12	105
136	Е8-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,07	161258,56	846,56	11288	59	521
		т металлических изделий		5985	317,25	419	22	118
137	Е8-20-3	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	298,56	8548,9	432,8	2552360	129217	564386
		м3 кладки		1440	162	429926	48367	118
139	Е8-7-3 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002,СН	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	75,12	1082,66	34,73	81329	2609	21098
		м3 кладки		225	13,01	16902	977	118

7.2 Перемычки ж/б

144	Е6-18-9	Устройство перемычек ПР1,2,3,4,5 из бетона кл.В7,5	3,4548	14790,52	367,51	51098	1270	8494
		м3		2202,75	138,83	7610	480	105
145	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,048186	50600		2438		
		т						
146	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,249108	50900		12680		
		т						
147	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,760224	45800		34818		
		т						

7.4 Монолитная обвязка(парапет)

151	E6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	9	14936,04	407,3	134424	3666	23992
		м3		2385	153,86	21465	1385	105
152	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,22	45800		10076		
		т						
153	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,7	42500		29750		
		т						
	7.5 Деформационные швы							
154	E7-57-4	Герметизация горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистиролом	600	53,9	1,88	32340	1128	6241 60%;
		м шва		6,71	0,72	4026	432	140
155	E7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	600	59,17	0,14	35502	84	22537
		м шва		26,78	0,05	16068	30	140
156	E7-19-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	600	292,04	0,82	175224	492	9391
		м шва		10,87	0,31	6522	186	140
	7.6 Узел 3 см лист АР 26							
157	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,75	7243,86	337,41	48896	2278	6344
		м3 кладки		670,5	126	4526	851	118
158	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,657408	8679,65	422,15	5706	278	6528
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5429	104	118
159	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,3662	53000		19409		
		т						

160	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,7041	50900		35839		
		т						
161	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02538	50600		1284		
		т						
		Итого по разделу 7				**3 378 525**		
		Накладные расходы, тенге				688 799		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				244 039		
		Всего по разделу, тенге				**4 311 363**		

Раздел 8 Кровля

8.1 Кровля

164	1-1-701	Прокладки уплотнительные 30 мм	3,332	8800		29322		
		100м						
165	Е10-14-1	Установка стропил	53,048	21311,58	334,28	1130537	17733	248596
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	180231	6684	133
167	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,9337	46400		43324		
		т						
168	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	7,9	10716,27	316,01	84659	2496	12338
		м3		1368	119,39	10807	943	105
169	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,74404	52400		38988		
		т						
170	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,19304	50600		9768		
		т						
171	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02695	149300		4024		
		т						
		Итого по разделу 8				**1 340 620**		

	Накладные расходы, тенге				260 934		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96 093		
	Всего по разделу, тенге				**1 697 647**		

18.12 Фундаменты под перегородки

362	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	18,1	8264,41	196,62	149586	3559	6586
		м3		272,25	74,27	4928	1344	105
363	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,04145	32300		1339		
		т						
364	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,21449	52400		11239		
		т						

18.13 Вентшахты и козырки

368	Е8-20-5	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	20,52	3303,33	372,83	67784	7650	31326
		м3 кладки		1154,25	139,5	23685	2863	118
371	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0382	72779,65	422,15	2780	16	379
		т металлических изделий		8257,5	157,5	315	6	118
		Итого по разделу 18				**232 728**	**232728**	
		Накладные расходы, тенге				38 291		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 261		
		Всего по разделу, тенге				**287 281**		

	Всего прямые затраты				**12 942 690,2**		
	Накладные расходы, тенге				1 770 995,3		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				882 821,1		
	Всего по АКТу				**15 596 506,6**		
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	452 298,7			452 298,7
	Итого по гл.1-8			**16 048 805,3**		-	**16 048 805,3**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	394 800,6			394 800,6
	Выслуга лет		1%			160 488,1	160 488,1
	Доп. отпуска		0,4%			64 195,2	64 195,2
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			2 407 320,8	2 407 320,8
	Итого по главе 9			**394 800,6**	**-**	**2 632 004,1**	**3 026 804,7**
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**16 443 605,9**	**-**	**2 632 004,1**	**19 075 610,0**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	34 329 973,9	-	5 494 940,2	39 824 914,0
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			796 498,3	796 498,3
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			34 329 973,9	-	6 291 438,5	40 621 412,3

	Налог на добавленную стоимость		12%			4 874 569,5	4 874 569,5
	Итого			34 329 973,9	-	11 166 007,9	45 495 981,8

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Заместитель Генерального директора

Руководитель проекта

Начальник ПТО

Начальник СДО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Пер. Зам. Директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор №434 от 14.09.2012г.

Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита". Здание №1*

Типовая межведомственная Форма № КС
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2012 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Код заказчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационная форма: наименование	Организационная форма: код
			№ 434	14.09.2012г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - ноябрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1: из них: в отчетном месяце	Из графы 1: из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	153 262 097								18 391 451,2	171 653 548,1
	в том числе		40 621 412,3							4 874 569,5	45 495 981,8
1	Сооружение основного котлована и котлована на здание 01-1,вычислительного центра "Орбита"	56 940 170									
2	Здание №1 АС	96 321 927	40 621 412,3							4 874 569,5	45 495 981,8
Итого к оплате тг		Сорок пять миллионов четыреста девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят один тенге 80 тыин									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс" Богма В.В.

Зам. Ген. Директора _____

Начальник СДО _____

Подрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000242 от 29 ноября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №434 от 14.09.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007404, БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по зданию №1 АС	тг.	1	40 621 412,30	40 621 412,30	12%	4 874 569,50	45 495 981,80	0	
Всего по счету:					**40 621 412,30**		**4 874 569,50**	**45 495 981,80**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получено

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 685 от 30 Ноября 2012 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН(БИН) и адрес места нахождения поставщика: РНН 620300007404 (БИН 000140002158) Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
ИИК поставщика: KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 434 от 14.09.12г орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620300007404 (БИН 000140002158), ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения

Грузополучатель: РНН 600900527277 (БИН 031040003399), ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения

Получатель: ТОО ТОП Лтд
РНН(БИН) и адрес места нахождения получателя: РНН 600900527277 (БИН 031040003399) Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИК получателя: KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	812428.57	812428.57	12 %	97491.43	909920.00	-----	-----
Всего по счету:					**812428.57**		**97491.43**	**909920.00**		-----

Руководитель: Богма Виктор Витальевич (ФИО,подпись)
Главный бухгалтер: Какенова Динара Куанышевна (ФИО,подпись)
Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры) зам.главного бухгалтера Дылькова Людмила Ивановна (должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 1660 от 30 Ноября 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице руководителя Богма Виктор Витальевич, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	909920.00	909920.00
ИТОГО					**909920.00**
в том числе НДС					**97491.43**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 45495981*2%

Исполнитель:ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН 620300007404
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана
БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись:)

Заказчик: ТОО ТОП Лтд
РНН 600900527277
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись:)

Договор № 527 от 19.10.2012г.
Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Объект: Вычислительный центр "Орбита". Здание 8

Форма 2Б

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2012г

№п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						Всего с начала строительства				За отчетный месяц			
		ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге
1	Здание 01-8 Пятно №7	м3	50	20 750,00	1 037 500,00	м3	50	20750	1 037 500,00	м3	50	20750	1 037 500,00
2	Здание 01-8 Пятно №11	м3	63	20 750,00	1 307 250,00	м3	63	20750	1 307 250,00	м3	63	20750	1 307 250,00
3	Здание 01-8 Пятно №12	м3	52	20 750,00	1 079 000,00	м3	52	20750	1 079 000,00	м3	52	20750	1 079 000,00
4	Подземный переход (тоннель)	м3	144,648	20 750,00	3 001 446,00	м3	144,648	20750	3 001 446,00	м3	144,648	20750	3 001 446,00
	Итого		309,648		6 425 196,00		282		6 425 196,00		282		6 425 196,00

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Заместитель Генерального директора
Руководитель управления материально-техниче
Начальник ПТО
Начальник СДО
Инженер ПТО
Инженер СДО
Начальник участка

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Курманалиев Б.О.
Жаупербаев Е
Исп. документ
нарядчик
Нач. комплекса: /Казиенов/

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор № 527 от 19.10.2012г.

Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита". Здание №1-8. Бетонные работы.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№527	19.10.2012г					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - ноябрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	5 736 782								688 414	6 425 196
	в том числе		5 736 782							688 414	6 425 196
1	Здание 01-8 Пятно №7	926 339	926 339							111 161	1 037 500
	Здание 01-8 Пятно №11	1 167 187	1 167 187							140 063	1 307 250
	Здание 01-8 Пятно №12	963 393	963 393							115 607	1 079 000
2	Подземный переход (туннель)	2 679 863	2 679 863							321 584	3 001 446
Итого к оплате тг		Шесть миллионов четыреста двадцать пять тысяч сто девяносто шесть тенге									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс" **Богма В.В.**

Зам.ген. директора:

Начальник СДО:

Подрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Счет-фактура № 00000000243 от 29 ноября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №527 от 19.10.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007404, БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по зданию №01-8	тг.	1	5 736 782,00	5 736 782,00	12%	688 414,00	6 425 196,00	0	
Всего по счету:					**5 736 782,00**		**688 414,00**	**6 425 196,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получено

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 686 от 30 Ноября 2012 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН(БИН) и адрес места нахождения поставщика: РНН 620300007404 (БИН 000140002158) Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
ИИК поставщика: KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 527 от 19.10.12г. ВЦ Орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620300007404 (БИН 000140002158), ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения

Грузополучатель: РНН 600900527277 (БИН 031040003399), ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения

Получатель: ТОО ТОП Лтд
РНН(БИН) и адрес места нахождения получателя: РНН 600900527277 (БИН 031040003399) Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИК получателя: KZ429143989l4BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	114735.71	114735.71	12 %	13768.29	128504.00	-----	-----
Всего по счету:					**114735.71**		**13768.29**	**128504.00**		-----

Руководитель: Богма Виктор Витальевич (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер: Какенова Динара Куанышевна (ФИО,подпись)

М.П.

Выдан (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
зам. главного бухгалтера Дылькова Людмила Ивановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 1661 от 30 Ноября 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице руководителя Богма Виктор Витальевич, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	128504.00	128504.00
ИТОГО					**128504.00**
в том числе НДС					**13768.29**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 6425196*2%

Исполнитель:ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН 620300007404
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана
БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

(должность, Ф.И.О.)

М. П.

(подпись:)

Заказчик: ТОО ТОП Лтд
РНН 600900527277
ИИК KZ429143989l4BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(должность, Ф.И.О.)

М. П.

(подпись:)

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА декабрь, 2012 г.

на КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	102	620,54	0,64	63295	65	13898
		м		106,20	0,25	10832	26	128
2	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	147	748,88	1,43	110085	210	19365
		м		102,38	0,54	15050	79	128
3	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	54	712,05	10,58	38451	571	8516
		м		119,25	3,96	6440	214	128
4	C130804-46	Крепления для полиэтиленовых труб д.50	10,2	226,00	--	2305	--	--
		10шт		--	--	--	--	--
5	C130804-49	Крепления для полиэтиленовых труб д.100	10	770,00	--	7700	--	--
		10шт		--	--	--	--	--
10	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2,4	114,31	6,39	274	15	78
		м		29,93	2,48	72	6	100
11	C11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	1,7	91,00	--	155	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			222265		
		Накладные расходы -	Тенге			41858		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15847		
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			279970		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения		2,90%	8 119			8 119
		Итого по гл.1-8			**288 089**		-	**288 089**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	7 087			7 087
		Выслуга лет		1%			2 881	2 881
		Доп. отпуска		0,4%			1 152	1 152
СН РК 8.02-07-2002		Вахтовый метод работ		расчет			7 462	7 462
		Итого по главе 9			**7 087**	-	**11 495**	**18 582**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**295 176**	-	**11 495**	**306 671**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	616 251	-	23 998	640 249
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			12 805	12 805
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			616 251	-	36 803	653 054
		Налог на добавленную стоимость		12%			78 366	78 366
		Итого			616 251	-	115 169	731 420

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Генеральный директор Богма В.В.

Руководитель проекта

Начальник комплекса

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы ПТ

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Директор ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

Переданы акты скрытых работ и исполнительные схемы

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс" Форма 4
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА декабрь, 2012 г.

на Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 7 Стены и перегородки							
	7.1 Стены наружные и внутренние,перегородки							
131	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	1,05772	8679,65 8257,5	422,15 157,5	9181 8734	447 167	10503 118
137	Е8-20-3	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	78	8548,9 1440	432,8 162	666814 112320	33758 12636	147448 118
137	Е8-7-3 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002,СН	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	50,08	1082,66 225	34,73 13,01	54220 11268	1739 652	14065 118
	7.2 Перемычки ж/б							

148	Е6-18-9	Устройство перемычек ПР1,2,3,4,5 из бетона кл.В7,5	2,3032	14790,52	367,51	34066	846	5663
		м3		2202,75	138,83	5073	320	105
149	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03212	50600		1625		
		т						
150	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,16607	50900		8453		
		т						
151	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,50682	45800		23212		
		т						
	7.6 Узел 3 см лист АР 26							
161	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,5	7243,86	337,41	32597	1518	4229
		м3 кладки		670,5	126	3017	567	118
162	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,43827	8679,65	422,15	3804	185	4352
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3619	69	118
		Итого по разделу 7				**833 972**		
		Накладные расходы, тенге				186 260		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61 214		
		Всего по разделу, тенге				**1 081 446**		
	Раздел 8 Кровля							
	8.1 Кровля							
169	Е10-14-1	Установка стропил	79,572	21311,58	334,28	1695805	26599	372895

	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	270346	10026	133
170 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	132,62	573,75	28,11	76091	3728	21378
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	16412	1403	120

8.2 Устройство карнизов узел1(230 п\м)

Итого по разделу 8		**1 771 895,8**
Накладные расходы, тенге		394 272,5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		129 970,1
Всего по разделу, тенге		**2 296 138,4**
Всего по акту		**3 377 584,3**

	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	97950,0			97950,0
	Итого по гл.1-8			**3475534,3**		**0,0**	**3475534,3**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	85498,0			85498,0
	Выслуга лет		1%			34755,0	34755,0
	Доп. отпуска		0,4%			13902,0	13902,0
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			521330,1	521330,1
	Итого по главе 9			**85498,0**	**0,0**	**569987,1**	**655485,1**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**3561032,3**	**0,0**	**569987,1**	**4131019,5**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	7434510,0	0,0	1189985,0	8624495,0
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			172490,0	172490,0

	Сметная стоимость в текущем уровне цен			7434510,0	0,0	1362475,0	8796985,0
	Налог на добавленную стоимость		12%			1055638,2	1055638,2
	Итого			7434510,00	0	2418113	9 852 623,2

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В.

Пер. Зам. Директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проекта

Начальник комплекса

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТ"

Договор: Договор №434 от 14.09.2012г.

Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита". Здание №1*

Типовая межведомственная Форма № К
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

		Код заказчика	Договор		номер	дата	Источник		Организационная форма		
							наименование	код	наименование		код
		162 712 136			№ 434	14.09.2012г.				19 525 455	
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - декабрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	162 712 136								19 525 455,2	182 237 591,7
	в том числе		9 450 039							1 134 004,2	10 584 043,2
1	Административный корпус (здание 01). Общестроительные работы АС.	116 306 923	8 796 985							1 055 638,2	9 852 623,2
2	Административный корпус (здание 01). Канализация бытовая К1.	653 054	653 054							78 366	731 420
Итого к оплате тг		Десять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи сорок три тенге 20 тыин									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс" Богма В.В.

Зам. Ген. Директора _____

Начальник СДО _____

Подрядчик :

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000262 от 11 декабря 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №434 от 14.09.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007404, БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Административный корпус (здание 01). Общестроительные работы АС.	тг.	1	8 796 985,00	8 796 985,00	12%	1 055 638,20	9 852 623,20	0	
2	Административный корпус (здание 01). Канализация бытовая К1	тг.	1	653 054,00	653 054,00	12%	78 366,00	731 420,00	0	
Всего по счету:					**9 450 039,00**		**1 134 004,20**	**10 584 043,20**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получила

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 687 от 14 Декабря 2012 г.

Поставщик: **ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"**
РНН(БИН) и адрес места нахождения поставщика: **РНН 620300007404 (БИН 000140002158) Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.**
ИИК поставщика: **KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA**
Договор (контракт) № 434 от 14.09.12г орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620300007404 (БИН 000140002158), ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения

Грузополучатель: РНН 600900527277 (БИН 031040003399), ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения

Получатель: **ТОО ТОП Лтд**
РНН(БИН) и адрес места нахождения получателя: **РНН 600900527277 (БИН 031040003399) Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"**
ИИК получателя: **KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	189000.89	189000.89	12 %	22680.11	211681.00	-----	-----
Всего по счету:					**189000.89**		**22680.11**	**211681.00**		-----

Руководитель:
Богма Виктор Витальевич
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
зам. главного бухгалтера Дылькова Людмила Ивановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Какенова Динара Куанышевна
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр)-получателю.
Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 1662 от 14 Декабря 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице руководителя Богма Виктор Витальевич, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
	Услуги генподряда	шт	1	211681.00	211681.00
ИТОГО					**211681.00**
в том числе НДС					**22680.11**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 10584043*2%

Исполнитель:ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН 620300007404
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана
БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись:)

Заказчик: ТОО ТОП Лтд
РНН 600900527277
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись:)

Генподрядчик: ТОО "Концерн "Найза Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: Договор № 527 от 19.10.2012г.

Наименование объекта: *Строительство "Вычислительного центра "Орбита". Здание №1-8. Бетонные работы.*

Типовая межведомственная Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№527	19.10.2012г					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
		с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - декабрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах 2001 г.	Дополнительные		НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них			на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	20 724 951								2 486 995	23 211 946
	в том числе		14 988 170							1 798 580	16 786 750
1	Здание 01-8 Пятно №7	11 134 598	10 208 259							1 224 991	11 433 250
	Здание 01-8 Пятно №11 Резервуар ОВ 3	5 947 098	4 779 911							573 589	5 353 500
	Здание 01-8 Подземный переход	963 393								0	0
2	Подземный переход (туниель)	2 679 863								0	0
Итого к оплате тг		Шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят тенге									

Генподрядчик :

Генеральный директор ТОО "Концерн "Найза Курылыс" Богма В.В.

Зам. ген. директора:

Начальник СДО:

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

Договор № 527 от 19.10.2012г.
Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Объект: Вычислительный центр "Орбита". Здание 8

Форма 2Б

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2012г

№п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						Всего с начала строительства				За отчетный месяц			
		ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге	ед. изм.	Кол-во	стоимость за ед тенге	Стоимость всего , тенге
1	Здание 01-8 Пятно №7 бетонирование плиты	м3	551	20 750,00	11 433 250,00	м3	551	20 750,00	11 433 250,00	м3	551	20 750,00	11 433 250,00
2	Здание 01-8 Пятно 11 бетонирование резервуара ОВ 3	м3	258	20 750,00	5 353 500,00	м3	258	20 750,00	5 353 500,00	м3	258	20 750,00	5 353 500,00
3	Здание 01-8 Подземный переход	м3				м3				м3			
4	Здание 01-8 Пятно №7 подбетонка	м3	50	20 750,00	1 037 500,00	м3	50	20 750,00	1 037 500,00				
5	Здание 01-8 Пятно №11 подбетонка	м3	63	20 750,00	1 307 250,00	м3	63	20750	1 307 250,00				
6	Здание 01-8 Пятно №12 подбетонка	м3	52	20 750,00	1 079 000,00	м3	52	20750	1 079 000,00				
7	Подземный переход (тоннель) подбетонка	м3	144,648	20 750,00	3 001 446,00	м3	144,648	20750	3 001 446,00				
	Итого		1118,65		23 211 946,00		1118,65		23 211 946,00		809		16 786 750,00

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"
Генеральный директор Бргма В.В.

Субподрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Директор ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

Руководитель проекта
Начальник комплекса
Начальник ПТО
Начальник СДО
Руководитель группы ПТО
Инженер ПТО
Инженер СДО
Начальник участка Курманкалиев Б.О.

Приняты акты скрытых работ и исполнительные схемы

Счет-фактура № 00000000263 от 11 декабря 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №527 от 19.10.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Концерн "Найза-Курылыс" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007404, БИН: 000140002158, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Тлендиева, 3 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ72998BTB0000060579, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по зданию №01-8	тг.	1	14 988 170,00	14 988 170,00	12%	1 798 580,00	16 786 750,00	0	
Всего по счету:					**14 988 170,00**		**1 798 580,00**	**16 786 750,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

ТОП Лтд

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получил

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 688 от 14 Декабря 2012 г.

Поставщик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН(БИН) и адрес места нахождения поставщика: РНН 620300007404 (БИН 000140002158) Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0016056 от 24.08.2012г.
ИИК поставщика: KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана БИК TSESKZKA
Договор (контракт) № 527 от 19.10.12г. ВЦ Орбита
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620300007404 (БИН 000140002158), ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", Адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения

Грузополучатель: РНН 600900527277 (БИН 031040003399), ТОО ТОП Лтд, Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
РНН (БИН), наименование и адрес места нахождения

Получатель: ТОО ТОП Лтд
РНН(БИН) и адрес места нахождения получателя: РНН 600900527277 (БИН 031040003399) Адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"
ИИК получателя: KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	299763.39	299763.39	12 %	35971.61	335735.00	-----	-----
Всего по счету:					**299763.39**		**35971.61**	**335735.00**		-----

Руководитель: Богма Виктор Витальевич (ФИО,подпись)
Главный бухгалтер: Какенова Динара Куанышевна (ФИО,подпись)
М.П.
Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры) зам. главного бухгалтера Дылькова Людмила Ивановна (должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр)-получателю.
Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Акт выполненных работ 1663 от 14 Декабря 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ТОО "Концерн "Найза-Курылыс", в лице руководителя Богма Виктор Витальевич, действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ТОО ТОП Лтд, в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Услуги генподряда	шт	1	335735.00	335735.00
ИТОГО					**335735.00**
в том числе НДС					**35971.61**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание: услуги генподряда 16786750*2%

Исполнитель:ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
РНН 620300007404
ИИК KZ72998BTB0000060579 в АО "Цеснабанк" г.Астана
БИК TSESKZKA
Юр.адрес: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тлендиева, 3,

(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись)

Заказчик: ТОО ТОП Лтд
РНН 600900527277
ИИК KZ42914398914BC01184 в ДБ АО Сбербанк г.Астана БИК SABRKZKA
Юр.адрес: г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В"

(должность, Ф.И.О.)
М. П.
(подпись)

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1

Договор № 434 - от 14 сентября 2012

Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль, 2013 г.

На Противопожарное водоснабжение В2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	60	623,7	14,12	37422,00	847,20	8113,15
		м трубопровода		100,35	5,29	6021,00	317,40	128
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5	200		1000		
		кг						
		Всего прямые затраты по Акту				**38422,00**		
		Накладные расходы, тенге				8113,15		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2792,11		
		Всего по Акту				**49327,26**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	1430,00			1430,00
		Итого по гл.1-8			**50757,26**		**0,00**	**50757,26**

	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	1249,00			1249,00
	Выслуга лет		1%			508,00	508,00
	Доп. отпуска		0,4%			203,00	203,00
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			7415,00	7415,00
	Итого по главе 9			**1249,00**	**0**	**8126,00**	**9375,00**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**52006,26**	**0**	**8126,00**	**60132,26**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	108576,00	0	16965,00	125541,00
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			2511,00	2511,00
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			108576,00	0	19476,00	128052,00
	Налог на добавленную стоимость		12%			15366,24	15366,24
	Итого			108576,00	0	34842,24	143418,24

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проект _____

Начальник комплекс _____

Начальник ПТО _____

Начальник СДО _____

Руководитель группы _____

Инженер ПТО _____

Инженер СДО _____

Начальник участка _____

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс" Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1

Договор № 434 - от 14 сентября 2012

Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА февраль, 2013 г.

На Противопожарное водоснабжение водопровод В2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во по смете	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм *м трубопровода*	135	1565,57 180,23	27,87 10,44	211351,95 24331,05	3762,45 1409,4	32947,78 128
2	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	24	801,76 116,1	15,99 5,99	19242 2786	384 144	3750 128
3	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	40	623,7 100,35	14,12 5,29	24948,00 4014	564,8 211,6	5408,77 128
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	133	343,48	3,96	45683	527	9140

			52,2	1,49	6943	198	128
5 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	77	422,48	3,96	32531	305	5292
	м трубопровода		52,2	1,49	4019	115	128
6 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	264	472,48	3,96	124735	1045	18143
	м трубопровода		52,2	1,49	13781	393	128
7 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	30	200		6000		
	кг						
38 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	140	21,8	0,05	3052,00	7	734,58
	м2		5,81	0,02	813,4	2,8	90
	Всего прямые затраты по Акту				**467542,95**		
	Накладные расходы, тенге				**75416**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**32577,54**		
	Всего по Акту				**575536,62**		

	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	16690,56			16690,56
	Итого по гл.1-8			**592227,18**		**0,00**	**592227,18**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	14568,79			14568,79
	Выслуга лет		1%			5922,27	5922,27
	Доп. отпуска		0,4%			2368,91	2368,91

СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			66555,52	66555,52
	Итого по главе 9			**14568,79**	**0**	**74846,70**	**89415,49**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**606795,97**	**0**	**74846,70**	**681642,67**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	**1266832,22**	**0**	**156260,45**	**1423092,67**
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			28461,85	28461,85
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			**1266832,22**	**0**	**184722,30**	**1451554,52**
	Налог на добавленную стоимость		12%			174186,54	174186,54
	Итого			**1266832,22**	**0**	**358908,84**	**1625741,06**

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Генеральный директор Богма В.В.

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проект

Начальник комплекс

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1

Договор № 434 - от 14 сентября 2012

Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль, 2013 г.

на Хозяйственно-питьевой водопровод В1, Водомерный узел

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	25	329,67	4,19	8241,75	104,75	1965,76
		м трубопровода		59,85	1,58	1496,25	39,5	128
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	10	364,67	4,19	3646,7	41,9	786,30
		м трубопровода		59,85	1,58	598,5	15,8	128
3	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	28	471,67	4,19	13206,76	117,32	2201,65
		м трубопровода		59,85	1,58	1675,8	44,24	128

7 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	8	200	1600		
	Итого по разделу 1			~~26695,21~~		23048,51
	Накладные расходы, тенге			~~4953,72~~		4167,41
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			~~1898,93551~~		1632,955
	Всего по разделу, тенге			~~33547,8607~~		28848,876
	Всего прямые затраты по Акту			~~26695,21~~		23048,51
	Накладные расходы, тенге			~~4953,72~~		4167,41
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			~~1898,94~~		1632,955
	Всего по Акту			~~33547,86~~		28848,876

	Глава 8. Временные здания и сооружения							
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	~~973,00~~ 836,62			~~973,00~~ 836,62	
	Итого по гл.1-8			~~34520,86~~ 29685,50		0,00	~~34520,86~~ 29685,50	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	730,26 ~~849,00~~		296,85 ~~345,00~~	~~849,00~~	730,26
	Выслуга лет		1%				~~345,00~~	296,85
	Доп. отпуска		0,4%		116,74	~~138,00~~	138,00	118,74
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет	730,26	3268,20	~~5153,00~~	3268,20 ~~5153,00~~	
	Итого по главе 9			~~849,00~~	0	~~5636,00~~ 3683,79	~~6485,00~~ 4414,05	

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			30416,76 ~~35369,86~~	0	3683,79 ~~5636,00~~		~~41005,86~~	34099,55
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	63500,19 ~~73843,00~~	0	~~11767,00~~	7690,79	85610,00	71190,98
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%	63500,19		1712,00	1423,82	~~1712,00~~	1423,82
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			~~73843,00~~	0	~~13479,00~~	9114,61	87322,00	72614,80
	Налог на добавленную стоимость		12%	63500,19		~~10478,64~~	8713,78	~~10478,64~~	8713,78
	Итого			~~73843,00~~	0	~~23957,64~~	17828,39	~~97800,64~~	81328,58

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проект

Начальник комплекс

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группь

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Форма 4

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1

Договор № 434 - от 14 сентября 2012

Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА февраль, 2013 г.

На Хозяйственно-питьевой водопровод В1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во по смете	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	20	329,67 59,85	4,19 1,58	6593,40 1197	83,8 31,6	1572,61 128
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	20	364,67 59,85	4,19 1,58	7293,40 1197	83,8 31,6	1572,61 128
3	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	16	471,67 59,85	4,19 1,58	7546,72 957,6	67,04 25,28	1258,09 128

7 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2	200		400		
	кг						
28 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	21,8	0,05	348,80	0,8	83,95
	м2		5,81	0,02	92,96	0,32	90
	Всего прямые затраты по Акту				**22182**		
	Накладные расходы, тенге				**4487**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1600,17**		
	Всего по Акту				**28269,75**		

	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	819,82			819,82
	Итого по гл.1-8			**29089,57**		**0,00**	**29089,57**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	715,60			715,60
	Выслуга лет		1%			290,90	290,90
	Доп. отпуска		0,4%			116,36	116,36
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			3202,59	3202,59
	Итого по главе 9			**715,60**	**0**	**3609,85**	**4325,45**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**29805,18**	**0**	**3609,85**	**33415,02**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	**62225,46**	**0**	**7536,42**	**69761,88**
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1395,24	1395,24

	Сметная стоимость в текущем уровне цен			62225,46	0	8931,66	71157,12
	Налог на добавленную стоимость		12%	-		8538,85	8538,85
	Итого			62225,46	0	17470,51	79695,97

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Генеральный директор Богма В.В.

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проект

Начальник комплекс

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группь

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль, 2013 г.

на Горячее водоснабжение Т3 - Т4

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 Горячее водоснабжение Т4,Т4								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	21	331,6 61,65	4,32 1,63	6963,6 1294,65	90,72 34,23	1700,97 128
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	48	366,9 61,65	4,32 1,63	17611,2 2959,2	207,36 78,24	3887,92 128
3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	28	364,6 61,65	4,32 1,63	10208,8 1726,2	120,96 45,64	2267,96 128
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	13	200		2600		
		Итого по разделу 1				**37383,60**		
		Накладные расходы, тенге				7856,84		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2714,43		
		Всего по разделу, тенге				**47954,87**		
		Всего прямые затраты по Акту				**37383,60**		

	Накладные расходы, тенге			7856,84				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			~~2725,20~~ 2714,43				
	Всего по Акту			~~48145,25~~ 47954,87				
	Глава 8. Временные здания и сооружения							
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	~~1396,00~~ 1390,69			~~1396,00~~ 1390,69	
	Итого по гл.1-8			~~49541,25~~ 49345,56		0,00	~~49541,25~~ 49345,56	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	1213,90 ~~1219,00~~			~~1219,00~~	1213,90
	Выслуга лет		1%			~~495,00~~ 493,46	~~495,00~~	493,46
	Доп. отпуска		0,4%			~~198,00~~ 197,38	~~198,00~~	197,38
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет	1213,90		~~7396,00~~ 5509,85	~~7396,00~~ 5509,85	
	Итого по главе 9			~~1219,00~~	0	~~8089,00~~ 6200,69	~~9308,00~~	7414,59
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			50559,46 ~~50760,25~~	0	6200,69 ~~8089,00~~	~~58849,25~~	56760,15
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	105555,01 ~~105974,00~~	0	12945,43 ~~16888,00~~	~~122862,00~~	118509,44
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%	105555,01		~~2457,00~~ 2370,01	~~2457,00~~	2370,01
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			~~105974,00~~	0	~~19345,00~~ 15315,44	~~125319,00~~	120879,45
	Налог на добавленную стоимость		12%	105556,01		~~15038,28~~ 14504,45	~~15038,28~~	14504,45
	Итого			~~105974,00~~	0	~~34383,28~~ 29819,89	~~140357,28~~	135374,92

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Генеральный директор Богма В.В.

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проекта

Начальник комплекса

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строй: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА февраль, 2013 г.

На Горячее водоснабжение Т3,Т4, Водомерный узел Т3

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во по смете	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Горячее водоснабжение Т3, Т4							
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	130	331,6 61,65	4,32 1,63	43108,00 8014,5	561,6 211,9	10529,79 128
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	20	366,6 61,65	4,32 1,63	7332,00 1233	86,4 32,6	1619,97 128
3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	10	364,6 61,65	4,32 1,63	3646,00 616,5	43,2 16,3	809,98 128
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	8	200		1600		
		Всего прямые затраты по Акту				**55686**		
		Накладные расходы, тенге				**12960**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4118,74**		
		Всего по Акту				**72764,49**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						

СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	2110,17			2110,17
	Итого по гл.1-8			**74874,66**		**0,00**	**74874,66**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	1841,92			1841,92
	Выслуга лет		1%			748,75	748,75
	Доп. отпуска		0,4%			299,50	299,50
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			8360,39	8360,39
	Итого по главе 9			**1841,92**	**0**	**9408,64**	**11250,55**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**76716,58**	**0**	**9408,64**	**86125,21**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	**160164,26**	**0**	**19642,79**	**179807,05**
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			3596,14	3596,14
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			**160164,26**	**0**	**23238,93**	**183403,19**
	Налог на добавленную стоимость		12%			22008,38	22008,38
	Итого			**160164,26**	**0**	**45247,31**	**205411,57**

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Генеральный директор Богма В.В.

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель прое
Начальник компле
Начальник ПТО
Начальник СДО
Руководитель груп
Инженер ПТО
Инженер СДО
Начальник участка

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1

Договор № 434 - от 14 сентября 2012

Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль, 2013 г.

на Система теплоснабжения установки П1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Система теплоснабжения установки П1								
1	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	110	805,72 119,58	16,47 6,17	88629,2 13153,8	1811,7 678,7	17705,60 128
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	55	200		11000		
		Итого по разделу 1				**99629,20**		
		Накладные расходы, тенге				17705,60		

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7040,09		
	Всего по разделу, тенге				**124374,89**		
	Всего прямые затраты по Акту				**99629,20**		
	Накладные расходы, тенге				17705,60		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7040,09		
	Всего по Акту				**124374,89**		
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	3607,00			3607,00
	Итого по гл.1-8			**127981,89**		**0,00**	**127981,89**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	3148,00			3148,00
	Выслуга лет		1%			1280,00	1280,00
	Доп. отпуска		0,4%			512,00	512,00
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			19106,00	19106,00
	Итого по главе 9			**3148,00**	**0**	**20898,00**	**24046,00**
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**131129,89**	**0**	**20898,00**	**152027,89**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	273765,00	0	43630,00	317395,00
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			6348,00	6348,00

	Сметная стоимость в текущем уровне цен			273765,00	0	49978,00	323743,00
	Налог на добавленную стоимость		12%			38849,16	38849,16
	Итого			273765,00	0	88827,16	362592,16

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проекта

Начальник комплекса

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка Курманалиев Б.О.

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА февраль, 2013 г.

На Вентиляцию

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 5. ВЕ1								
53	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,826	1810,92 259,88	13,82 5,18	5118 734	39 15	959 128
56	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке *м2 поверхности изоляции*	4,24	210,92 100,8	92,82 34,88	894 427	394 148	575 100
57	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	0,212	6240		1323		
58	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м *рулон*	0,54	847		457		
59	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	11	93		1023		
		Итого по разделу 5				**8815,00**		
		Накладные расходы, тенге				1534,00		

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				620,94		
	Всего по разделу, тенге				**10349,00**		
	Раздел 6. ВЕ2						
60	E20-3-1						
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,304	1810,92	13,82	20471	156	3836
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	2938	59	128
63	E26-12-1						
	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	14,2	210,92	92,82	2995	1318	1926
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	1431	495	100
64	1-3-165						
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,71	6240		4430		
	м3						
65	1-3-544						
	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м	1,08	847		915		
	рулон						
66	13-12-78						
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	22	93		2046		
	кг						
	Итого по разделу 6				**30857,00**		
	Накладные расходы, тенге				5762,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2197,14		
	Всего по разделу, тенге				**38816,14**		
	Раздел 7. ВЕ3 - ВЕ9						
67	E20-3-1						
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	39,564	1810,92	13,82	71647	547	13423
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	10282	205	128
70	E26-12-1						
	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	50	210,92	92,82	10546	4641	6784
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	5040	1744	100

71	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	2,5	6240		15600	
72	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м *рулон*	3,78	847		3202	
73	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	78	93		7254	
		Итого по разделу 7				**108249,00**	
		Накладные расходы, тенге				20207,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7707,36	
		Всего по разделу, тенге				**136163,36**	

Раздел 8. ВЕ10 - ВЕ16

74	E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	37,68	1810,92	13,82	68235	521	12783
				259,88	5,18	9792	195	128
77	E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке *м2 поверхности изоляции*	50	210,92	92,82	10546	4641	6784
				100,8	34,88	5040	1744	100
78	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	2,5	6240		15600		
79	1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м *рулон*	3,6	847		3049		
80	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	75	93		6975		
		Итого по разделу 8				**104405,00**		
		Накладные расходы, тенге				19567,00		

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7438,32		
	Всего по разделу, тенге				**131410,32**		
Раздел 9. ВЕ17							
81	E20-3-1						
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,669	1810,92	13,82	4833	37	906
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	694	14	128
84	E26-12-1						
	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4	210,92	92,82	844	371	543
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	403	140	100
85	1-3-165						
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,2	6240		1248		
	м3						
86	1-3-544						
	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м	0,51	847		432		
	рулон						
87	13-12-78						
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11	93		1023		
	кг						
	Итого по разделу 9				**8380,00**		
	Накладные расходы, тенге				1449,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				589,74		
	Всего по разделу, тенге				**10418,74**		
Раздел 10. ВЕ18							
88	E20-3-1						
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,884	1810,92	13,82	3412	26	640
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	490	10	128
92	E26-12-1						
	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4	210,92	92,82	844	371	543
	м2 поверхности изоляции						

			100,8	34,88	403	140	100
93	1-3-165						
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,2	6240		1248		
	м3						
94	1-3-544						
	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м	0,18	847		152		
	рулон						
95	13-12-78						
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3,8	93		353		
	кг						
	Итого по разделу 10				**6009,00**		
	Накладные расходы, тенге				1183,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				431,52		
	Всего по разделу, тенге				**7623,52**		

Раздел 13. ВЕ18 - ВЕ23 в осях 13-20

112	E20-3-1						
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	33,912	1810,92	13,82	61412	469	11506
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	8813	176	128
115	E26-12-1						
	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	44	210,92	92,82	9280	4084	5970
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	4435	1535	100
116	1-3-165						
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	2,2	6240		13728		
	м3						
117	1-3-544						
	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м	3,24	847		2744		
	рулон						
118	13-12-78						
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	67	93		6231		
	кг						
	Итого по разделу 13				**93395,00**		

	Накладные расходы, тенге				17476,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6652,26		
	Всего по разделу, тенге				**117523,26**		
	Раздел 14. ВЕ24						
119	Е20-3-1						
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,826	1810,92	13,82	5118	39	959
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	734	15	128
122	Е26-12-1						
	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4,4	210,92	92,82	928	408	597
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	444	153	100
123	1-3-165						
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,22	6240		1373		
	м3						
124	1-3-544						
	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип АА 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м	0,54	847		457		
	рулон						
125	13-12-78						
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11	93		1023		
	кг						
	Итого по разделу 14				**8899,00**		
	Накладные расходы, тенге				1556,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				627,30		
	Всего по разделу, тенге				**11082,30**		
	Раздел 15. ВЕ25 - ВЕ30						
126	Е20-3-1						
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	35,168	1810,92	13,82	63686	486	11931
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	9139	182	128
129	Е26-12-1						
	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	44	210,92	92,82	9280	4084	5970

	м2 ерхности изоляции			100,8	34,88	4435	1535	100
130 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	2,2	6240			13728		
	м3							
131 1-3-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AA 130 ALU, цвет алюминий, ширина 50 мм, длина 50 м	3,36	847			2846		
	рулон							
	Итого по разделу 15					**89540,00**		
	Накладные расходы, тенге					17901,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					6446,46		
	Всего по разделу, тенге					**113887,46**		
	Всего прямые затраты по Акту					**458549,00**		
	Накладные расходы, тенге					86635,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					32711,04		
	Всего по Акту					**577895,04**		
	Глава 8. Временные здания и сооружения							
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	16759,00			16759,00	
	Итого по гл.1-8			**594654,04**		**0,00**	**594654,04**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	14628,00			14628,00	
	Выслуга лет		1%			5947,00	5947,00	
	Доп. отпуска		0,4%			2379,00	2379,00	
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			88850,00	88850,00	
	Итого по главе 9			**14628,00**	**0**	**97176,00**	**111804,00**	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**609282,04**	**0**	**97176,00**	**706458,04**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	1272022,00	0	202878,00	1474900,00	
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			29498,00	29498,00	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			1272022,00	0	232376,00	1504398,00	

	Налог на добавленную стоимость		12%			180527,76	180527,76
	Итого			1272022,00	0	412903,76	1684925,76

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проекта

Начальник комплекса

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы ПТО

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Форма 4

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2
ЗА февраль, 2013 г.

На Отопление

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во по смете	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	57	266,17 53,77	4,08 1,53	15171,69 3064,89	232,56 87,21	4034,69 128
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	16	345,17 53,77	4,08 1,53	5522,72 860,32	65,28 24,48	1132,54 128
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	10	424,17 53,77	4,08 1,53	4241,70 537,7	40,8 15,3	707,84 128
5	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	50	608,51	8,19	30425,50	409,5	4512,00

	м трубопровода						
			67,44	3,06	3372	153	128
10 8-10-45	Подвески и хомуты для крепления труб	996	200		199200,00		
	кг						
	Всего прямые затраты по Акту				**254562**		
	Накладные расходы, тенге				**10387**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15897		
	Всего по Акту				280846		
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	8144,52			8144,52
	Итого по гл.1-8			**288990**		**0,00**	**288990**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	7109,16			7109,16
	Выслуга лет		1%			2889,90	2889,90
	Доп. отпуска		0,4%			1155,96	1155,96
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			29293,37	29293,37
	Итого по главе 9			**7109,16**	**0**	**33339,24**	**40448,39**
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**296099,28**	**0**	**33339,24**	**329438,52**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	618178,32	0	69603,66	687781,97
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			13755,64	13755,64
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			618178,32	0	83359,30	701537,61
	Налог на добавленную стоимость		12%			84184,51	84184,51

618178,32 167543,81 785722,13

	Итого			1329277,81	0	360271,89	1689549,70

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс" Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В. Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проект _____
Начальник комплекс _____
Начальник ПТО _____
Начальник СДО _____
Руководитель группь _____
Инженер ПТО _____
Инженер СДО _____
Начальник участка _____

Форма 4

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"
Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1
Договор № 434 - от 14 сентября 2012
Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль, 2013 г.

на Отопление

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	500	268,17	4,08	134085,00	2040,00	35392,00
		м трубопровода		53,77	1,53	26885,00	765,00	128
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	200	266,17	4,08	53234,00	816,00	14156,80
		м трубопровода		53,77	1,53	10754,00	306,00	128
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	200	345,17	4,08	69034,00	816,00	14156,80
		м трубопровода		53,77	1,53	10754,00	306,00	128
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	200	424,17	4,08	84834,00	816,00	14156,80
		м трубопровода		53,77	1,53	10754,00	306,00	128

6	Е18-9-8	Установка регистров из стальных свар.. их труб диаметром 100 мм 159 *м труб нитки регистра*	47,5	1428,58 38,71	8,09 3,04	67857,55 1838,73	384,28 144,40	2538,40 128
10	8-10-45	Подвески и хомуты для крепления труб *кг*	800	200		160000,00		
		Всего прямые затраты по Акту				**569044,55**		
		Накладные расходы, тенге				80400,80		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38966,72		
		Всего по Акту				**688412,07**		

	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	19964,00			19964,00
	Итого по гл.1-8			**708376,07**		**0,00**	**708376,07**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	17426,00			17426,00
	Выслуга лет		1%			7084,00	7084,00
	Доп. отпуска		0,4%			2834,00	2834,00
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			109074,00	109074,00
	Итого по главе 9			**17426,00**	**0**	**118992,00**	**136418,00**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**725802,07**	**0**	**118992,00**	**844794,07**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	1515286,00	0	248424,00	1763710,00
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			35274,00	35274,00
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			1515286,00	0	283698,00	1798984,00

	Налог на добавленную стоимость		12%			215878,08	215878,08
	Итого			1515286,00	0	499576,08	2014862,08

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проекта

Начальник комплекса

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс"

Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1

Договор № 434 - от 14 сентября 2012

Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА февраль, 2013 г.

На Систему теплоснабжения установки П1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во по смете	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Система теплоснабжения установки П1								
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	70	200		14000		
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	27	21,8 5,81	0,05 0,02	588,60 156,87	1,35 0,54	141,67 90
		Всего прямые затраты по Акту				**14589**		
		Накладные расходы, тенге				**141,67**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**883,82**		
		Всего по Акту				**15614,09**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения		2,90%	452,81			452,81
		Итого по гл.1-8			**16066,89**		**0,00**	**16066,89**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						

СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	395,25			395,25
	Выслуга лет		1%			160,67	160,67
	Доп. отпуска		0,4%			64,27	64,27
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет			1604,52	1604,52
	Итого по главе 9			**395,25**	**0**	**1829,46**	**2224,70**

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**16462,14**	**0**	**1829,46**	**18291,59**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	34368,67	0	3819,43	38188,09
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			763,76	763,76
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			34368,67	0	4583,19	38951,86
	Налог на добавленную стоимость		12%			4674,22	4674,22
	Итого			34368,67	0	9257,41	43626,08

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Генеральный директор Богма В.В.

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проект

Начальник комплекс:

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группь

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка

Заказчик: ТОО "Концерн "Найза-Курылыс" Форма 4

Генподрядчик "ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "Орбита" Здание №1

Договор № 434 - от 14 сентября 2012

Наименование объекта :Здание № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2

ЗА февраль, 2013 г.

На Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 8 Кровля								
8.1 Кровля								
166	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	1390	1268 272,95	8,2 3,08	1762520 379401	11398 4281	456581 119
167	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	805,88	715,87 153,23	1,24 0,47	576905 123485	999 379	164739 133
168	1-1-701	Прокладки уплотнительные 30 мм *100м*	4,998	8800		43982		

Итого по разделу 8	**2 383 407,72**
Накладные расходы, тенге	621 320,02
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	180 283,66
Всего по разделу, тенге	2 185 011,40

Раздел 18 Разные работы

18.13 Вентшахты и козырки

369	E9-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен, сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,5396	9883,8	2860,42	5333	1543	3417
		т конструкций		6300	736,43	3399	397	90
370	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,5396	172800		93243		
		т						
371	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,79	715,87	1,24	4145	7	1059
		м2 покрытия		153,23	0,47	887	3	119
141	99-11-12(пл)	Облицовочный кирпич	~~10522~~	~~35~~		~~368270~~		
		шт						
369	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	~~149,7~~	~~38,93~~	~~0~~	~~5828~~	0	~~6877~~
		м2 стен(без вычета проемов)		38,93	0	5828	0	118
373	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	14,83	112,46	34,25	1668	508	795
		м2		51,08	8,45	758	125	90
374	1-1-426	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	16,313	1180		19249		
		м2						

18.14 Выход на крышу

375	E10-15-1	Устройство слуховых окон	12	3960,69	81,61	47528	979	14321
		слуховое окно		963	31,5	11556	378	120
376	E9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,01802	9850,47	1162,94	178	21	121
		т конструкций		7357,5	108	133	2	90
377	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,01802	162700		2932		
		т						
378	E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	6	1134,9	8,2	6809	49	1709

	м2 кровли	236,25	,08	1418	18	119
	Итого по разделу 18		181085	~~555 183,05~~		
	Накладные расходы, тенге		21412	~~28 298,25~~		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		12150	~~35 008,88~~		
	Всего по разделу, тенге		214647	~~618 490,17~~		
	Всего прямые затраты по Акту		2564492	~~2 938 590,76~~		
	Накладные расходы, тенге		625391	~~649618,27~~		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		191393	~~215292,54~~		
	Всего по Акту		3381276	~~3 803 501,57~~		

	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02 09-2002	Временные здания и сооружения		2,90%	~~110301,55~~ 98057			~~110301,55~~ 98057
	Итого по гл.1-8			~~3913803,12~~ 3479333		0,00	~~3913803,12~~ 3479333
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-09-2002 п7.1.априм	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,460%	85592 ~~96279,56~~			85592 ~~96279,56~~
	Выслуга лет		1%			~~39138,03~~	34793 ~~39138,03~~
	Доп. отпуска		0,4%			~~15655,21~~	13917 ~~15655,21~~
СН РК 8.02-07-2002	Вахтовый метод работ		расчет	85592	651876	~~733287,13~~	~~733287,13~~
	Итого по главе 9			~~96279,56~~	0	~~788080,37~~ 700586	651876 ~~884359,93~~ 786178
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			3564925 ~~4010082,68~~	0	700586 ~~788080,37~~	4265511 ~~4798163,05~~
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		2,08774	7442636 ~~8372010,01~~	0	1462641 ~~1645306,92~~	8905277 ~~10017316,93~~
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			~~200346,34~~	178106 ~~200346,34~~
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			~~8372010,01~~	0	~~1845653,26~~	9083383 ~~10217663,27~~
	Налог на добавленную стоимость		12%			~~1226119,59~~	1090006 ~~1226119,59~~
	Итого			~~8372010,01~~	0	~~3071772,85~~	~~11443782,86~~

10173389

Генподрядчик: ТОО"Концерн "Найза-Курылыс"

Генеральный директор Богма В.В.

Субподрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Руководитель проекта

Начальник комплекса

Начальник ПТО

Начальник СДО

Руководитель группы

Инженер ПТО

Инженер СДО

Начальник участка
