ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМІ
ШЕШІМ

№ 85 30 қыркүйек 2011 ж.

Орал қаласы әкімінің
2011 жылғы 14 қыркүйектегі №78
«Салынған нысананы пайдалануға
қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау
комиссиясының актін бекіту туралы»
шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 73,78-баптарын басшылыққа алып, «Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы» ММ-нің қолдаухаты негізінде, **ШЕШЕМІН:**

1.Орал қаласы әкімінің 2011 жылғы 14 қыркүйектегі №78 «Салынған нысананы пайдалануға қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясының актін бекіту туралы» шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

- Кестеде «Жалпы алаңы (жобалау)» сөздерінің орнына «Ғимараттың жалпы алаңы (пәтердің жалпы алаңы)» деп оқылсын;
- «8921,44» сандарының орнына «15164,58 (9856,8) ш.м.» деп оқылсын.

2.Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі бекітілген тәртіппен құжаттарды ресімдесін.

Қала әкімі **С.Оразов**

УТВЕРЖДЕН
Решением акима г. Уральска
№ _____ от 2011 года
(дата номер решения (приказ, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица
подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
государственной приёмочной комиссии
о приёмке построенного объекта в эксплуатацию

от " 09 " сентября 2011 года *"Строительство девятиэтажного 240 квартирного жилого дома № 1 в 5-ом микрорайоне г. Уральска ЗКО"*
(место нахождение объекта)

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) *от " 25 " июня 2010 года № 28 Акимат города Уральска*
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
Председателя комиссии:
Тусупкалиев М. Б. заместитель Акима города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя комиссии представителя государственной архитектурно-строительной инспекции:
Паленов А. В. главный специалист отдела контроля за качеством строительства управления архитектурно-строительного контроля ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
Представитель подрядчика *Потиченко С. А. зам.генерального директора ТОО "Альтаир"*
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации
Мамбеталиев Р. Г. заведующий сектором ЖКХ
ГФ АО "ЗапказРЭК" Гайсин А. Б. начальник кабельной службы
ГККП "ОралСуАрнасы" Саказов А. Г. главный инженер
АО "Казахтелеком" Полевой В. В. начальник технического отдела АО "Казахтелеком"
АО "Жайыктеплоэнерго" Куанышкалиев З. К технический директор
ЗКАО "КазТрансГаз Аймак" Омаров Б. А. начальник эксплуатации

органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора
Кулманова В. Е. главный специалист городского управления санитарно-эпидемиологического надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного противопожарного надзора
Бисембаев К. У. начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции *Зулкашев Е. У. начальник отдела контроля безопасности и охраны труда*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кушнер В. В. начальник отдела архитектуры и строительства г. Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

Разов М. А. начальник отдела земельных отношений г. Уральска

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мукиев А. и.о. заместителя начальника управления ГУ"Управление строительства ЗКО"

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ним В. В. и.о. начальника Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тлегенов С. Б. государственного экологического инспектора ЗКФЖКДЭ

(фамилия, имя, отчество, должность)

Фадин А. В. - директор ТОО "ЗапПроектServis"

(фамилия, имя, отчество, должность)

Питерсков С. М. инженер технического надзора ЗКОФ АО "НЦ"Курылсконсалтинг"

(фамилия, имя, отчество, должность)

Аубекеров А. У. инспектор УГФ НДП "Нур Отан"

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) *Управление строительства ЗКО (заказчик) совместно с ТОО "Альтаир " (ген.подрядчик)*

(наименование организации)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию построенный объект *Девятиэтажный 240 квартирный жилой дом № 1 в 5-ом микрорайоне г. Уральска, г. Уральск ул.*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: *Западно-Казахстанская область, г. Уральск, 5-ый микрорайон д.1*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказа, постановления и др.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *07 июня 2011 года № 271 от ГУ "Управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-казахстанской области"*

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось Генеральным подрядчиком *ТОО "Альтаир"*

(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы по строительству " Девятиэтажного 240 квартирного жилого дома № 1 в 5-ом микрорайоне г. Уральска ЗКО"*

(виды работ)

субподрядными организациями *ТОО "Эврика", ТОО "Уральсклифт", ТОО "СМП", ТОО "Шебер", ТОО "ALFACOM"*

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО "ЗапПроект SERVIS" (г. Уральск),***

(наименования организаций и их ведомственные подчиненность)

выполнившим ***ПСД в составе: рабочие чертежи***

(наименование частей или разделов документации)

субподрядными организациями _____

(наименования организаций и их ведомственные подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трёх указать перечень в приложении _____ к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы. Заключение по обследованию строительных конструкций здания ***Управление строительства ЗКО***

(наименование научно-исследовательских и взыскательных организаций)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) ***рабочий проект № 11.002***

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

7. Проектно сметная документация утверждена ***ДГП "Запгосэкспертиза"от " 18 "мая 2011г. № 09-0213/1***

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2011 года*** окончание работ ***август 2011 года***

(месяц и год) (месяц и год)

по норме или ПОС 10 месяцев; фактически 5 месяцев

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация ***проектная и исполнительно-техническая документация, сертификаты качества***

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности производительности, производственной площади, способности, число рабочих мест и т. п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Мощность производительность и т.д.	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
этажность	этаж	9		9	
вместимость	шт.кв.	240		240	
пл.застройки	м2	1939,20		1939,20	
строй.объем	м3	58027,48		58027,48	
Общая пл.здания	м2	15164,58		15164,58	

(краткие технологические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывабезопастности, пожаробезопастности, охране труда природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____ ***выполнены согласно проекта***

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Недоделки и дефекты, выявлены рабочими комиссиями, устранены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ***979 640,46*** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***832 858,59*** тыс.тенге. Оборудования, инструменты и инвентаря ***13 185,52*** тыс.тенге.

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____

(по жилым зданиям не заполняется)

архитектурно-строительных работ (включая объёмно планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии
Предъявленный к приёмке объект: ***Девятиэтажный 240 квартирный жилой дом № 1 в 5-ом микрорайоне г. Уральска ЗКО"*** (наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приёмочной комиссии:

_____ Тусупкалиев М. Б.

_____ Паленов А. В.

Члены Государственной приёмочной комиссии:

_____ Кулманова В. Е.

_____ Бисембаев К. У.
Ростиов 10.15.

_____ Зулкашев Е. У.

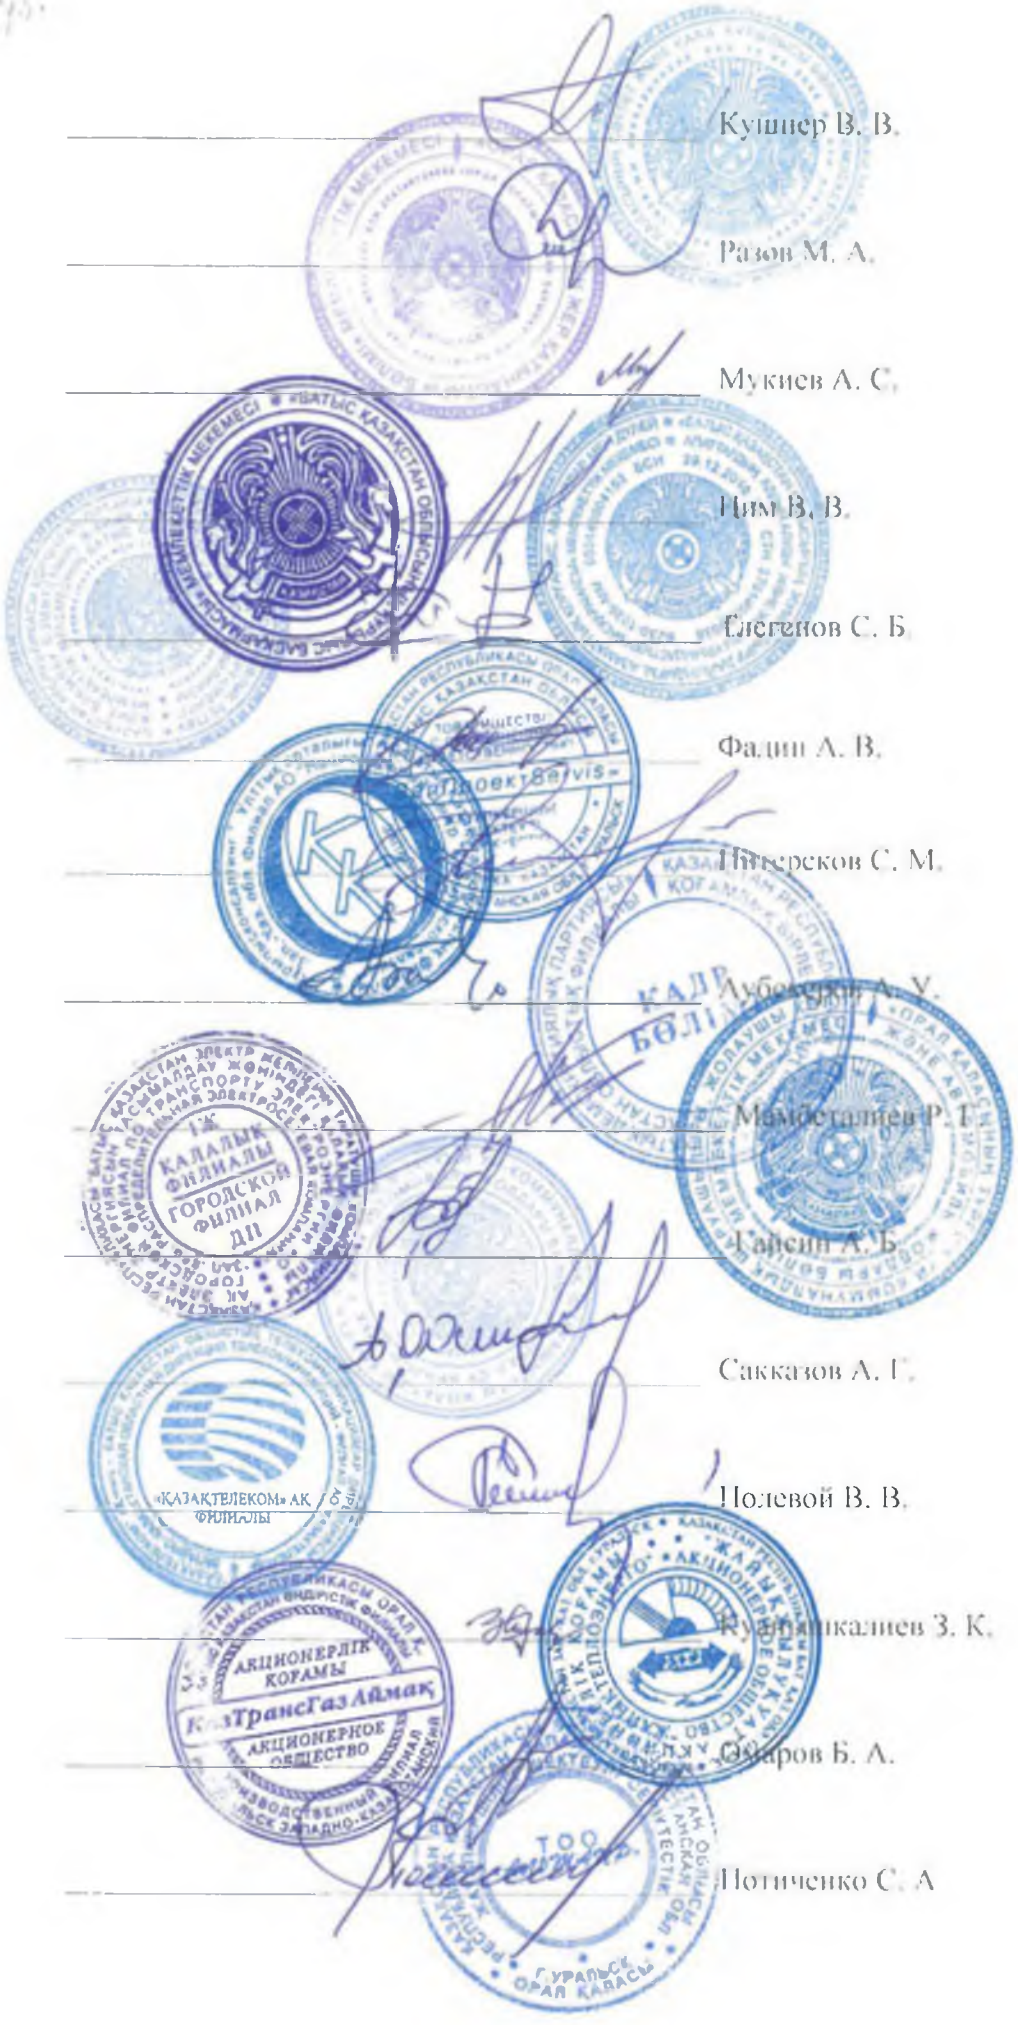

Кушнер В. В.

Разов М. А.

Мукиев А. С.

Ним В. В.

Елегенов С. Б.

Фадин А. В.

Питерсков С. М.

Аубекеров А. У.

Мамбеталиев Р. Т.

Гайсин А. Б.

Сакказов А. Г.

Полевой В. В.

Кульпинкалиев З. К.

Омаров Б. А.

Потиченко С. А

Форма №3

Подрядчик: ТОО "Альтаир"
Субподрядчик: ТОО "ЭВРИКА"
Объект: Сантехнические работы (отопление,водопровод,канализация)на объекте:Девятиэтажный 240 кв. жилой дом №1 в 5-м микрорайоне г.Уральска"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль 2011** года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор № 17 января 2011	Источник финансирования Наименов	Код	Организ. прав.форма №		Дата

№ п/п	Наименование центра затрат	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс тенге: С начала работ по договору по отчетный период период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР в базисных ценах	доп затраты: приобрет мат-лов	доп затраты: др. доп. затраты	Налоги на добавленную стоимость	Всего с НДС
		А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Всего по объекту										
		в том числе за июль	10178,463								1221,416	11399,879
		ОТОПЛЕНИЕ		6011,573							721,389	6732,962
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		4166,890							500,027	4666,917
		Итого		10178,463							1221,416	11399,879

Всего выполнено за июль 11 399 879 (Одиннадцать миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят девять) тенге

Подрядчик: _____

Субподрядчик: _____

Заказчик Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Альтаир"
Субподрядчик ТОО "Эврика"
Договор от 10июня 2011г

Наименование строительства и его адрес: 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 240 КВ.ЖИЛОЙ ДОМ №1 В 5-М МИКРОРАЙОНЕ Г.УРАЛЬСКЕ

Наименование обьекта:

А К Т N
ОТОПЛЕНИЕ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	16-15-3	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2,60 0,16	10 1
2.	С	Стальной фланцевый шаровый кран д 65мм	шт	2,00	6188,70 --	-- --	12377 --	-- --	-- --	-- --
3.	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	5,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	6204 652	104 39	0,72 0,04	4 0
4.	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	102,00	935,75 130,50	20,80 7,79	95446 13311	2122 795	0,72 0,04	74 4
5.	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	110,00	623,70 100,35	14,12 5,29	68607 11038	1553 582	0,55 0,03	61 3
6.	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	54,00	801,76 116,10	15,99 5,99	43295 6269	863 323	0,66 0,03	35 2
7.	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	543,00	266,48 52,20	3,96 1,49	144699 28345	2150 809	0,30 0,01	161 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	2008,00	264,48	3,96	531076	7952	0,30	596
					52,20	1,49	104818	2992	0,01	15
9.	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	92,00	343,48	3,96	31600	364	0,30	27
					52,20	1,49	4802	137	0,01	1
10.	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	130,00	422,48	3,96	54922	515	0,30	39
					52,20	1,49	6786	194	0,01	1
11.	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	125,00	472,48	3,96	59060	495	0,30	37
					52,20	1,49	6525	186	0,01	1
12.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3008,00	10,99	--	33058	--	0,05	151
					10,69	--	32156	--	--	--
13.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	161,00	11,13	--	1792	--	0,05	8
					10,69	--	1721	--	--	--
14.	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	657,30	181,44	35,77	119261	23513	0,70	462
					111,70	13,40	73423	8808	0,07	43
15.	8-10-45	Кронштейны для радиаторов	кг	362,00	200,00	--	72400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	18,00	961,78	8,09	17312	146	0,25	4
					38,71	3,04	697	55	0,01	0
17.	16-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	483,00	473,47	39,24	228686	18953	1,47	710
					254,25	15,75	122803	7607	0,07	34
18.	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	350,00	--	1050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	480,00	395,00	--	189600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	16-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	195,00	473,47	39,24	92327	7652	1,47	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					254,25	15,75	49579	3071	0,07	14
21.	16-15-2	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	21,00	473,47	39,24	9943	824	1,47	31
					254,25	15,75	5339	331	0,07	1
22.	С	Шаровый кран д 15мм	шт	83,00	326,16	--	27071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Шаровый кран д 20мм	шт	112,00	505,73	--	56642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Шаровый кран д 32мм	шт	2,00	1270,62	--	2541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Шаровый кран д 40мм	шт	14,00	2058,02	--	28812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Шаровый кран д 50мм	шт	5,00	2939,65	--	14698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	8,00	2954,47	38,10	23636	305	1,14	9
					201,62	13,91	1613	111	0,07	1
28.	24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	шт	3,00	8099,95	85,07	24300	255	3,11	9
					585,00	11,25	1755	34	0,06	0
29.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	330,00	200,00	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	16-15-3	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
31.	9-4-73	Краны шаровые Dy 80 мм 200 град.С, P 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	3,00	10500,00	--	31500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	1,00	5320,13	56,38	5320	56	2,80	3
					522,00	9,00	522	9	0,04	0
33.	24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	шт	2,00	6918,61	66,73	13837	133	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					535,50	11,25	1071	23	0,06	0
34.	18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	65,00	28,13	--	1828	--	0,12	8
					22,50	--	1462	--	--	--
35.	С	Кран воздушный д 15мм	шт	65,00	89,00	--	5785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								2120931

ИТОГО:	2120929	68587
	477821	26342

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4437
На сантехнические работы	640960
Всего накладных расходов:	645397
Итого с накладными	2766328

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	165980
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2932308
Итого с временными, 1,1 %	2964563
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	3009921
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3021779
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3051425
Пересчет в текущих ценах, К-1,93146	5893699
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	117874
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6011573
Налог на добавленную стоимость, 12 %	721389
Итого с НДС	6732962

Принял:

Сдал:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Альтаир"
Субподрядчик ТОО "Эврика"
Договор от 10 июня 2011г.

Наименование строительства и его адрес: 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 240 КВ.ЖИЛОЙ ДОМ №1 В 5-М МИКРОРАЙОНЕ Г,УРАЛЬСКЕ

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	470,00	748,88 102,38	1,43 0,54	351974 48119	672 254	0,56 0,00	263 1
2.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	337,50	620,54 106,20	0,64 0,25	209432 35842	216 84	0,58 0,00	197 0
3.	С	Отводы д 50 90 град	шт	120,00	75,91 --	-- --	9110 --	-- --	-- --	-- --
4.	С	Отводы д 100 90 град	шт	3,50	131,93 --	-- --	462 --	-- --	-- --	-- --
5.	С	Тройник 50х50х50	шт	240,00	131,93 --	-- --	31663 --	-- --	-- --	-- --
6.	С	Тройник 110х110х110	шт	260,00	343,44 --	-- --	89294 --	-- --	-- --	-- --
7.	С	Отводы д 100 45 град	шт	10,50	131,93 --	-- --	1385 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С	Тройник 110х110х110 45 град	шт	8,00	343,44	--	2748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Тройник 50х110х110	шт	102,00	239,78	--	24457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Крестовина 110Кх110Кх110Кх110К	шт	3,00	343,44	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Патрубок П50Кх110С	шт	120,00	74,87	--	8984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Ревизия д 100	шт	54,00	288,47	--	15577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Прочистка д 100	шт	16,00	288,47	--	4615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Прочистка д 50	шт	121,50	138,74	--	16857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Крепления канализационных трубопроводов	шт	180,00	37,69	--	6785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								774373
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
16.	16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	7,00	891,93	90,13	6244	631	2,60	18
					447,75	33,75	3134	236	0,16	1
17.	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	7,00	6480,00	--	45360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	14,00	572,00	--	8008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,	шт	1,00	1060,00	--	1060	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
20.	16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	6,00	1550,07 117,00	19,03 7,13	9300 702	114 43	0,69 0,03	4 0
21.	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	0,80	693,07 76,95	10,34 3,87	554 62	8 3	0,43 0,02	0 0
22.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,20	329,67 59,85	4,19 1,58	66 12	1 --	0,34 0,01	0 0
23.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	347 251	44 2	73,60 0,49	1 0
24.	2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,02	107900,00 --	-- --	2158 --	-- --	-- --	-- --
25.	16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	95,00	1550,07 117,00	19,03 7,13	147257 11115	1808 677	0,69 0,03	66 3
26.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	471,67 59,85	4,19 1,58	4717 598	42 16	0,34 0,01	3 0
27.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	430,50	362,67 59,85	4,19 1,58	156129 25765	1804 680	0,34 0,01	145 3
28.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	108,00	200,00 --	-- --	21600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								402800
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3								
29.	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	3,00	891,93 447,75	90,13 33,75	2676 1343	270 101	2,60 0,16	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 100 мм								
30.	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	5190,00 --	-- --	15570 --	-- --	-- --	-- --
31.	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	458,00 --	-- --	2748 --	-- --	-- --	-- --
32.	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	864,00 --	-- --	864 --	-- --	-- --	-- --
33.	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	7,00	1082,42 92,93	12,21 4,57	7577 651	85 32	0,56 0,02	4 0
34.	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	0,80	693,07 76,95	10,34 3,87	554 62	8 3	0,43 0,02	0 0
35.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,20	329,67 59,85	4,19 1,58	66 12	1 --	0,34 0,01	0 0
36.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	347 251	44 2	73,60 0,49	1 0
37.	2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,02	107900,00 --	-- --	2158 --	-- --	-- --	-- --
38.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	430,50	362,67 59,85	4,19 1,58	156129 25765	1804 680	0,34 0,01	145 3
39.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	42,00	471,67 59,85	4,19 1,58	19810 2514	176 66	0,34 0,01	14 0
40.	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	596,67 59,85	4,19 1,58	4773 479	34 13	0,34 0,01	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	40,00	693,07	10,34	27723	414	0,43	17
					76,95	3,87	3078	155	0,02	1
42.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,00	200,00	--	19400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3								260396
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т4								
43.	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	15,00	596,67	4,19	8950	63	0,34	5
					59,85	1,58	898	24	0,01	0
44.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	40,00	471,67	4,19	18867	168	0,34	13
					59,85	1,58	2394	63	0,01	0
45.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	470,00	362,67	4,19	170455	1969	0,34	158
					59,85	1,58	28130	743	0,01	4
46.	С	Шаровый кран д 40мм	шт	1,00	2058,02	--	2058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Шаровый кран д 32мм	шт	1,00	1270,62	--	1271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,20	329,67	4,19	66	1	0,34	0
					59,85	1,58	12	--	0,01	0
49.	16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
50.	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	3,00	1530,00	--	4590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	8-9-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20	компл	6,00	1170,00	--	7020	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм			--	--	--	--	--	--
52.	16-15-2	Установка клапанов обратных,на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
53.	9-3-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --
54.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	63,00	200,00 --	-- --	12600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т4								229020
ИТОГО:							1666588 192206	10532 3940		1074 19

Накладные расходы :

На металломонтажные работы	456
На сантехнические работы	250420
Всего накладных расходов:	250876
Итого с накладными	1917464

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	115049
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2032513
Итого с временными, 1,1 %	2054871
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	2086311
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2094530
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2115079
Пересчет в текущих ценах, К-1,93146	4085186
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 :	81704
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4166890
Налог на добавленную стоимость, 12 %	500027
Итог : НДС	4666917

Принял: Сдал:

Форма №3

Подрядчик: ТОО "Альтаир"
Субподрядчик: ТОО "ЭВРИКА"
Объект:Сантехнические работы (отопление,водопровод,канализация)на объекте:Девятиэтажный 240 кв. жилой дом №1 в 5-м микрорайоне г.Уральска"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август 2011** года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор № 10 июня 2011	Источник финансирования Наименов	Код	Организ. прав.форма №		Дата

№ п/п	Наименование центра затрат	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала работ по договору по отчетный период период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР в базисных ценах	доп.затраты: приобрет. мат-лов	доп.затраты: др. доп. затраты	Налоги на добавленную стоимость	Всего с НДС
		А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		**Всего по объекту:**										
		в том числе за август	23348,319								2801,799	26150,118
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		13169,856							1580,383	14750,239
		Итого		13169,856							1580,383	14750,239

Всего выполнено за август 14 750 239(Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч двести тридцать девять) тенге

Подрядчик: _____

Субподрядчик: _____

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Альтаир"
Субподрядчик ТОО "Эврика"
Договор от 10 июня 2011г.

Наименование строительства и его адрес: 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 240 КВ.ЖИЛОЙ ДОМ №1 В 5-М МИКРОРАЙОНЕ Г,УРАЛЬСКЕ

Наименование обьекта:

А К Т N2-2-3
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	572,00	748,88 102,38	1,43 0,54	428359 58561	818 309	0,56 0,00	320 1
2.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	337,50	620,54 106,20	0,64 0,25	209432 35842	216 84	0,58 0,00	197 0
3.	С	Отводы д 50 90 град	шт	120,00	75,91 --	--	9110 --	--	--	--
4.	С	Отводы д 100 90 град	шт	3,50	131,93 --	--	462 --	--	--	--
5.	С	Тройник 50х50х50	шт	240,00	131,93 --	--	31663 --	--	--	--
6.	С	Тройник 110х110х110	шт	260,00	343,44 --	--	89294 --	--	--	--
7.	С	Отводы д 100 45 град	шт	10,50	131,93 --	--	1385 --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С	Тройник 110х110х110 45 град	шт	8,00	343,44	--	2748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Тройник 50х110х110	шт	102,00	239,78	--	24457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Крестовина 110Кх110Кх110Кх110К	шт	3,00	343,44	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Патрубок П50Кх110С	шт	120,00	74,87	--	8984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Ревизия д 100	шт	54,00	288,47	--	15577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Прочистка д 100	шт	16,00	288,47	--	4615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Прочистка д 50	шт	121,50	138,74	--	16857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Крепления канализационных трубопроводов	шт	180,00	37,69	--	6785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								850759
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ								
16.	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	243,00	636,62	39,24	154699	9535	2,22	539
					387,00	15,75	94041	3827	0,07	17
17.	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	243,00	460,28	21,53	111848	5232	1,95	474
					346,50	9,00	84200	2187	0,04	10
18.	17-1-1	Установка купальных ванн	комплект	240,00	666,57	93,94	159977	22546	2,90	696
					488,25	36,00	117180	8640	0,17	41
19.	17-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	240,00	387,40	13,90	92976	3336	1,56	374
					279,00	4,50	66960	1080	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	17-2-3	Установка смесителей	шт	483,00	143,32	1,57	69224	758	0,70	338
					126,00	--	60858	--	--	--
21.	16-14-12	Монтаж гибких подводок	м	145,80	59,31	--	8647	--	0,34	49
					59,15	--	8624	--	--	--
22.	17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	240,00	7298,33	6,95	1751599	1668	2,48	595
					414,00	2,25	99360	540	0,01	2
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ								2348970
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
23.	16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
24.	11-2-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ- 50	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	48,96	1,62	49	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
26.	С	Манометр МПЗУ 0-1,6Мпа	шт	1,00	1308,84	--	1309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	9-4-57	Краны трехходовые Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	241,88	72,98	242	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
29.	С	Фильтр д 50мм	шт	1,00	2474,23	--	2474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,00	10,99	--	11	--	0,05	0
					10,69	--	11	--	--	--
31.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	6,00	11,13	--	67	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм			10,69	--	64	--	--	--
32.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	430,50	362,67 59,85	4,19 1,58	156129 25765	1804 680	0,34 0,01	145 3
33.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	730,00	329,67 59,85	4,19 1,58	240659 43690	3059 1153	0,34 0,01	246 6
34.	С	Шаровый кран д 15мм	шт	486,00	326,16 --	-- --	158515 --	-- --	-- --	-- --
35.	С	Шаровый кран д 25мм	шт	27,00	801,53 --	-- --	21641 --	-- --	-- --	-- --
36.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1601,00	10,99 10,69	-- --	17595 17115	-- --	0,05 --	80 --
37.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	95,00	11,13 10,69	-- --	1057 1016	-- --	0,05 --	5 --
38.	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	243,00	75,82 67,50	1,57 --	18424 16402	382 --	0,41 --	100 --
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								633853
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3								
39.	16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	952,37 211,50	36,99 13,50	952 212	37 14	1,22 0,07	1 0
40.	11-2-14	Счетчики /водомеры/горячей воды ВСКМ 50	шт	1,00	10600,00 --	-- --	10600 --	-- --	-- --	-- --
41.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	48,96 41,72	1,62 --	49 42	2 --	0,23 --	0 --
42.	С	Манометр МПЗУ 0-1,6Мпа	шт	1,00	1308,84	--	1309	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
43.	9-4-57	Краны трехходовые Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Фильтр д 50мм	шт	1,00	2474,23	--	2474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,00	10,99	--	11	--	0,05	0
					10,69	--	11	--	--	--
46.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	7,00	11,13	--	78	--	0,05	0
					10,69	--	75	--	--	--
47.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	730,00	329,67	4,19	240659	3059	0,34	246
					59,85	1,58	43690	1153	0,01	6
48.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	430,50	362,67	4,19	156129	1804	0,34	145
					59,85	1,58	25765	680	0,01	3
49.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1681,00	10,99	--	18474	--	0,05	84
					10,69	--	17970	--	--	--
50.	С	Шаровый кран д 15мм	шт	243,00	326,16	--	79257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Шаровый кран д 25мм	шт	54,00	801,53	--	43283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
53.	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	483,00	--	966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/	1счетчи	243,00	75,82	1,57	18424	382	0,41	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 40 мм	к		67,50	--	16402	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3								573941
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т4								
55.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	470,00	362,67	4,19	170455	1969	0,34	158
					59,85	1,58	28130	743	0,01	4
56.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	995,00	10,99	--	10935	--	0,05	50
					10,69	--	10637	--	--	--
57.	С	Шаровый кран д 25мм	шт	295,00	801,53	--	236452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 25 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
59.	11-2-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00	--	9870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	47,70	1,57	48	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
61.	С	Манометр МПЗУ 0-1,6Мпа	шт	1,00	1308,84	--	1309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6095,10	70,85	6095	71	0,91	1
					155,25	27,00	155	27	0,13	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т4								435567
		Раздел: ПЕРВИЧНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С	Шаровый кран д 15мм	шт	240,00	326,16	--	78279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	36,00	329,67	4,19	11868	151	0,34	12
					59,85	1,58	2155	57	0,01	0
66.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	36,00	10,99	--	396	--	0,05	2
					10,69	--	385	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРВИЧНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ								90543
ИТОГО:							4933631	57022		4965
							876348	21247		101

Накладные расходы :

На сантехнические работы	1148921
Всего накладных расходов:	1148921
Итого с накладными	6082552

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	364953
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6447505
Итого с временными, 0,935 %	6507789
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	6607358
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6633389
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6698467
Пересчет в текущих ценах, К-1,93146	12937821
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	258756
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13196577
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1583589
Итого с НДС	14780166
Разница возврата материалов от временных зданий и сооружений Согласно актов выполненных работ за июль месяц	-29927
Итого	14750239

Принял: Сдал:

ЭВРИКА
