САРАПТАМА **ЭКСПЕРТИЗА**

ҚР ККМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА

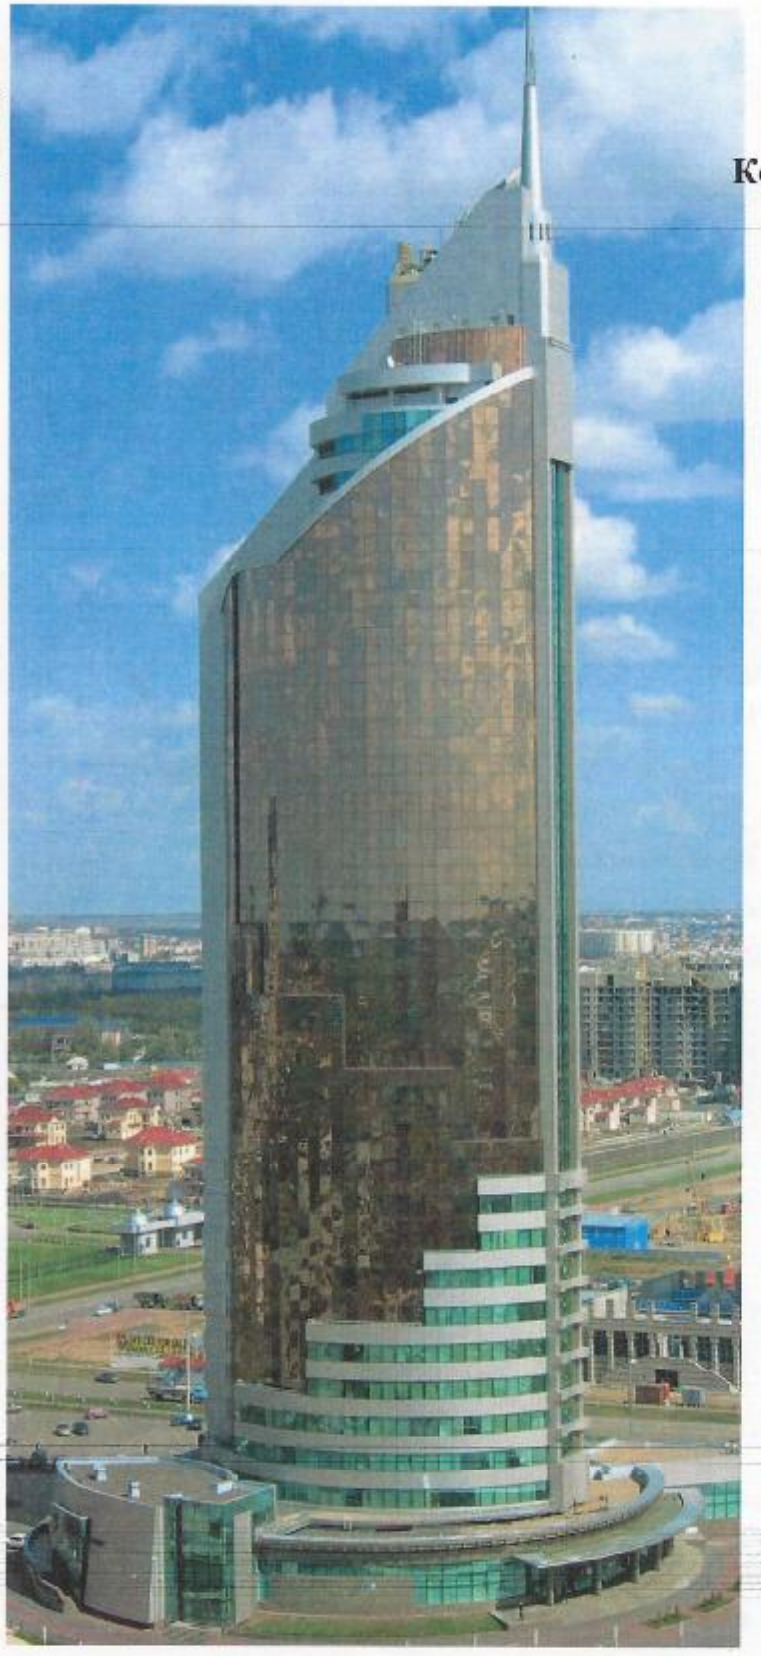

Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігінің
Автомобиль жолдары комитетінің
төраға орынбасары
Т.Ж. Мендіғалиев

Алматы облысының
аудандық автомобиль жолын
орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2013 жылғы «30» желтоқсан № 318

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Алматы облысың
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары басқармасы

Астана 2013 ж.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МТК РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МТК РК
_____ Мендыгалиев Т.Ж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 518 от « 30 » декабря 2013г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог Аксуского, Алакольского, Жамбылского, Панфиловского, Саркандского районов Алматинской области

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Алматинской области»

Астана 2013 г.

ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

- средний ремонт автомобильной дороги «Сагабуйен-Кызылту» км 0-13 Аксуского района.

- средний ремонт автомобильной дороги «Аксу-Каракоз» км 18-25 Аксуского района.

- средний ремонт автомобильной дороги р/д-сан.Аксу-Арасан км 23-48 Аксуского района.

- средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Акший (разъезд №13), км 0-7 Алакольского района.

- средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Коктума, км 0-6 Алакольского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Кабанбай-Коктума, км 58-64 Алакольского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Бишкек-ст.Жиренайгыр, км 0-30 Жамбылского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Бишкек-ст.Жиренайгыр, подъезд к с.Ульгули, км 0-1 Жамбылского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Бишкек-ст.Жиренайгыр, подъезд к с.Акдала, км 0-2 Жамбылского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Фабричный-Новороссийское-Мынбаева, км 9-14 Жамбылского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Ташкент-Термез, подъезд к с.Новороссийск, км 0-3 Жамбылского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Сары-Озек-Хорогос, подъезд к с.Суптай через Надек, км 4-14 Панфиловского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Усть-Каменогорск-Кокузек, км 27-32 Саркандского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Саркан-Тополевка, км 19-22 Саркандского района.

- средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Бакалы, км 0-2 Саркандского района.

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Инвестор, источники финансирования: областной бюджет

Подрядная строительная организация: будет определена тендером

Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:

- межремонтный срок службы;
- дефектный акт с указанием объемов работ.

Комплектность представленной документации:

- пояснительная записка;
- дефектная ведомость;
- месторасположение карьеров и АБЗ;
- сметная документация.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

«Средний ремонт автомобильной дороги «Сагабуйен-Кызылту» км 0-13 Аксуского района»

- ямочный ремонт 3570 м2;
- замена водопропускной трубы диаметром 1,0 м;
- выравнивающий слой 29750 м2;
- одиночная ШПО 78000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги «Аксу-Каракоз» км 18-25 Аксуского района»

- ямочный ремонт 870 м2;
- замена водопропускной трубы диаметром 1,5 м;
- замена водопропускной трубы диаметром 2х1,5 м;
- выравнивающий слой 20200 м2;
- одиночная ШПО 30000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги р/д-сан.Аксу-Арасан км 23-48 Аксуского района»

- ямочный ремонт 2130 м2;
- подсыпка ПГС в месте размыва 290 м3;
- выравнивающий слой 35000 м2;
- одиночная ШПО 150000 м2;
- укрепление обочин;

- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Акший (разъезд №13), км 0-7 Алакольского района»

- ямочный ремонт 1670 м2;
- выравнивающий слой 21500 м2;
- одиночная ШПО 39000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Коктума, км 0-6 Алакольского района»

- ямочный ремонт 1210 м2;
- выравнивающий слой 19200 м2;
- одиночная ШПО 36000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Кабанбай-Коктума, км 58-64 Алакольского района»

- исправление профиля с добавлением материала 42000 м2;
- разборка покрытия в местах исправления поперечного профиля 19200 м2;
- восстановление покрытия из асфальтобетона 19200 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Бишкек-ст.Жиренайгыр, км 0-30 Жамбылского района»

- ямочный ремонт 3900 м2;
- выравнивающий слой 27600 м2;
- разборка покрытия в местах исправления поперечного профиля 24500 м2;
- восстановление покрытия из асфальтобетона 24500 м2;
- одиночная ШПО 143100 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Бишкек-ст.Жиренайгыр, подъезд к с.Ульгули, км 0-1 Жамбылского района»

- ямочный ремонт 150 м2;
- выравнивающий слой 1200 м2;

- одиночная ШПО 6000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Бишкек-ст.Жиренайгыр, подъезд к с.Акдала, км 0-2 Жамбылского района»

- ямочный ремонт 310 м2;
- выравнивающий слой 1800 м2;
- одиночная ШПО 12000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Фабричный-Новороссийское-Мынбаева, км 9-14 Жамбылского района»

- ямочный ремонт 340 м2;
- выравнивающий слой 2400 м2;
- одиночная ШПО 32000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Ташкент-Термез, подъезд к с.Новороссийск, км 0-3 Жамбылского района»

- ямочный ремонт 180 м2;
- одиночная ШПО 18000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Сары-Озек-Хорогос, подъезд к с.Суптай через Надек, км 4-14 Панфиловского района»

- ямочный ремонт 875 м2;
- подсыпка ПГС в месте размыва 20 м3;
- выравнивающий слой 5900 м2;
- одиночная ШПО 46800 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Усть-Каменогорск-Кокузек, км 27-32 Саркандского района»

- ямочный ремонт 1750 м2;
- выравнивающий слой 20900 м2;
- одиночная ШПО 30000 м2;

- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Саркан-Тополевка, км 19-22 Саркандского района»

- ямочный ремонт 150 м2;
- выравнивающий слой 1100 м2;
- восстановление слоя покрытия из асфальтобетона 14400 м2;
- одиночная ШПО 3600 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Бакалы, км 0-2 Саркандского района»

- ямочный ремонт 210 м2;
- выравнивающий слой 2800 м2;
- одиночная ШПО 12000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

ВЫВОДЫ:

Техническая документация по среднему ремонту автомобильных дорог Аксуского, Алакольского, Жамбылского, Панфиловского, Саркандского районов Алматинской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

«Средний ремонт автомобильной дороги «Сагабуйен-Кызылту» км 0-13 Аксуского района»

Протяженность - 13 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 31 547,66 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 86 124,09 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги «Аксу-Каракоз» км 18-25 Аксуского района»

Протяженность - 7 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 19 354,93 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 52 838,33 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги р/д-сан.Аксу-Арасан км 23-48 Аксуского района»

Протяженность - 25 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 42 580,22 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 116 242,62 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Акший (разъезд №13), км 0-7 Алакольского района»

Протяженность - 7 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 18 785,80 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 51 284,62 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Коктума, км 0-6 Алакольского района»

Протяженность - 6 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 16 213,88 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 44 263,36 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Кабанбай-Коктума, км 58-64 Алакольского района»

Протяженность - 6 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 45 836,53 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 125 132,23 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Бишкек-ст.Жиренайгыр, км 0-30 Жамбылского района»

Протяженность - 30 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 55 091,58 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 150 398,21 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Бишкек-ст.Жиренайгыр, подъезд к с.Ульгули, км 0-1 Жамбылского района»

Протяженность - 1 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 1 678,19 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 4 581,41 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Бишкек-ст.Жиренайгыр, подъезд к с.Акдала, км 0-2 Жамбылского района»

Протяженность - 2 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 3 025,89 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 8 260,59 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Фабричный-Новороссийское-Мынбаева, км 9-14 Жамбылского района»

Протяженность - 5 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 5 659,21 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 15 449,47 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Ташкент-Термез, подъезд к с.Новороссийск, км 0-3 Жамбылского района»

Протяженность - 3 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 2 268,36 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 6 192,54 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Сары-Озек-Хорогос, подъезд к с.Суптай через Надек, км 4-14 Панфиловского района»

Протяженность - 10 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 10 340,42 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 28 229,02 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Усть-Каменогорск-Кокузек, км 27-32 Саркандского района»

Протяженность - 5 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 18 371,36 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 50 153,22 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Саркан-Тополевка, км 19-22 Саркандского района»

Протяженность - 3 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 16 497,74 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 45 038,31 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Бакалы, км 0-2 Саркандского района»

Протяженность - 2 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 3 445,62 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 9 406, 43 тыс.тенге

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Токтаров Д.С. _____

Курманбеков Н.Б. _____

Каримбаев А. К. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Жумагулов Е.М. _____

Өрлеу 3 б.

Колы

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «АИС Проект», г. Алматы, ул. Толе би, 304, офис 302. БИН 050340008728

А К Т за декабрь 2013 года
Выполненных работ к Договору № 445 от 03 декабря 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по разработке технической документаций на средний ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Коктума, км 0-6 Алакольского района Алматинской области	тенге	160 198,44	160 198,44	4 805,95	-	160 198,44	4 805,95	155 392,49
	в т. ч. 159 - Оплата прочих услуг и работ		160 198,44	160 198,44	4 805,95	-	160 198,44	4 805,95	155 392,49
	Всего по акту:		160 198,44	160 198,44	4 805,95	-	160 198,44	4 805,95	155 392,49

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
М.П.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"
Абишев Р.В.
М.П.

Счет-фактура № 12 от 13 декабря 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340008728, Республика Казахстан, Алматы, Толе би, дом №

ИИК поставщика: KZ229261802157484000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договору №445 от 03.12.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340008728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект",Республика

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ,	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по разработке технической документаций на средний ремонт автомобильной дорогиПодъезд к с.Коктума, км 0-6 Алакольского района Алматинской области	шт	1	160 198,44	160 198,44	0%	0,00	160 198,44	0	
Всего по счету:					**160 198,44**		**0,00**	**160 198,44**		

Руководитель: Абишев Р. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Волохова Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

АИС Проект №1 МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) -
