САРАПТАМА ЭКСПЕРТИЗА

ҚР ККМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА

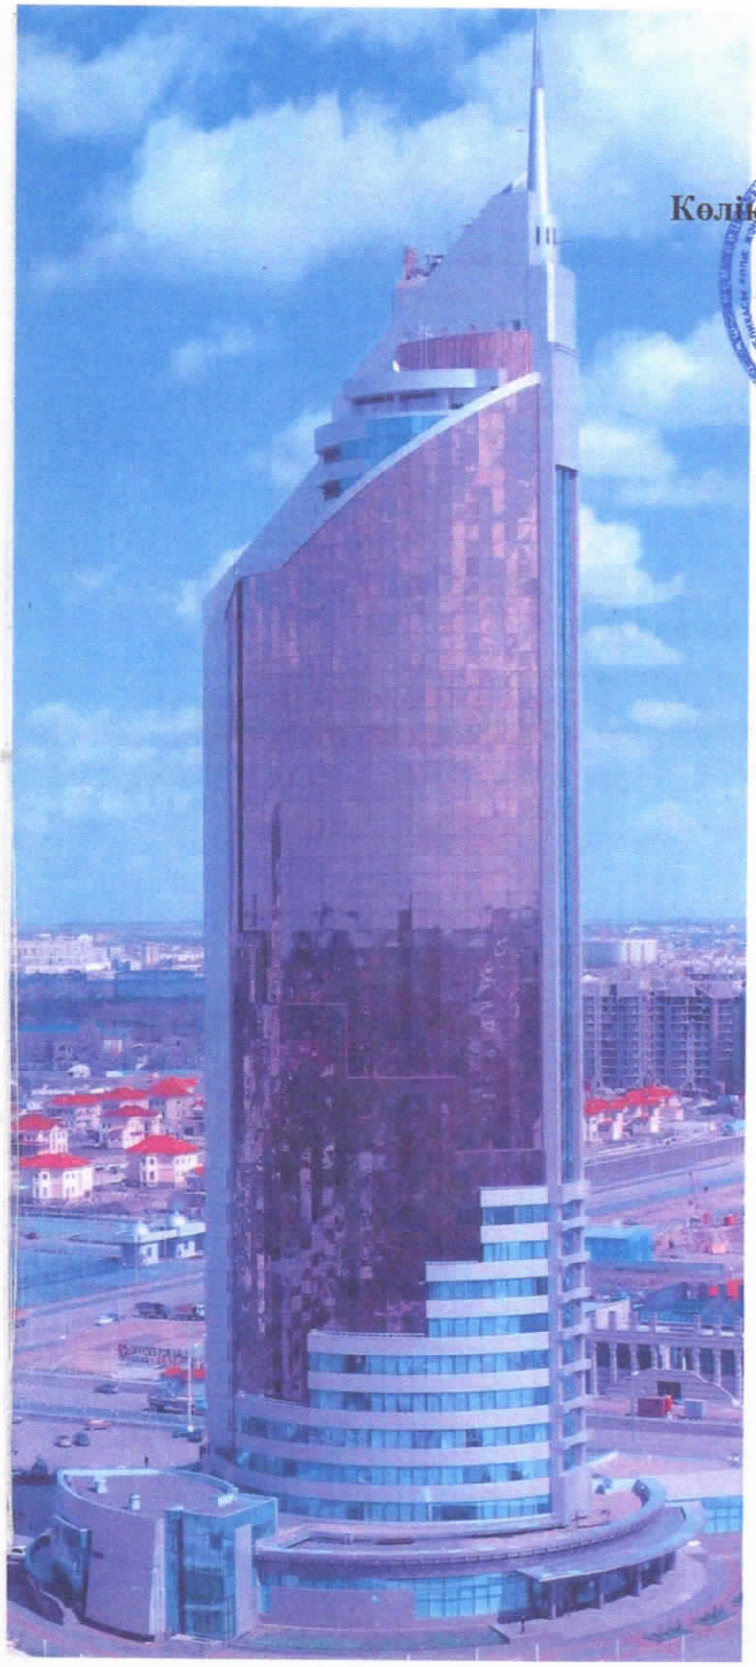

Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
_____ С.Ә. Аблалиев

Алматы облысының
Ақсу, Алакөл, Балқаш, Іле, Қарасай,
Кербұлақ аудандары автомобиль
жолдарын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2014 жылғы «30» сәуір № 356

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Алматы облысының Жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары
басқармасы» ММ

Астана 2014 ж.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МТК РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МТК РК
_____ Аблалиев С.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№____ от «____» _____ 2014 г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог Аксуского, Алакольского, Балхашского, Илийского, Карасайского, Кербулакского районов Алматинской области

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Астана 2014 г.

ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

- средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай, км 20-34 Аксуского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызыл-Кайын-Лепсы, км 5-29 Алакольского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Топар-Акжар, км 39-72 Балхашского района.

- средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Куйган, км 0-10 Илийского района.

- средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Аксай-Чемолган подъезд к ур.Коклайсай, км 0-3 Карасайского района.

- средний ремонт автомобильной дороги 1мая-Кайнар, км 0-7 Карасайского района.

- средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Жоламан, км 1-15 Кербулакского района.

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Инвестор, источники финансирования: областной бюджет

Подрядная строительная организация: будет определена тендером

Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:

- межремонтный срок службы ПРРК 218-05.1-2005*;
- Акт обследования автомобильных дорог районного значения Алматинской области, комиссией ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области».
- дефектный акт с указанием объемов работ.

Комплектность представленной документации:

- пояснительная записка;
- дефектная ведомость;
- калькуляция строительных материалов;
- сметная документация.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай, км 20-34 Аксуского района»

- выравнивающий слой 4200 т;

- одиночная ШПО 84000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызыл-Кайын-Лепсы, км 5-29 Алакольского района»
- выравнивающий слой 7200 т;
- одиночная ШПО 144000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Топар-Акжар, км 39-72 Балхашского района»
- выравнивающий слой 7009 т;
- одиночная ШПО 198000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Куйган, км 0-10 Илийского района»
- ямочный ремонт 450 м2;
- выравнивающий слой 1739 т;
- одиночная ШПО 60000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Аксай-Чемолган подъезд к ур.Коклайсай, км 0-3 Карасайского района»
- разборка покрытия в местах исправления поперечного профиля 18000 м2;
- выравнивающий слой 864 т;
- восстановление покрытия из асфальтобетона 18000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги 1мая-Кайнар, км 0-7 Карасайского района»
- разборка покрытия в местах исправления поперечного профиля 42000 м2;
- выравнивающий слой 2016 т;
- восстановление покрытия из асфальтобетона 42000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

«Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Жоламан, км 1-15 Кербулакского района»
- выравнивающий слой 4200 т;
- одиночная ШПО 84000 м2;
- укрепление обочин;
- обустройство автодороги.

ВЫВОДЫ:

Техническая документация по среднему ремонту автомобильных дорог Аксуского, Алакольского, Балхашского, Илийского, Карасайского, Кербулакского районов Алматинской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай, км 20-34 Аксуского района»

Протяженность - 14 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 37 668,88 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 102 834,82 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызыл-Кайын-Лепсы, км 5-29 Алакольского района»

Протяженность - 24 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 69 314,75 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 189 227,01 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги Топар-Акжар, км 39-72 Балхашского района»

Протяженность - 33 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 87 221,62 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 238 112,19 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Куйган, км 0-10 Илийского района»

Протяженность - 10 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 20 782,54 тыс.тенге

- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 56 735,67 тыс.тенге
-

«Средний ремонт автомобильной дороги Алматы-Аксай-Чемолган подъезд к ур.Коклайсай, км 0-3 Карасайского района»

Протяженность - 3 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 17 811,59 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 48 625,07 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги 1мая-Кайнар, км 0-7 Карасайского района»

Протяженность - 7 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 42 301,71 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 115 482,30 тыс.тенге

«Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Жоламан, км 1-15 Кербулакского района»

Протяженность - 14 км

- Сметная стоимость в базовых ценах 2001 года - 38 570,25 тыс.тенге
- Общая сметная стоимость (в ценах 2014 г.) - 105 295,52 тыс.тенге

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Токтаров Д.С. _____

Шымырбаев Г.З. _____

Курманбеков Н.Б. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Жумагулов Е.М. _____

6 б. нөмірленіп, байланды

Қолы

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «АИС Проект», г. Алматы, ул. Толе би, 304, офис 302. БИН 050340008728

А К Т за апрель 2014 года
Выполненных работ к Договору № 209 от 03 марта 2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка технической документации на средний ремонт автомобильной дороги Топар-Акжар, км 39-72 Балхашского района Алматинской области	тенге	1 794 240,00	1 794 240,00	53 827,20	1 609 266,80	184 973,20	5 549,20	179 424,00
	в т. ч. 159 - Оплата прочих услуг и работ		1 794 240,00	1 794 240,00	53 827,20	1 609 266,80	184 973,20	5 549,20	179 424,00
	Всего по акту:		1 794 240,00	1 794 240,00	53 827,20	1 609 266,80	184 973,20	5 549,20	179 424,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"
_____ **Абишев Р.В.**
М.П.

Счет-фактура № 31 от 30 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340008728, Республика Казахстан, Алматы, Толе би, дом № 304, к.302
ИИК поставщика: KZ229261802157484000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договору №209 от 03.03.2014г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340008728, Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект",Республика Казахстан, Алматы, Толе би, дом № 304, к.302
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка технической документации на средний ремонт автомобильной дороги Топар-Акжар, км 39-72 Балхашского района Алматинской области	шт	1	165 154,64	165 154,64	12%	19 818,56	184 973,20		
Всего по счету:					**165 154,64**		**19 818,56**	**184 973,20**		

Руководитель: Абишев Р. В.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Волохова Е. И.
(Ф.И.О., подпись)

АИС Проект
МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Волохова Е. И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
