Заказчик: ГУ "КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК"

Подрядчик: ТОО "АКМОЛА-КАПЧАГАЙСТРОЙ"

Форма 2

Наименование стройки - Одноэтажная модульная районная ветеринарная лаборатория в поселке Амангельды Костанайской области, Амангельдинский район

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС								
			ЛС №42-2-1-1и Общестроительные работы								
			Раздел 1. Стены и перегородки								
1	31	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М100, РАСТВОР М50)	392	1605,47	34,73	629344	13614	110094	1,43	561
			м2		225,90	13,01	88200	5100	118	0,06	25
2	32	E6107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	50	111,81	66,43	5590	3322	3339	0,15	7
			шт		23,85	23,85	1193	1192	140	0,11	5
3	33	C1430-5-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,06	18400,00	–	37904	–	–	–	–
			м3		–		–				–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			672838	16936			568
				Тенге			89293	6292			30
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			672838				
			Материалы -	Тенге			21180				
			Всего заработная плата -	Тенге				95685			
			Местные материалы -	Тенге			568206				
			Накладные расходы -	Тенге			113433				57
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				17015			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			47176				
			Невосстановленные и непредвиденные затраты -	Тенге			833447				655
			ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				112700			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			833447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							655
		Сметная заработная плата	Тенге				112'00			
		РАЗДЕЛ 2.Двери								
4	82	E0110-92-1 Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах	26,51 м2	367,11 139,35	19,34 6,57	9732 3695	513 174	4643 128	0,83 0,33	22 1
5	83	С Прайс "Технопласт-Астана" Стоимость двери	26,51 м2	22743,25	–	602925	–	–	–	–
6	84	E0109-53-1 Монтаж конструкций дверей	3,0915 т	14806,0 12892,50	1133,15 398,25	1355 1179	104 36	1094 90	82.10 1.95	8
7	85	С12022-2 Двери	3,07 М2	8904,76	–	27338	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			641350	617			30
			Тенге			4874	219			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512657				
		Материалы -	Тенге			21842				
		Всего заработная плата -	Тенге				1835			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58962				
		Накладные расходы -	Тенге			4663				6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2127			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			37038				
		Неформируемые и непредвиденные затраты	Тенге			654338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				3962			45
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			28692				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71				
		Материалы -	Тенге				1216			
		Всего заработная плата -	Тенге			27338				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1094				
		Накладные расходы -	чел.-ч							1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				164			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1787				
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31574				8
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				1386			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			685912				53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				5342			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 3.Окна								

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		19,10	0,50	554	14	95	–	–
220	16	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,06732	28900,40	–	1946	–	–	–	–
			1000м	–	–	–	–	–	–	–	–
221	17	С151604-177	Кабели связи низкочастотные, марка ТППБ, диаметр жилы: 0,5 мм, число пар 10	0,02158	132000,60	–	3905	–	–	–	–
			1000м	–	–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			46034	3756			38
				Тенге			6242	888			8
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			10961				
		Материалы -		Тенге			649				
		Всего заработная плата -		Тенге				3185			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5850				
			Накладные расходы -	Тенге			3026				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454			
			Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			839				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			14826				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата -	Тенге				3639			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35073				
		Материалы -		Тенге			17809				
		Всего заработная плата -		Тенге				3946			
		Местные материалы -		Тенге			11719				
			Накладные расходы -	Тенге			4249				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				643			
			Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			2362				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41724				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата -	Тенге				4589			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			56550				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
			Сметная заработная плата -	Тенге				8228			

ЛС №13.7-1И Благоустройство территории

Раздел 1. МАФы

222	1	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов под ограждение из пескоблоков	31	9898,28	311,32	306847				
			м3		441,00	117,61	13671				
223	2	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,142	61905,80	–	–				
			т		–	–					

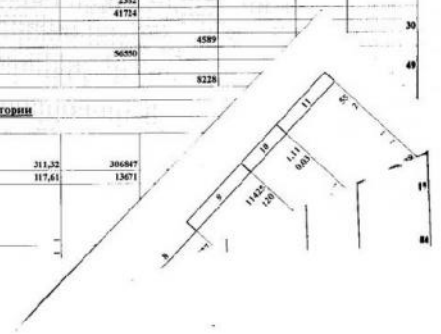

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			81928	91031			
		Накладные расходы -	Тенге							41
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч				12289			
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			11511				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			263362				495
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -	чел.-ч				103320			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			2164481				485
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				103320			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 5.Полы

ТИП 2

14	105	Е0111-13-3 К=2	Устройство подбетонных покрытий с пропиткой битумом /ТОЛЩ 100ММ/ м2	60,895	871,15 79,64	49,10 18,40	53049 4851	2990 1120	7345 123	0,53 0,09	32 5
15	106	Е0111-3-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	9,135	11542,68 567,00	– –	105442 5183	– –	6371 123	3,66 –	33 –
16	107	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,12055	5239,08 1890,00	327,33 123,75	632 228	39 15	255 105	11,60 0,60	1 –
17	108	С12041-90 Изм. и дополн.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 т	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В4, ВР-1, d 5 мм	0,12055	51500,00 –	– –	6208 –	– –	– –	– –	– –
18	112	Е0111-11-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.30ММ) м2	121,79	96,64 1,26	1,34 0,50	11770 153	163 61	226 123	0,01 –	1 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				177101	3192			67
			Тенге				10412	1196			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				177101				
		Материалы -	Тенге				106345				
		Всего заработная плата -	Тенге				4967	1136			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				120386				
		Местные материалы -	Тенге				14197				17
		Накладные расходы -	чел.-ч					5225			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11478				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге				202776				84
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				16588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			202776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				16588			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренние отделки								
		ПОТОЛКИ								
19	125	E0115-61-2 Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	519,8	297,35	3,39	154563	1760	67198	0,68	353
			м2	122,46	0,72	63624	374	105	0,05	26
20	126	E0115-64-2 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	519,8	146,25	1,42	76021	738	39226	0,45	234
			м2	71,33	0,54	37077	281	105	–	1
		СТЕНЫ								
21	128	E0115-61-1 Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1257,6	293,00	3,39	368478	4257	155447	0,65	817
			м2	117,00	0,72	147139	905	105	0,05	64
22	129	E0115-64-1 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	1497,6	124,49	1,19	186436	1782	95528	0,37	554
			м2	60,30	0,45	90305	674	105	–	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			785498	8537			1958
			Тенге			338145	2234			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			785498				
		Материалы -	Тенге			268602				
		Всего заработная плата -	Тенге				34914			
		Местные материалы -	Тенге			214423				
		Накладные расходы -	Тенге			357399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1211471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2147
		Сметная заработная плата -	Тенге				92479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1211471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2147
		Сметная заработная плата -	Тенге				92479			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
23	149	E0134-68-11 Облицовка	10,5	148,29	0,76	1526	8	1578	0,86	9

	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
				м2		142,88	0,19	1500		3	105	-	-
	180	С11011-468 прим	Стоимость облицовки		11,03	1610,00	-	17750		-	-	-	-
				м2		-	-	-		-	-	-	-
			ОТМОСТКА/лет.52сер.2.110-1/										
25	151	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см		68	792,51	12,52	19891	851	3837	0,24	17	
				м2		38,03	4,39	2586	599	133	0,02	1	
26	152	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать ДО ТОЛЩИНЫ 10 СМ		68	-43,36	-	-2948	-	-150	-0,01	-1	
				м2		-1,04	-	-111	-	133	-	-	
27	153	Е0127-55-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров толщиной 3 см		68	495,07	-	33665	-	2238	0,14	10	
				м2		24,75	-	1683	-	133	-	-	
28	154	Е0111-2-4	Подготовка под бортовой камень из щебня М1000 фр.20-40 мм		1,564	2601,10	-	4068	-	1021	3,24	5	
				м3		531,00	-	830	-	123	-	-	
29	155	Е0127-34-3	Установка бортовых бетонных камней сечением :50х300 мм при других видах покрытий		68	338,68	6,63	23030	451	9908	0,70	47	
				м		108,68	1,76	7390	119	133	0,01	-	
30	156	С143003-9	Бортовой камень БР100.20.8		1,088	28200,00	-	30682	-	-	-	-	
				м3		-	-	-	-	-	-	-	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7					127664	1310			87	
				Тенге				13877	421			2	
				Тенге									
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				127664					
			Материалы -	Тенге				2864					
			Всего заработная плата -	Тенге					14298				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				17750					
			Местные материалы -	Тенге				93587					
			Накладные расходы -	Тенге				18513				5	
			Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч					2777				
			Сметная заработная плата в НР -	Тенге				8771					
			Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге				154948				98	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч					17075				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				154948				98	
			Сметная заработная плата -	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч					17075				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге									
			Сметная заработная плата -										

Раздел 1. Отопление

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления диам. 32 мм	м	32	422,48 52,29	3,96 1,49	13519 1679	127 48	7199 128	0,30 0,01	10 –
	2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления диам. 25 мм	м	28	343,48 51,20	3,96 1,49	9617 1462	111 42	1924 128	0,30 0,01	8 –
33	3	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления диам. 20 мм	м	166	264,48 52,20	3,96 1,49	43904 8665	657 247	11408 128	0,30 0,01	49 1
34	6	Е0116-25-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	226	11,31 11,01	–	2556 951	–	3185 128	0,05	12 –
35	7	С130904-52	Краны шаровые проходные Dy 15 мм	шт	55	1250,00 –	–	68750 –	–	– –	– –	– –
36	8	С130904-53	Краны шаровые проходные Dy 20 мм	шт	19	1390,00 –	–	26410 –	–	– –	– –	– –
37	9	С130904-54	Краны шаровые проходные Dy 25 мм	шт	8	5670,00 –	–	45360 –	–	– –	– –	– –
38	10	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - автоматический клапан: наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	33	198,71 169,18	–	6557 5583	–	5025 90	1,00	34 –
39	11	СЦена	Автоматический клапан диам. 15	шт	33	1649,00 –	–	54417 –	–	– –	– –	– –
40	12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	9	62,81 23,18	–	565 209	–	267 128	0,12 –	1 –
41	13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из труб диам. до 25 мм	1шт	80	482,27 261,88	40,42 16,22	38582 20950	3233 1258	28477 128	1,51 0,07	121 5
42	14	С Прайс "ООО Тепломакс"	Запорный вентиль "Иусосов А" PN16 1/2", d 15мм /код 1067404/	шт	64	4494,59 –	–	287654 –	–	– –	– –	– –
43	15	С Прайс "ООО Тепломакс"	Запорный вентиль "Иусосов А" PN16 3/4", d 20мм /код 1067406/	шт	16	5170,92 –	–	82735 –	–	– –	– –	2
44	16	Е0118-6-2	Установка радиаторов	1кВт	32,2	234,78 100,35	19,17 7,19	7560 3231	617 231	4432 128	0,61 0,04	20 1

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x1800, 1,8кВт	1 шт	11053,83	–	11054	–	–	–	–
	18	С Прайс "Строй Центр"	Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x1600, 1,6кВт	1 шт	10083,65	–	10084	–	–	–
47	19	С Прайс "Строй Центр"	Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x1400, 1,4кВт	6 шт	9129,62	–	54778	–	–	–
48	20	С Прайс "Строй Центр"	Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x1200, 1,2кВт	1 шт	8160,60	–	8161	–	–	–
49	21	С Прайс "Строй Центр"	Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x1100, 1,1кВт	2 шт	7659,15	–	15398	–	–	–
50	22	С Прайс "Строй Центр"	Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x1000, 1,0кВт	6 шт	7221,56	–	43329	–	–	–
51	23	С Прайс "Строй Центр"	Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x900, 0,9кВт	4 шт	6743,97	–	26976	–	–	–
52	24	С Прайс "Строй Центр"	Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x800, 0,8кВт	4 шт	6371,36	–	25485	–	–	–
53	25	С Прайс "Строй Центр"	Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x700, 0,7кВт	3 шт	5983,74	–	17951	–	–	–
54	26	С Прайс "Строй Центр"	Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x500, 0,5кВт	1 шт	5402,33	–	5402	–	–	–
55	27	С Прайс "Строй Центр"	Панельные радиаторы "Purmo C11", 500x400, 0,4кВт	4 шт	5058,55	–	20234	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			931247	4774		188
				Тенге			44863	1876		9
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			6552			
		Материалы -		Тенге			974			
		Всего заработная плата -		Тенге				5420		
		Накладные расходы -		Тенге			5025			2
		Нормативная трудоемкость в НР -		чел.-ч				281		
		Сметная заработная плата в НР -		Тенге			695			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -		Тенге			12277			35
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч						
		Нормативная трудоемкость -								

			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				6152			
			...общестроительных работ -	Тенге			56010				
			...ть материалов и конструкций -	Тенге			56010				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3374				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59607				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			868680				
			Материалы -	Тенге			75105				
			Всего заработная плата -	Тенге				40960			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			749761				
			Местные материалы -	Тенге			11				
			Накладные расходы -	Тенге			52359				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7854			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55262				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			976301				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
			Сметная заработная плата -	Тенге				48760			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1048185				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
			Сметная заработная плата -	Тенге				55377			

ГАРАЖ

ЛС №42.3 1н Общестроительные работы

Раздел 1. Окна

56	40	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,672	498,09	19,17	335	13	191	1,38	1
			м2		230,97	6,18	155	4	120	0,03	--
57	41	С Прайс "Технопласт-Астана"	Стоимость О-1 с тройным остеклением	0,672	9955,15	--	6690	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7025	13			1
				Тенге			155	4			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7025				
			Материалы -	Тенге			167				
			Всего заработная плата -	Тенге				159			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6690				
			Сдача и испытание -	Тенге			8				
			Накладные расходы -	Тенге			191				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7649				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				188			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7649				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				188			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								
			ПОТОЛКИ								
58	52	Е0115-151-1 прим	Окраска щелочно-силикатной краской	28,4	31,32	0,18	890	5	277	0,06	2
				м2	9,23	0,07	262	2	105	–	–
			СТЕНЫ								
59	53	Е0115-151-1 прим	Окраска щелочно-силикатной краской	61,3	31,32	0,18	1920	12	599	0,06	3
				м2	9,23	0,07	566	5	105	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2810	16			5
				Тенге			828	6			–
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2810				
			Материалы -	Тенге			1966				
			Всего заработная плата -	Тенге				834			
			Сдача и испытание -	Тенге			42				
			Накладные расходы	Тенге			876				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			
			Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3907				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата -	Тенге				966			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3907				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата -	Тенге				966			
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
			ОТМОСТКА/дет52сер.2.110 1/								
60	54	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	19,56	292,51	12,52	5721	245	1104	0,24	5
				м2	38,03	4,39	744	86	133	0,02	–
61	55	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать ДО ТОЛЩИНЫ 10 СМ	19,56	-43,36	–	-848	–	-43	-0,01	–
				м2	-1,66	–	-32	–	133	–	–
62	56	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	19,56	495,07	–	9684	–	644	0,14	3
				м2	24,75	–	484	–	133	–	–
63	57	Е0111-2-4	Подготовка под бортовой камень из щебня М:800 фр.20-40 мм	0,4499	2601,10	–	1170	–	294	3,24	1
				м3	531,00	–	239	–	123	–	–

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	58	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	19,56	338,68	6,63	6625	136	2873	0,70	14
				ч	108,68	1,76	2126	36	133	0,01	–
55	59	С143033-9 Изм. к доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002/СИ РК 8.02-04С-2004	Бортовой камень БР100.20.8	0,313	28200,00	–	8827	–	–	–	–
				м3	–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39392	275			22
				Тенге			3560	120			–
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39392				
		Материалы -		Тенге			623				
		Всего заработная плата -		Тенге				3680			
		Местные материалы -		Тенге			34835				
		Сдача и испытание -		Тенге			197				
			Накладные расходы -	Тенге			4871				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				731			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46919				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
			Сметная заработная плата -	Тенге				4411			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46919				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
			Сметная заработная плата -	Тенге				4411			

ЛС №42.4-1в Оборудование и материалы для ВЛ-10 кВ

РАЗДЕЛ 1. Молниезащита

66	71	E0133-25-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	1	2480,57	–	2481	–	366	2,21	2
				опора	348,75	–	349	–	105	–	–
67	72	С143001-13 Изм. к доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002/СИ РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый класса В30 (М-400)	8,51	12300,00	–	6273	–	–	–	–
				м3	–	–	–	–	–	–	–
68	73	Ц168-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	50	51,70	2,80	2585	140	1320	0,16	8
				м	27,50	0,30	1375	15	95	–	–
69	74	Ц168-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию зала, диаметр до 50 мм	7	57,40	6,30	402	42	265	0,24	2
				м	38,50	1,30	270	9	95	0,01	–

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	75	С130806-65 Изм. и доп.№ 9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2304	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3кп-ВСт4кп, 57х3 мм	7.07	243.00	–	1718	–	–	–	–
				м	–	–	–	–	–	–	–
71	76	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	25	431.60	21.60	10790	540	3608	0,90	23
				шт	140.00	2.90	3725	73	95	0,02	–
72	77	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	110	61,90	3,30	6809	363	2445	0,14	15
				м	23.00	0,40	2530	44	95		–
73	78	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	8	247.70	20.70	1982	166	856	0,70	6
				шт	111,00	1,60	888	13	95	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			33039	1251			55
				Тенге			9136	153			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			24285				
		Материалы -		Тенге			12529				
		Всего заработная плата -		Тенге				8941			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1718	1274			
		Сдача и испытание -		Тенге			502				
			Накладные расходы -	Тенге			8494				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1330			
			Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			1967				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34746				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
			Сметная заработная плата -	Тенге				10215			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8754				
		Всего заработная плата -		Тенге				349			
		Местные материалы -		Тенге			8405				
		Сдача и испытание -		Тенге			17				
			Накладные расходы -	Тенге			366				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
			Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			547				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9667				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата -	Тенге				404			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							61
			Сметная заработная плата -	Тенге				10619			

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	6	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,02	47611,09	17877,09	952	358	894	173,00	3
			км		29700,00	4698,68	594	94	130	18,10	–
75	7	C130004-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dh 50 мм	2,02	2130,00	–	4303	–	–	–	–
			10м		–	–	–	–	–	–	–
76	8	E122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,02	8897,12	–	162	–	209	51,50	1
			км		8832,50	–	161	–	130	–	–
77	9	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
			шт		144,00	1,25	288	5	130	0,01	–
78	10	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем , Dy 50 мм	2	3500,00	–	7000	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
79	11	E122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,01	154891,68	66099,80	1549	660	1237	375,00	4
			км		70200,00	24936,75	702	249	130	121,79	1
80	12	C130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 219х5 мм	10,04	1910,00	–	19176	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
81	13	E122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,01	10651,88	–	107	–	125	61,80	1
			км		9630,00	–	96	–	130	–	–
82	14	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
			шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
83	15	C130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	16300,00	–	32600	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
84	16	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,47	34346,00	2104,00	261047	15723	28997	13,90	104
			м3		2362,50	623,48	17648	4657	130	2,48	18
85	17	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,47	100,00	–	747	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	18	С143001-52	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,47	284,00	–	2121	–	–	–	–
				м3	–	–	–	–	–	–	–
87	19	ССБ.Цен вып.7	Люк чугунный тяжелый	4	13400,00	–	53600	–	–	–	–
				шт	–	–	–	–	–	–	–
88	20	С.11911-7/4	Скобы ходовые	27,2	129,00	–	3509	–	–	–	–
				кг	–	–	–	–	–	–	–
89	21	Е0110-55-1	Укладка плит над подвальными каналами	1,56	1292,59	29,74	2016	46	83	9,23	–
				м2	32,85	11,23	51	18	120	0,05	–
90	22	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	1,56	186,45	0,80	291	1	18	0,06	–
				м2	9,25	0,32	14	–	120	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			392125	17735			121
				Тенге			20581	5374			22
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			392125				
			Материалы -	Тенге			13380				
			Всего заработная плата -	Тенге				25955			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12088				
			Местные материалы -	Тенге			220242				
			Сдача и испытание -	Тенге			1916				
			Накладные расходы -	Тенге			₽33733				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5060			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15551				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			451410				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
			Сметная заработная плата -	Тенге				31015			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			451410				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
			Сметная заработная плата -	Тенге				31015			

РАЗДЕЛ 2.Канализация К1

91	23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194,60	1
				км	33075,00	6813,45	99	20	130	26,38	–
92	24	С130804-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100х2, мм	3,03	386,06	–	1170	–	–	–	–
				м	–	–	–	–	–	–	–
93	25	Е0122-3-3	Укладка стальных полиэтиленовых труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	70153,47	10674,97	140	21	137	270,90	1
				км	48825,00	4032,00	98	8	130	19,09	–

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	26	С130806-79 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3кп-ВСт4кп, 108х4 мм	2,01	626,00	–	1257	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
95	27	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	2	142,95	33,05	286	66	185	0,44	1
			м		79,88	12,31	160	25	100	0,06	–
96	28	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	0,0377	4590,00	–	173	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
97	29	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине уплотненного слоя 60 мм	2	153,84	10,09	308	20	70	0,20	–
			м		31,28	3,83	63	8	100	0,02	–
98	30	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0007	314500,00	–	221	–	–	–	–
			1000м2			–	–	–	–	–	–
99	31	Е0110-55-1	Укладка щетов над подпольными каналами	0,39	1292,59	29,74	504	12	21	0,23	–
			м2		32,85	11,23	13	4	120	0,05	–
100	32	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	0,39	186,45	0,80	73	–	4	0,06	–
			м2		9,25	0,32	4	–	120	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4308	197			3
				Тенге			436	65			–
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4308				
		Материалы -		Тенге			855				
		Всего заработная плата -		Тенге				501			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2821				
		Сдача и испытание -		Тенге			32				
			Накладные расходы -	Тенге			573				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5174				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				587			3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5174				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				587			3

РАЗДЕЛ 26 ЛС №42.6-3н Колодец-хлоратор

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	7	Е123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,09	2081,20	152,52	187	14	25	1,02	–
			м3		153,68	57,15	14	5	130	0,28	–
102	8	Е0123-13-6	Устройсво канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,72	36602,39	1686,97	62956	2902	5587	11,16	19
			м3		1867,05	631,80	3211	1087	130	3,09	5
103	9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,72	100,00	--	172	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
104	10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,72	284,00	--	488	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
105	11	ССБ.Цек вып.7	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99)	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
106	12	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,39	1292,59	29,74	504	12	21	0,23	–
			м2		32,85	11,23	13	4	120	0,05	–
107	13	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	0,39	186,95	0,80	73	--	4	0,06	--
			м2		9,25	0,32	4	--	120	--	--
			Дозатор хлора								
108	14	Е0116-15-1	Установка шаровых кранов к дозатору хлора d-25мм	2	473,47	39,24	947	78	65	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	--	0,07	–
109	15	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
110	16	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	217,70	14,12	871	56	51	0,55	2
			м		100,35	5,29	401	21	--	0,03	–
111	17	Е0109-53-2	Монтаж дозатора	0,004	9850,48	1162,95	39	5	27	46,60	–
			т		7357,50	108,00	29	--	90	0,53	–
112	18	С11011-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм	0,004	166500,00	--	666	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
113	19	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,004	49326,74	16388,64	197	66	117	161,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	28980,00	3479,80	116	14	90	13.02	--
			Тенге			83280	3133			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4297	1162			6
		Материалы -	Тенге			83043				
		Всего заработная плата -	Тенге			8087				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3566			
		Местные материалы -	Тенге			16846				
		Сдача и испытание -	Тенге			50898				
		Накладные расходы -	Тенге			361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			5753				3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94124				35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4472			
		Сметная заработная плата -	Тенге			237				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21				
		Материалы -	Тенге				168			
		Всего заработная плата -	Тенге			11				
		Сдача и испытание -	Тенге			144				
		Накладные расходы -	Тенге				23			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403				1
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				190			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			94908				36
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	чел.-ч				5662			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

ЛС №42.6-6и Монтаж оборудования котельной

114	2	1 прайс Казкор-Астана	Котел малой мощности В30/6 58кВТ	компл.	2	146473,03	--	292946	--	--	--
115	4	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Дымовая труба д-200мм	м	8	3800,00	--	30400	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				323346			
				Тенге				292946			
		Стоимость оборудования -		Тенге				292946			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				30400			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				30400			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1824			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				32224			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			325170				
		ЛС №42.6-9и Ограждение емкостей для хранения нефтепродуктов								
116	1	E106-1-5								
		Фундамент под стойки ограждения	2,42	13127,42	112,36	31768	272	2703	6,34	15
		м3		1021,50	42,44	2472	103	105	0,21	1
117	2	C143001-54								
		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,42	100,00	--	242	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	3	C143001-62								
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водовепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,42	284,00	--	687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	4	CI2041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004								
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,022	51500,00	--	1133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	5	E106-11-8								
		Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД-1)	0,09	70437,87	304,24	6339	27	925	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	871	10	105	0,56	--
121	6	CI2041-132								
		Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,09	40200,00	--	3618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	7	E109-17-1								
		Металлические стойки оргаждения	0,266	4646,85	2285,57	1236	608	526	9,35	2
		т		1579,50	617,13	420	164	90	2,34	1
123	8	C12021-237								
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,266	154400,00	--	41070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	9	E109-48-2								
		Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,266	542,84	144,52	144	38	70	1,34	--
		т		292,50	--	78	--	90	--	--
125	10	E113-16-6								
		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,18	21,80	0,05	157	--	38	0,03	--
		м2		5,81	0,02	42	--	90	--	--
126	11	E113-26-6к-2								
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2раза)	14,36	35,73	0,02	513	--	54	0,02	--
		м2		4,16	--	60	--	90	--	--
127	12	E0109-53-2								
		Монтаж ограждающих конструкций	0,558	9850,48	1162,95	5497	649	3749	46,60	26
		т		7357,50	108,00	4105	60	90	0,53	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	13	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,558	54300,00	–	30299	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
129	14	Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,07	21,80	0,05	328	1	79	0,03	–
			м2		5,81	0,02	88	–	90	–	–
130	15	Е113-26-6к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2раза)	30,14	35,73	0,02	1077	1	113	0,02	1
			м2		4,16	–	125	–	90	–	–
131	16	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	2003,85	33,47	4008	67	4055	7,85	16
			шт		1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			128118	1664			67
				Тенге			11132	363			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80170				
		Материалы -		Тенге			9491				
		Всего заработная плата -		Тенге				6667			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35050				
		Местные материалы -		Тенге			28733				
		Сдача и испытание -		Тенге			207				
			Накладные расходы -	Тенге			7967				4
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1195			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5288				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93425				43
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				7862			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			47947				
			Сметная заработная плата -	Тенге			978				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4828			
		Материалы -		Тенге			41070				
		Всего заработная плата -		Тенге			177				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4345				
		Сдача и испытание -		Тенге							2
			Накладные расходы -	чел.-ч				652			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3138				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			55430				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							32
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				5480			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			148855				
			Сметная заработная плата -	Тенге							74
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	чел.-ч				13342			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							
			Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛС №42.7-И Благоустройство территории

Раздел 1. Вертикальная планировка

Дорожное покрытие Тип 1 /1190м2/

132	6	Е0127-14-1	Дополнительный слой основания из песка Н-20см	м3	119	1532,94 21,38	48,31 12,76	182420 2544	5749 1519	5403 133	0,14 0,05	17 5
133	7	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /н-13см/	м2	1190	316,84 5,00	32,88 11,49	377036 5950	39133 13669	26093 133	0,03 0,04	39 48
134	8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /вязкого битума 2,5л/м2/	т	2,98	29768,75 --	339,59 140,94	88562 --	1010 419	558 133	0,58 0,58	2 2

Тротуарное покрытие Тип 2 /249м2/

135	11	Е0127-56-1 прим.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /из щебня фракционированного/	м2	249	320,46 38,03	14,09 4,75	79796 9469	3509 1183	14168 133	0,24 0,02	62 5
136	12	Е0127-56-2 к=8 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 20 см/	м2	1992	23,78 0,83	-- --	47370 1653	-- --	2199 133	0,01 --	11 --
137	13	Е0127-56-1 прим.	Слой из мелкозернистого песка Н-5см	м2	249	125,37 38,03	21,26 7,97	31218 9469	3509 1183	14168 133	0,25 0,02	62 5
138	14	Е0127-56-2 к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	1743	-0,83 -0,83	-- --	-1447 -1447	-- --	-1924 133	-0,01 --	-10 --
139	15	Е0111-25-1	Устройство покрытия из брусчатки	м2	249	1346,69 156,15	21,26 7,97	335326 38881	5294 1985	50265 123	0,95 0,04	243 10

Установка бортового камня

140	16	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	265	716,68 108,68	6,63 1,76	189919 28800	1757 466	38923 133	0,72 0,01	185 2
141	17	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	124	338,68 108,68	6,63 1,76	41996 13476	822 218	18213 133	0,72 0,01	87 1

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	18	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Бортовой камень БР100.30.15	11,4	29000,00	--	330455	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--
143	19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Бортовой камень БР100.20.8	1,98	28200,00	--	55949	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1758600	65525			709
				Тенге			108795	21261			79
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1758600				
			Материалы -	Тенге			123769				
			Всего заработная плата -	Тенге				133323			
			Местные материалы -	Тенге			1076805				
			Сдача и испытание -	Тенге			5172				
			Накладные расходы -	Тенге			168066				87
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25967			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115600				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2042266				874
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				159290			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2042266				874
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				159290			

РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Газоны /1260м2/

144	20	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1260	244,28	--	307793	--	94728	0,41	504
				м2	58,28	--	73433	--	129	--	--
145	21	Е0147-25-5 к=2 к объему	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 25см/	2520	69,97	--	176324	--	25909	0,05	138
				м2	7,97	--	20084	--	129	--	--
146	22	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1260	40,18	31,47	50625	39651	25047	0,05	68
				м2	8,21	7,20	10345	9072	129	0,03	42
147	23	С143012-18	Семена многолетних трав	50,4	515,00	--	25956	--	--	--	--
				кг	--	--	--	--	--	--	--
148	24	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	1260	88,74	31,47	111809	39651	92160	0,34	427

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		49,50	7,20	62370	9072	129	0,03	42
149	25	Е ЕНИР-18 п.18-13-1	Мульчирование газонов перегноем								
				32,76	74,93	--	2455	--	3166	0,52	17
			т		74,93	--	2455	--	129	--	--
150	26	Е ЕНиР-18 п.18-40-9	Просеивание перегноя								
				25,2	310,50	--	7825	--	10094	2,16	55
			м3		310,50	--	7825	--	129	--	--
151	27	С140-25882	Перегной								
				25,2	1617,12	--	40751	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Деревья /25шт/								
152	28	Е0147-5-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,6 м								
				25	4190,83	78,00	104771	1950	27393	5,72	143
			яма		819,45	29,95	20486	749	129	0,12	3
153	29	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м								
				25	1073,10	327,72	26827	8193	24304	3,88	97
			шт		674,55	79,07	16864	1977	129	0,33	9
154	30	Е0147-36-7	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м								
				25	910,44	314,69	22761	7867	21254	3,88	97
			шт		587,03	72,00	14676	1800	129	0,32	8
155	31	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород, с комом размером 1х1х0,6м, высотой 3м								
				25	3760,00	--	94000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			971898	97311			1543
				Тенге			228537	22669			100
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			971898				
			Материалы -	Тенге			10957				
			Всего заработная плата -	Тенге				251206			
			Местные материалы -	Тенге			635092				
			Сдача и испытание -	Тенге			9775				
			Накладные расходы -	Тенге			324056				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48608			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77757				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1373710				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805
			Сметная заработная плата -	Тенге				299814			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1373710				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805
			Сметная заработная плата -	Тенге				299814			

ЛС №42.7-2 Устройство дезбарьера

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	1	E0101-12-15 Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	27,84	26,18	557	524	172	0,01	--
		м3		1,66	7,20	33	144	97	0,03	1
157	2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
		м3		262,72	--	263	--	113	--	--
158	3	E0101-28-2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8	6,83	6,83	55	55	14	--	--
		м3		--	1,87	--	15	97	0,01	--
159	4	E0101-28-8 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	8	3,29	3,29	26	26	7	--	--
		м3		--	0,90	--	7	97	--	--
160	5	E0101-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3
		м3		134,10	--	402	--	113	--	--
161	6	E0101-134-1 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8	21,55	4,52	172	36	132	0,11	1
		м3		17,03	--	136	--	97	--	--
162	7	E0101-17-14 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	10	32,55	30,98	326	310	102	0,01	--
		м3		1,53	9,01	15	90	97	0,04	--
163	8	E010333-A10-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	17,5	84,26	84,26	1475	1475	295	--	--
		т		--	16,85	--	295	100	0,35	6
164	9	E0101-20-2 Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10	3,79	3,24	38	32	16	--	--
		м3		0,48	1,12	5	11	97	--	--
165	10	E0111-13-3 к=2 Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/ТОЛЩ.100ММ/	18	871,15	49,10	15681	884	2171	0,53	9
		м2		79,66	18,40	1434	331	123	0,09	2
166	11	E0106-33-3 Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,5	15254,17	1327,03	38135	3318	6809	12,49	31
		м3		2137,50	456,24	5344	1141	105	1,72	4

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0832 т	51500,00 --	-- --	4283 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			61413	6660			46
				Тенге			7632	2034			13
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61413				
			Материалы -	Тенге			11761				
			Всего заработная плата -	Тенге				8485			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4283				
			Местные материалы -	Тенге			45424				
			Сдача и испытание -	Тенге			491				
			Накладные расходы -	Тенге			10470				6
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1777			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4313				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76196				52
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10262			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			76196				52
			Сметная заработная плата -	Тенге				12562			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			9661163	253110			6076
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			995832	71572			385
			Сметная заработная плата -								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			292946				
			Стоимость оборудования -	Тенге			292946				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			30842				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			13503				
			Материалы -	Тенге				14361			
			Всего заработная плата -	Тенге			1718				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27644				
			Сдача и испытание -	Тенге			13519				
			Накладные расходы -	чел.-ч							2
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1619			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2662				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47023				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч							93
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				15980			
			Сметная заработная плата -	Тенге			8251494				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			618393				
			Материалы -	Тенге				608103			
			Всего заработная плата -	Тенге			686031				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3064887				
			Местные материалы -	Тенге			19175				
			Сдача и испытание -	Тенге			1082248				
			Накладные расходы -	чел.-ч							574
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			560025	176978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9893767				6189
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				785081			
		Сметная заработная плата -	Тенге			186799				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3303				
	Материалы -		Тенге				97243			
	Всего заработная плата -		Тенге			117693				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			188				
	Сдача и испытание -		Тенге			87511				45
		Накладные расходы -	чел.-ч				13128			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			16459				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			290769				532
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				110371			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			868680				
		Сметная заработная плата -	Тенге			75105				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				40960			
	Материалы -		Тенге			749761				
	Всего заработная плата -		Тенге			20				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1033				
	Местные материалы -		Тенге			52359				
	Сдача и испытание -		Тенге							130
		Накладные расходы -	чел.-ч				7854			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			55262				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			976301				1285
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				48814			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			11531208				
		Сметная заработная плата -	Тенге							8099
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	чел.-ч				960246			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -				11 531 208,00				
		Итого				392 061,07				
		Временные здания и сооружения 3,4%				11 923 269,07				
		Итого				275 427,52				
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,2% х1,05=2,31%				35 769,81				
		Затраты на снегоборьбу 0,3%				119 232,69				
		Затраты на выслугу лет 1%				47 693,08				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				12 401 392,16				
		Итого в ценах 2001г.				**20 375 487,32**				
		Итого в ценах 2009г. К=1,643				407 509,75				
		Налоги, обязательные платежи 2%				20 782 997,07				
		Итого				0,96				
		Коэффициент тендерной скидки				19 951 677,19				
		Итого								
		НДС 12%				2 394 201,26				
		Всего к оплате				**22 345 878,45**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:

Начальник Костанайской областной территориальной инспекции КВКН

Шанбаев Т.К.

Технадзор :

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Акмола-Капчагайстрой"

Оздбев Ю.Д.

Сметная заработная плата -		Тенге				47176	17015		
		Тенге							
		чел.-ч							
