Раздел VI.

Схема доставки ДСМ, месторасположение карьеров. Ведомость источников поставляемых материалов

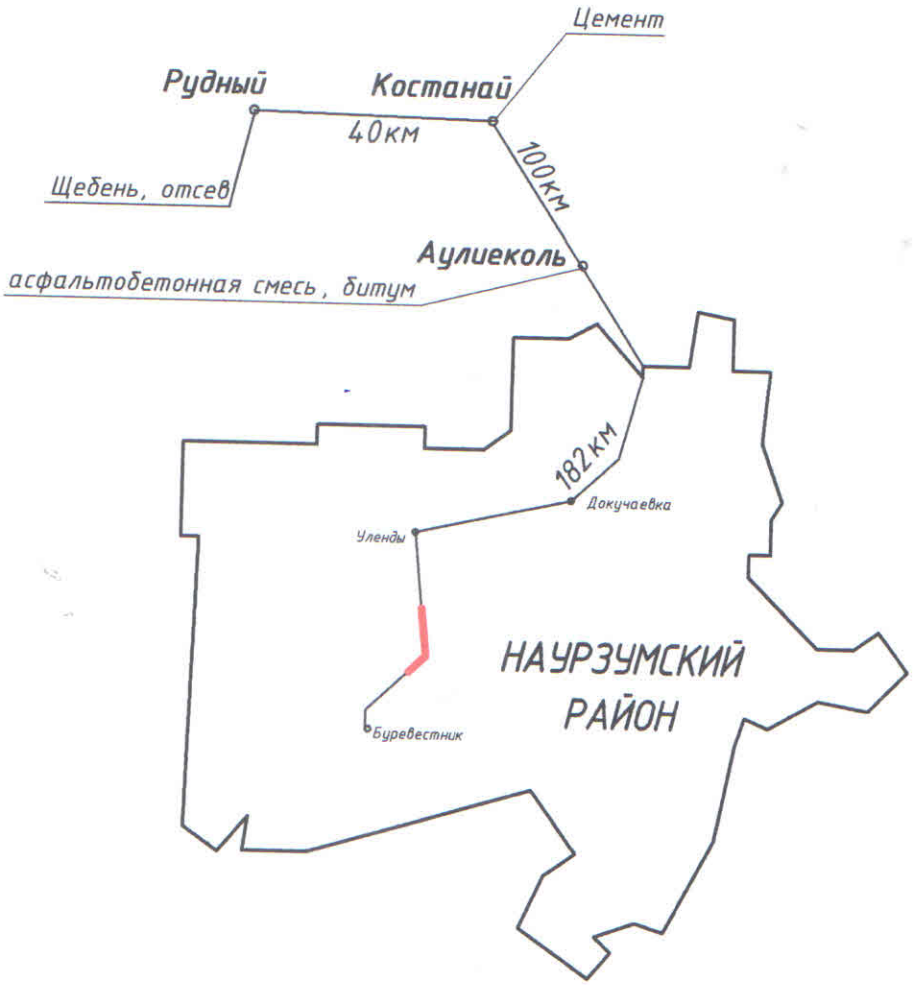

Сводная таблица доставки ДСМ на строительный участок автомобильной дороги

Наименование материала	км
Асфальтобетонная смесь	182
Битум	182
Щебень, отсев	322
Цемент	282

Условные обозначения:

- РУДНЫЙ – населенный пункт
- 40 км – протяженность автомобильной дороги
- граница Наурзумского района
- ремонтируемый участок автомобильной дороги

Изм	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата
Исполнил		Алпыспаев Т.Ф.			
Проверил		Исмаилов А.С.			

"Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-NZ-2 "Уленды-Буревестник" км 38-53, Наурзумского района, Костанайской области"

Схема доставки ДСМ, месторасположение карьеров

Стадия	Лист	Листов
	1	1

Товарищество с ограниченной ответственностью "Geosmet"

Geosmet

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Наурзумского района"

_____ Анаев Ж.А.

ВЕДОМОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ПОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

«Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-NZ-2 "Уленды-Буревестник" км 38-53, Наурзумского района, Костанайской области»

№	Наименование ДСМ	Расстояние, км	Вид транспорта	Наименование организации	Местонахождение источника ДСМ
1	Щебень, отсев	322	автомобилями-самосвалами	АО «ССГПО»	г. Рудный Промзона
3	Асфальтобетонная смесь	182	автомобилями-самосвалами	ТОО "ВАН"	3-й км трассы «Аулиеколь – Диевка – Косагал – Акжол»
4	Битум	182	автомобилями-битумовозами	ТОО "ВАН"	3-й км трассы «Аулиеколь – Диевка – Косагал – Акжол»
5	Цемент	282	автомобили-бортовые	ТОО «Костанайцемент»	г.Костанай, ул. Герцена 5

Составил:
Инженер ТОО "Geosmet" **Исмаилов А.С.**
