Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Акт приемочной комиссии

г. Талдыкорган "30" декабря 2014г.

Приемочная комиссия, назначенная Приказом начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области полковником противопожарной службы Битаевым С.К
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
решением от *"29" декабря 2014 года № 215* в составе:

председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика) ***Битаев С.К. Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области***
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора ***Иманбеков Е.И. главный специалист государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»***
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика ***Байменов Ж.Е директор ТОО «Баймен»***

генерального проектировщика ***Сарсебаев Т. руководитель ТОО «СПК – Туран»***

органов государственной противопожарной службы ***Сулейменов Б.Т. вр. И.о. руководитель государственного учреждения «Отдела по чрезвычайным ситуациям Коксуского района***

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора ***Ажиева М.Б. руководитель Коксуского районного управления по защите прав потребителей***

государственный орган в области охраны окружающей среды ***Жаксылыкбаев Т.С. экологический инспектор Алматинского областного Департамента экологии***

эксплуатационной организации (представители заказчика) ***Кабылов М.У. заместитель начальника ДЧС Алматинской области***

представитель заказчика (независимая экспертиза) ***Жамилов Ф.М. руководить ТОО «АзияЭкспертАлматы***

представителей других заинтересованных органов государственного

контроля и надзора:

Калиева А. А. Аким Балпыкского сельского округа

Адетбеков К.Б. руководитель ГУ «Отдел строительства Коксуского района

Абылкасымов Б.А. руководитель «Отдел жилищно-коммунального Хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района

Камзин Б. директор государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Коксу су Кубыры» акимата Коксуского района

Кудайкул Е. директор районного узла электроснабжения Коксуского района

технадзор ***Баталов С.Т. ИП «Баталов С.Т.»***

авторский надзор ***Баймурзин А.К. представитель ТОО «СПК – Туран»***

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Баймен»*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект после капитального ремонта *склады длительного хранения Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, после капитального ремонт*

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю на основании *договора ДЧС области и ТОО «Баймен» от «24»апреля 2014г. №44*

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ *Департамента ГАСКиЛ по Алматинской области от «01»июля 2014г. №ЗТ-15-1у-555 и от «01»июля 2014г №ЗТ-15-1у-555*

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, *ТОО «Баймен»*

(наименование организаций)

выполнившим *капитальный ремонт зданий и сооружений на территории склада длительного хранения Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области*

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций)

выполнившими

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана *ТОО «СПК-Туран»*

(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту ПСД

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектно-сметная документация утверждена *РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области от «19»марта 2013г. №18-0132/13, от «28» февраля 2013г. №18-0100/13*

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *16.07.2014 года*

(месяц и год)

окончание работ *16.01.15года*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: *6 месяцев*

по норме или по проекту организации строительства *6 месяцев*

фактически *31.12.2014 года*

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Журнал производства работ, журнал инструктажа на рабочем месте, акты скрытых работ сметная документация, сертификаты качества на строительные материалы

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей вначальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Оштукатуривание стен зданий и сооружений, устройство основания под штукатурку металлической сеткой отдельных зданий окраска стен и потолков, демонтаж и монтаж пожарной и охранной сигнализации, замена отдельных ворот, замена деревянных окон на ПХВ, устройство бетонных стяжек в зданиях и сооружениях, устройство водопроводной сети с установкой пожарного гидранта, монтаж решеток на окнах зданий, монтаж электроосветительной сети, установка бортовых камней, подготовка основания под асфальт, устройство двух слойного асфальтного покрытия,

насадка колючей проволоки, площадка для мусоросборника, площадка для золы, навес для угля, капитальный ремонт кровли всех зданий и сооружений.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____*выполнена по проекту* _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 75849368 тенге, в фактически 73839997 тенге

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *склады длительного хранения Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, после капитального ремонт*

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Битаев С.К.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Иманбеков Е.И.

Члены Государственной приемочной комиссии _____ Кабылов М.У.

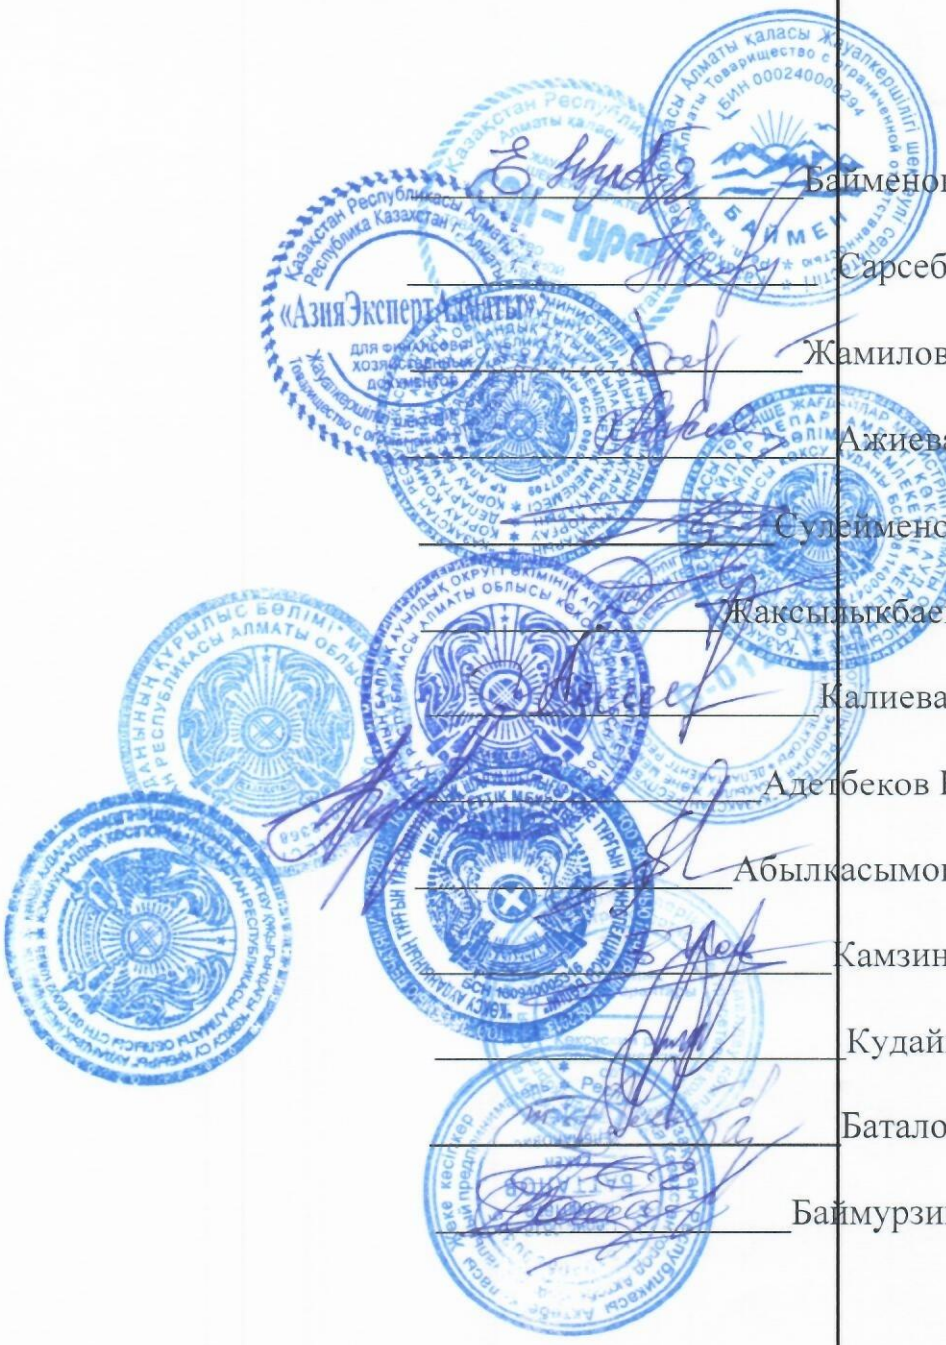

Байменов Ж.Е.

Сарсебаев Т.

Жамилов Ф.М.

Ажиева М.Б.

Сулейменов Б.Т.

Жаксылыкбаев Т.С.

Калиева А.А.

Адетбеков К.Б.

Абылкасымов Б.А.

Камзин Б.

Кудайкул Е.

Баталов С.Т.

Баймурзин А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС	920940000300
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Баймен", г.Алматы ул. Сары-Арка 99	000240000294
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 44 от 24.04.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
39	29.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальны ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы		усл	1	23289333	23 289 333,00
			Итого	1	23289333	23 289 333,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области»
Подрядчик. ТОО «Баймен»
Наименование строительства, адрес: Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Организационно правовая форма код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма код
		№44	24 марта 2014 г				

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ: С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ: В отчетном месяце за июль без НДС (тенге)	Стоимость выполненных работ: Из гр. 1: Строит. монтаж. работы (тенге) В в базовых ценах 2001 г	Из них: в отчетный месяц	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А		1	2	3	4	5	6	7	8		10
Капитальный ремонт складов длительного хранения Департамента по ЧС Алматинской области по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Тереты	75 849 368	54 267 091	20 794 047	11458984	11458984					2 495 286	23 289 333
Аванс 30%	22 754 810	16 280 127									6 986 800
Обеспечение договора 5% п 2.5 договора	3 792 468	2 713 355									1 164 467
Итого к оплате: за июль		35 273 609									15 138 066

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №44 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС Алматинской области, находящегося по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы.

Наименование обьекта: 2-1-1 Капитальный ремонт складских помещений длительного хранения ДЧС Алматинской области, находящегося по адресу Алматинская область, Коксуский район, с. Теректы.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п: осн. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отдельно стоящий гараж на 6 боксов								
12.	E0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	490,50	316,78	2,63	155380	1288	0,45	220
					74,78	0,99	36682	484	0,00	2
13.	E0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	432,00	338,18	2,91	146092	1258	0,56	243
					93,41	1,10	40355	475	0,01	2
14.	E0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, перегородок	м2	50,46	316,78	2,63	15985	132	0,45	23
					74,78	0,99	3774	50	0,00	0
18.	E0113-15- 1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	457,40	228,15	0,22	104358	103	0,05	22
					9,31	0,09	4261	40	0,00	0
19.	E0115-156 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	457,40	318,24	2,54	145564	1161	0,15	67
					26,14	0,96	11956	440	0,00	2
20.	E0109-46-	Монтаж каркасов ворот	т	1,40	189966,82	21793,74	265954	30511	47,61	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания			8797,50	3035,84	12316	4250	10,19	14
21.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	3,30	210567,17 14826,38	1416,44 497,81	694872 48927	4674 1643	94,42 2,44	312 8
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	151,20	22,68 6,68	0,06 0,03	3429 1010	9 4	0,03 0,00	5 0
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	151,20	20,99 4,78	0,03 --	3173 723	4 --	0,02 --	4 --
		Итого по разделу: Отдельно стоящий гараж на 6 боксов								1534807
		Раздел: Отдельно-стоящий гараж на один бокс								
30.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	73,60	19,52 15,79	0,15 0,06	1436 1162	11 5	0,11 0,00	8 0
36.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	76,40	228,15 9,31	0,22 0,09	17431 712	17 7	0,05 0,00	4 0
37.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	76,40	318,24 26,14	2,54 0,96	24314 1997	194 74	0,15 0,00	11 0
38.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,20	210567,17 14826,38	1416,44 497,81	42113 2965	283 100	94,42 2,44	19 0
39.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,82	22,68 6,68	0,06 0,03	177 52	-- --	0,03 0,00	0 0
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,82	20,99 4,78	0,03 --	164 37	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Отдельно-стоящий гараж на один бокс								85636
		Раздел: Вещевой склад с двумя боксами								
49.	Е0115-152	Окраска водными составами внутри	м2	1136,30	19,52	0,15	22178	170	0,11	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений известковая по штукатурке			15,79	0,06	17942	71	0,00	0
50.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема более 2 м2	м2	8,90	371,23 156,91	23,59 7,99	3304 1396	210 71	0,94 0,04	8 0
двухстворчатых										
51.	C12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	8,90	6920,00 --	-- --	61588 --	-- --	-- --	-- --
52.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,80	446,86 174,40	128,16 44,59	4826 1883	1384 482	1,03 0,17	11 2
53.	C12063-18	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние	м2	10,80	5380,00 --	-- --	58104 --	-- --	-- --	-- --
54.	E0110-35-1	Установка штучных изделий	шт	24,00	353,32 115,40	29,84 11,27	8480 2770	716 271	0,78 0,06	19 1
55.	C11011-791	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в помещение	т	24,00	1380,00 --	-- --	33120 --	-- --	-- --	-- --
56.	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	34,50	612,48 359,66	7,91 2,99	21130 12408	273 103	2,06 0,01	71 1
57.	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	34,50	19,52 15,79	0,15 0,06	673 545	5 2	0,11 0,00	4 0
60.	E0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	423,00	228,15 9,31	0,22 0,09	96509 3940	95 37	0,05 0,00	20 0
61.	E0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	423,00	318,24 26,14	2,54 0,96	134616 11057	1073 407	0,15 0,00	62 2
64.	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,40	210567,17 14826,38	1416,44 497,81	84227 5931	567 199	94,42 2,44	38 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,20	22,68 6,68	0,06 0,03	1706 502	5 2	0,03 0,00	3 0
66.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	75,20	20,99 4,78	0,03 --	1578 360	2 --	0,02 --	2 --
		Итого по разделу: Вещевой склад с двумя боксами								532039
		Раздел: Центральный вещевой склад								
76.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	902,34	19,52 15,79	0,15 0,06	17611 14247	135 56	0,11 0,00	95 0
77.	Е0110-91-6 двухстворчатых	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема более 2 м2	м2	17,85	371,23 156,91	23,59 7,99	6626 2801	421 143	0,94 0,04	17 1
78.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	17,85	6920,00 --	-- --	123522 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,21	145244,84 8461,13	1453,68 135,00	31111 1812	311 29	53,59 0,66	11 0
80.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,60	446,86 174,40	128,16 44,59	1609 628	461 161	1,03 0,17	4 1
81.	С12063-18	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние	м2	3,60	5380,00 --	-- --	19368 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	шт	8,00	353,32 115,40	29,84 11,27	2827 923	239 90	0,78 0,06	6 0
83.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в помещение	т	8,00	1380,00 --	-- --	11040 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2	м2	470,40	228,15 9,31	0,22 0,09	107324 4382	106 41	0,05 0,00	23 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без растворителя								
87.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	470,40	318,24	2,54	149701	1194	0,15	69
					26,14	0,96	12296	453	0,00	2
90.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,40	210567,17	1416,44	84227	567	94,42	38
					14826,38	497,81	5931	199	2,44	1
91.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,00	22,68	0,06	1247	3	0,03	2
					6,68	0,03	367	1	0,00	0
92.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	55,00	20,99	0,03	1154	1	0,02	1
					4,78	--	263	--	--	--
		Итого по разделу: Центральный вещевой склад								557368
		Раздел: Электромонтажные работы								
97.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	538,55	16,50	3231	99	1,15	7
					261,05	2,87	1566	17	0,02	0
98.	СПрайс	Автоматы трехполюсные до 100А	шт	6,00	184,83	--	1109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0121-29-1	Монтаж охранно-пожарной сигнализации Б/У	шт	6,00	81,00	--	486	--	0,33	2
					52,53	--	315	--	--	--
100.	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	шт	3,00	181,55	0,69	545	2	0,89	3
					180,86	0,11	543	--	0,00	0
101.	СПрайс	Счетчик трехфазный	шт	3,00	10579,43	--	31738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	460,00	24,84	--	11426	--	0,15	69
					24,84	--	11426	--	--	--
103.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,30	60500,00	--	18150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до	1000м	0,16	52100,00	--	8336	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41	660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2			--	--	--	--	--	--
105.	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп	шт	35,00	550,53	178,29	19269	6240	2,01	70
		устанавливаемых на подвесках /штангах/		341,55	107,33	11954	3757	0,47	17	
106.	С151702-2-1	Светильники тип ЛВ003-2Х40-001-УХЛ4	шт	35,00	2550,00	--	89250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка,	шт	30,00	37,55	--	1126	--	0,24	7
		распред.коробка		37,55	--	1126	--	--	--	
108.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	12,00	182,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	18,00	145,00	--	2610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,03	16300,00	--	489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								189950
		Раздел:								
111.	С143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	46,97	6250,00	--	293582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов глухих	м2	22,20	250,04	23,78	5551	528	1,52	34
					226,26	8,98	5023	199	0,04	1
113.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических ворот	т	2,50	5893,58	814,06	14734	2035	27,96	70
					4414,50	75,60	11036	189	0,37	1
114.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	2,00	4899,14	1880,99	9798	3762	21,24	42
					3018,15	538,09	6036	1076	2,91	6
115.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	т	0,37	99406,82	3209,40	36383	1175	179,48	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					32166,00	1212,75	11773	444	5,92	2
116.	Е0109-47-1	Облицовка фрамуг листом	м2	21,60	64,02	3,74	1383	81	0,34	7
					56,15	1,45	1213	31	0,01	0
117.	С11011-87 5	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	т	0,08	64200,00	--	5008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0109-46-1	Монтаж б/у каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	2,50	36982,82	21793,74	92457	54484	47,61	119
					8797,50	3035,84	21994	7590	10,19	25
119.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	32,00	221,81	12,44	7098	398	0,41	13
					60,03	4,67	1921	150	0,02	1
120.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	32,00	450,94	13,40	14430	429	0,08	3
					11,59	5,00	371	160	0,02	1
121.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5604,41	409,16	429	31	13,34	1
					2173,50	154,69	166	12	0,75	0
122.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,08	50800,00	--	3886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,18	21898,02	417,85	4024	77	25,41	5
					3907,13	157,50	718	29	0,78	0
124.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистомпо деревянной обрешетке сее устройством	м2	20,00	1844,08	10,25	36882	205	1,97	39
					313,89	3,85	6278	77	0,02	0
125.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,29	1911,45	17,71	552	5	2,16	1
					349,31	6,75	101	2	0,03	0
126.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	20,00	133,09	0,69	2662	14	0,05	1
					7,45	0,25	149	5	0,00	0
127.	Е0109-57-5прим	Монтаж обрамления смотровой ямы	т	0,06	26001,11	11140,23	1430	613	62,45	3
					11695,50	2468,47	643	136	9,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,06	47200,00	--	2596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,23	11244,84	1453,68	2643	342	53,59	13
					8461,13	135,00	1988	32	0,66	0
130.	С12021-268	Сварная решетка смотровой ямы	т	0,23	134000,00	--	31490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0107-13-1К=0,5	Демонтаж плит перекрытия	шт	1,00	1174,26	242,01	1174	242	1,18	1
					197,94	71,89	198	72	0,29	0
132.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	1,00	1614,21	484,02	1614	484	2,37	2
					395,89	143,77	396	144	0,58	1
133.	С143017-32	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87/, приведенная толщина 30 см	м2	9,00	2520,00	--	22680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	10,80	3090,75	--	33380	--	3,73	40
					610,65	--	6595	--	--	--
135.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	37,80	8628,64	82,51	326162	3119	1,55	59
					225,11	31,16	8509	1178	0,15	6
136.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,40	99406,82	3209,40	39763	1284	179,48	72
					32166,00	1212,75	12866	485	5,92	2
137.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,20	211,49	9,95	6176	291	0,36	10
					52,20	3,74	1524	109	0,02	1
138.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	29,20	446,75	10,72	13045	313	0,07	2
					10,08	4,00	294	117	0,02	1
139.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5239,08	327,33	401	25	11,60	1
					1890,00	123,75	145	9	0,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,08	50800,00 --	-- --	3886 --	-- --	-- --	-- --
141.	Е0146-44-2	Разборка заполнений оконных проемов	м2	7,20	250,04 226,26	23,78 8,98	1800 1629	171 65	1,52 0,04	11 0
142.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	7,20	346,04 136,44	18,87 6,39	2492 982	136 46	0,82 0,03	6 0
143.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	7,20	6920,00 --	-- --	49824 --	-- --	-- --	-- --
144.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,36	563,98 312,75	6,33 2,39	1895 1051	21 8	1,79 0,01	6 0
145.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	3,36	17,43 13,73	0,12 0,05	59 46	-- --	0,09 0,00	0 0
146.	Е0109-53-2	Монтаж оконных решеток	т	0,40	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	3940 2943	465 43	46,60 0,53	19 0
147.	С12021-268	Сварная решетка оконная	т	0,40	134000,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	156,00	33,58 31,05	2,52 0,40	5238 4844	394 62	0,20 0,00	31 1
160.	Е0169-18-1	Очистка кровли от мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	156,00	6,99 6,99	-- --	1091 1091	-- --	0,05 --	8 --
161.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	40,00 72,71	158,06 48,69	82,72 2909	6322 1948	3309 0,08	0,39 3	16
162.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,10	379612,58	670,08	37961	67	332,35	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой			54596,25	253,12	5460	25	1,24	0
163.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99034,93 38036,25	380,30 143,44	990 380	4 1	227,70 0,70	2 0
164.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,10	169851,80 8694,00	13899,17 5250,94	16985 869	1390 525	48,88 25,65	5 3
165.	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата	м3	1,44	21898,02 3907,13	417,85 157,50	31533 5626	602 227	25,41 0,78	37 1
166.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистомпо деревянной обрешетке сее устройством	м2	170,00	1844,08 313,89	10,25 3,85	313493 53362	1742 655	1,97 0,02	334 3
167.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,70	1911,45 349,31	17,71 6,75	5161 943	48 18	2,16 0,03	6 0
168.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	170,00	133,09 7,45	0,69 0,25	22625 1267	117 42	0,05 0,00	8 0
169.	Е0110-12-3	Подшивка карниза плитами OSB толщиной 10 мм	м2	24,00	1268,24 122,65	5,60 2,11	30438 2944	134 51	0,77 0,01	19 0
170.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,00	739,16 176,21	1,55 0,59	5174 1234	11 4	1,12 0,00	8 0
171.	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок	м2	9,90	141,28 125,23	16,04 6,06	1399 1240	159 60	0,69 0,03	7 0
172.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	395,00	25,70 25,70	-- --	10152 10152	-- --	0,18 --	70 --
173.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	4,56	1795,50 1167,75	627,75 236,25	8187 5325	2863 1077	7,10 1,16	32 5
174.	Е0146-44-2	Разборка заполнений оконных проемов	м2	7,68	289,92 260,20	29,73 11,22	2227 1998	228 86	1,74 0,05	13 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	395,00	7,13	0,09	2816	36	0,05	19
					7,04	0,02	2781	8	0,00	0
176.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку	м2	525,00	494,50	0,85	259615	446	0,82	428
					117,50	0,13	61688	68	0,00	1
177.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	395,00	247,22	4,23	97653	1672	0,75	295
					134,55	0,90	53147	356	0,06	25
178.	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, перегородок	м2	130,00	445,91	5,68	57968	739	1,35	175
					255,65	1,44	33234	187	0,07	9
179.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен и перегородок	м2	525,00	19,52	0,15	10247	79	0,11	56
					15,79	0,06	8289	33	0,00	0
180.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	7,68	371,23	23,59	2851	181	0,94	7
					156,91	7,99	1205	61	0,04	0
	двухстворчатых	площадью проема более 2 м2								
181.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	7,68	6920,00	--	53146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	7,06	612,48	7,91	4324	56	2,06	15
					359,66	2,99	2539	21	0,01	0
183.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	7,06	19,52	0,15	138	1	0,11	1
					15,79	0,06	111	--	0,00	0
184.	Е0109-53-2	Монтаж оконных решеток	т	0,27	11244,84	1453,68	3036	392	53,59	14
					8461,13	135,00	2285	36	0,66	0
185.	С12021-268	Сварная решетка оконная	т	0,27	134000,00	--	36180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным	м2	140,00	703,50	0,85	98491	119	0,82	114
					117,50	0,13	16450	18	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностям								
187.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	140,00	245,81	2,45	34413	343	0,70	98
					125,23	0,56	17533	79	0,03	5
188.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	140,00	228,15	0,22	31942	31	0,05	7
					9,31	0,09	1304	12	0,00	0
189.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	140,00	318,24	2,54	44554	355	0,15	21
					26,14	0,96	3660	135	0,00	1
190.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	156,00	279,92	16,79	43667	2619	0,42	66
					60,55	6,30	9445	983	0,03	5
191.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	156,00	450,94	13,40	70347	2090	0,08	13
					11,59	5,00	1808	780	0,02	4
192.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,35	5604,41	409,16	1962	143	13,34	5
					2173,50	154,69	761	54	0,75	0
193.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,35	50800,00	--	17780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,27	210567,17	1416,44	56853	382	94,42	25
					14826,38	497,81	4003	134	2,44	1
195.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,40	22,68	0,06	463	1	0,03	1
					6,68	0,03	136	1	0,00	0
196.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,40	20,99	0,03	428	1	0,02	0
					4,78	--	98	--	--	--
197.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	10,00	7683,16	419,80	76832	4198	5,22	52
					804,71	157,50	8047	1575	0,76	8
198.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,15	61023,81	527,69	9154	79	64,86	10
					9496,13	196,87	1424	30	0,96	0
199.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса	м3	4,00	11568,87	395,01	46275	1580	9,49	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1573,20	149,24	6293	597	0,73	3
200.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,12	51000,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	3,00	1795,50	627,75	5386	1883	7,10	21
					1167,75	236,25	3503	709	1,16	3
202.	Е0146-22-2	Кладка парапетов	м3	7,50	8134,64	192,54	61010	1444	8,16	61
					1221,30	73,12	9160	548	0,35	3
203.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	24,00	739,16	1,55	17740	37	1,12	27
					176,21	0,59	4229	14	0,00	0
204.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	36,00	245,81	2,45	8849	88	0,70	25
					125,23	0,56	4508	20	0,03	1
205.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	36,00	19,52	0,15	703	5	0,11	4
					15,79	0,06	568	2	0,00	0
217.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	20,00	132,03	66,18	2641	1324	0,34	7
				63,23	38,95		1265	779	0,06	1
218.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	379612,58	670,08	7592	13	332,35	7
					54596,25	253,12	1092	5	1,24	0
219.	Е0146-12-2	Усиление стен	т	0,22	31135,75	6222,50	6781	1355	106,38	23
					19975,50	230,06	4351	50	0,99	0
220.	С11041-86	Сталь угловая 63х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,10	45500,00	--	4404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,12	51000,00	--	6171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,03	99034,93	380,30	2971	11	227,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			38036,25	143,44	1141	4	0,70	0
223.	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	м3	0,50	20675,53	395,71	10338	198	30,48	15
					5084,44	149,06	2542	75	0,72	0
224.	Е0106-11-10	Армирование набетонок	1т	0,05	5604,41	409,16	280	20	13,34	1
					2173,50	154,69	109	8	0,75	0
225.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,05	51000,00	--	2550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
A-III, d 14 мм										
226.	Е0146-44-2	Разборка заполнений оконных проемов	м2	5,60	289,92	29,73	1624	166	1,74	10
					260,20	11,22	1457	63	0,05	0
227.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	5,60	371,23	23,59	2079	132	0,94	5
					156,91	7,99	879	45	0,04	0
двухстворчатых		площадью проема более 2 м2								
228.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	5,60	6920,00	--	38752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,04	612,48	7,91	1862	24	2,06	6
					359,66	2,99	1093	9	0,01	0
230.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	3,04	19,52	0,15	59	--	0,11	0
					15,79	0,06	48	--	0,00	0
231.	Е0109-53-2	Монтаж оконных решеток	т	0,24	11244,84	1453,68	2699	349	53,59	13
					8461,13	135,00	2031	32	0,66	0
232.	С12021-268	Сварная решетка оконная	т	0,24	134000,00	--	32160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	29,53	27,10	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	29,53	252,11	252,11	7445	7445	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-2	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2			--	50,42	--	1489	1,06	31
		Итого по разделу:								2920033
ИТОГО:							5819833	165766		4753
							776692	40373		228

Накладные расходы :

На монтажные работы	29660
На общестроительные работы	625662
На металломонтажные работы	114946
Всего накладных расходов:	770269
Итого с накладными	6590101

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	4753
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	228
- в накладных расходах, чел-ч.	385
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5366

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	393502
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6983603
Пересчет в текущих ценах, К-1,77907	12424310
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	248486
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12672796
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1520736
Итого с НДС	14193532

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
