форма 3

...сырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і

...женер: "Люкс Строй Инжиниринг" ЖШС

...рдігер: "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС

...сан: Шымкент қ. Қайтпас-1 ш/а Наурыз өткелін орташа жөндеу

...лісім шарт: 03.07.2018ж. №158 келісім шартқа қосымша келісім №1 22.08.2018ж.

2018 жылғы қыркүйек айындағы орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы

12.09.2018ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
	30340	№158 келісім шарт	03.07.2018ж.				ЖШС	17
		№1 қосымша келісім	17.08.2018ж.					

Істе жасу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ККС есепті айда (Қыркүйек айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Қыркүйек айы ККС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
...ымкент қ. Қайтпас-1 ш/а Наурыз өткелін орташа жөндеу	20 390 335	18 205 656						2 184 679	20 390 335
Устап қалу 5%	1 019 517	910 283						109 234	1 019 517
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	19 370 818	17 295 373						2 075 445	19 370 818

...сырыс беруші:
...мкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль
...ары басқармасы» ММ-и басшысы
_____ К. Жұмаулев
"___" _____ 2018 жыл

Инженер:
"Люкс Строй Инжиниринг" ЖШС директоры:
_____ Ж.К.Мустафин
"___" _____ 2018 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ С.К.Карсыбаев
"___" _____ 2018 жыл

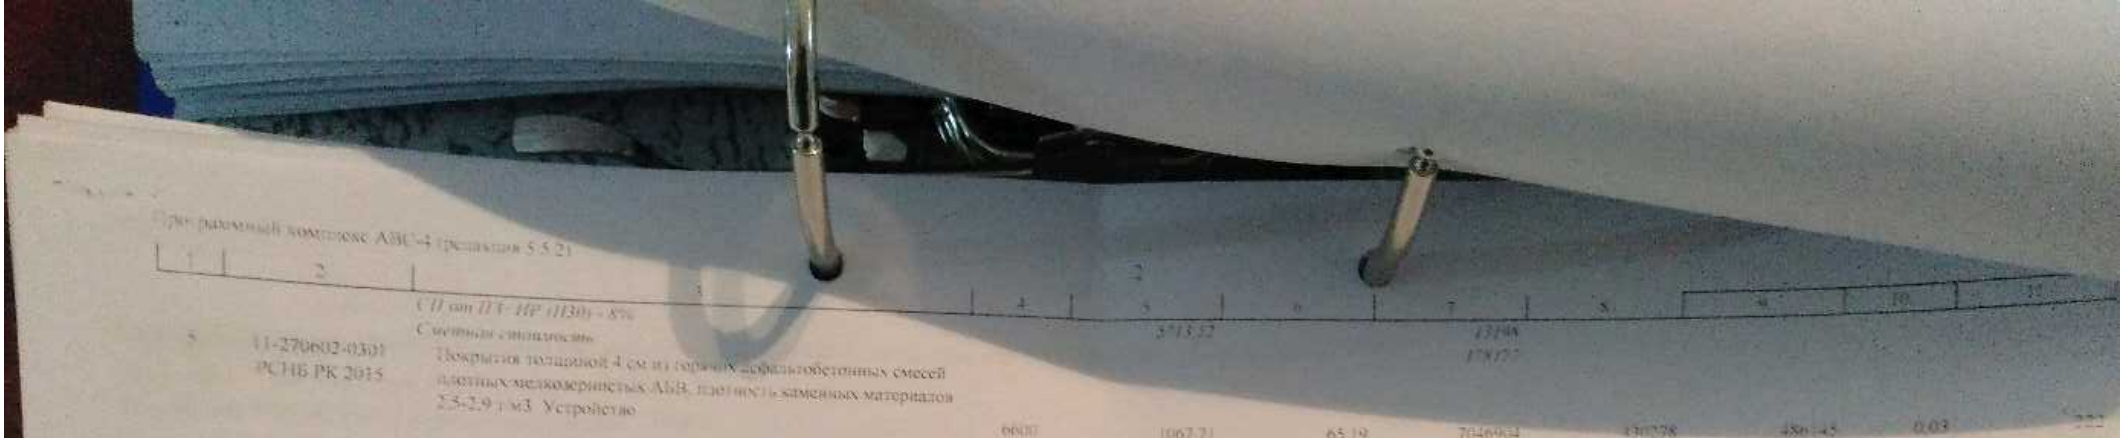

Жилищный комплекс АЗС-4 (редакция 5.5.21)

		СП от ПЗ- НР (Н30) - 8%									
		Сметная стоимость									
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			6000	1067,71	65,19	7046964	436028	486145	0,03	222	
		м2 покрытия		27,83	18,03	183671	118998	80,3	0,02	111	
		Накладные расходы -		*73,66*		*486145*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*182509*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*46,01*				*303635*			
		СП от ПЗ- НР (Н30) - 8%		*91,31*		*602644*					
		Сметная стоимость				*8135693*					
6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301									
			6000	243,00	0,03	1603804	224	67978	--	1	
		м2 покрытия		0,15	--	984	--	60,3	--	--	
		Накладные расходы -		*10,30*		*67978*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*593*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,21*				*67385*			
		СП от ПЗ- НР (Н30) - 8%		*20,26*		*133743*					
		Сметная стоимость				*1805325*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15719903	1304139			518	
		Накладные расходы -	Тенге			1137186					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					457725			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					679461			
		Сметная прибыль -	Тенге			1348567					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18205656					
		НДС-12%	Тенге			2184679					
		ИТОГО:	Тенге			20 390 335					

Инженер:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ Н.С.Аутеханов

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев

Нач.участка _____ А.Хоналиев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"
Инженер: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: доп.согл. №1 от 22.08.2018г. к договору №158 от 03.07.2018г.

Наименование объекта - "Средний ремонт улицы проезд Наурыз, мкр. Кайтпас-1, Каратауский район, г. Шымкент"

АКТ №1
приёмки выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала м2 площади основания	6600	198,10 21,90	78,20 20,18	1307442 144565	516088 133221	229452 60,3	0,03 0,02	204 137
		Накладные расходы -		*34,77*		*229452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*25,38*				*167505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9,39*				*61948*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,63*		*122952*				
		Сметная стоимость				*1659846*				
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов т	4,62	68206,74 –	1193,97 553,21	315115 –	5516 2556	14841 60,3	– 0,58	– 3
		Накладные расходы -		*3212,28*		*14841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*1541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2878,69*				*13300*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5713,52*		*26396*				
		Сметная стоимость				*356352*				
3	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона т смеси	477,84	11068,73 160,56	730,94 203,18	5289080 76720	349274 97088	331349 60,3	0,19 0,19	91 90
		Накладные расходы -		*693,43*		*331349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*219,33*				*104806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*474,10*				*226543*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*940,97*		*449634*				
		Сметная стоимость				*6070064*				
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов т	2,31	68206,74 –	1193,97 553,21	157558 –	2758 1278	7420 60,3	– 0,58	– 1
		Накладные расходы -		*3212,28*		*7420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2878,69*				*6650*		
