Приложение № 3
К Договору №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

РЭУ Караозек «12» марта 2019г.

Объект:
КУ32 tag № GHV3201; КУ34 tag № GHV3401; КУ37 tag № GHV3701; КУ38 tag № GHV3801
МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
Дата проведения работ (оказания услуг): 11-12.03.2019
Наименование проекта:
Корректировка системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH

Работы произведены в соответствии с требованиями Договора№2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018 г.,
Выполненные работы (в соответствие с Планом производства работ на соответствующий период):

- Демонтаж установленного клапана-соленоида (НО) Art.Nr 203006.146;
- Установка нового клапана-соленоида (НЗ) Art.Nr 203006.151;
- Подача напряжения 24V от ТШ на блок управления запорной арматуры SEC200;
- Имитация повышенного давления (Pmax) в МГ (свыше 100 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация пониженного давления (Pmin) в МГ (ниже 20 bar), клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Имитация резкого понижения давления в МГ (свыше 2 bar в минуту) клапан-соленоид (НЗ) срабатывает в штатном режиме, запорная арматура закрывается;
- Проверка системы управления запорной арматуры в дистанционном режиме на закрытие/открытие, запорная арматура переставляется в штатном режиме.

Примечание:

1. Проверка системы управления запорной арматуры в дистанционном режиме на закрытие/открытие не было выполнено на крановых узлах №32,34, в связи с отсутствием серверной связи в ДЦ «Кызылорда».
2. На КУ-34 открыли крышку контроллера блока управления SEC200 и поставили предохранитель в исходное положение (фото прилагается).

Заключение:
Работы по корректировке системы управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH на КУ-32; КУ-34, КУ-37, КУ-38 выполнены в полном объеме, в соответствии с требованиями Договора №2018/BSGP/S-132 от 26.10.2018г.
Принципиальная схема управления запорной арматуры Franz Schuck GmbH готова к интеграции линейной телемеханики SCADA RTU ТОО «ГБШ».

Представители комиссии:
От Заказчика:

Ведущий инженер ПТД ТОО «ГБШ» _____ Кудайбергенов Н.Б.

От Оператора:

Инженер ЛЭС РЭУ «Караозек» АО «ИЦА» _____ Дуйсенбаев Б.У.

Инженер КИПиА РЭУ «Караозек» АО «ИЦА» _____ Сакесов У.Н.

От Исполнителя:

Инженер ТОО «Виса-Трейд» _____ Бувашев А.Ю.

Слеварь ТОО «Виса-Трейд» _____ Ахмедов В.А.

От Представителя Алора-Техносерв

Инженер-монтажник _____ Ертаев М.Н.

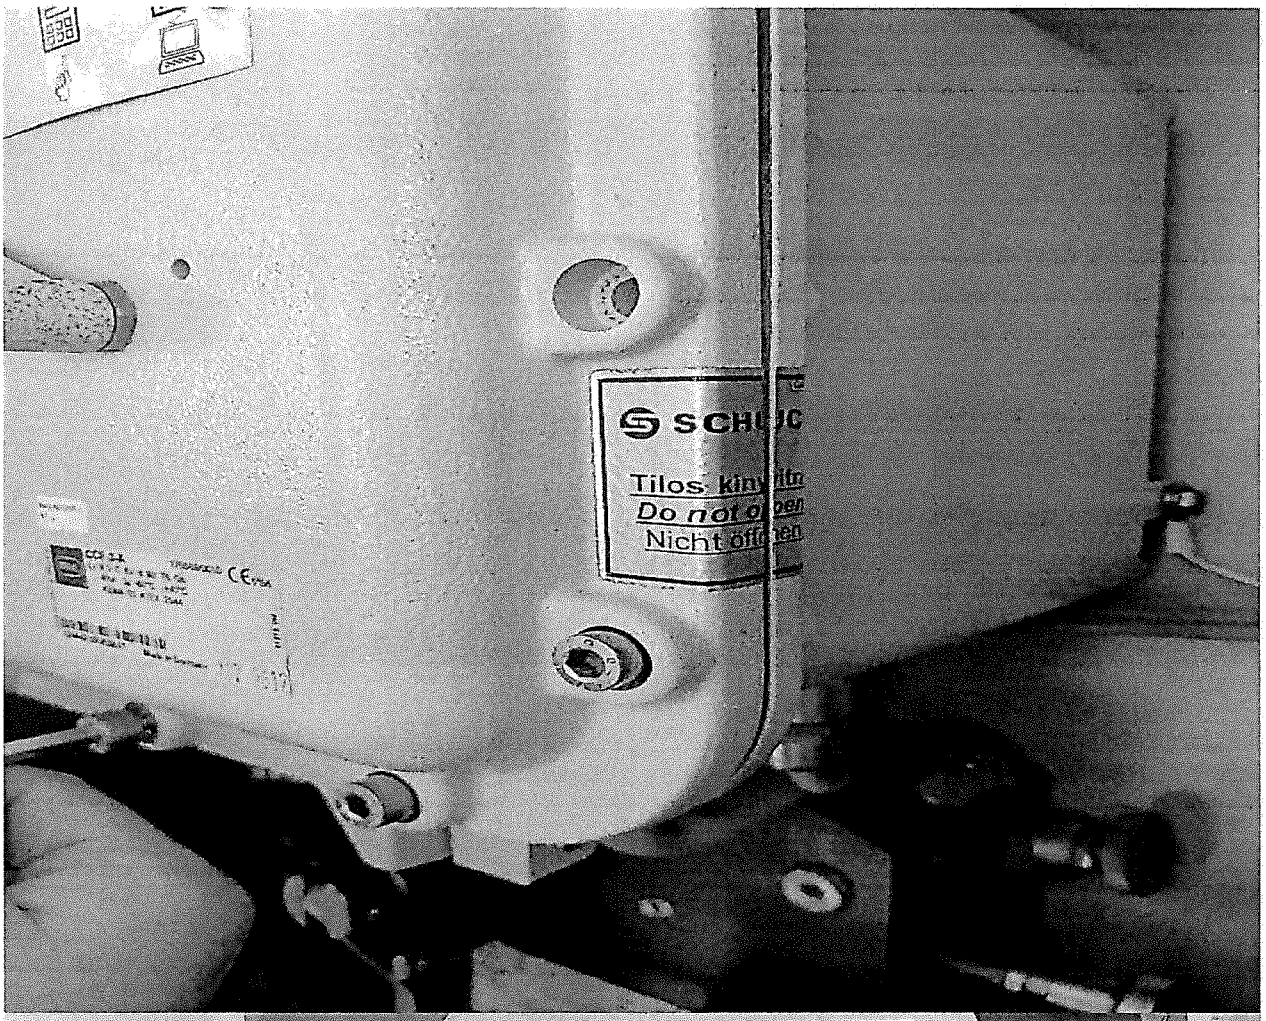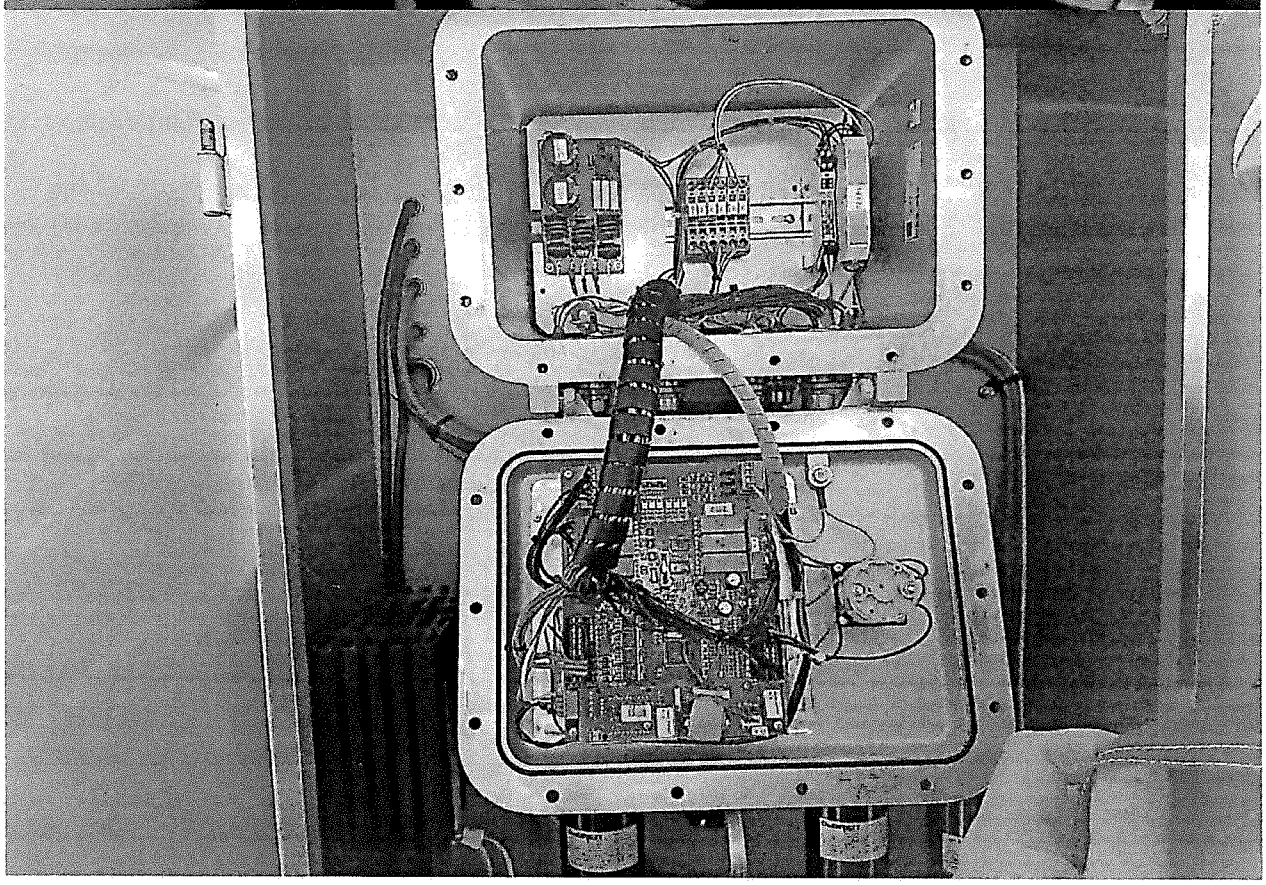
Do not open
Nicht öffnen
