Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы "06" 05

Тапсырыс беруші «Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ Басшысы – Садыков Асланбек Балтабекович, БСН: 060140013382, 140000, Павлодар қ, Кривенко к,25

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

2019 жылғы 28 қазандағы №152/19 шарты негізінде

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) « » 2020 жылы. «Dike» жауапкершілігі шектеулі серіктестік. БИН:030840016436, 23.09.2019 жылы берілген №19019491 I санатты лицензия; Заңды мекенжайы: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Еркенов көш, 45 Директор - Сейфуллин Марат Бекетович тұлғасында

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)

« » 2020 жылы. «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ» ЖШС, БСН: 021140003456

Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қ, Абай көш,13, басшы Н. Нурманбетов

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

1) Забиров Айдар Тлеубаевич– құрылыс бақылауы жөніндегі инженер-сарапшы, 19.01.2018 жылы 06.12.2019 жылғы №185 бұйрығы негізінде берілген № KZ84VJE00034284 сарапшы аттестаты

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) « » 2020 жылы "Строй Экс Проект " ЖШС, БСН: 060640004004 Павлодар қ, Қайырбаев көш,69 Басшысы Нурмашов Икрам Жолдасбайулы

Сарапшылар:

1) Сарапшы– Нурмашов Икрам Жолдасбайулы 12.11.2019 жылғы №160/9 шарт негізінде

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Павлодар қаласы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Павлодар қаласында Сибирская, Хабаровская, Дальневосточная, Сулейменов, Деров көшелеріне орталықтандырылған кәріздік инженерлік желілер құрылысы»; Нысан екінші қалыпты жауапкершілік деңгейіне жатады.

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 20___жылғы "___" _____ №_____

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдарының құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

1. Нысан құрылысы

Тиісті жер құқығын беру туралы шешім Павлодар қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 26 қазандағы «Жобаны қаржыландыру туралы» №1144/26 Қаулысы, Павлодар қаласы әкімдігінің 2019 жылғы "15" ақпандағы № 156/1 шешімі негізінде жүргізілді;

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы 18.11.2019 жылғы KZ45REA00152543 Павлодар облысының әкімдігі «Павлодар облысының қала құрылысы және жерді бақылау басқармасы» ММ талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) Тиісті жер құқығын беру туралы шешім Павлодар қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 26 қазандағы «Жобаны қаржыландыру туралы» №1144/26 Қаулысы, Павлодар қаласы әкімдігінің 2019 жылғы "15" ақпандағы № 156/1 шешімі бекітілген жобаны

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

"Строй Экс Проект " ЖШС, Павлодар қ, (мемлекеттік лицензия 2017 жылы 25 қыркүйекте берілген ГСЛ №12013082 (Бірнші санат), 30.04.2019 жылғы 61/18-1-НК, ГЭ №ЦЭ-0129/19 жобалары (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы қараша 2019 ж.;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы сәуір 2020 ж ;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 6 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай;

нақты 5 ай;

3. Объектінің (кешеннің) сынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,

тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады).

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сыртқы кәріз желілері					
Гост Р 54475-2011 д-200мм ұзындығы - 2742,35метр; д-315мм ұзындығы - 138,47метр SN8 екі қабатты гофрленген құбырлардан сыртқы кәріз желілерін салу	метр	2880,82		3160,82	
д-426х7,0мм, ұзындығы - 62 метр болат құбырларынан жасалған қаптамалар	шт	62		62	
Кәріз желілеріне арналған темірбетон құдықтар	шт	106		106	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: SN8, Гост Р 54475-2011 д-200мм, д-315мм К1 тұрмыстық кәріз желілерінің құрылысы полипропилен гофрленген екі қабатты қысымсыз құбырлардан жасалған, сақиналы қаттылығы бар, темірбетон кәріз құдықтарын. автожол астынан өтетін құбырлар д-426х7,0мм болат қаптамаларда төселеді _____

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы _____ мың теңге, оның ішінде

құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге,

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге;

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған Объект «Павлодар қаласында Сибирская, Хабаровская, Дальневосточная, Сулейменов, Деров көшелеріне орталықтандырылған кәріздік инженерлік желілер құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші ___А.Б. Садыков

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы ,мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау __А.Т. Забиров _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау __И.Ж. Нурмашов _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) __М.Б. Сейфуллин _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, м өрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су тартқыштары, коллекторлар және тағы басқа)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тартқыштар (жалпы ұзындығы)	м		
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) темірбетон құбырынан	м		
	5)	м		
2	Таратқыш желі (жалпы ұзындығы)	м		
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) полиэтилен құбырынан	м		
	5)	м		
3	Өзге құрылғылар			
	Байқау құдығы	дана		
	Ысырма d-300	дана		
	" d-200	дана		
	" d-150	дана		
	d-100	дана		
	Бұрандалар d-300	дана		
	" d-200	дана		
	" d-150	дана		
	" d-100	дана		
	" d-50	дана		
	Су өлшеу түйіні d-15	дана		
	" d-	дана		
	" d-	дана		
	Гидрант	дана		
	Су құбыры шүмегі	дана		
	Су таратын бағаң			
	Болат футляр			
	Ішетін су бүргіш	дана		
Кәріз				
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м		
	1) керамика құбырларынан	м		
	2) болат құбырларынан	м		
	3) бетон құбырларынан	м		

	4) асбестоцемент құбырларынан	м		
	5) темірбетон құбырынан	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м	3160,82	
	1) керамика құбырларынан	м		
	2) болат құбырларынан	м		
	3) бетон құбырларынан	м		
	4) асбестоцемент құбырларынан	м		
	5) темірбетон құбырларынан (қаптама)	м	62	
	6) полипропилен құбырлары	м	3160,82	
3	Өзге құрылғылар			
	Байқау құдығы	дана	106	
	Жеңсырық	дана		
Құдықтың көлденең кескіні		Құдықтың тік кескіні		
Масштабы 1:5		Масштабы 1:50		

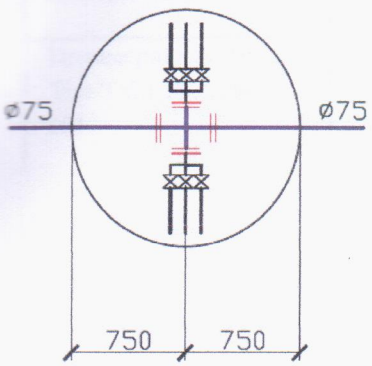

Сурет 1

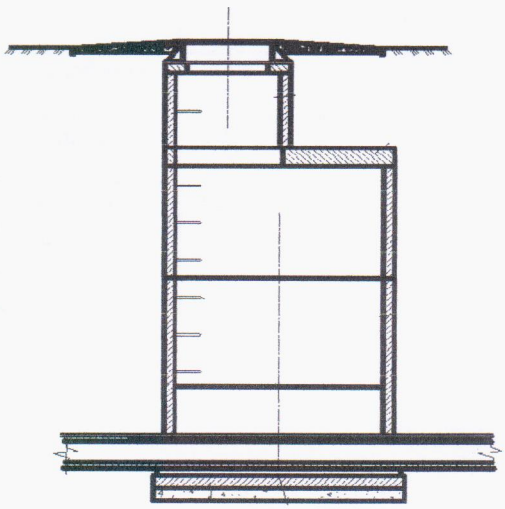

Сурет 2

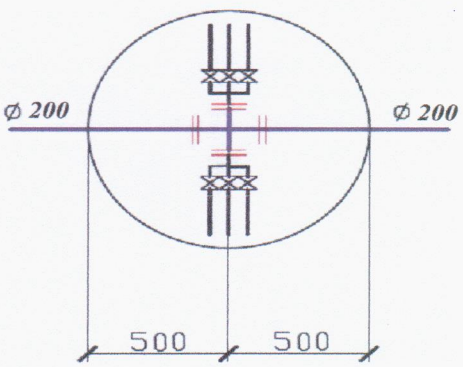

Сурет 2

Ерекшелігі

№ р/с	Атауы	Маркасы	Материалы	Диаметрі (өлшемі),мм	Саны	Ескерту
1	Түбінің плитасы	ПН 15	Темірбетон	1500	1	
2	Қабырға сақинасы	КС 15.6	Темірбетон	1500	1	
3	Қабырға сақинасы	КС 15.9	Темірбетон	1500	1	
4	Аражабын плитасы	1ПП15-1	Темірбетон	1500	1	
5	Тірек сақинасы	КО6	Темірбетон	600	1	
6	Түбінің плитасы	ПН 10	Темірбетон	2000	1	
7	Қабырға сақинасы	КС 10.6	Темірбетон	2000	2	
8	Қабырға сақинасы	КС 10.9	Темірбетон	2000	1	
9	Аражабын плитасы	ПП10-1	Темірбетон	2000	1	
10	Қабырға сақинасы	КС7,3	Темірбетон	700	1	
11	Полимерлі құм люгі Тип-Т СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	Полимер-құм	600	1	

Павлодар қаласындағы Сибирская, Хабаровская, Дальневосточная, Сулейменова, Дерова кәріз желілерінің тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою сызбасы

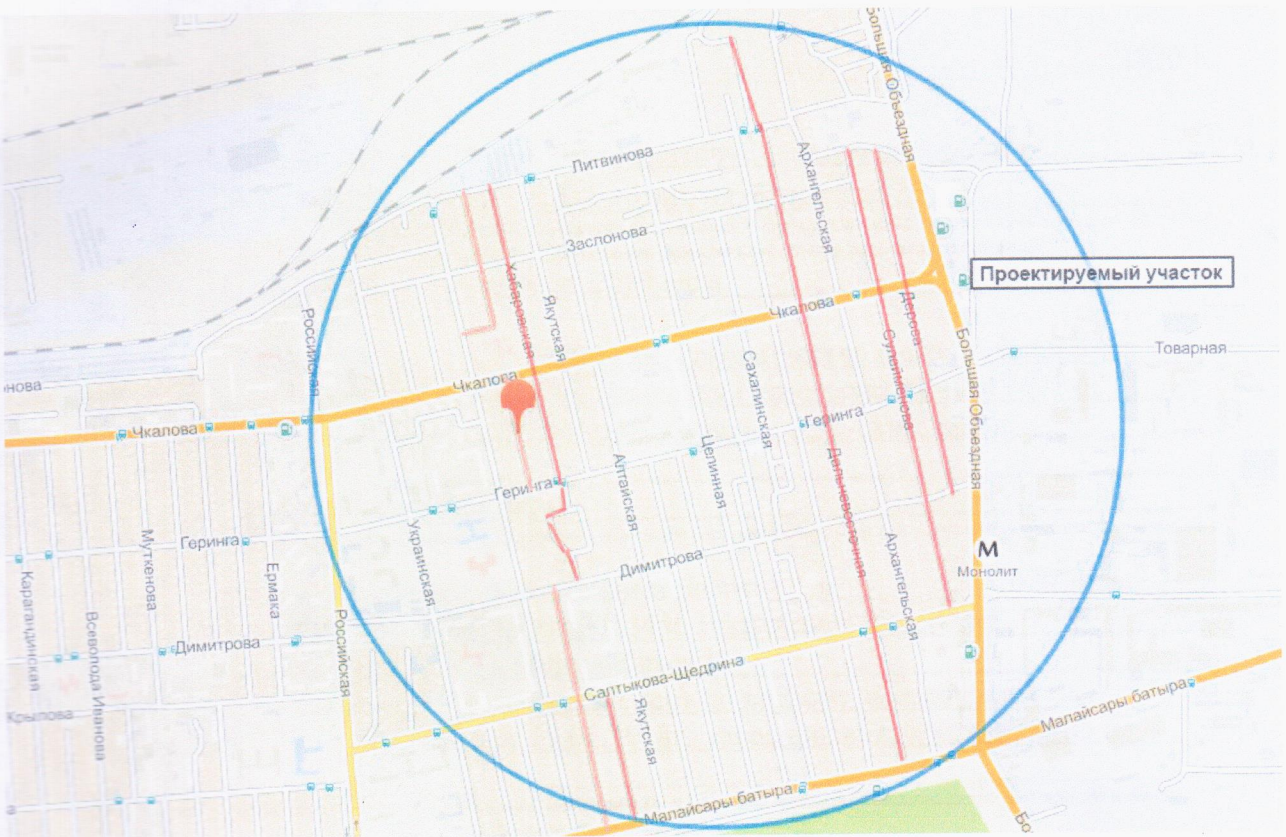

Тапсырыс беруші А.Б. Садыков
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау И.Ж. Нурмашов
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы мөрдің орны (болған жағдайда)
